



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 28 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	878
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	882
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	376
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.323
C. Baygorria	2.185
C. Palmar	7.868
C. Salto Grande	15.419
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.841
TOTAL Generación	32.804

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.804
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	34.480
Diferencia (MWh)	-1.676
Ejecutada - Programada	-4,86 %

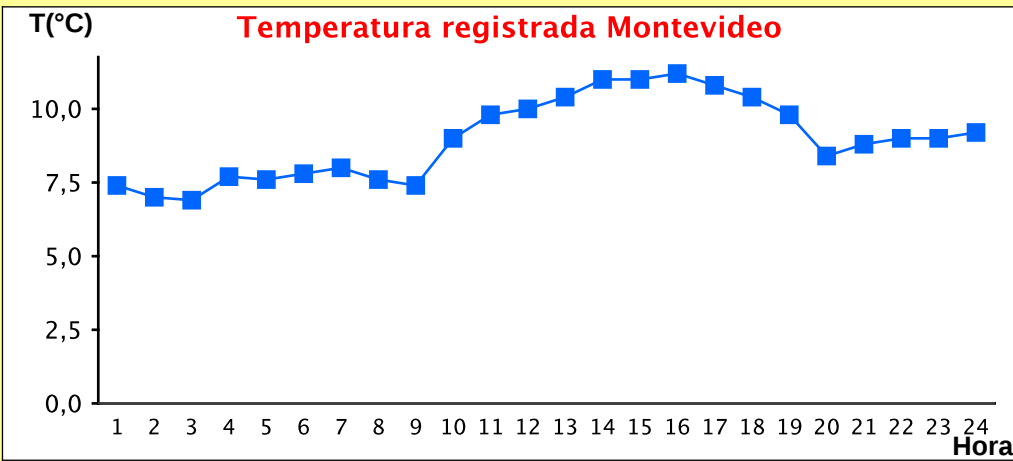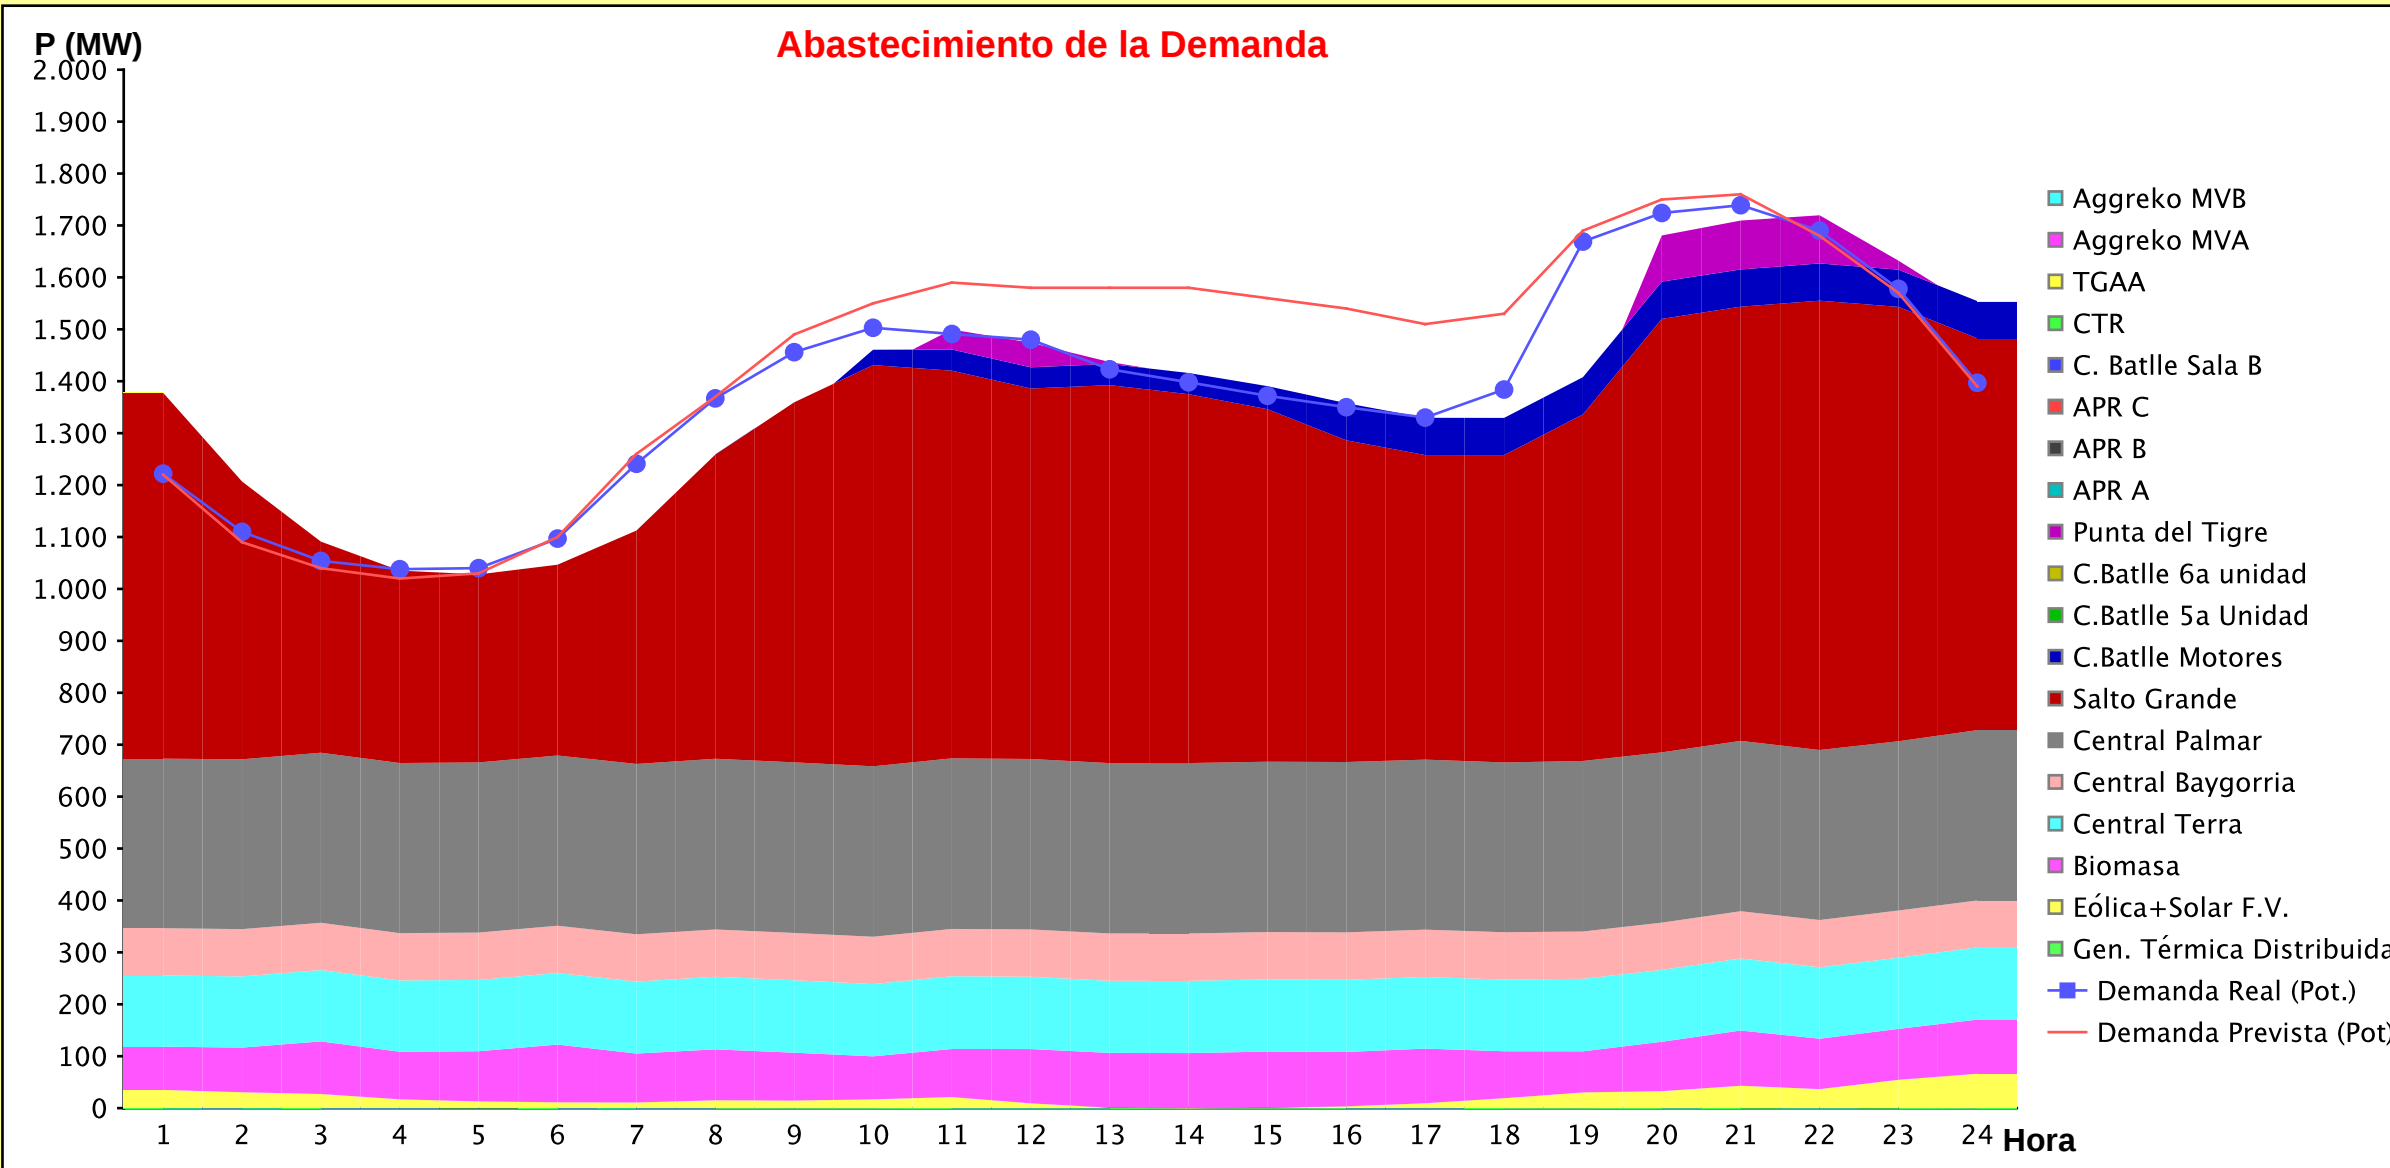



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1509,9 Hora 10:02
Potencia mínima:	1025,44 Hora 03:52
Pico noche:	1757,31 Hora 21:03

Generación Media (MW)	
Eólica	22,4
Biomasa	97,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

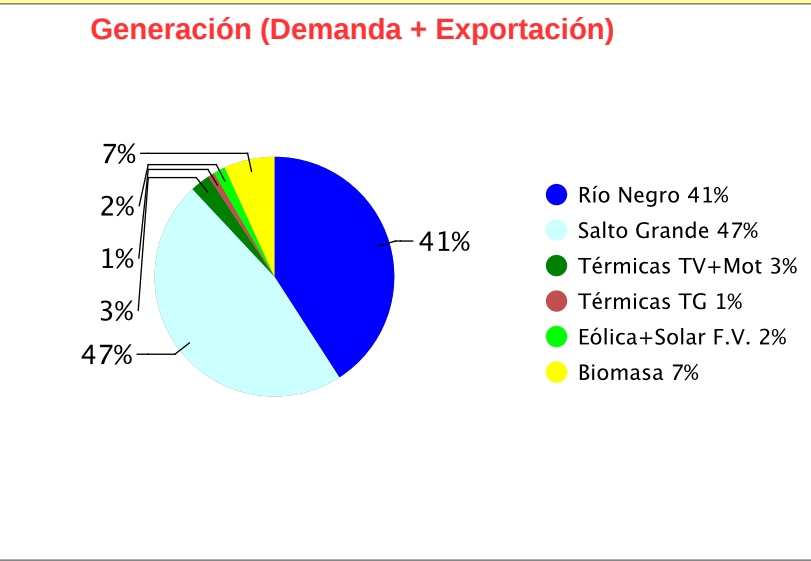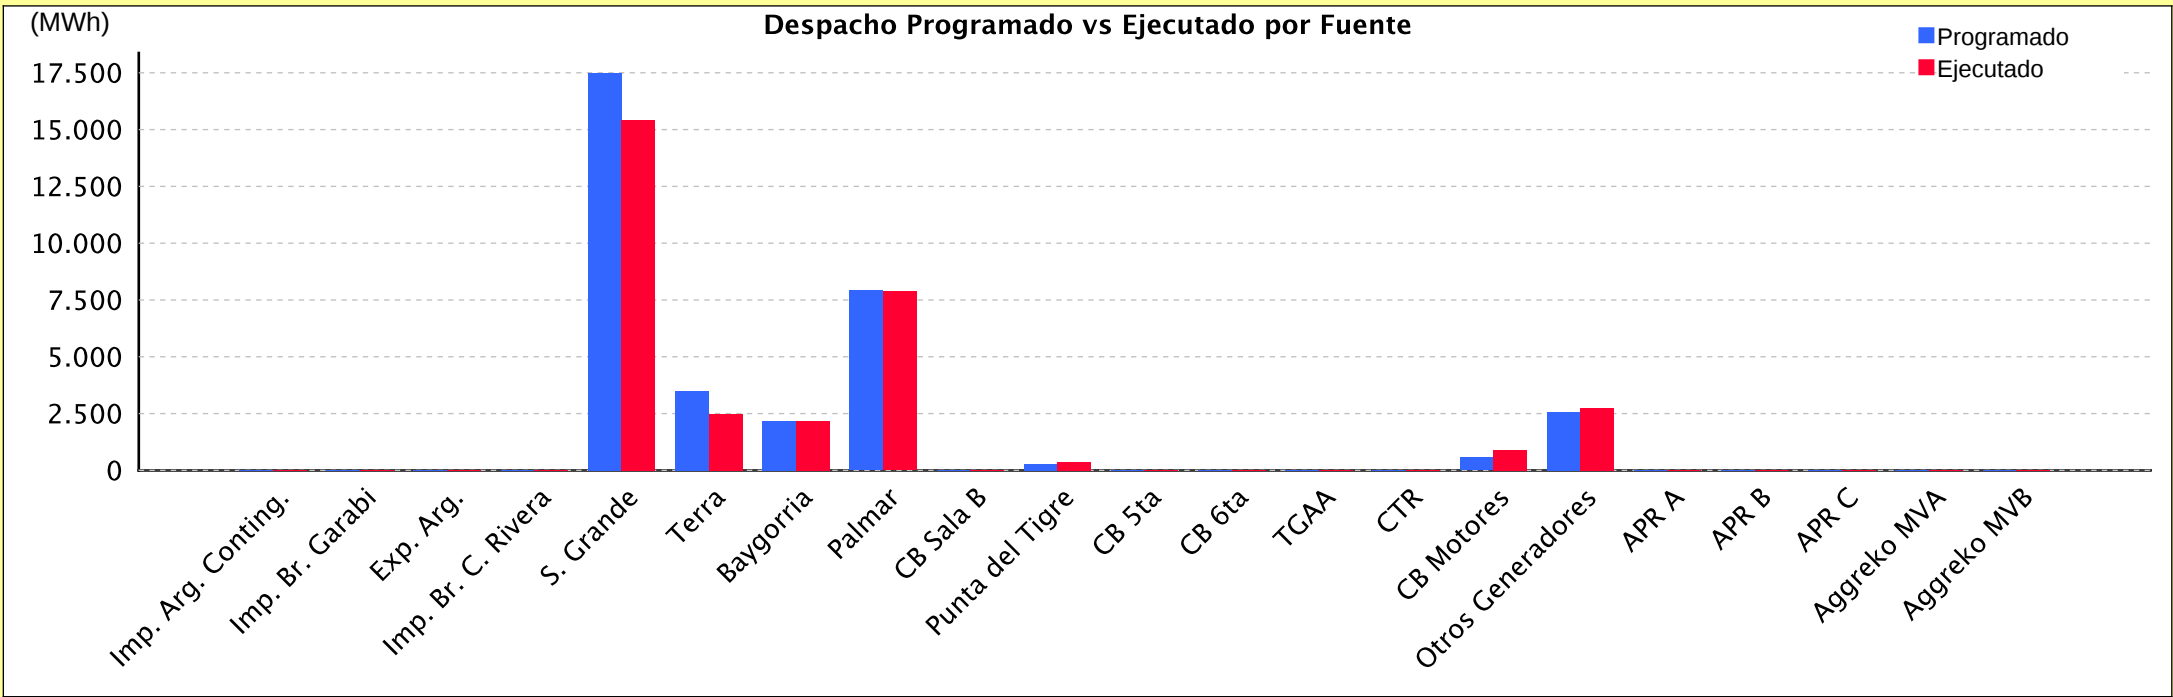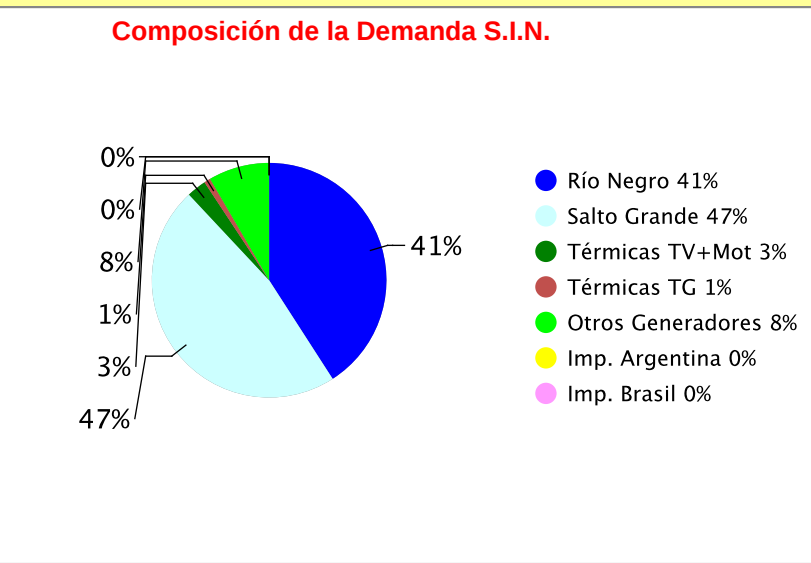



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

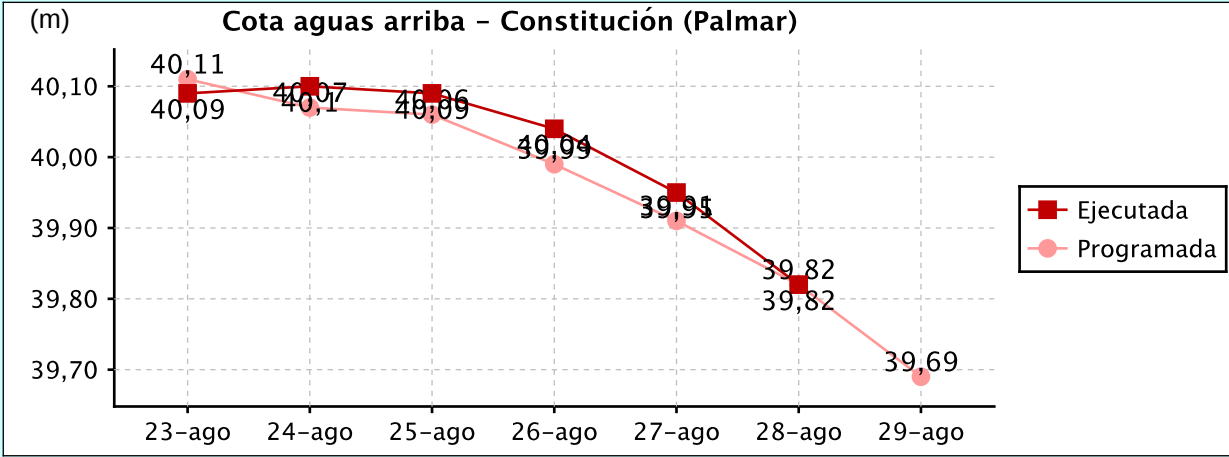
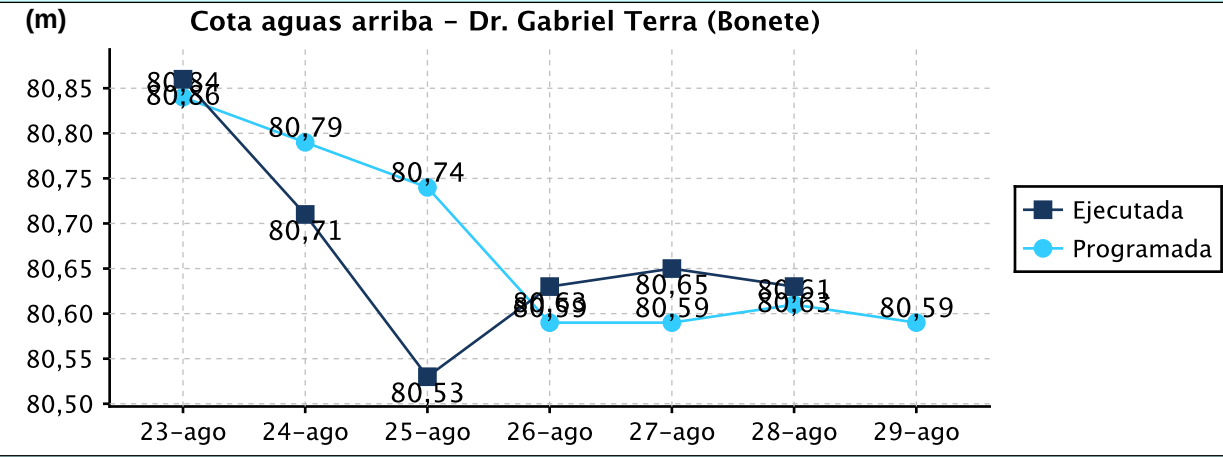


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,61	80,63
Baygorria	53,95	53,93
Palmar	39,82	39,82
SGU	34,62	34,8

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

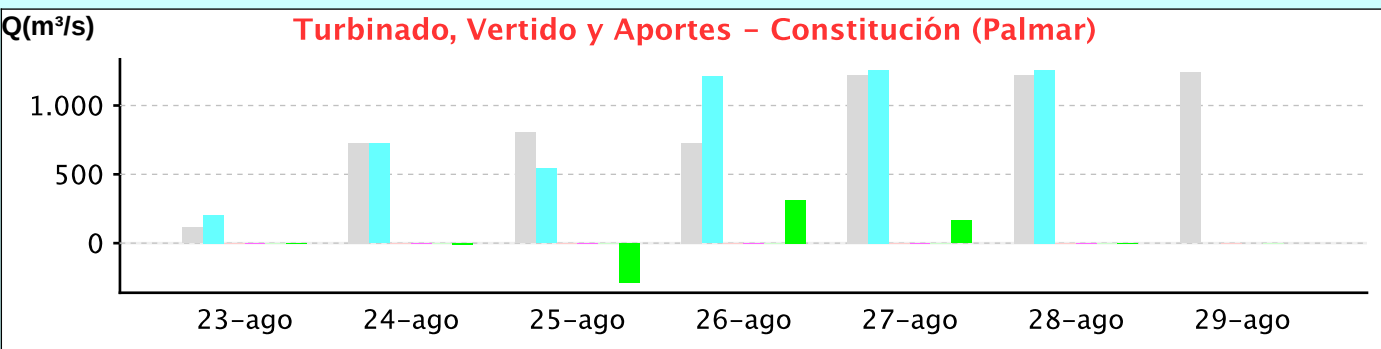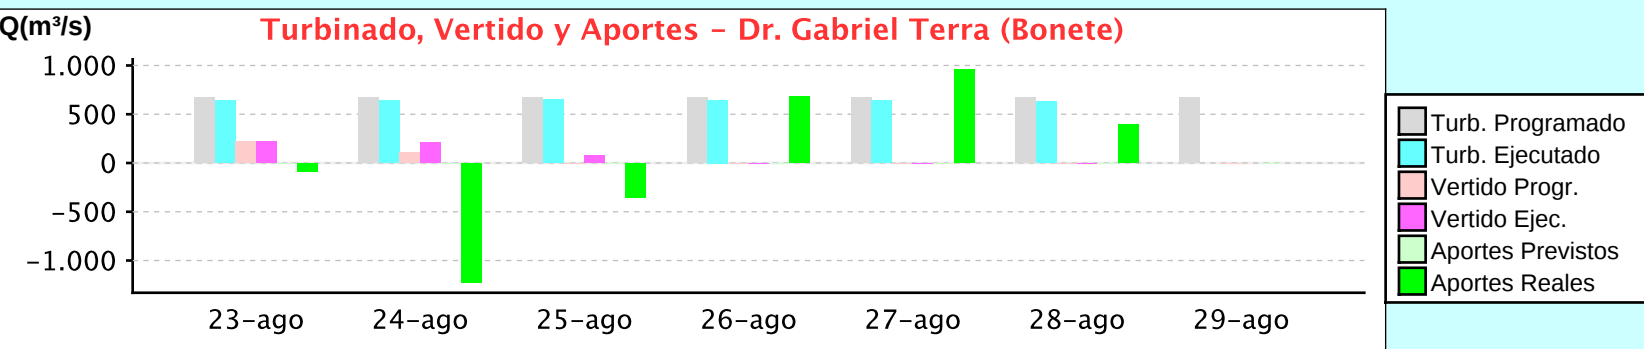

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

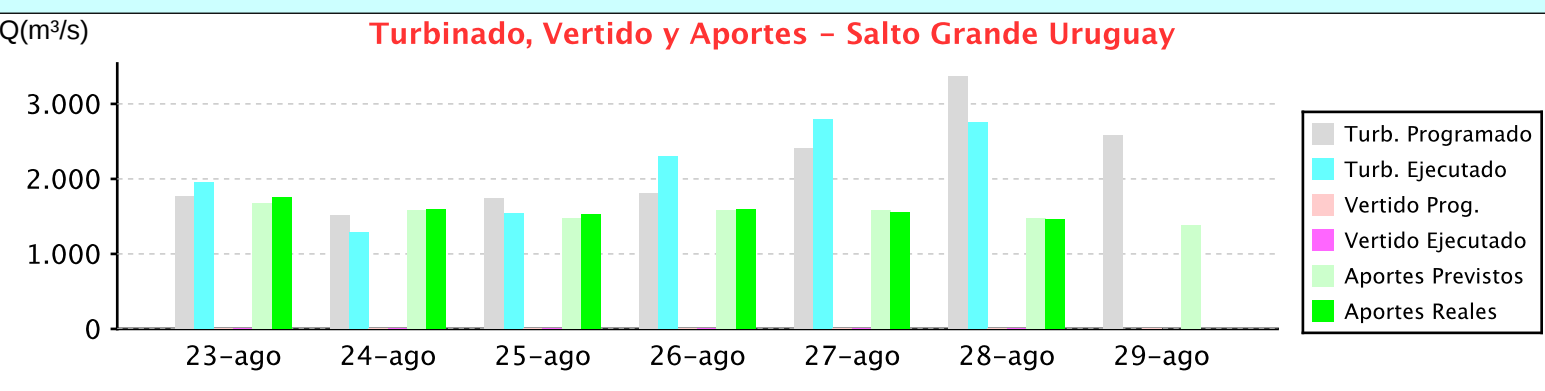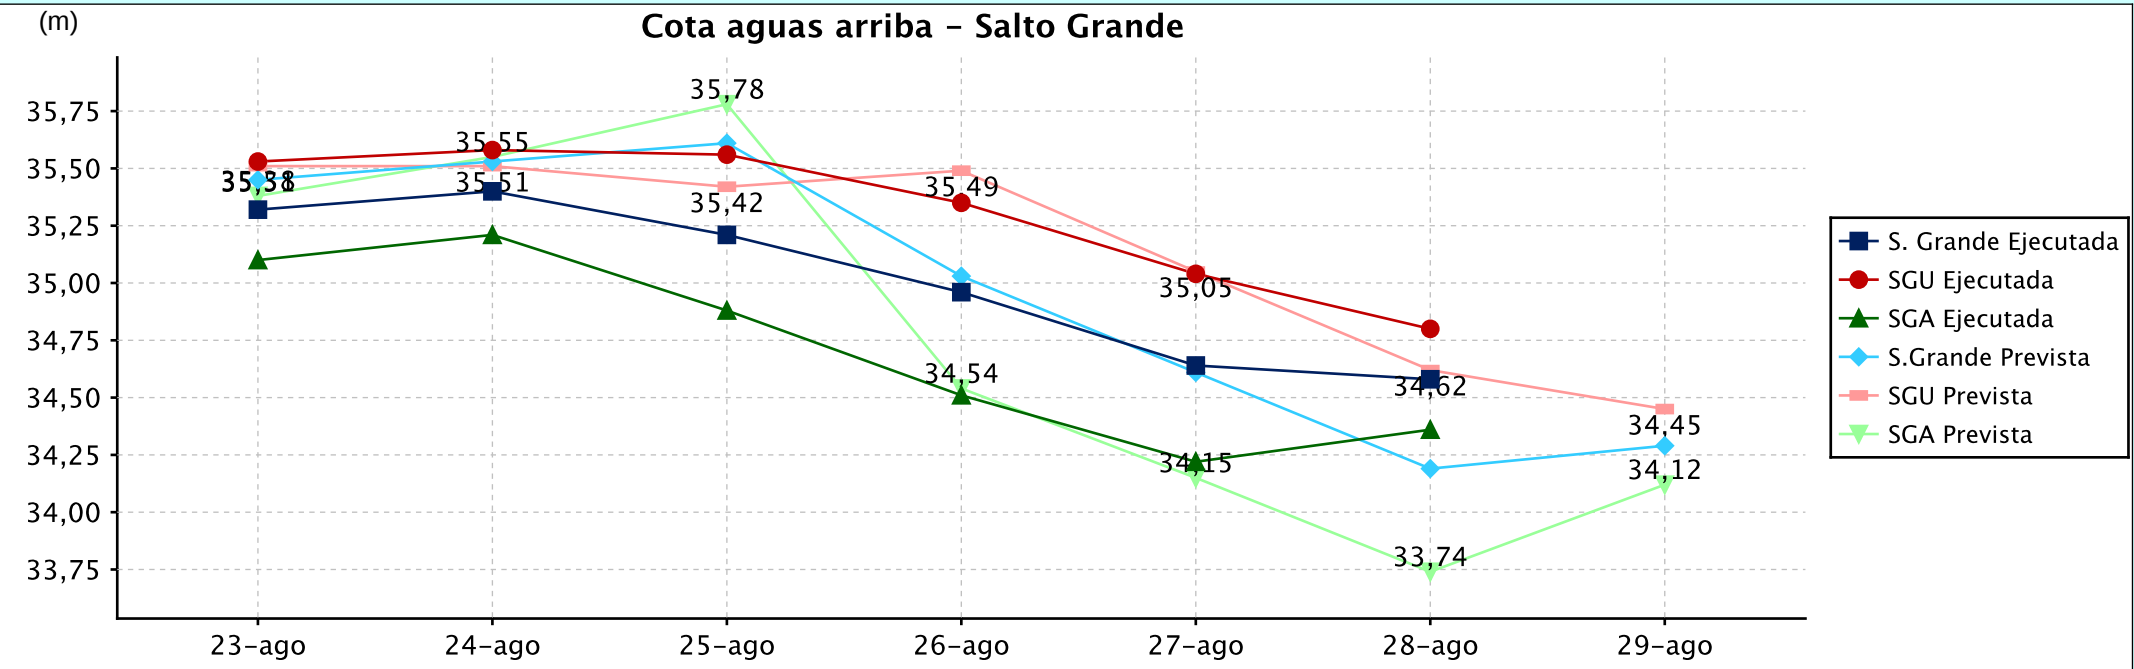

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,80
Cota Vista Arg	34,36
Cota real	34,58
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	9.868

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	676	634
Baygorria	777	795
Palmar	1.223	1.258
SGU	3.371	2.752

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	395
Baygorria	0	30
Palmar	0	-5
SGU	1.475	1.463

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
