



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 30 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.441
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.445
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.337
C. Baygorria	1.822
C. Palmar	7.605
C. Salto Grande	7.948
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.510
TOTAL Generación	28.561

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.561
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.930
Diferencia (MWh)	1.631
Ejecutada - Programada	6,06 %

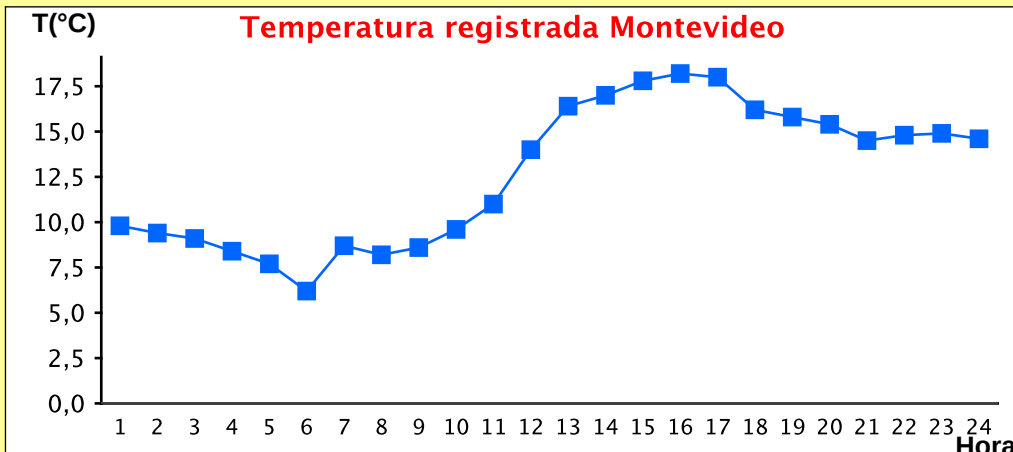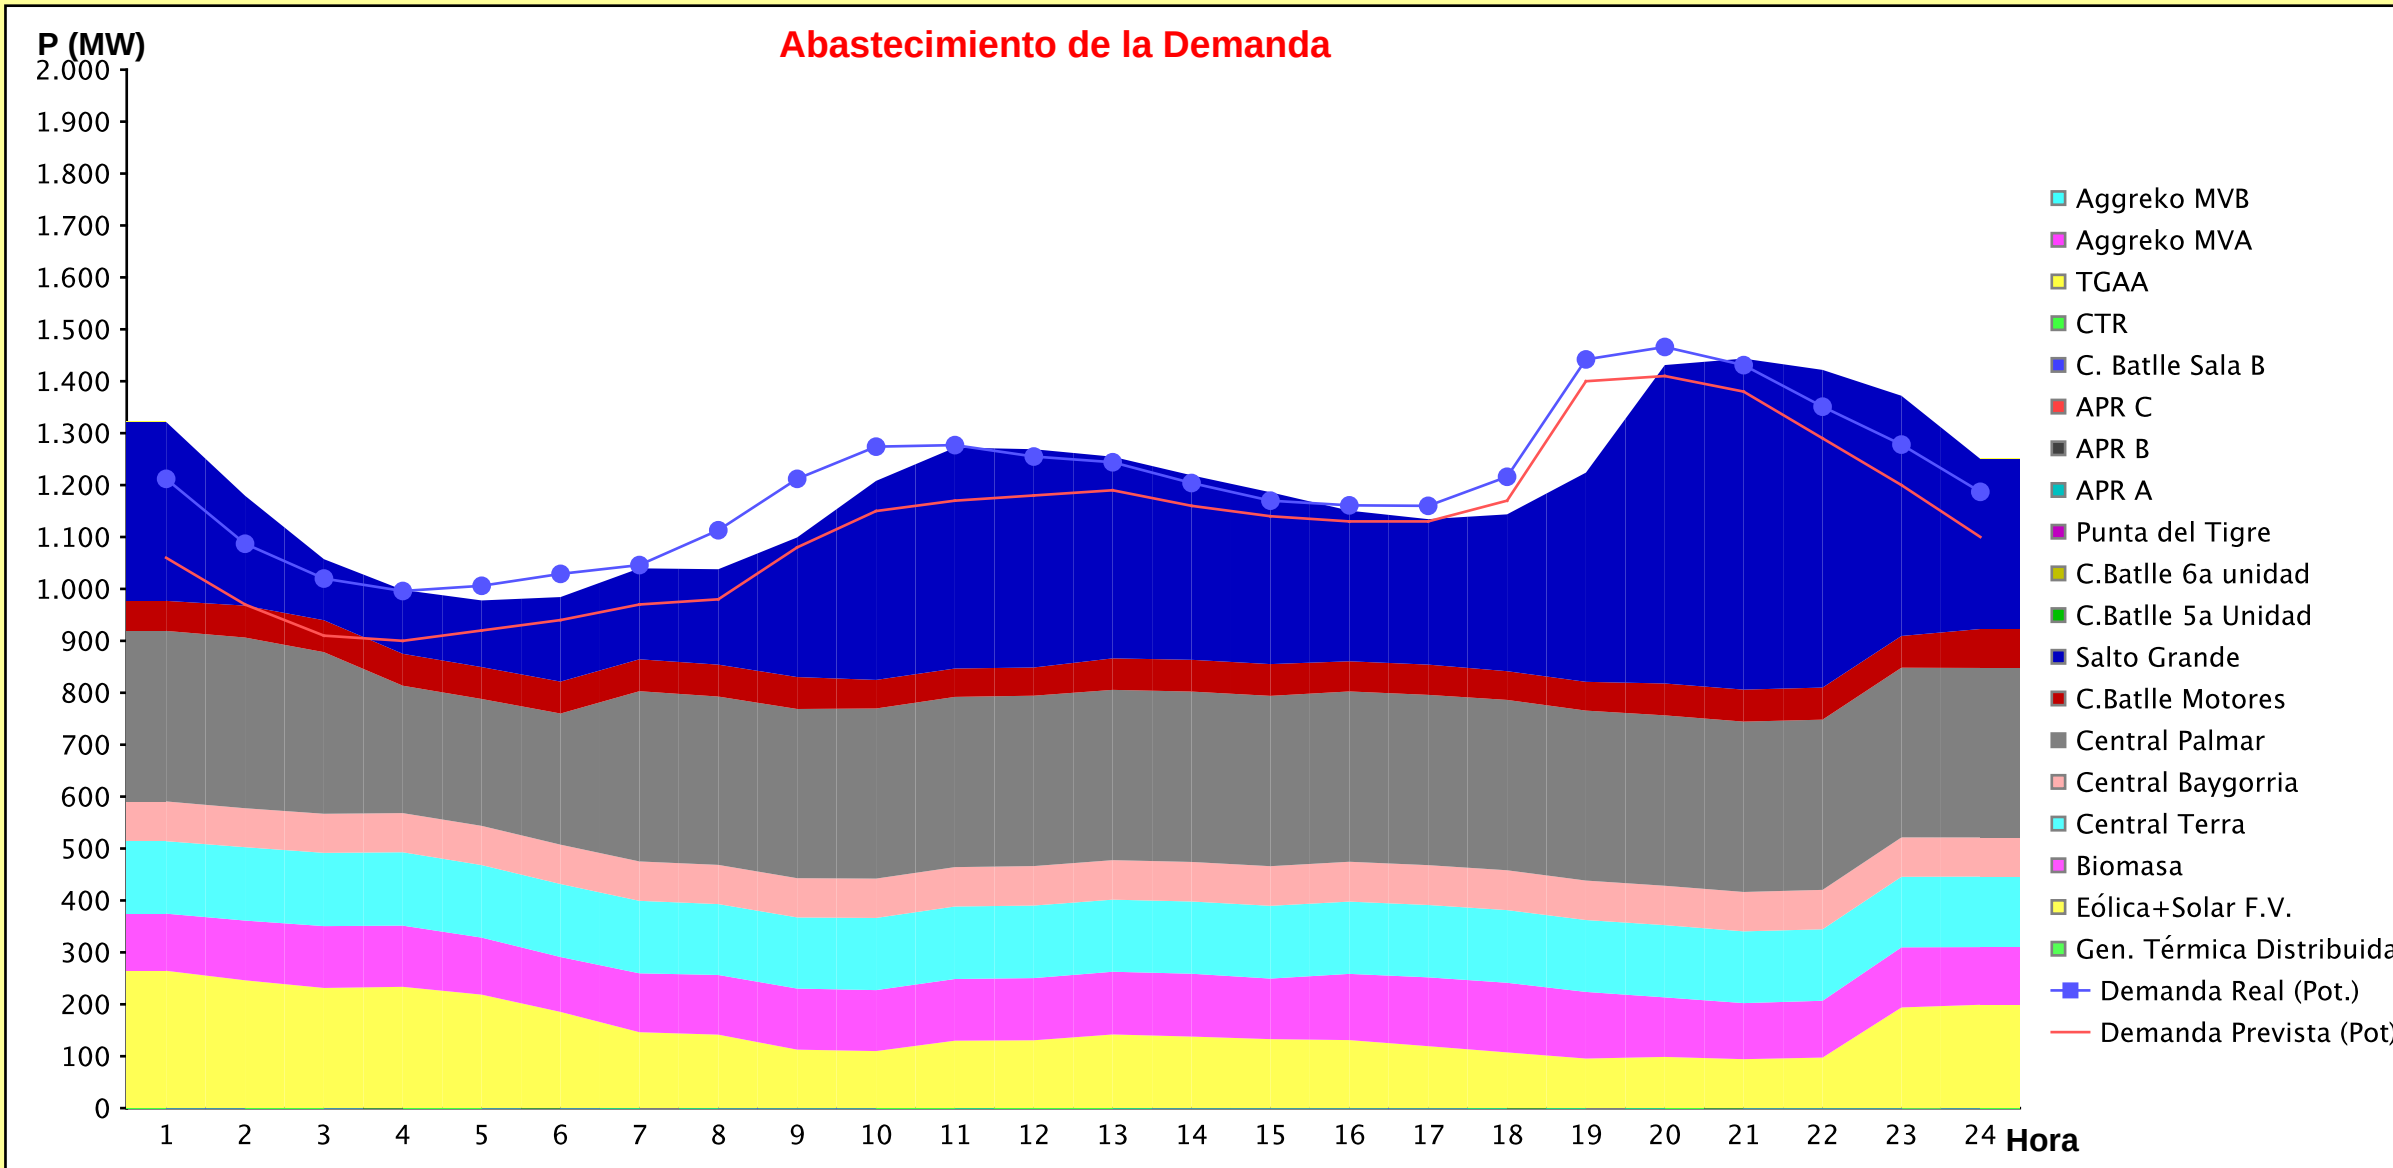



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1289,97 Hora 10:27
Potencia mínima:	985,25 Hora 03:59
Pico noche:	1472,74 Hora 19:33

Generación Media (MW)	
Eólica	154,3
Biomasa	118,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

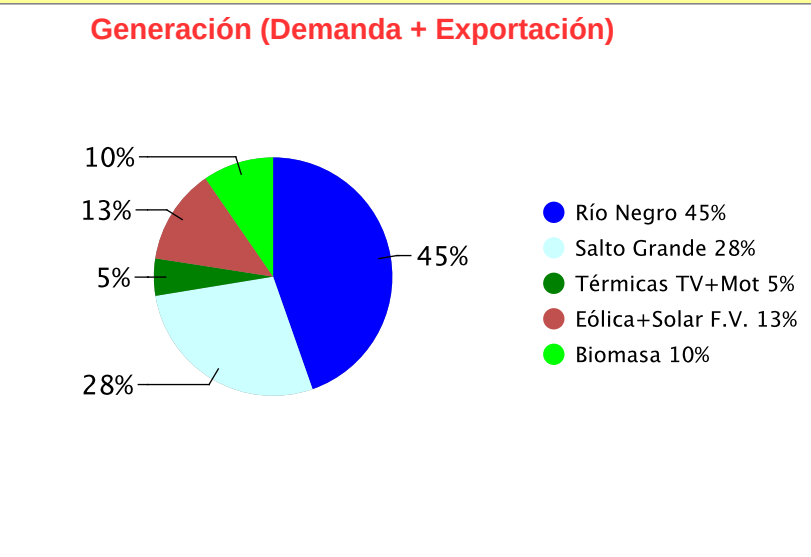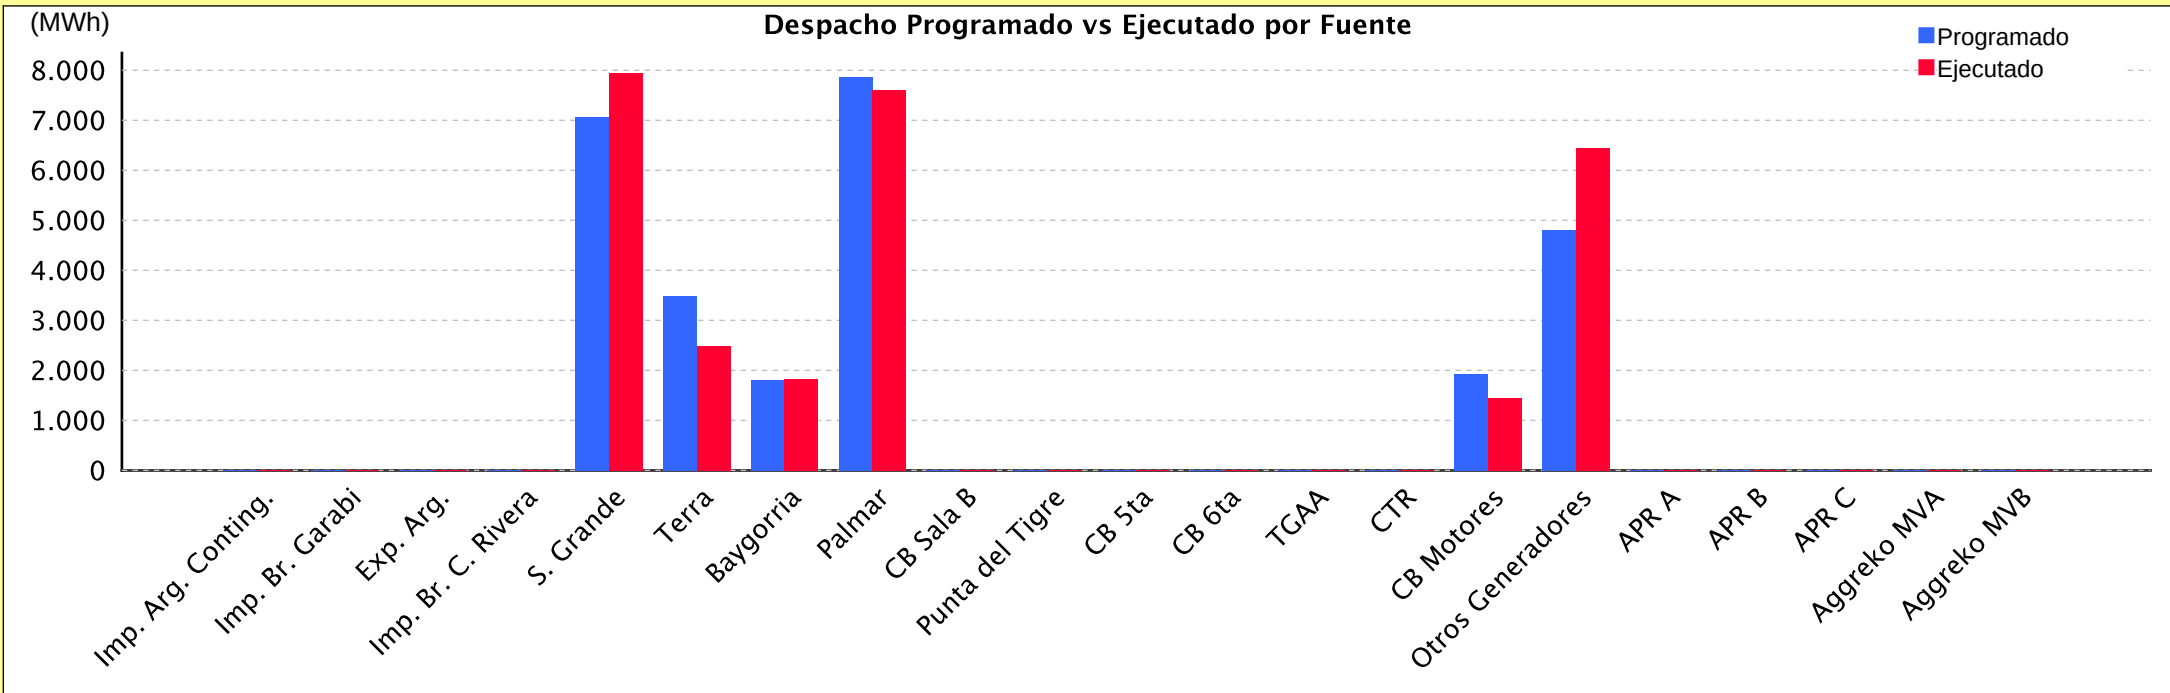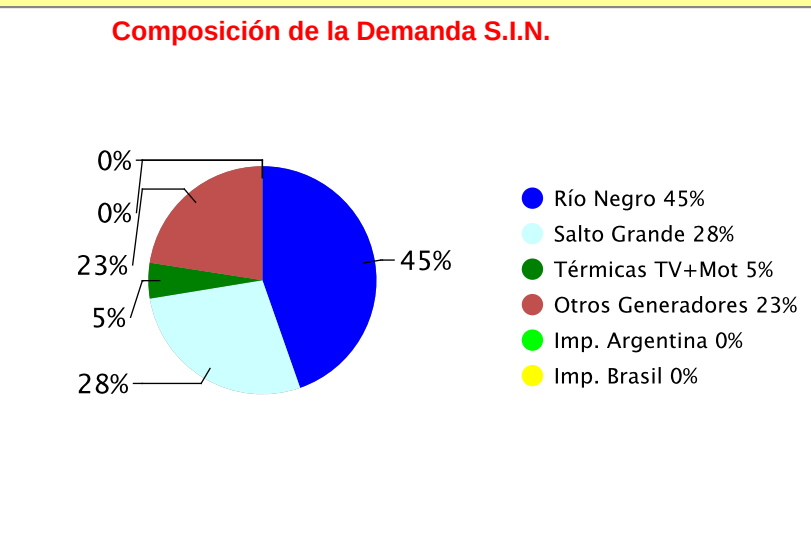



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

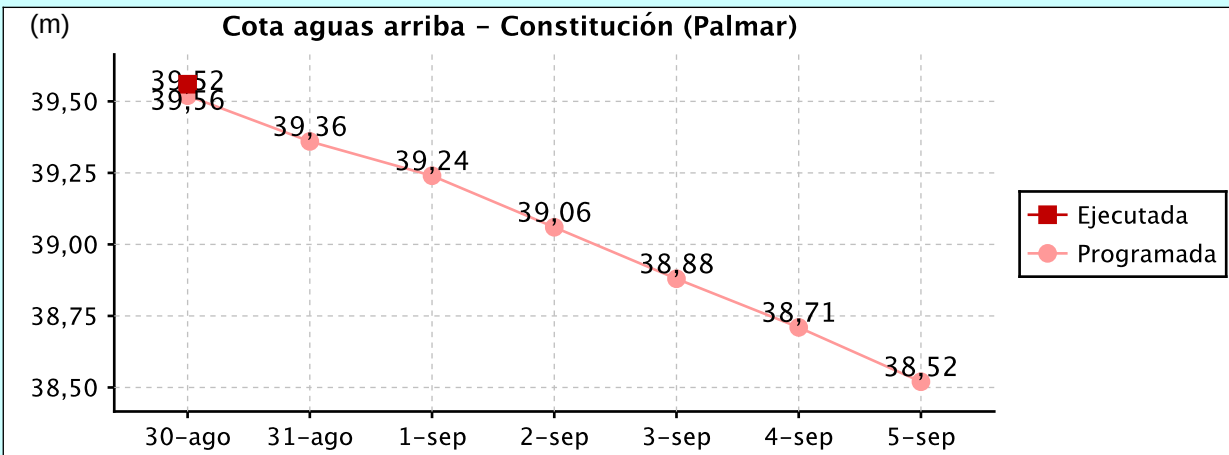
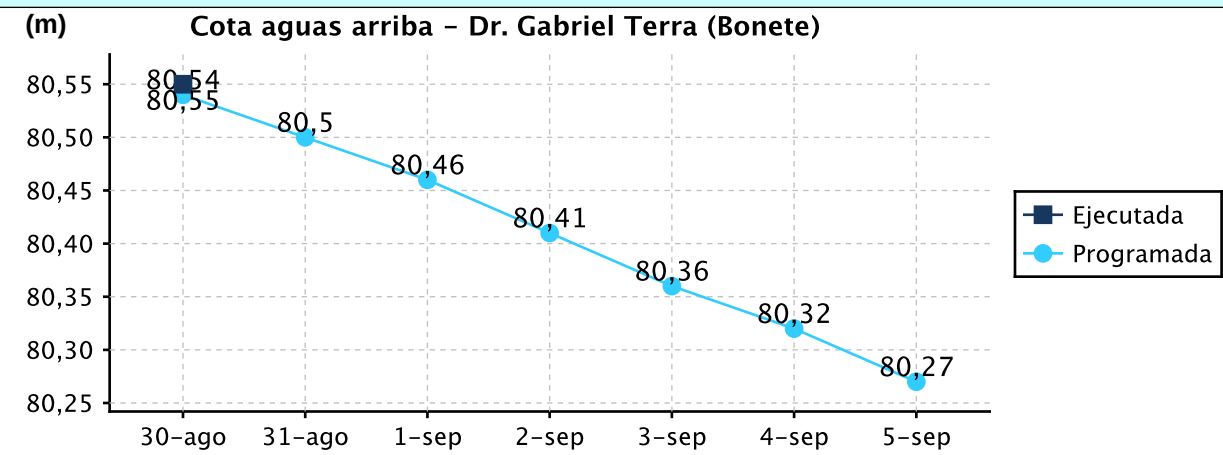


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,54	80,55
Baygorria	53,82	53,82
Palmar	39,52	39,56
SGU	34,48	34,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

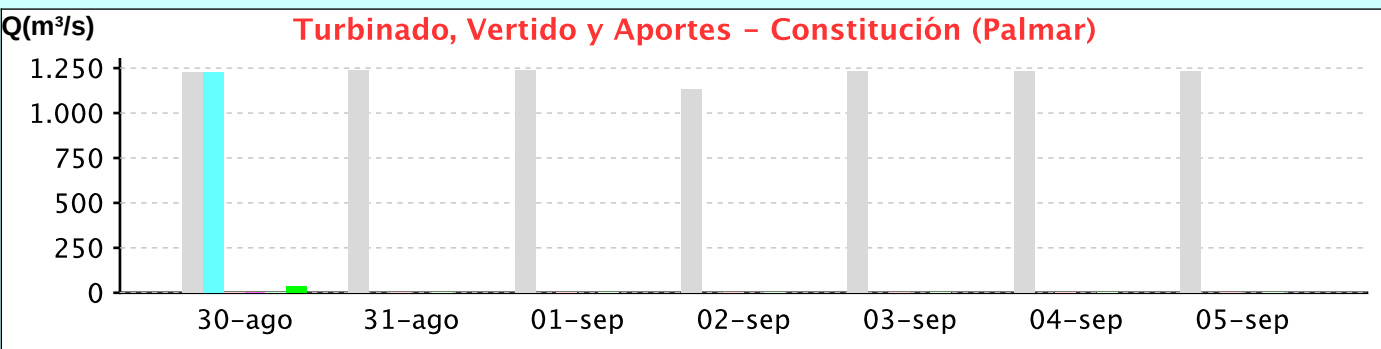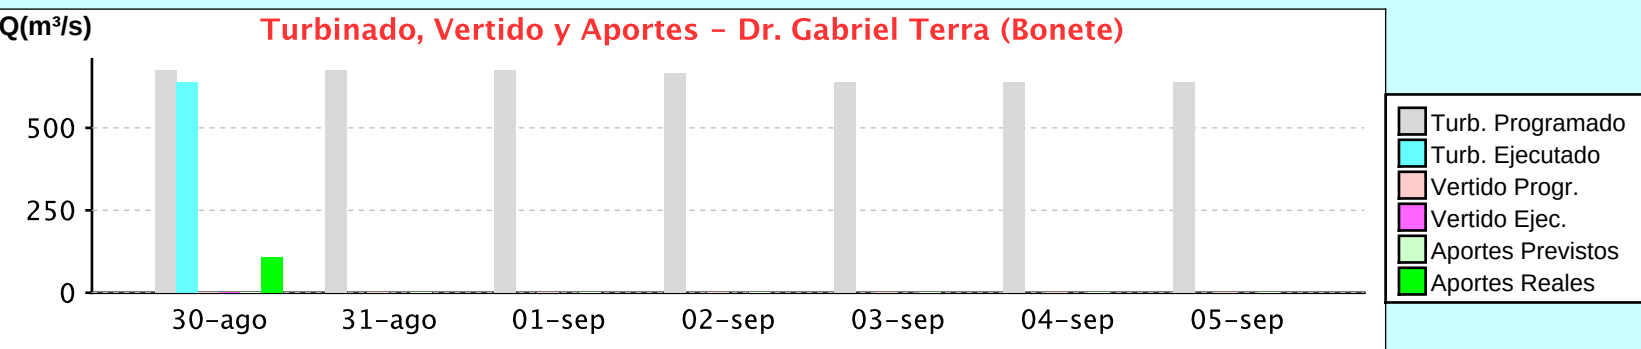

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

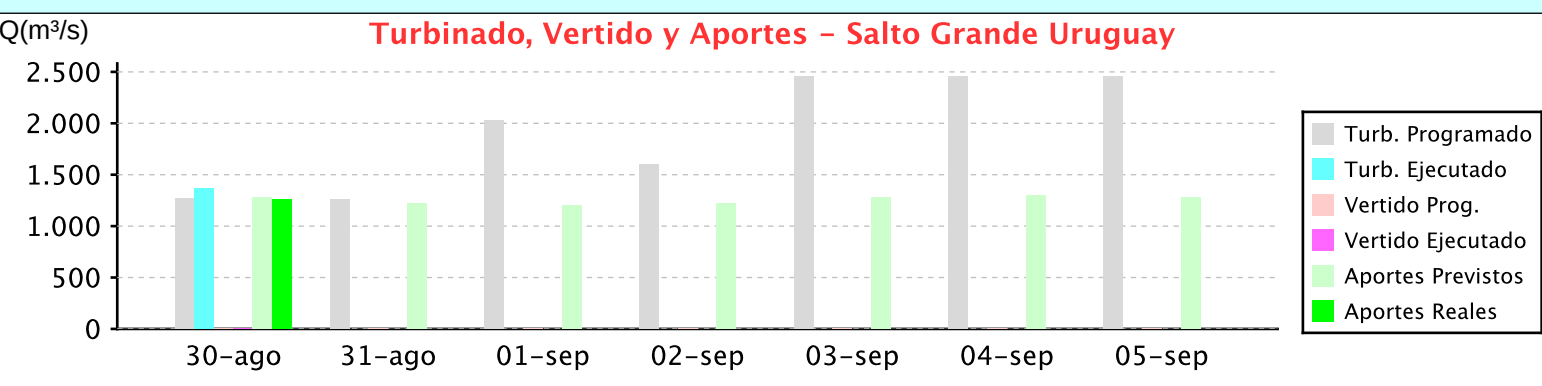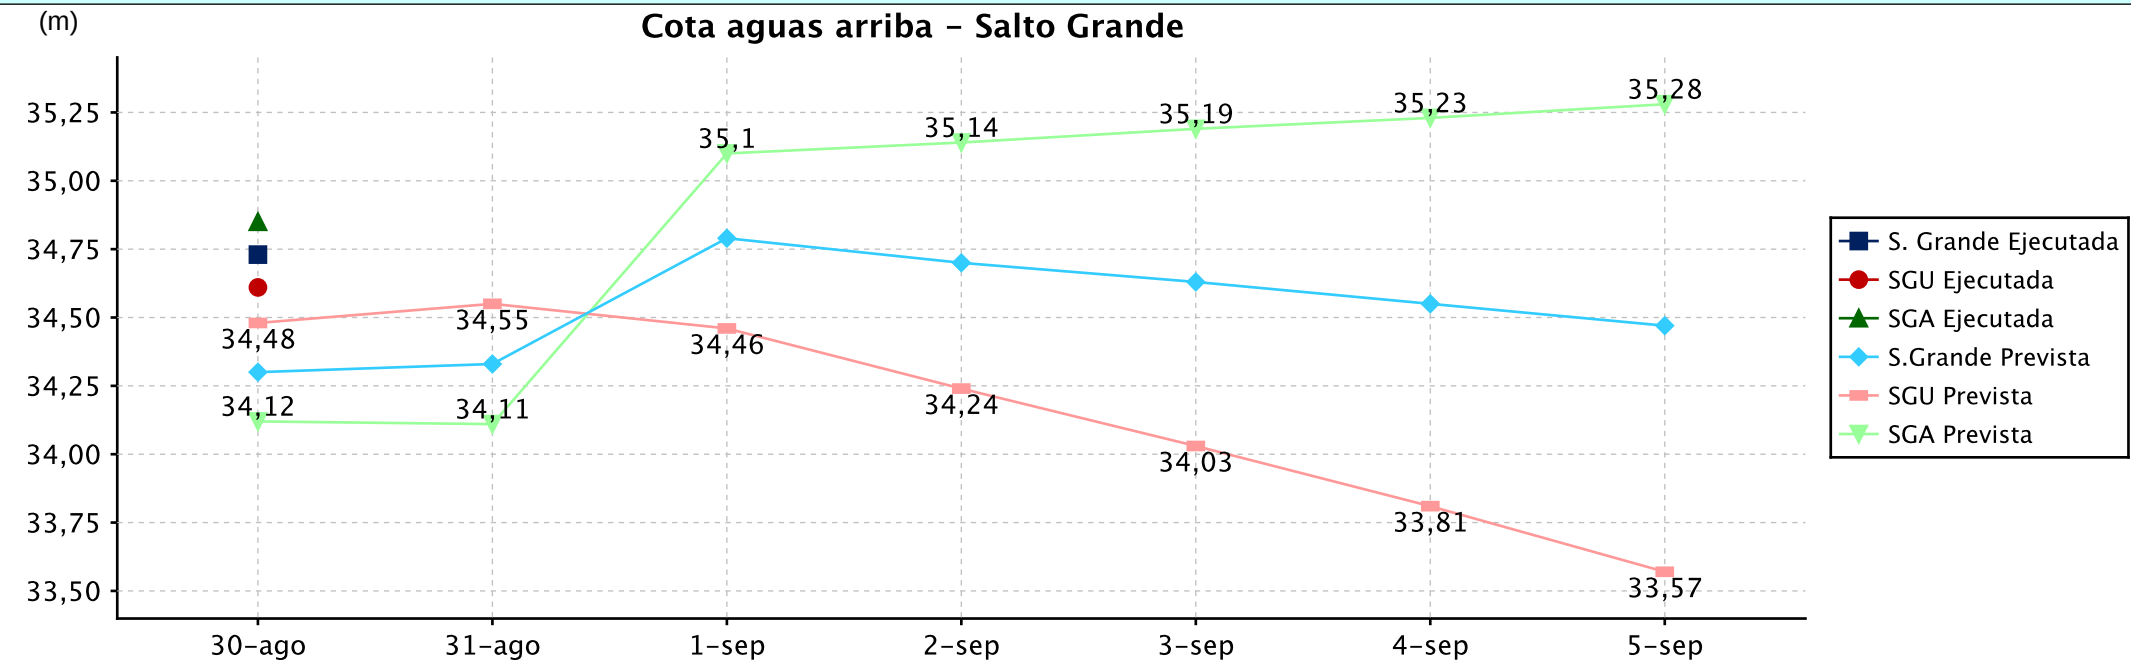

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,61
Cota Vista Arg	34,85
Cota real	34,73

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-5.466

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	674	637
Baygorria	652	653
Palmar	1.229	1.227
SGU	1.272	1.369

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	109
Baygorria	0	35
Palmar	0	36
SGU	1.275	1.256

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
