



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 31 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.931
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.935
Central La Tablada	-95
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.351
C. Baygorria	1.817
C. Palmar	7.619
C. Salto Grande	6.322
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.087
TOTAL Generación	25.015

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.015
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.570
Diferencia (MWh)	-555
Ejecutada - Programada	-2,17 %

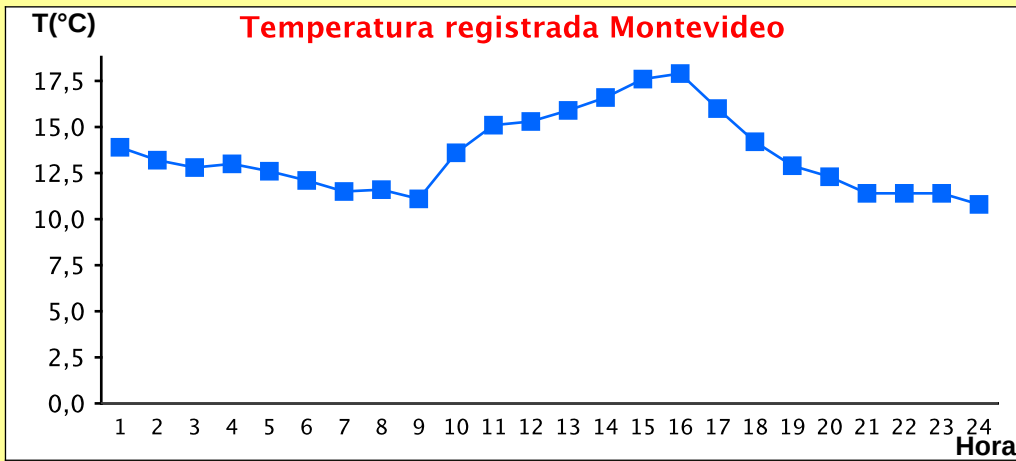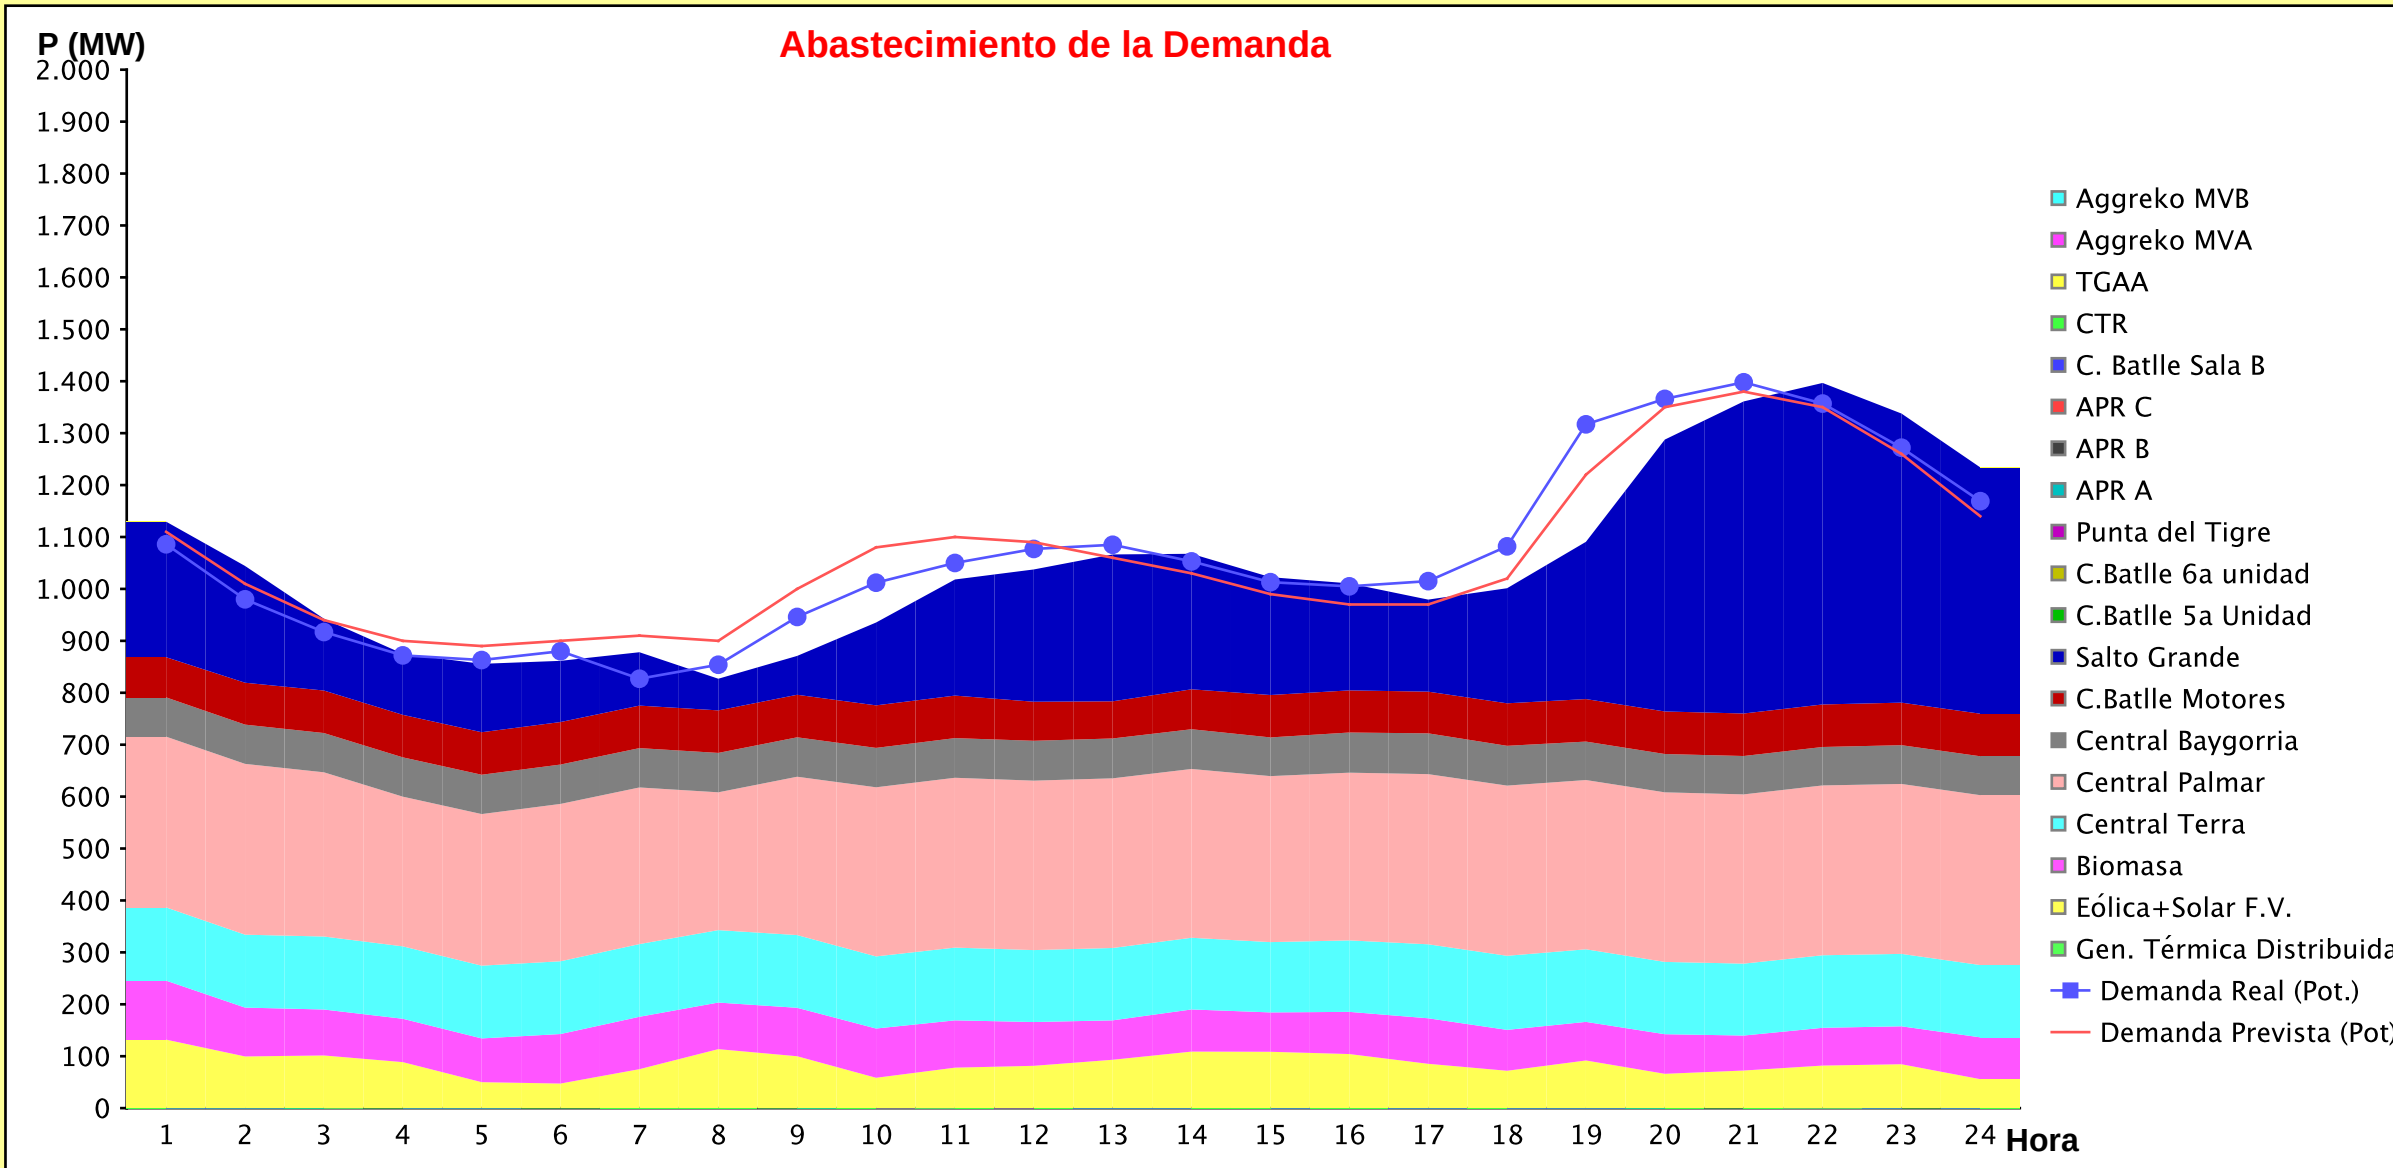



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1081,21 Hora 13:01
Potencia mínima:	798,91 Hora 07:13
Pico noche:	1410,13 Hora 21:02

Generación Media (MW)	
Eólica	85,6
Biomasa	85,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

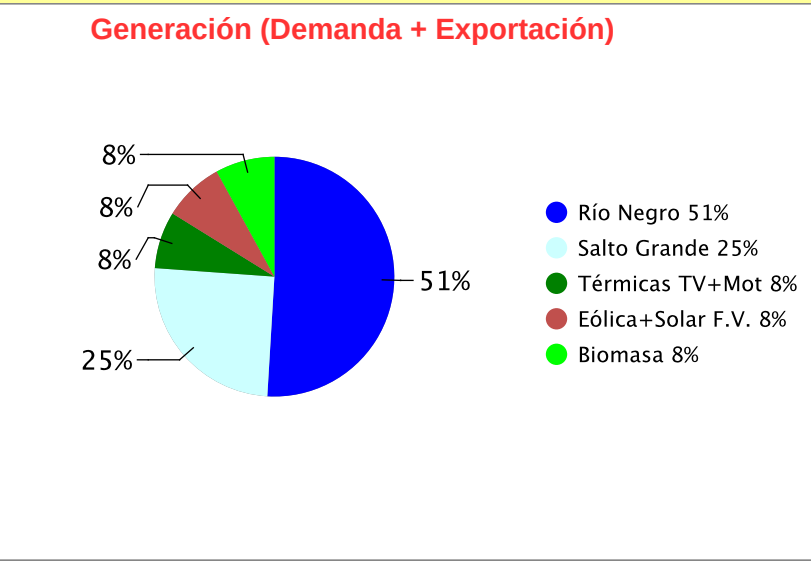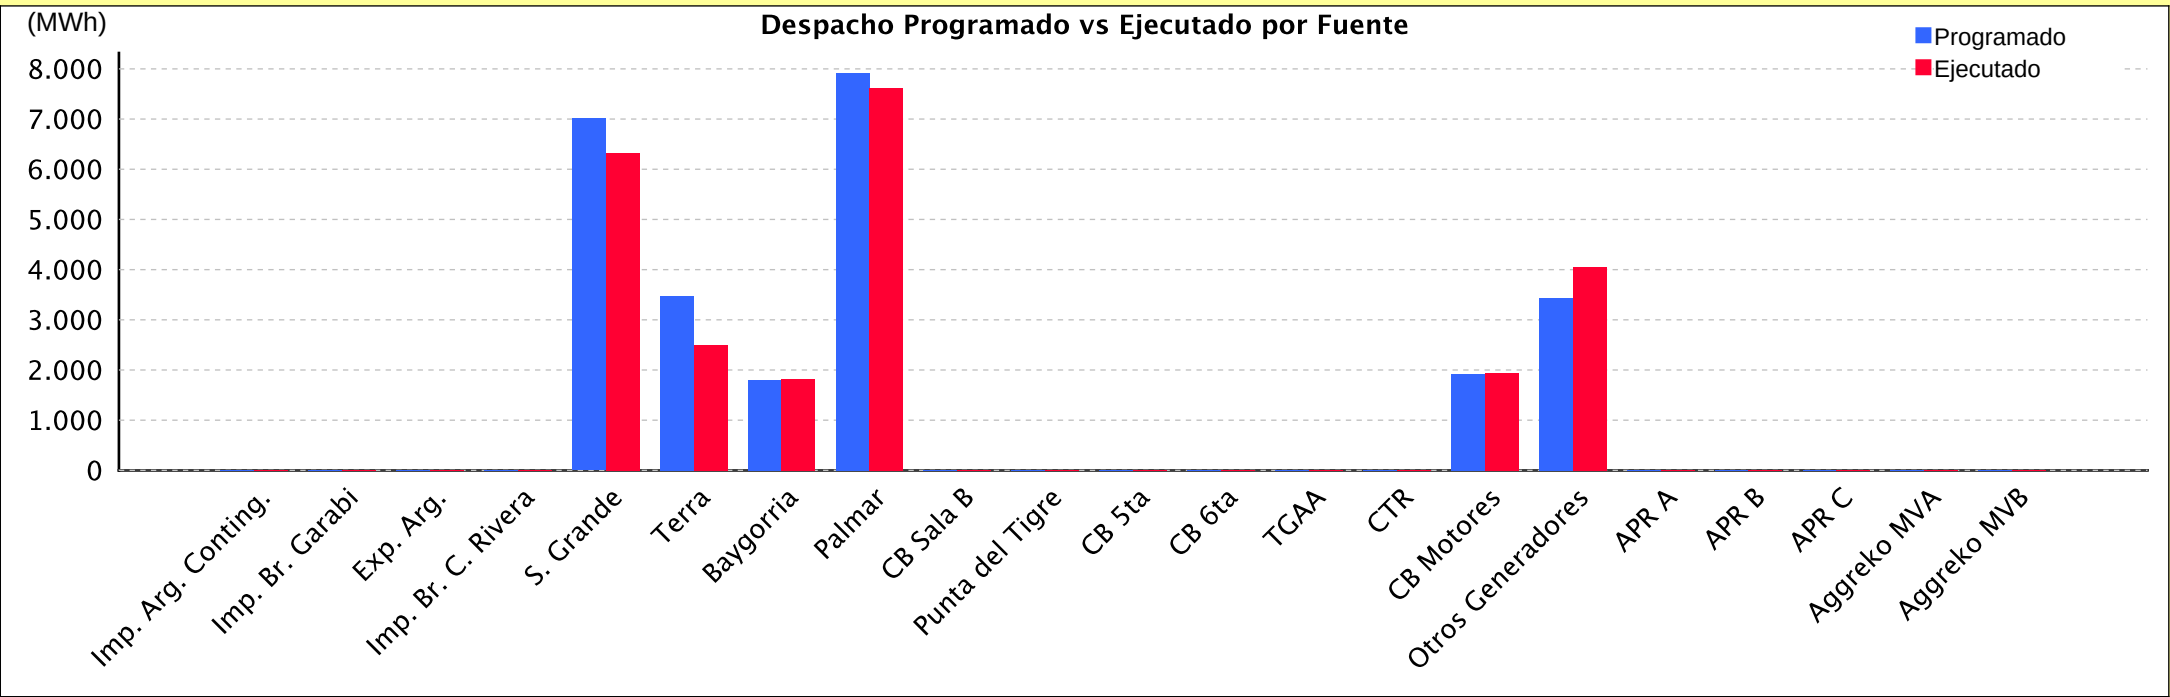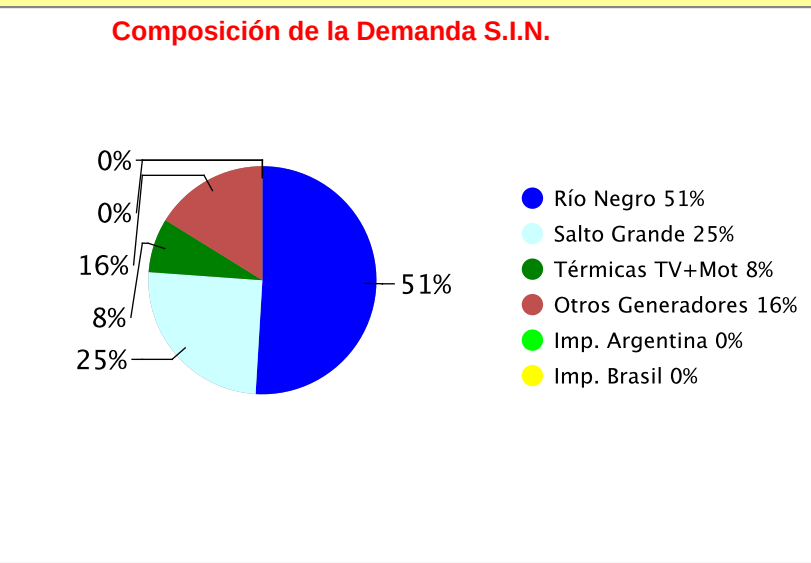



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

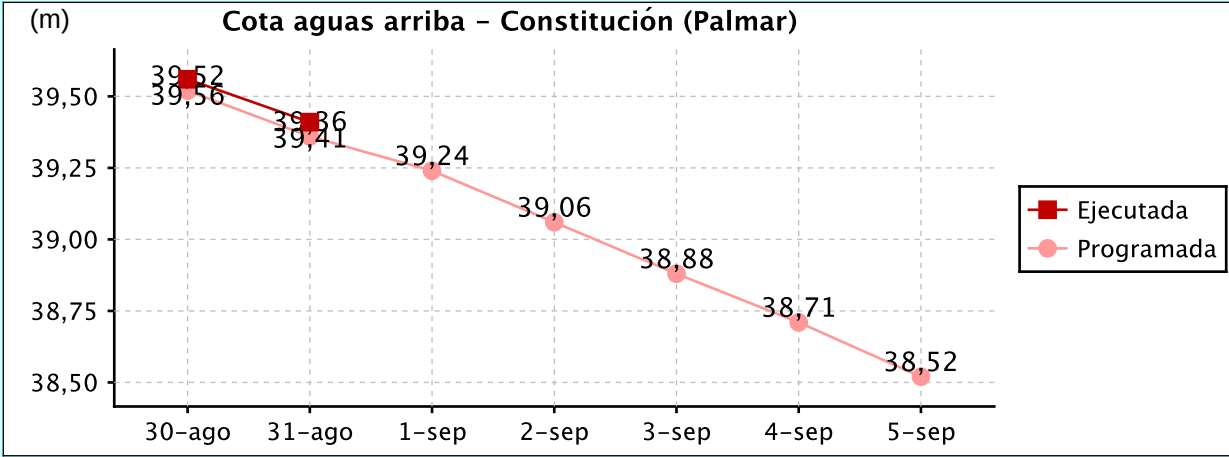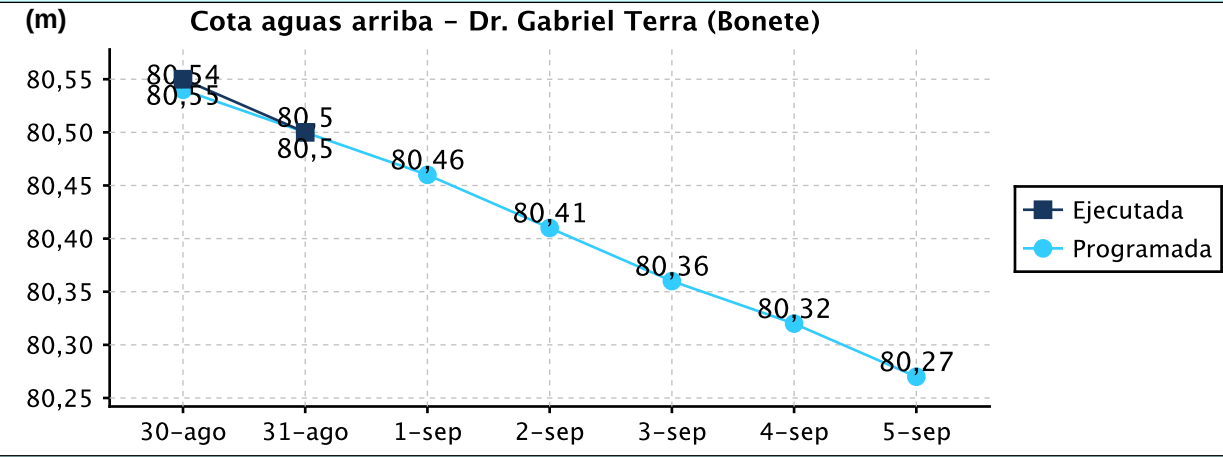


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,50	80,5
Baygorria	53,81	53,82
Palmar	39,36	39,41
SGU	34,55	34,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

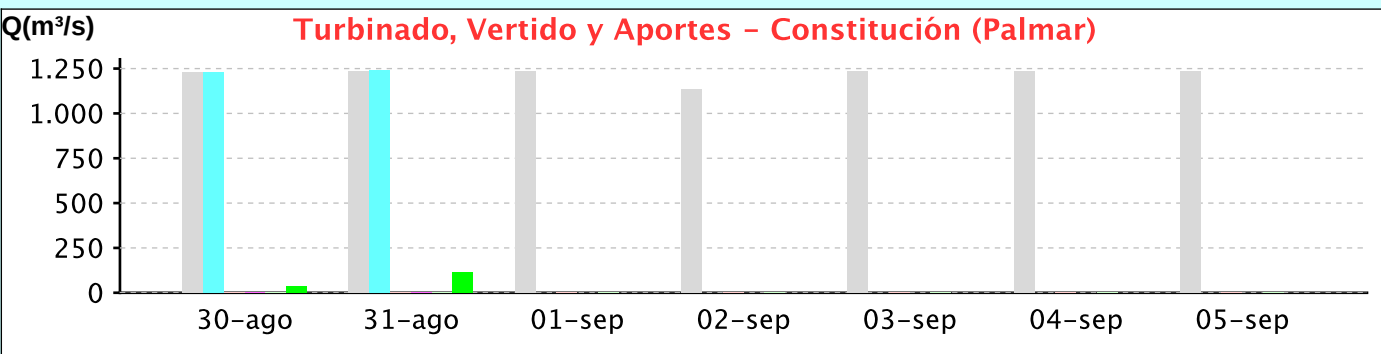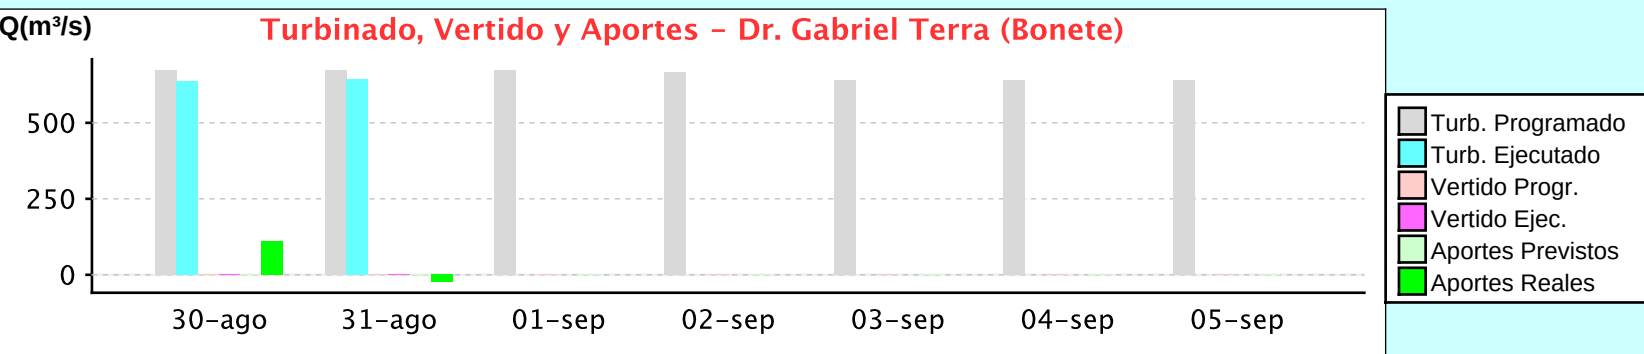


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

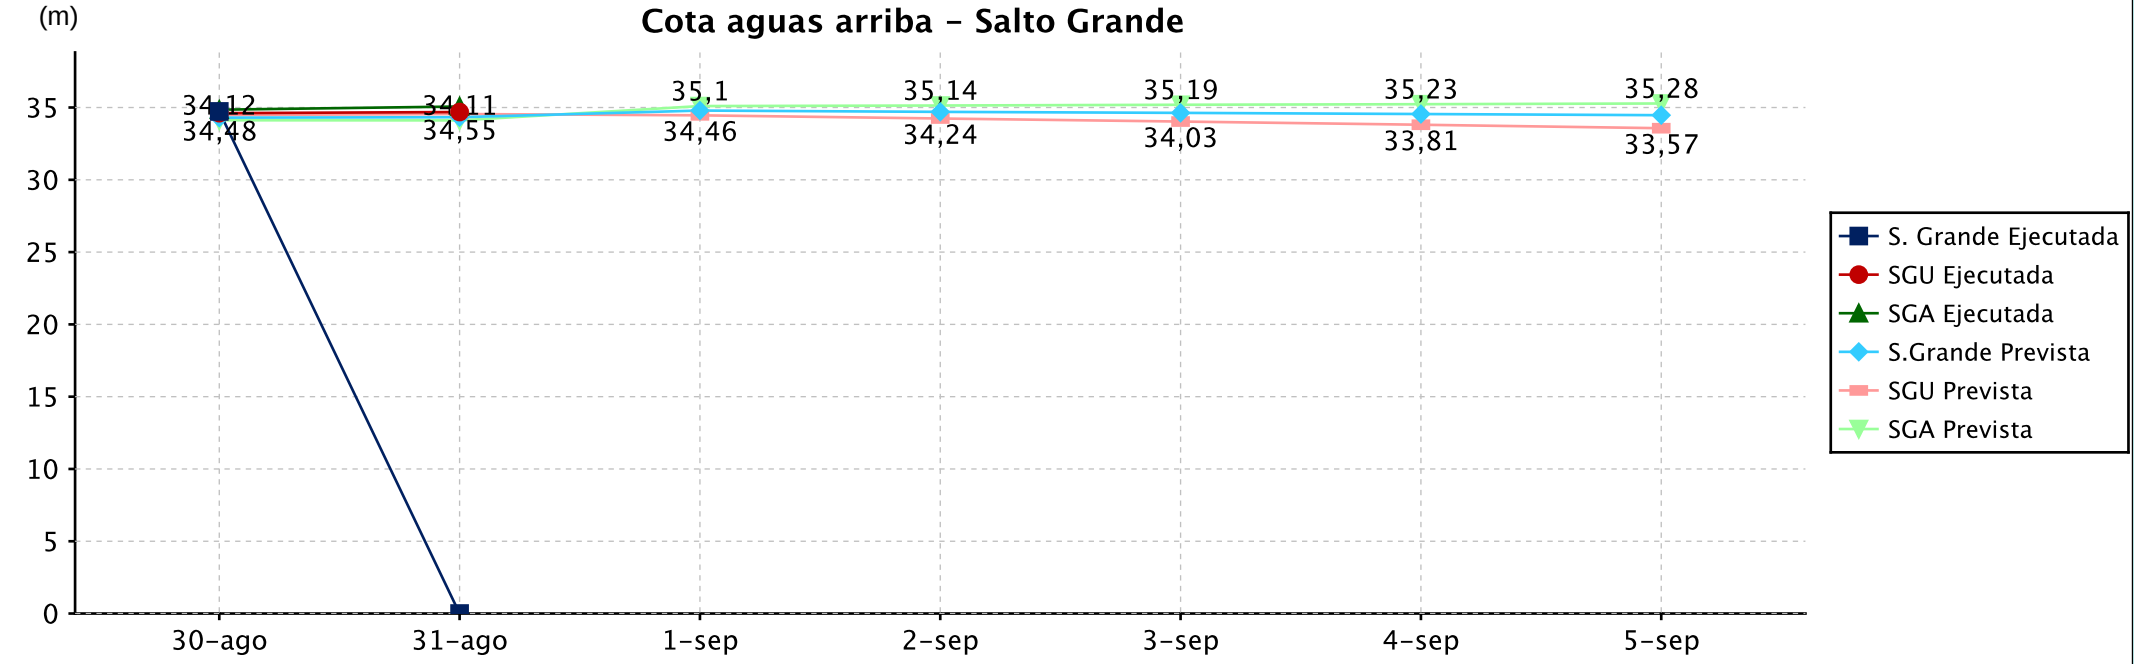

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	674	643
Baygorria	652	631
Palmar	1.237	1.240
SGU	1.263	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-24
Baygorria	0	-4
Palmar	0	117
SGU	1.225	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

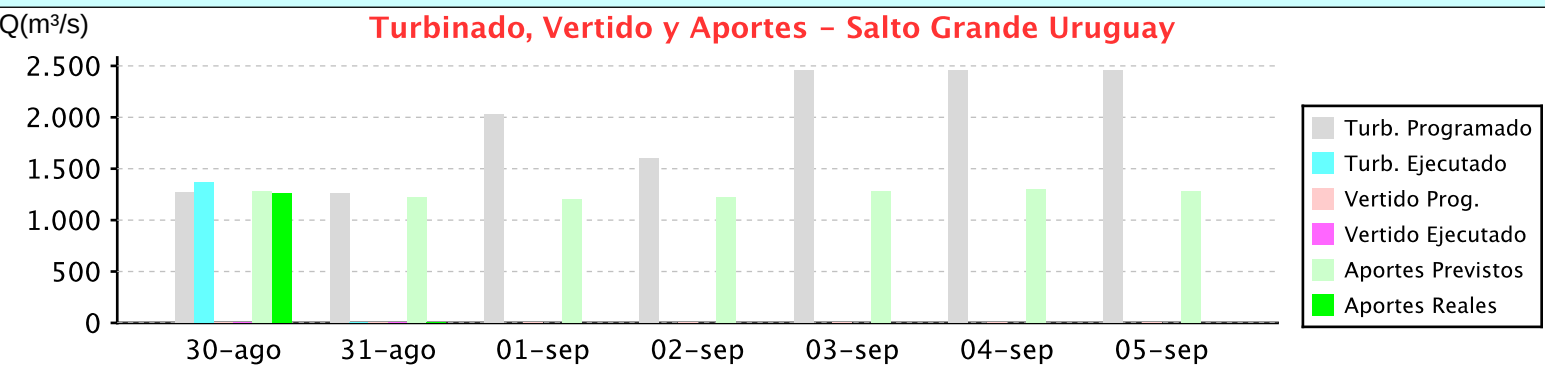

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,69
Cota Vista Arg	35,07
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-8.921	

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Al momento no se dispone de la cota real, turbinado y aportes de Salto Grande.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

01/09/2014 17:03
