



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 01 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.942
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.946
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.374
C. Baygorria	1.818
C. Palmar	7.852
C. Salto Grande	9.265
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.092
TOTAL Generación	29.247

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.247
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.950
Diferencia (MWh)	297
Ejecutada - Programada	1,03 %

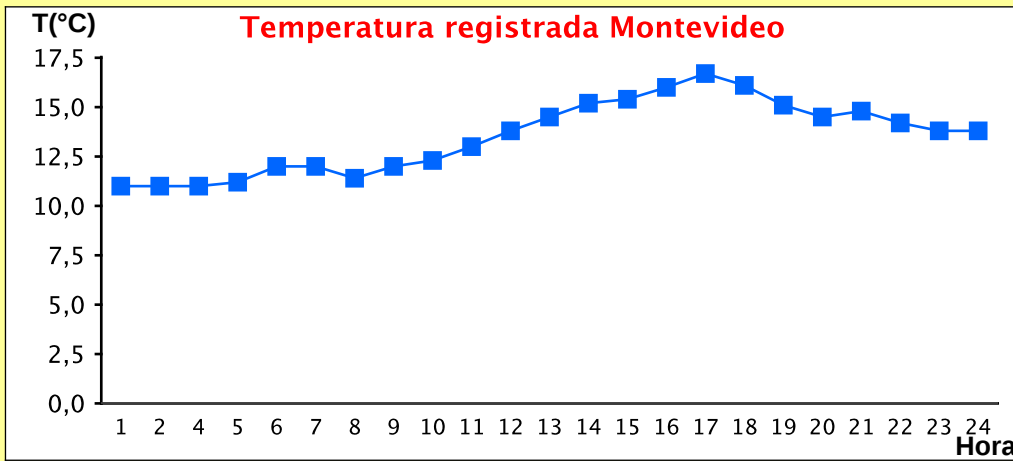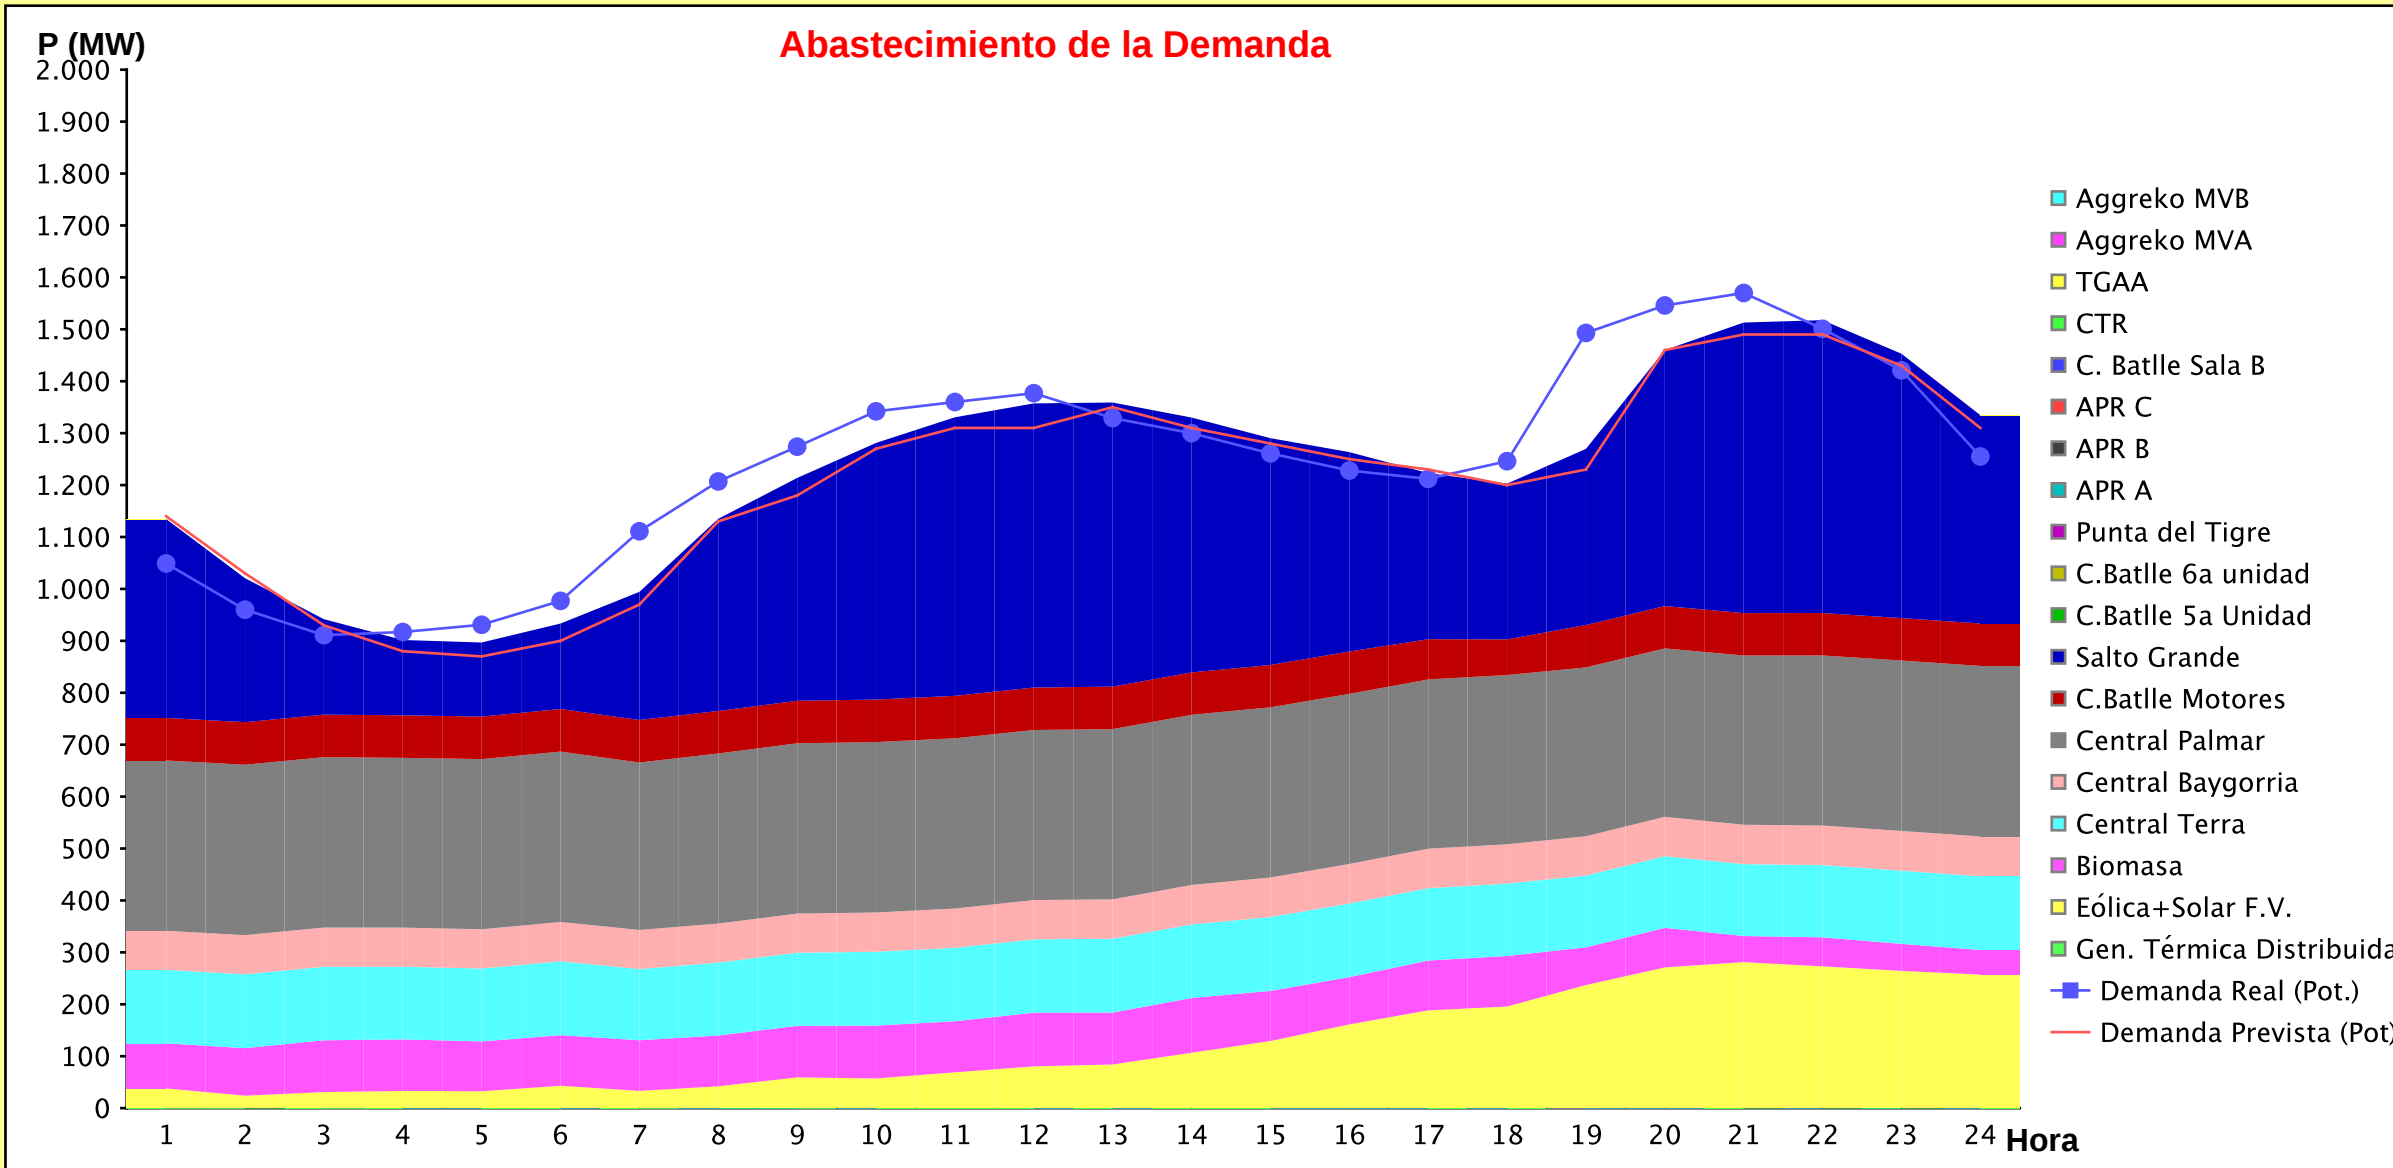



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1395,01 Hora 11:51
Potencia mínima:	886,69 Hora 03:48
Pico noche:	1584,01 Hora 20:42

Generación Media (MW)	
Eólica	124,9
Biomasa	88,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

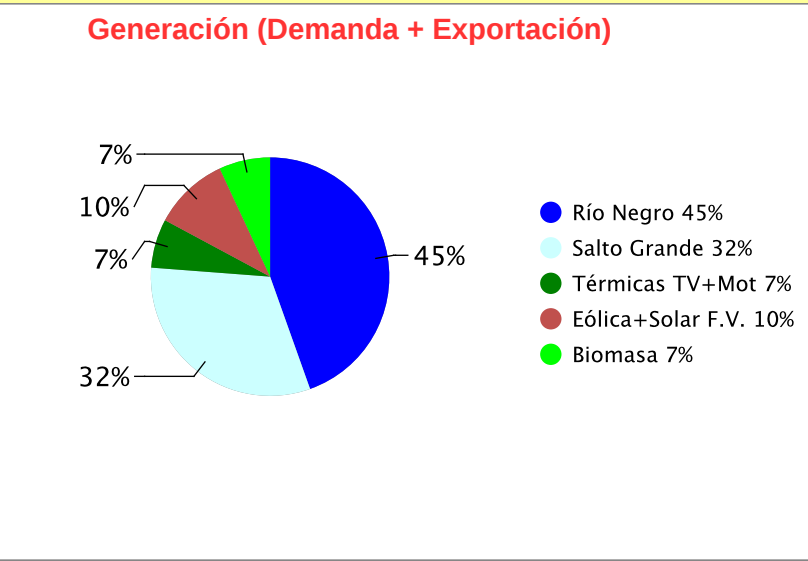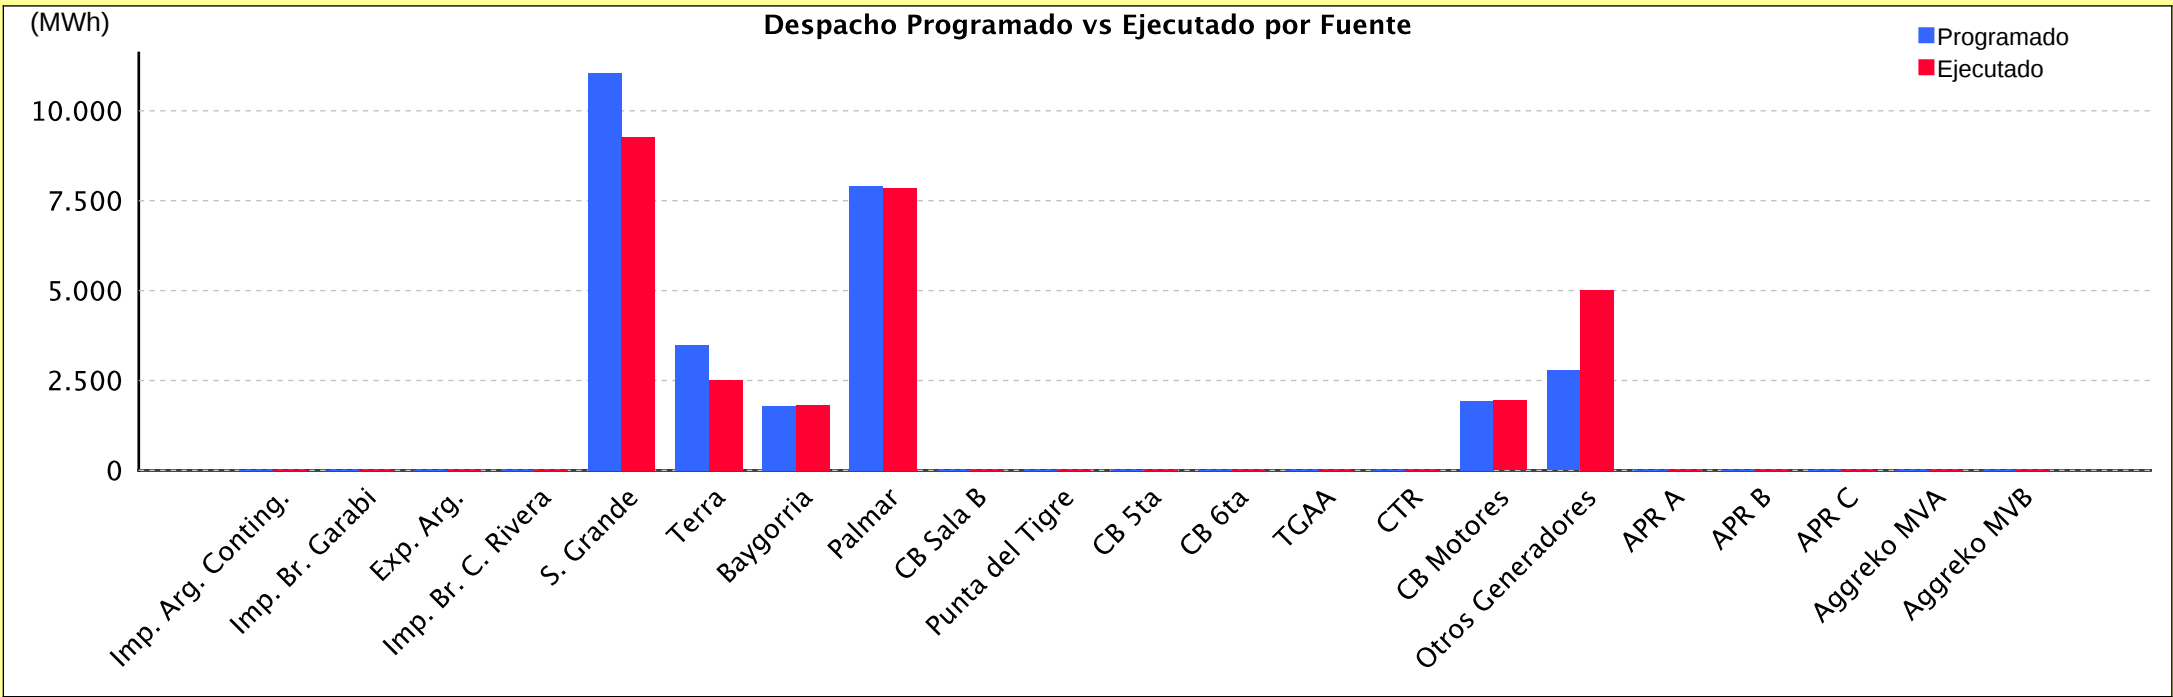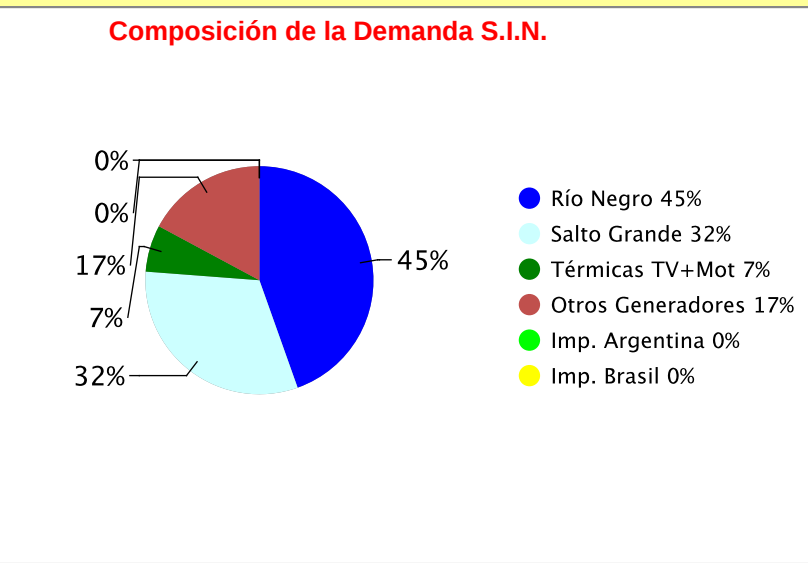



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

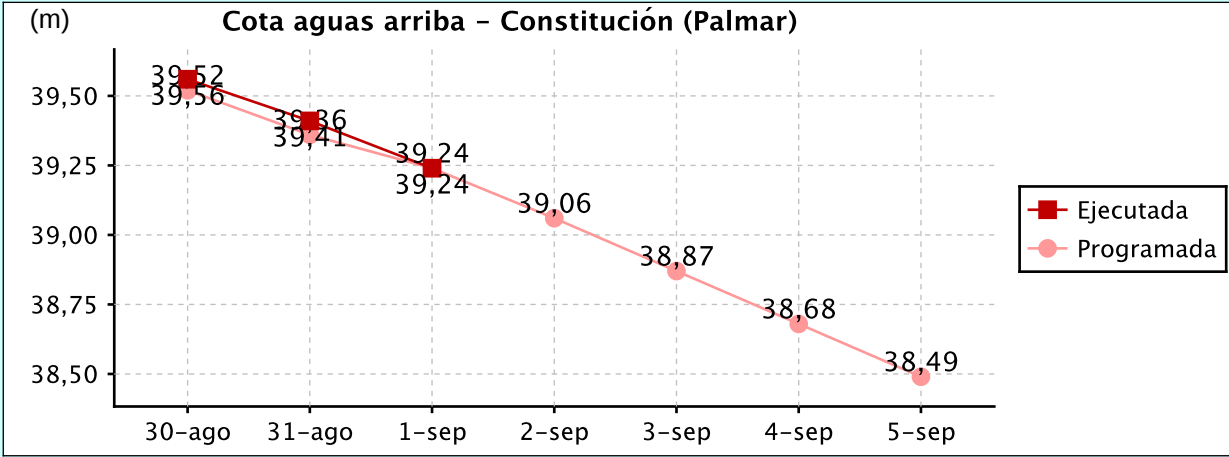
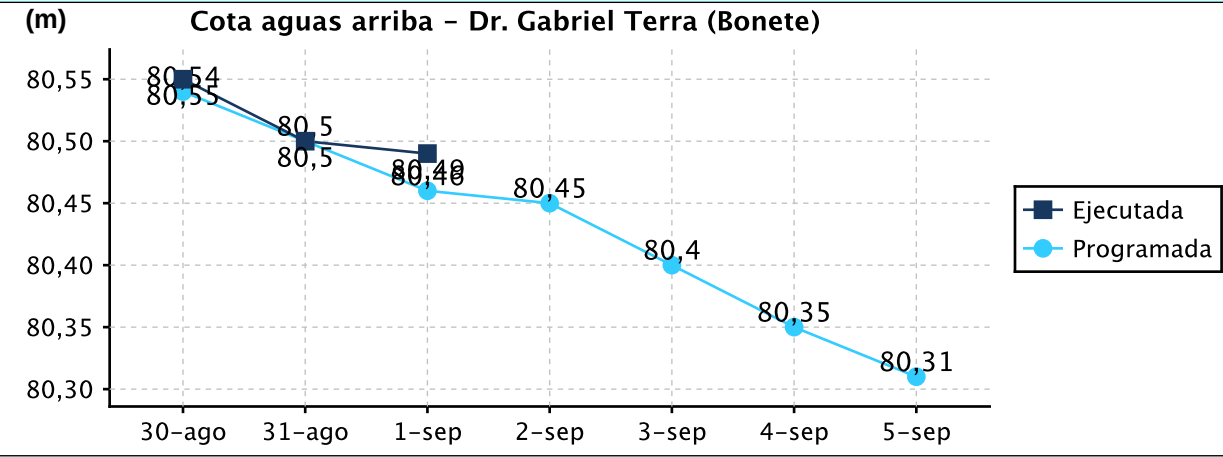


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,46	80,49
Baygorria	53,83	53,86
Palmar	39,24	39,24
SGU	34,46	34,58

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

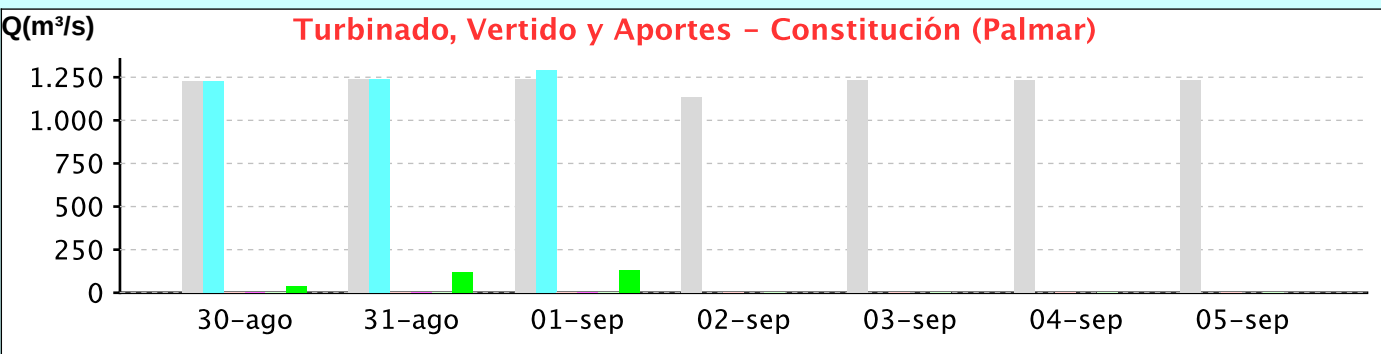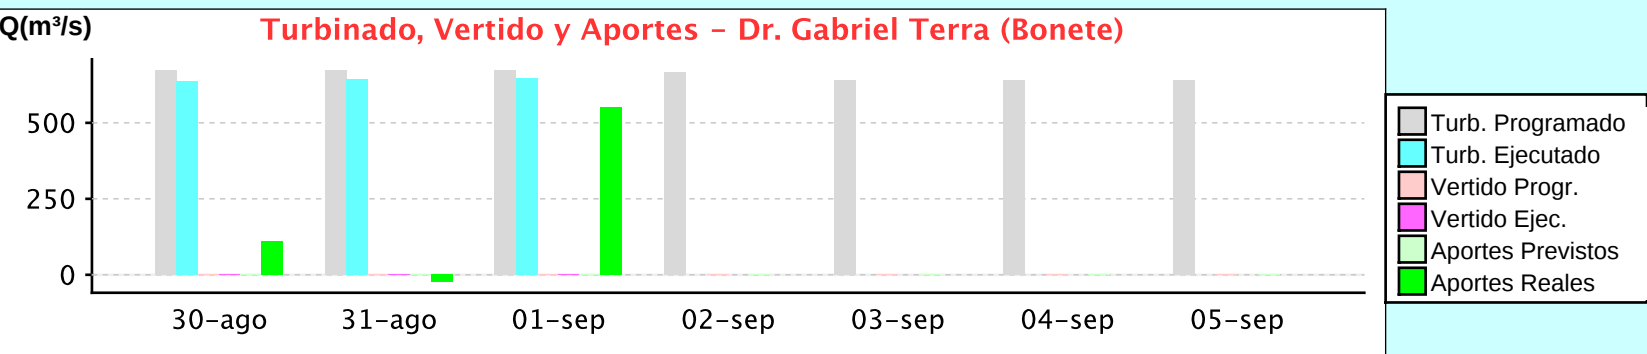

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

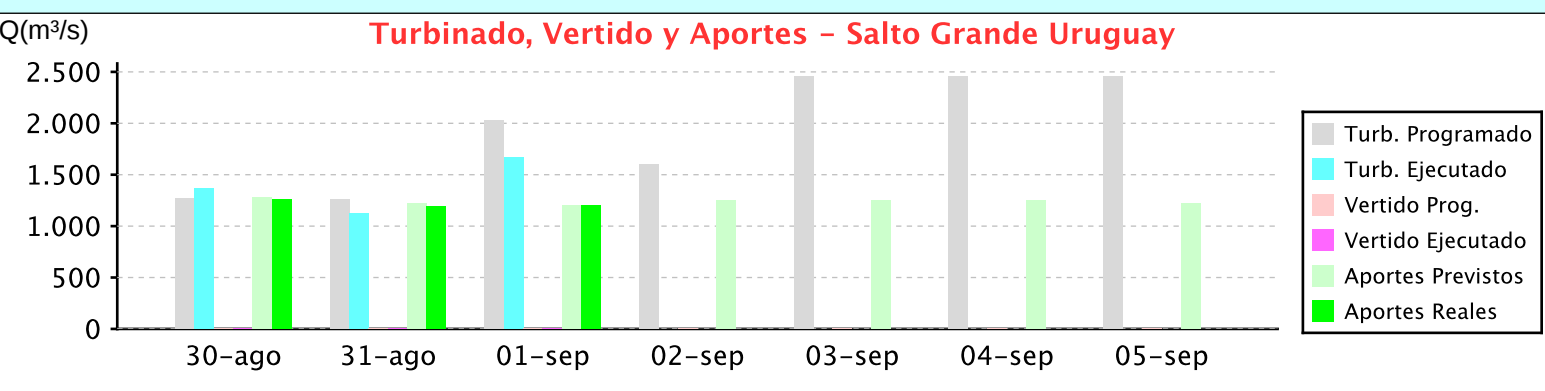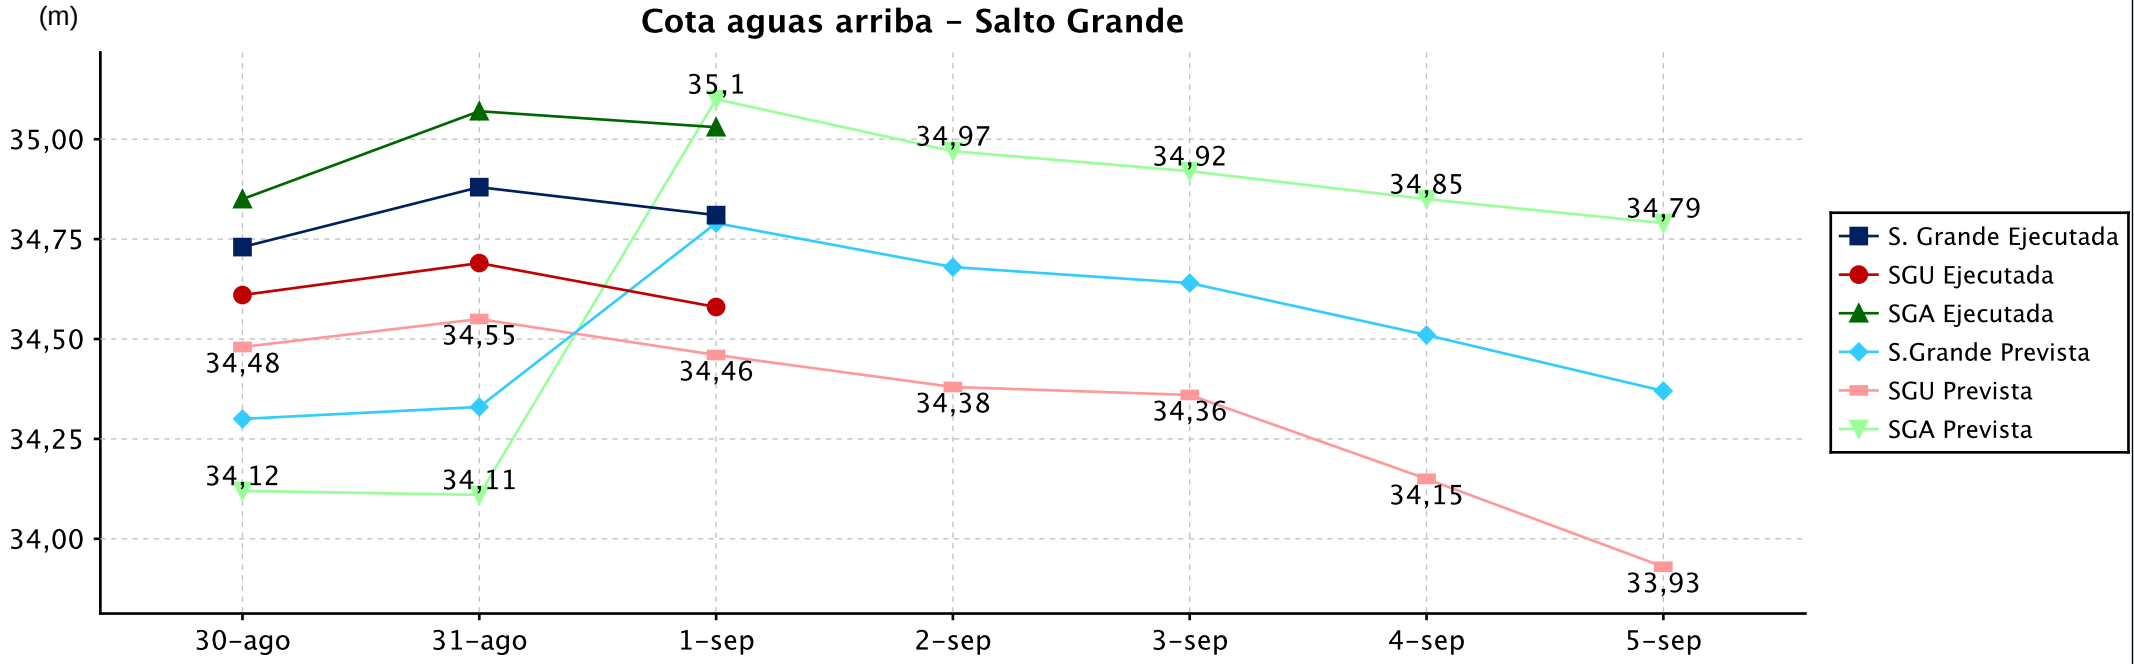

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,58
Cota Vista Arg	35,03
Cota real	34,81

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-10.270

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	674	645
Baygorria	652	621
Palmar	1.237	1.289
SGU	2.027	1.667

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	552
Baygorria	0	30
Palmar	0	132
SGU	1.200	1.200

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
