



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 02 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.849
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.853
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-9
APR A	-1
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.351
C. Baygorria	2.034
C. Palmar	7.165
C. Salto Grande	9.327
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.536
TOTAL Generación	30.172

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.172
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.430
Diferencia (MWh)	-258
Ejecutada - Programada	-0,85 %

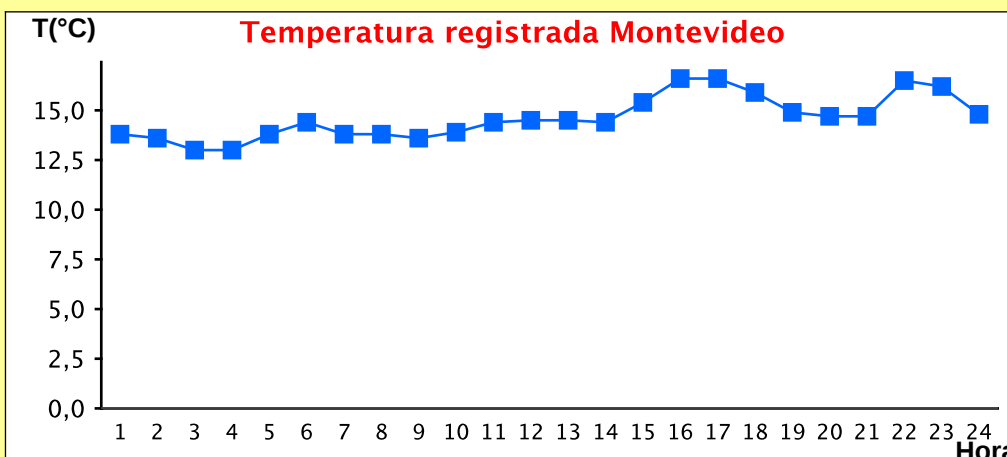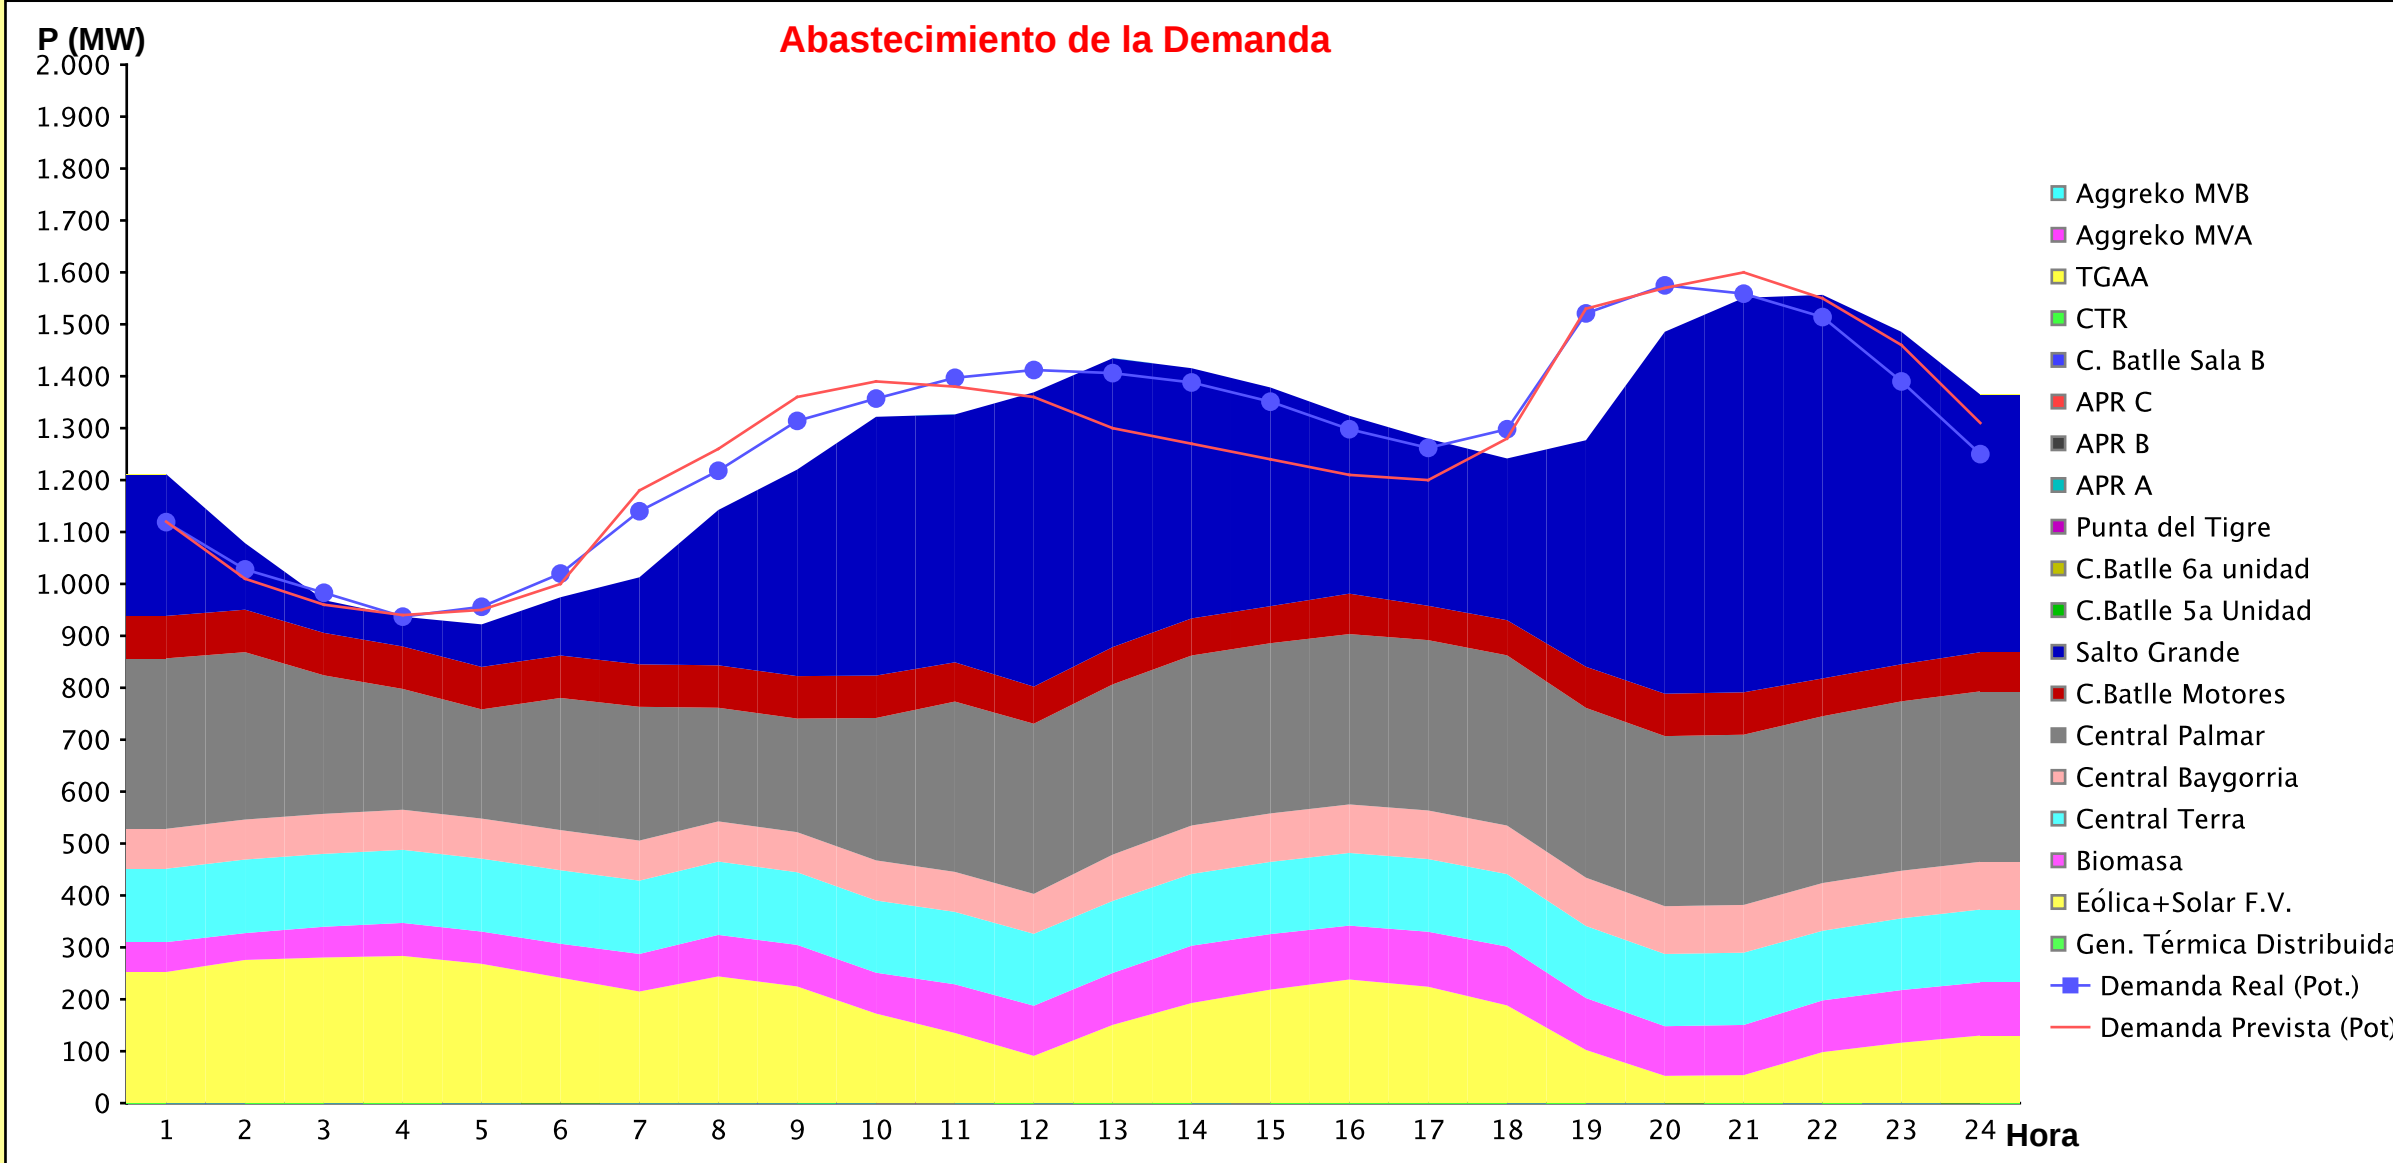



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1423,62 Hora 12:35
Potencia mínima:	927,89 Hora 04:00
Pico noche:	1585,83 Hora 20:13

Generación Media (MW)	
Eólica	185,7
Biomasa	88,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

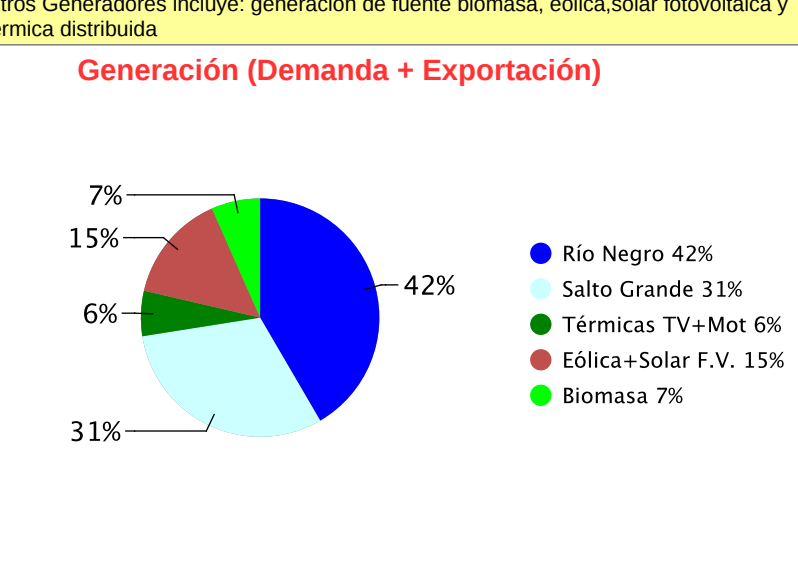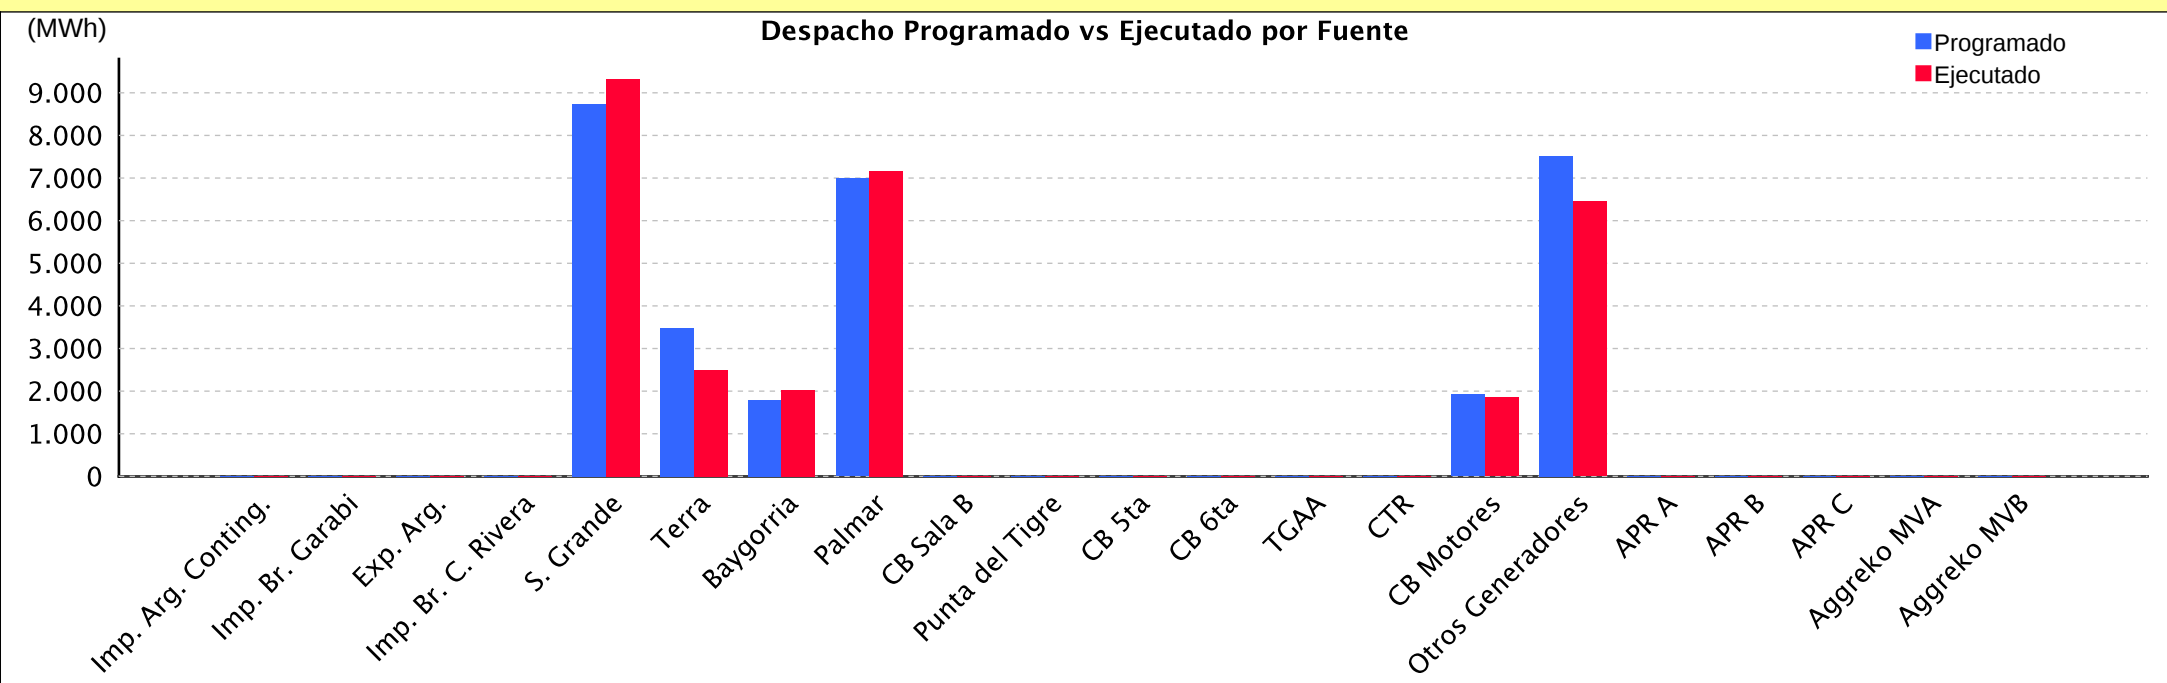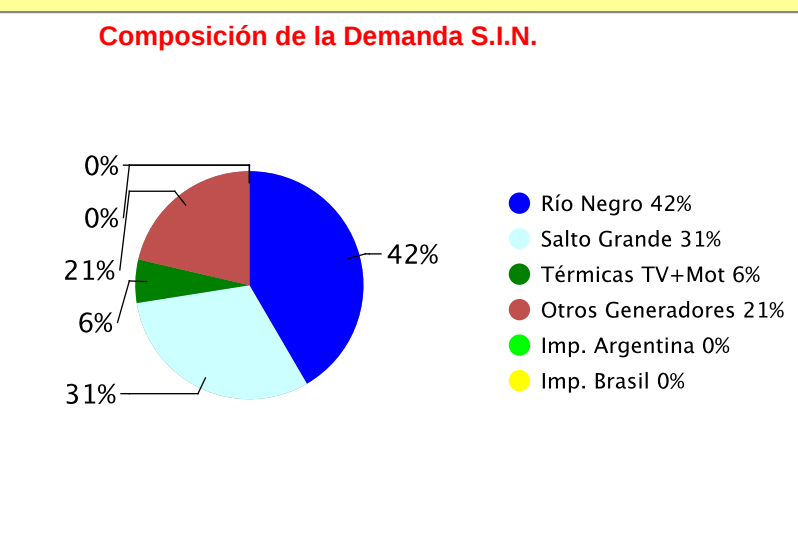



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

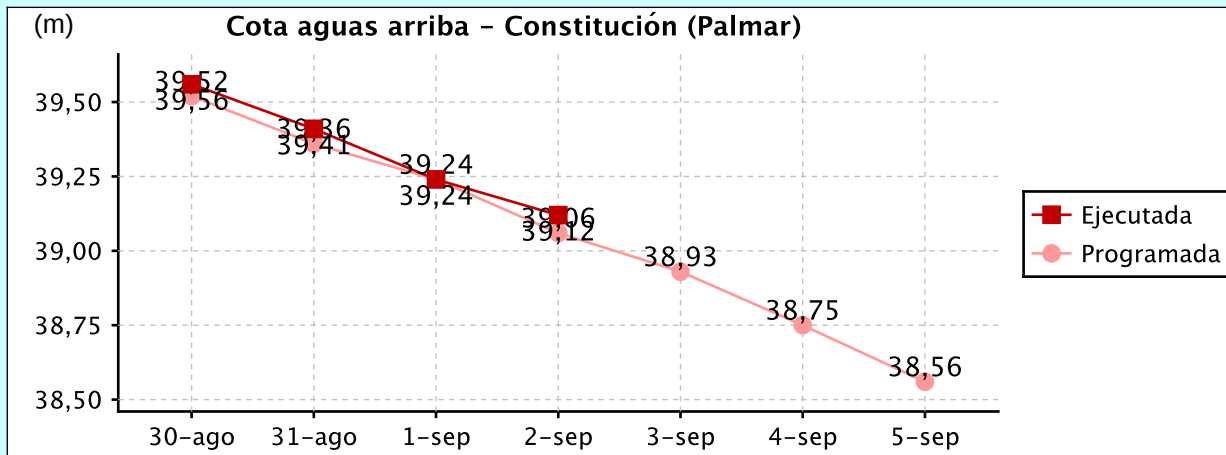
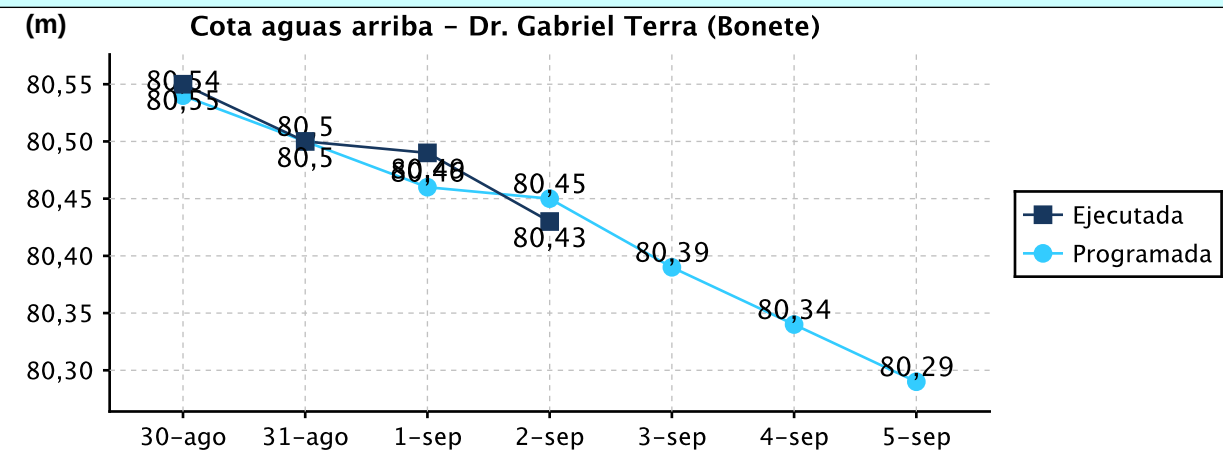


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,45	80,43
Baygorria	53,87	53,86
Palmar	39,06	39,12
SGU	34,38	34,41

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

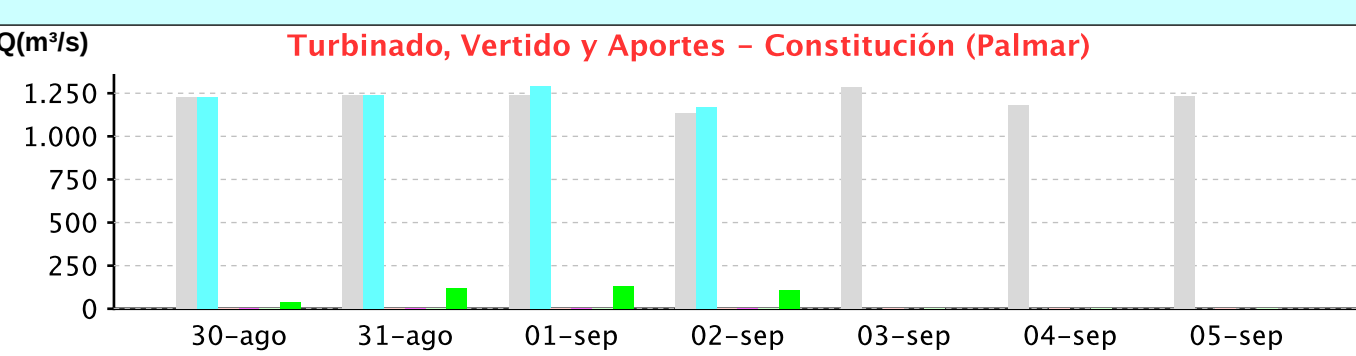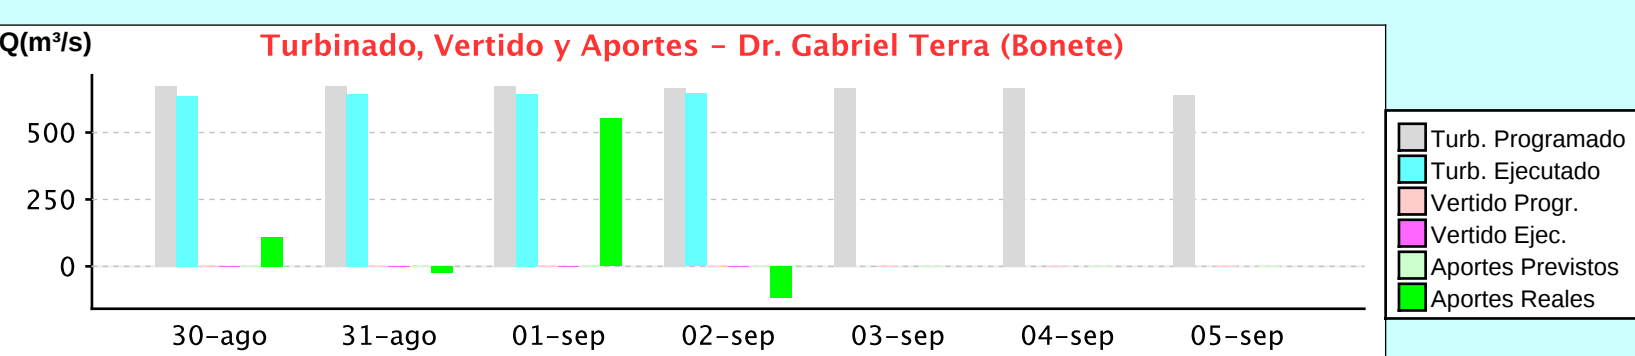

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

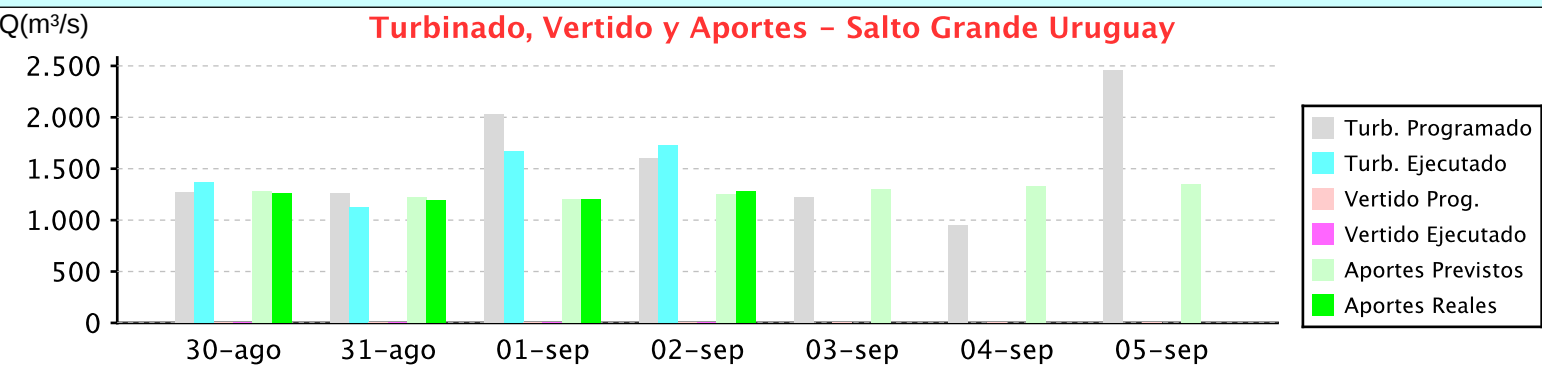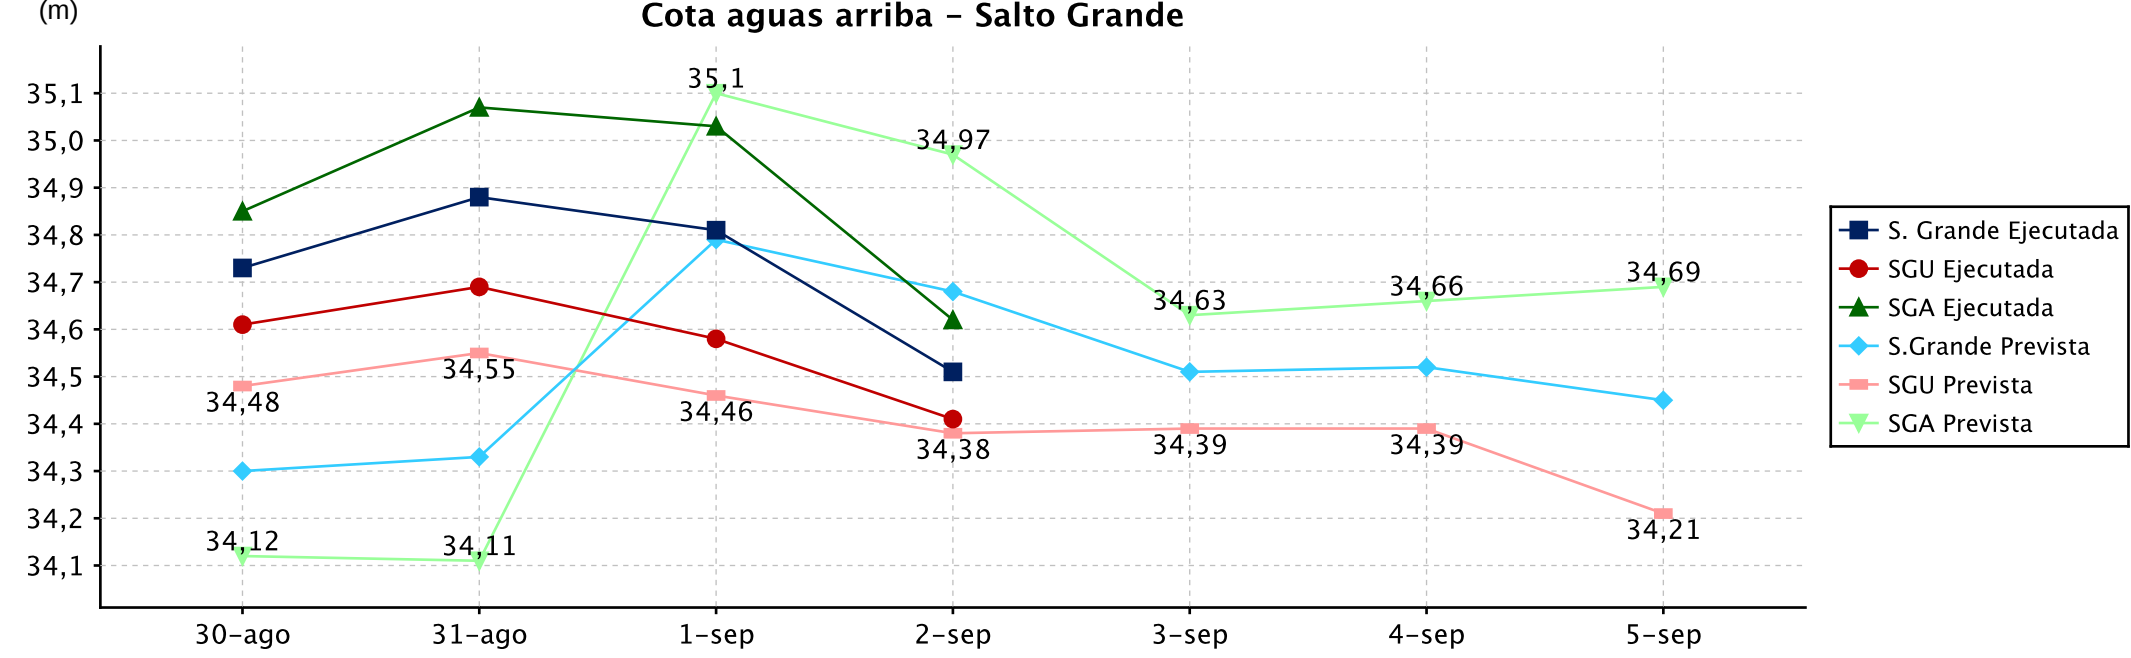

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,41
Cota Vista Arg	34,62
Cota real	34,51

Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	-4.654

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	645
Baygorria	635	698
Palmar	1.132	1.171
SGU	1.603	1.722

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-119
Baygorria	0	61
Palmar	0	109
SGU	1.250	1.284

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
