




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 04 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.929
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.933
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.364
C. Baygorria	2.232
C. Palmar	7.042
C. Salto Grande	6.113
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.854
TOTAL Generación	28.443

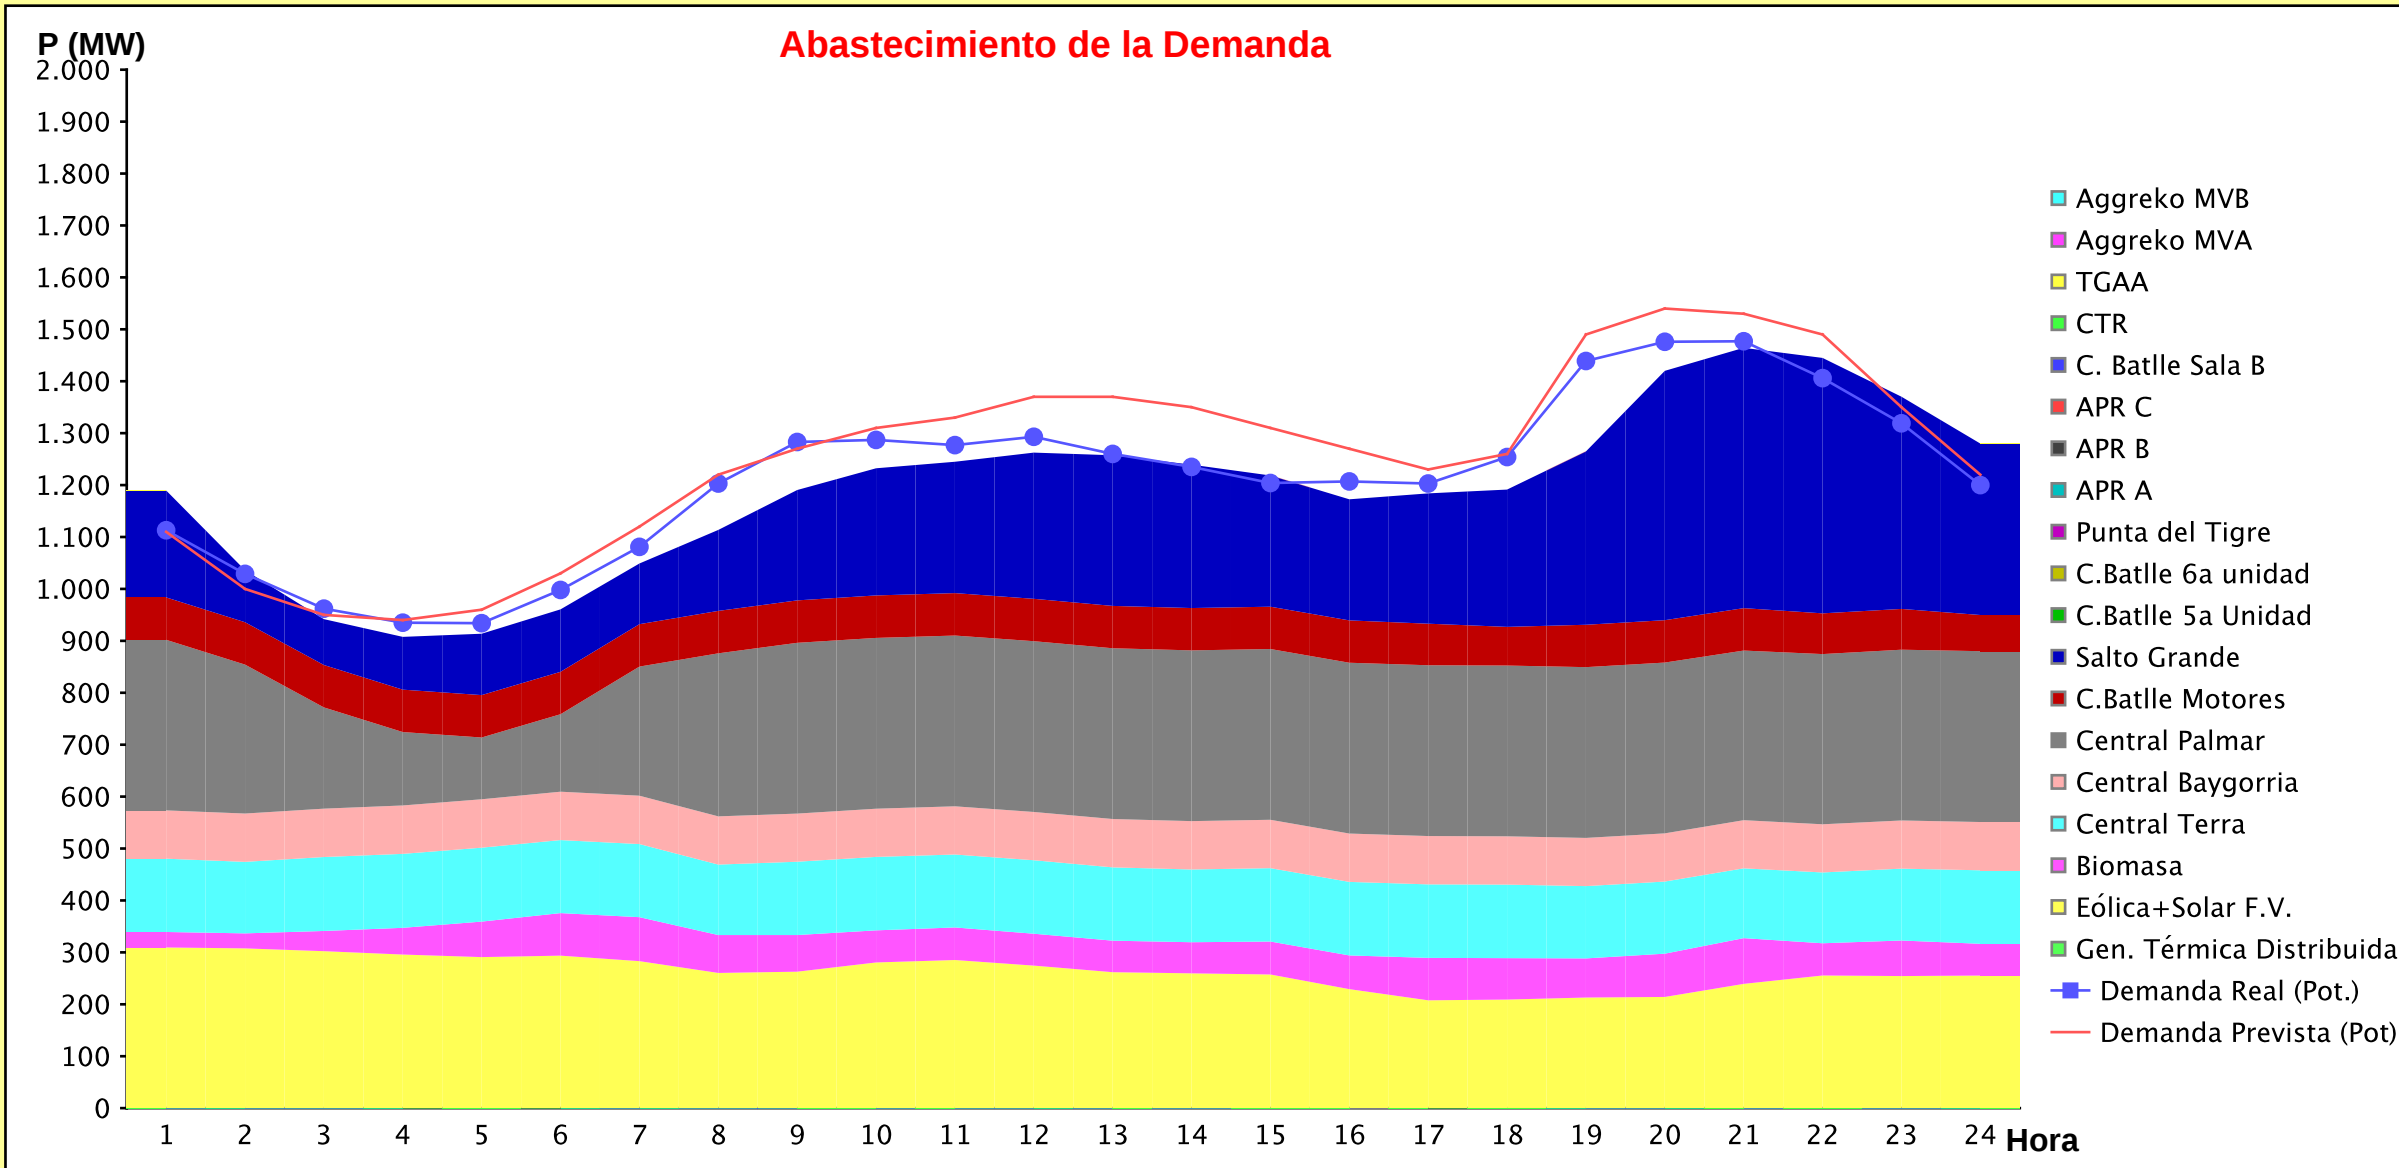




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.443
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	30.020
Diferencia (MWh)	-1.577
Ejecutada - Programada	-5,25 %

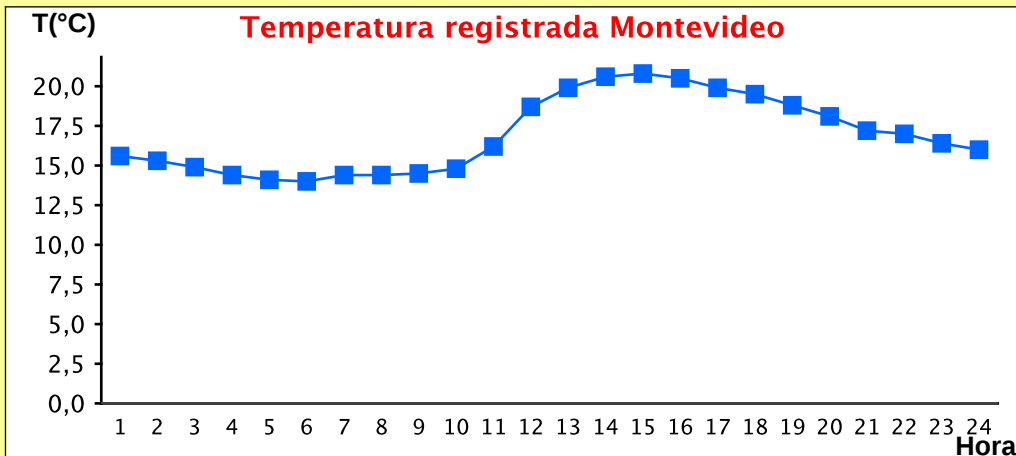



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1303,49 Hora 11:49
Potencia mínima:	891,36 Hora 04:08
Pico noche:	1486,26 Hora 20:33

Generación Media (MW)	
Eólica	262,8
Biomasa	66,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

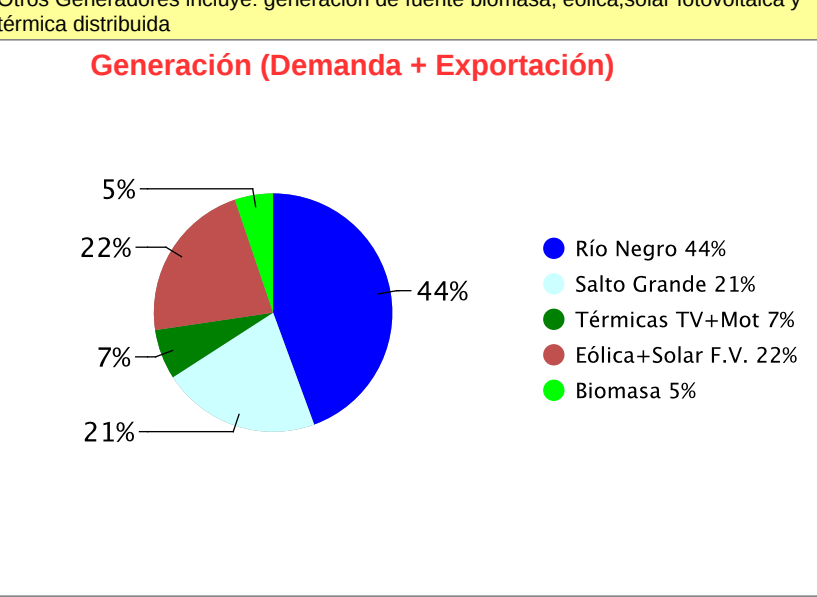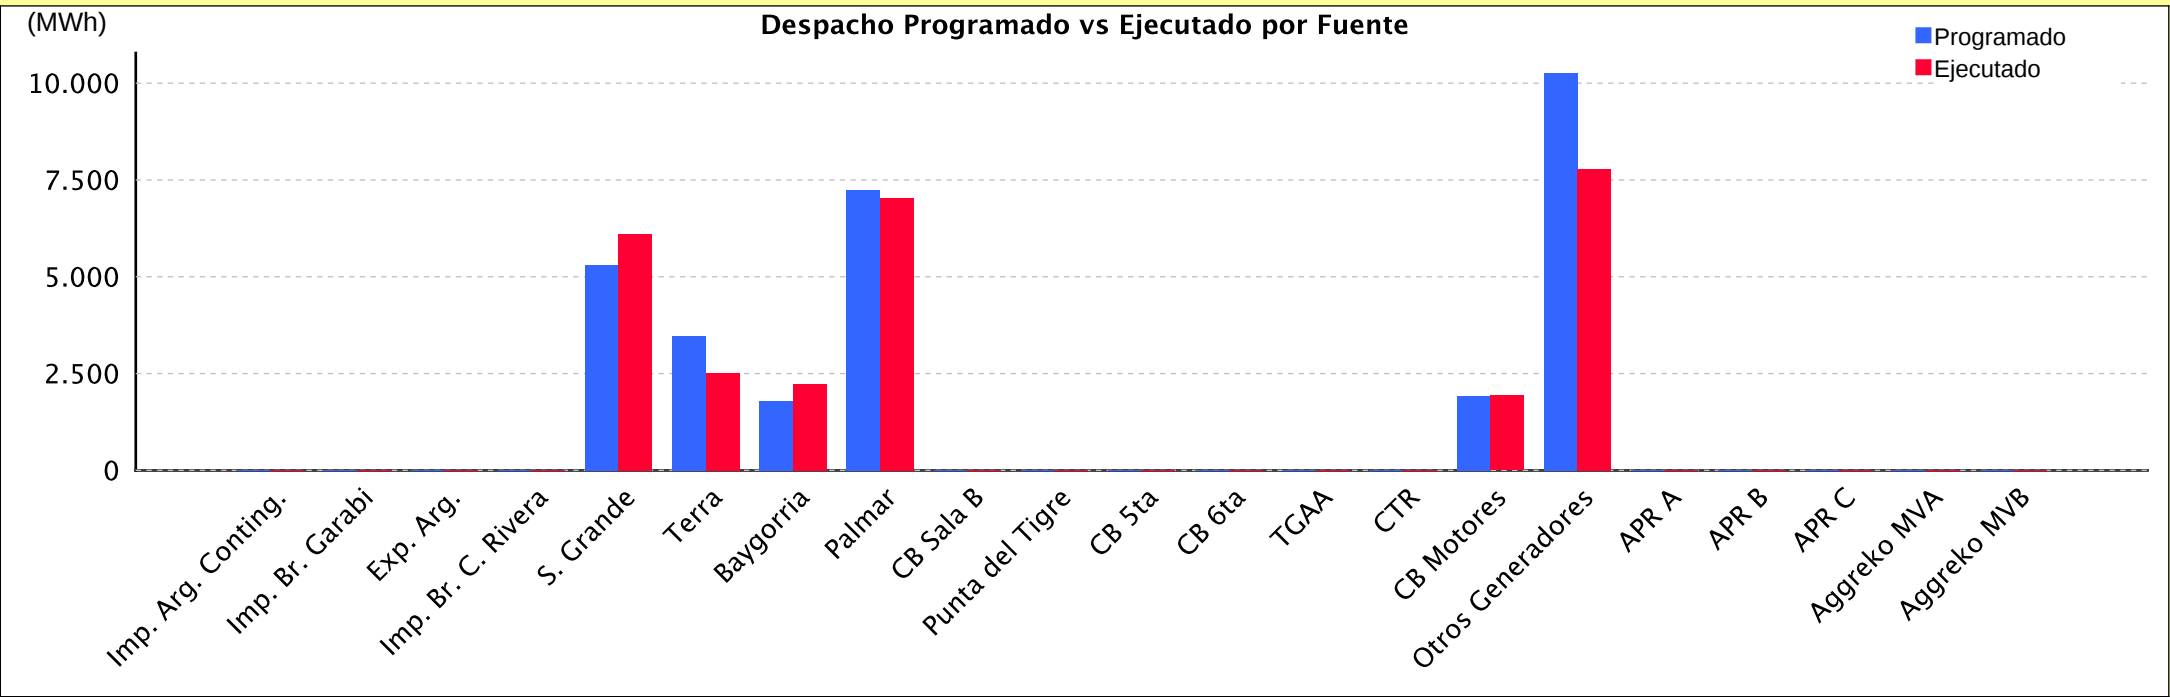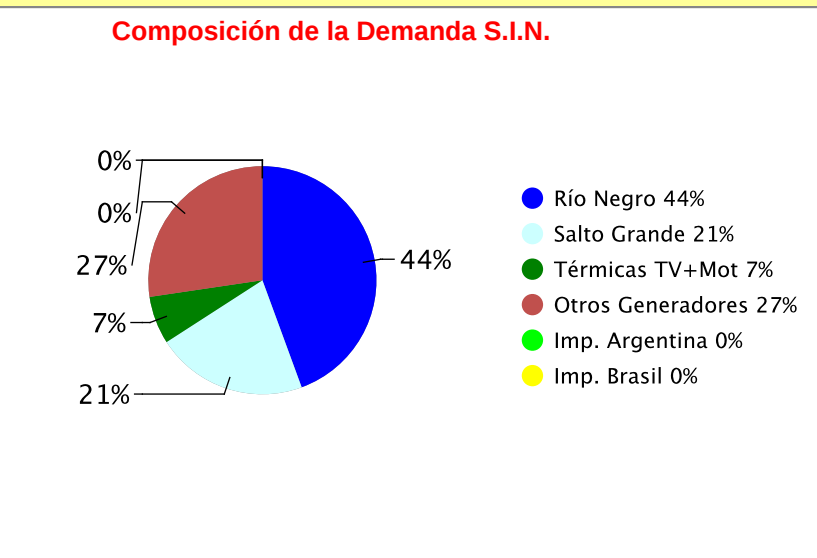



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

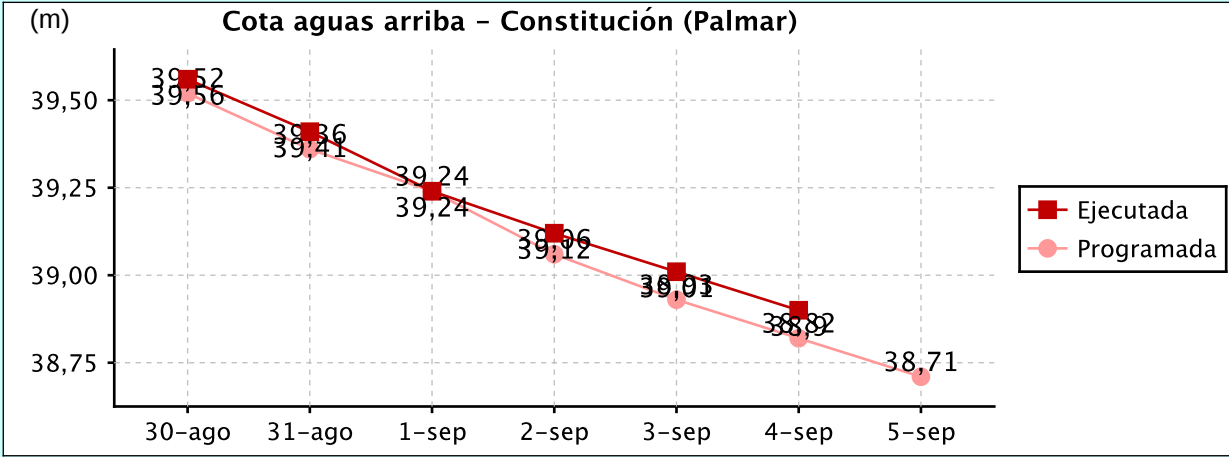
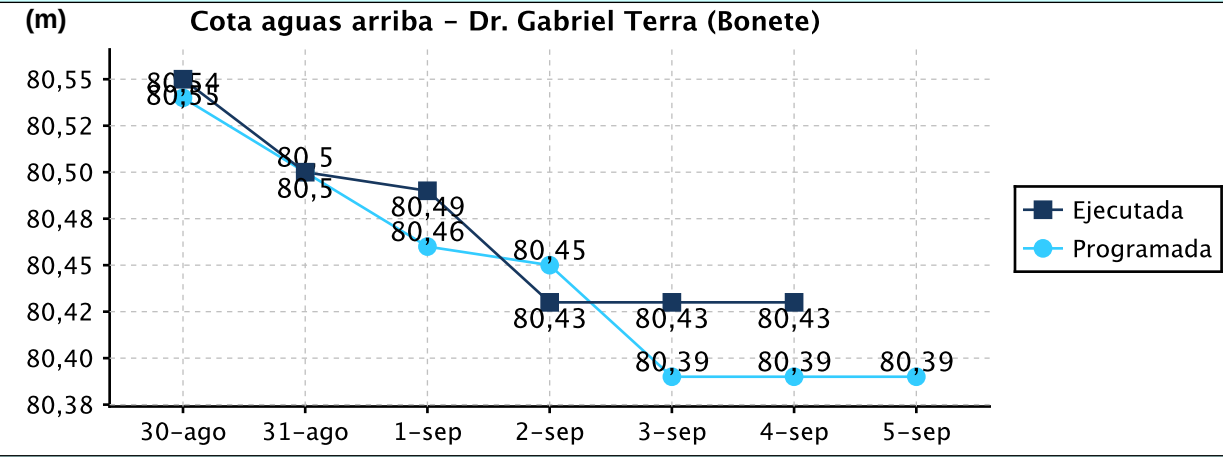


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,39	80,43
Baygorria	53,84	53,75
Palmar	38,82	38,9
SGU	34,50	34,56

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

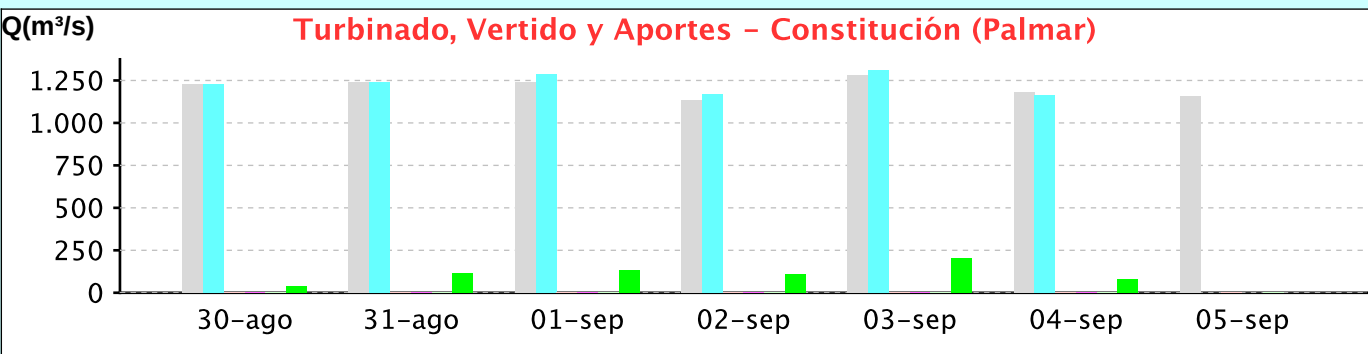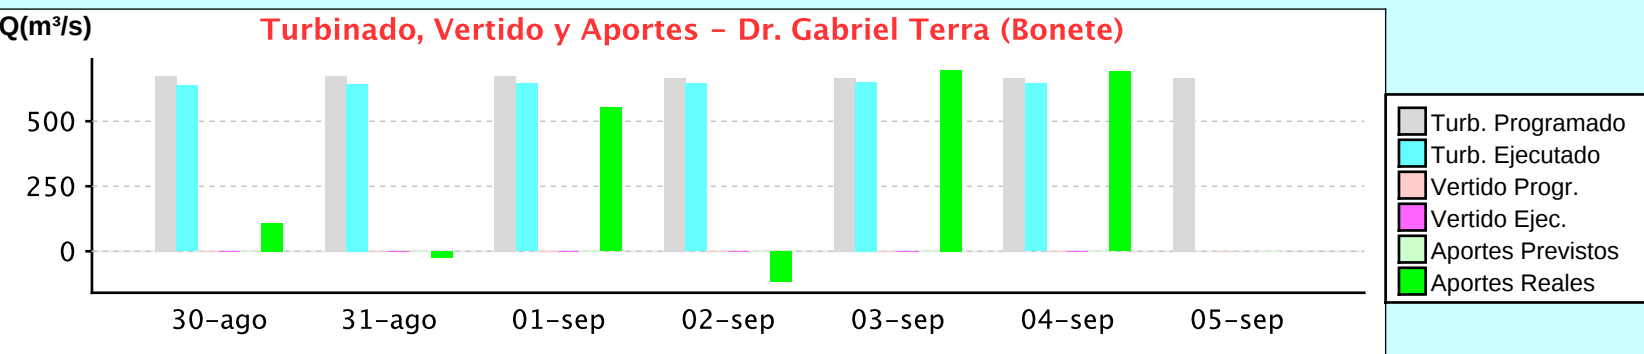

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

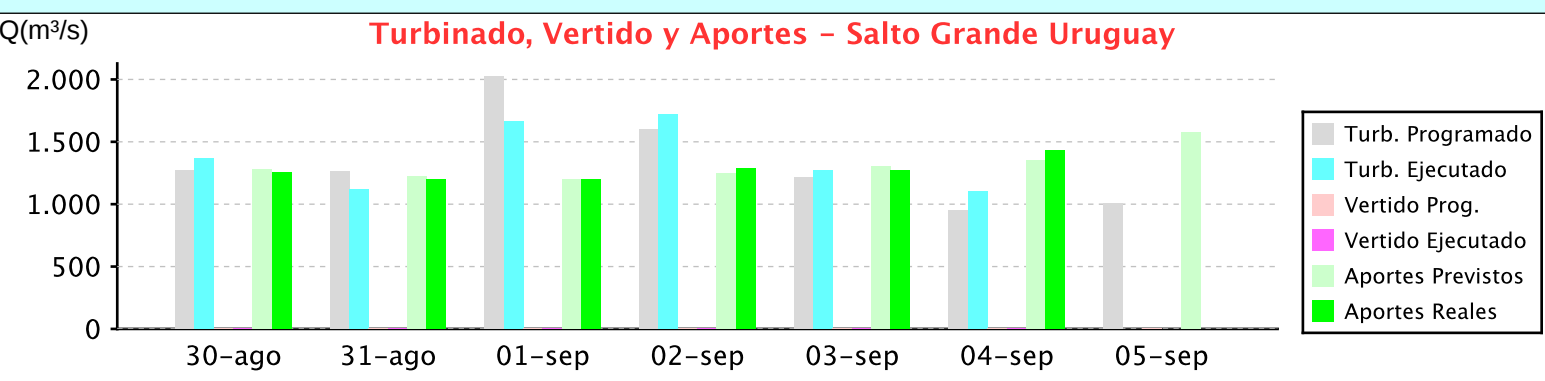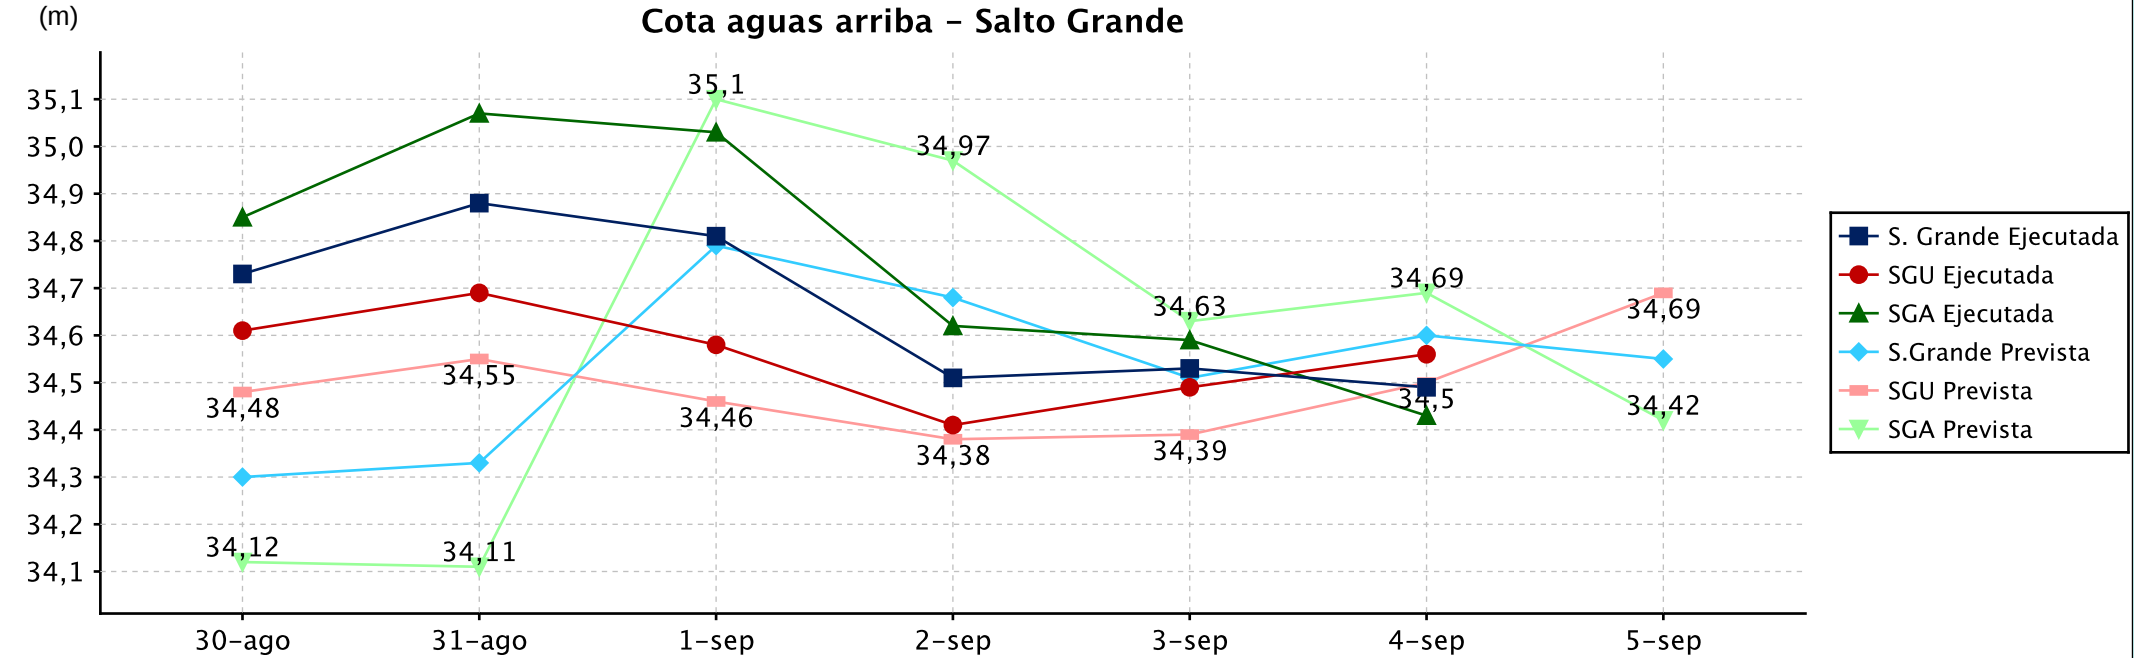

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,56
Cota Vista Arg	34,43
Cota real	34,49

Dif. Energ. (U-A)	2.909
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	646
Baygorria	625	764
Palmar	1.180	1.163
SGU	951	1.106

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	691
Baygorria	0	33
Palmar	0	81
SGU	1.350	1.428

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
