



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 06 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.341
C. Baygorria	1.878
C. Palmar	3.411
C. Salto Grande	11.987
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.908
TOTAL Generación	25.424

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.424
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.500
Diferencia (MWh)	-3.076
Ejecutada - Programada	-10,79 %

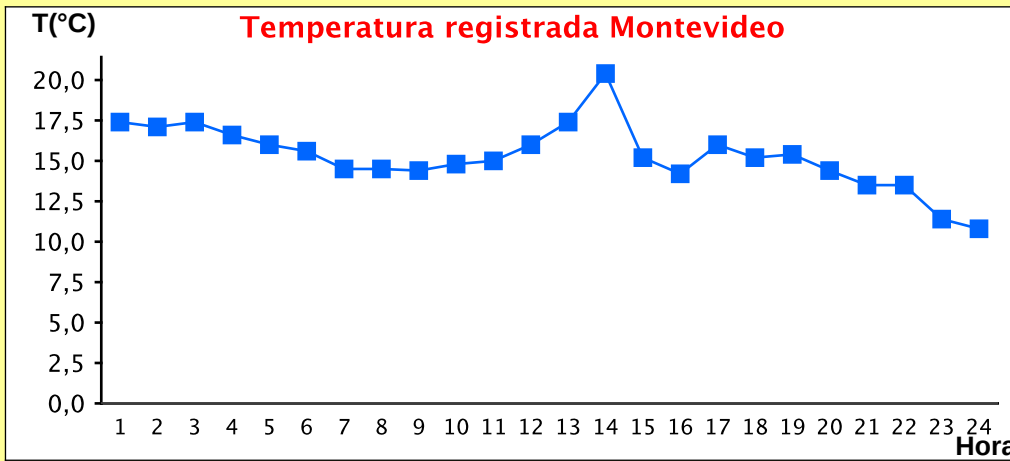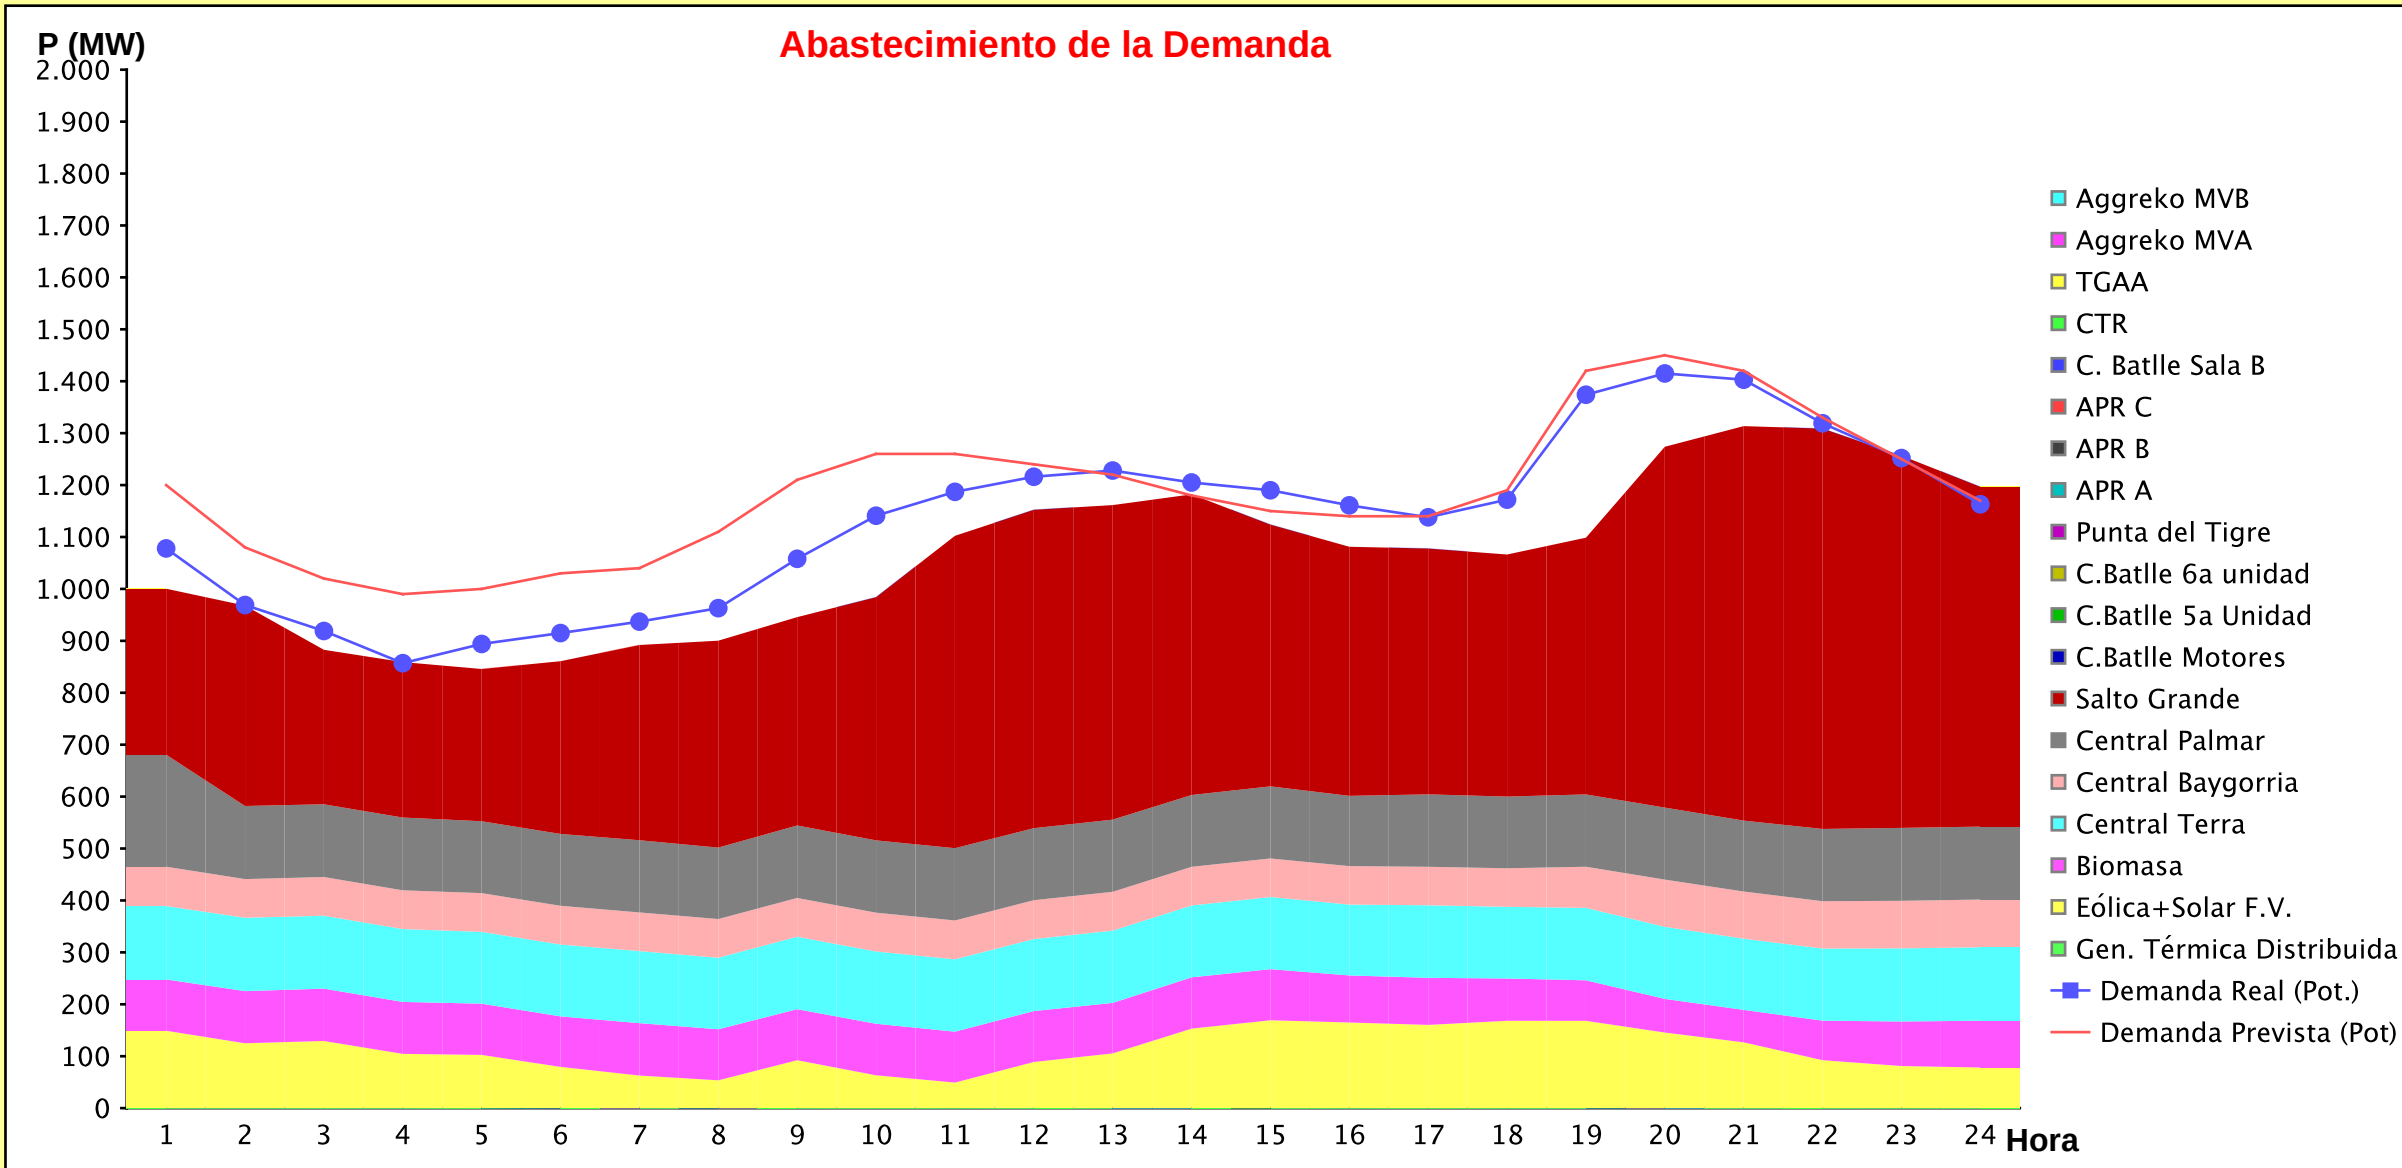



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1235,13 Hora 12:57
Potencia mínima:	840,22 Hora 03:55
Pico noche:	1422,93 Hora 19:59

Generación Media (MW)	
Eólica	113,2
Biomasa	92,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

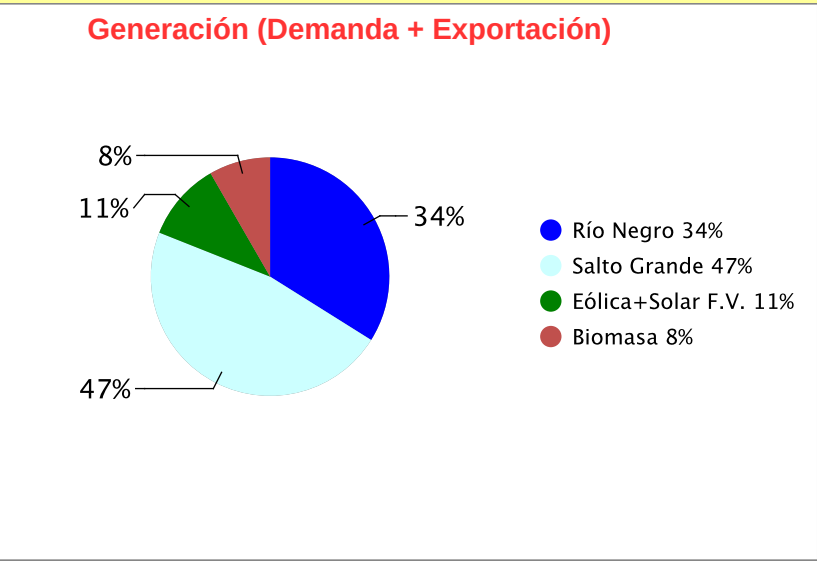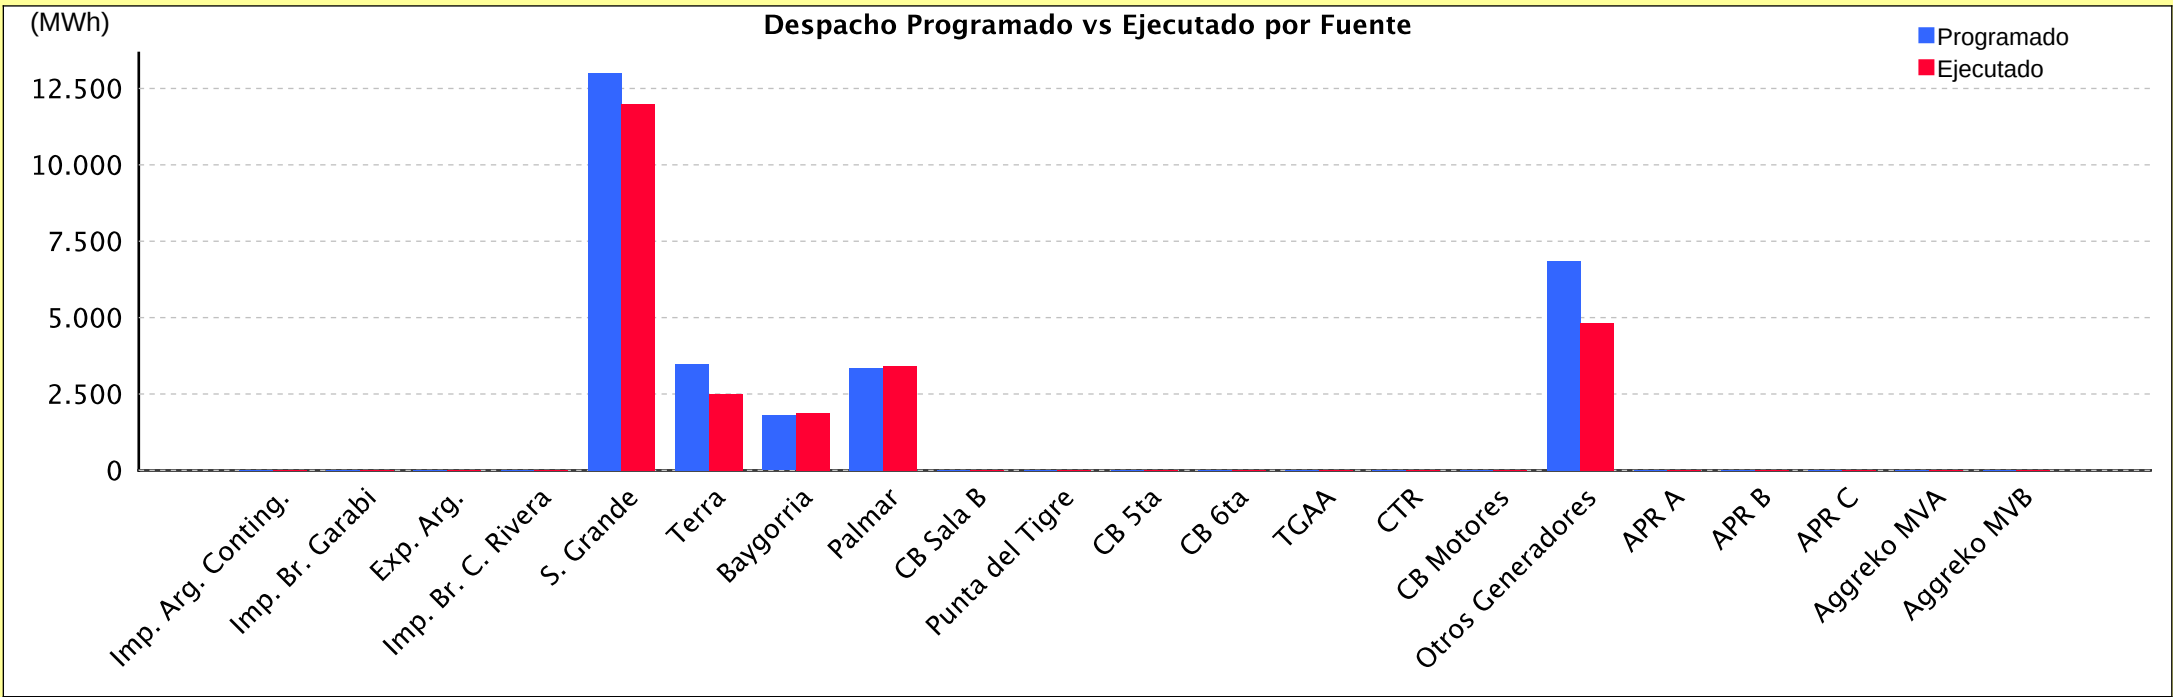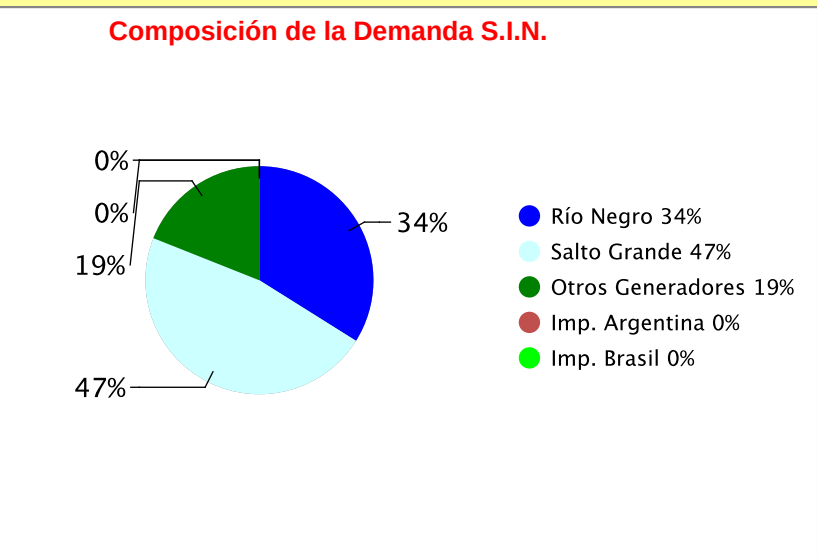



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

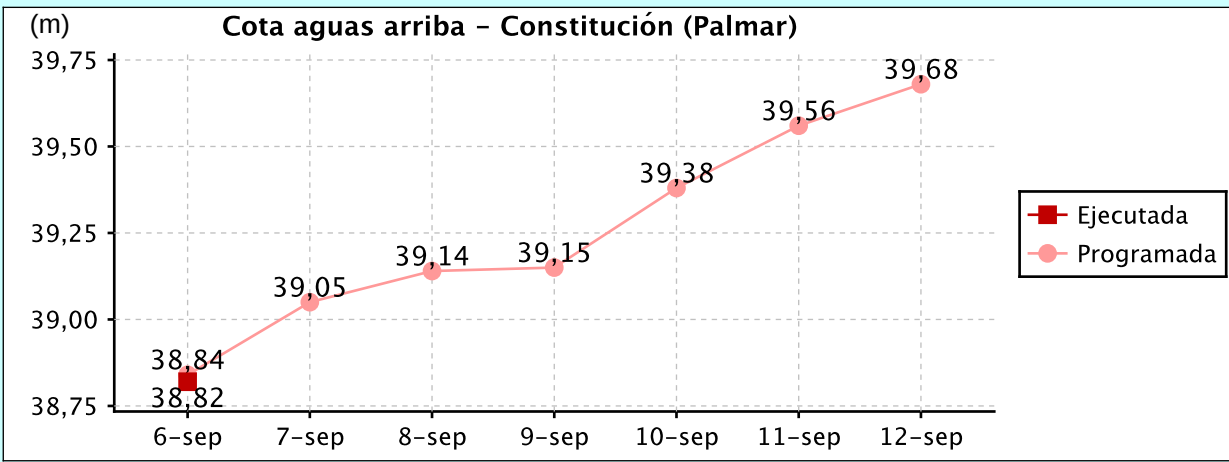
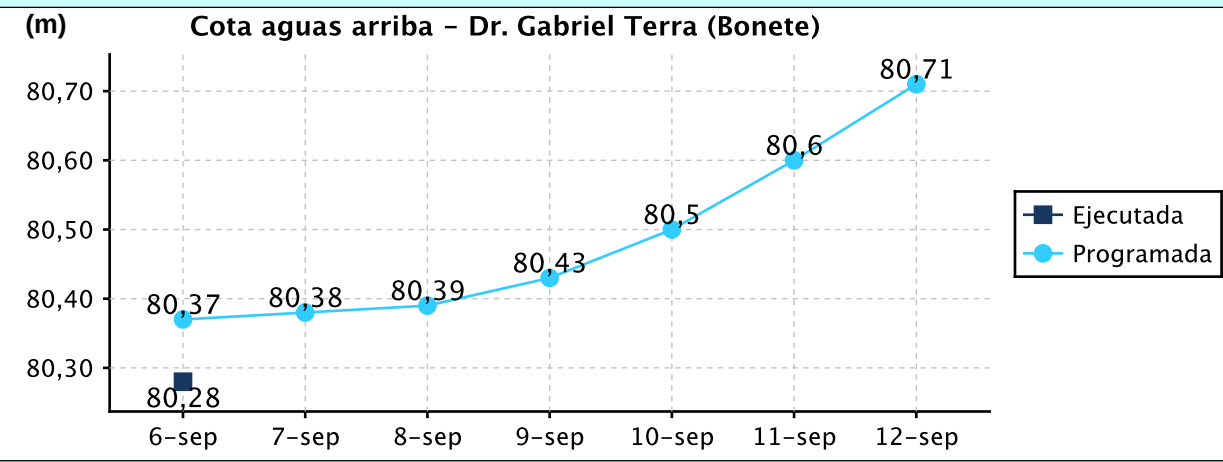


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,37	80,28
Baygorria	53,72	53,69
Palmar	38,84	38,82
SGU	34,71	34,55

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

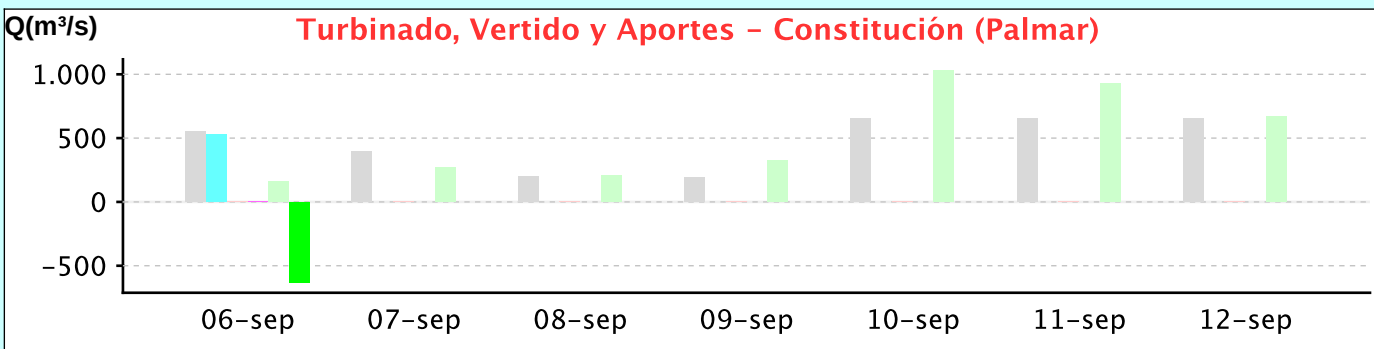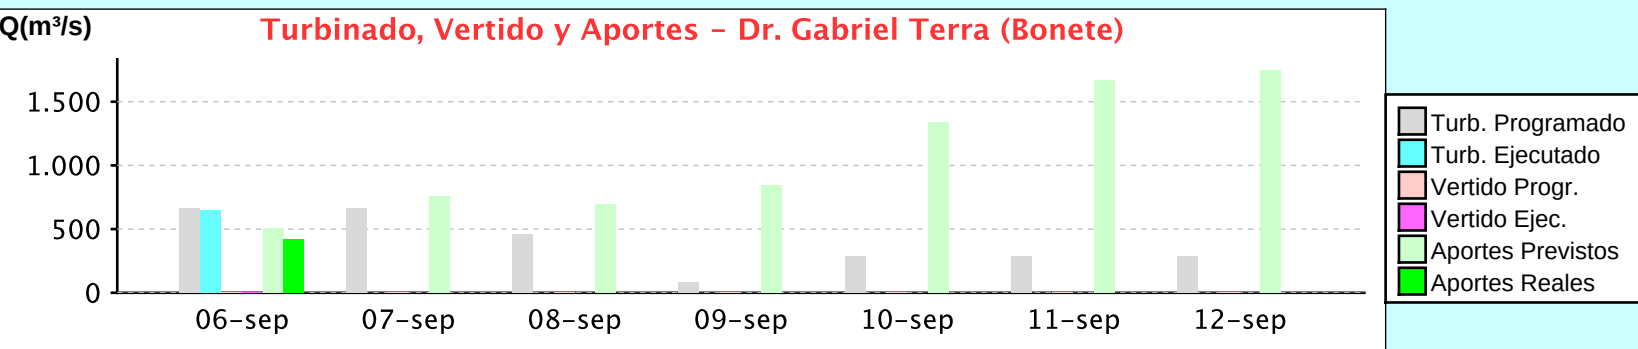

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

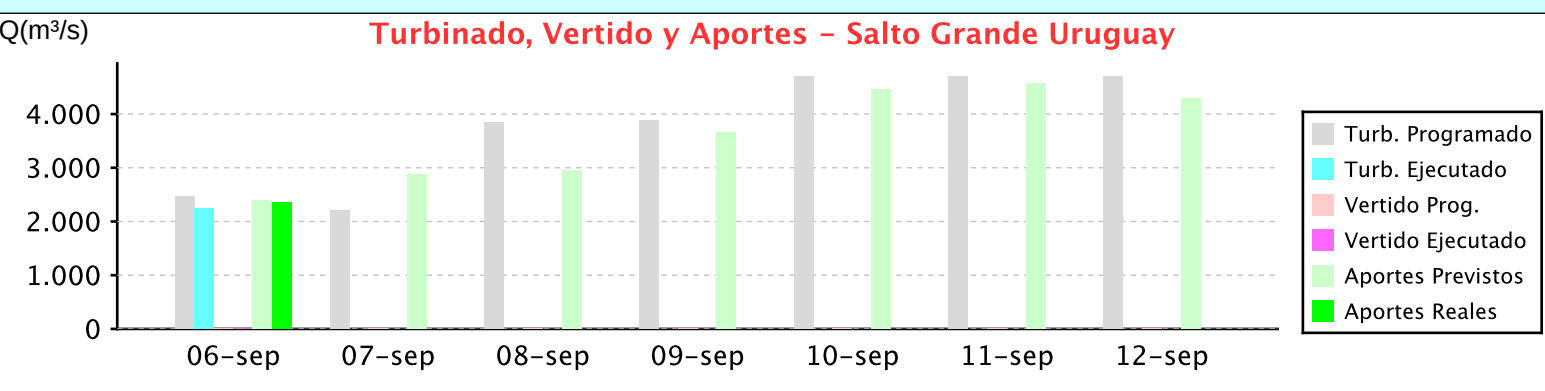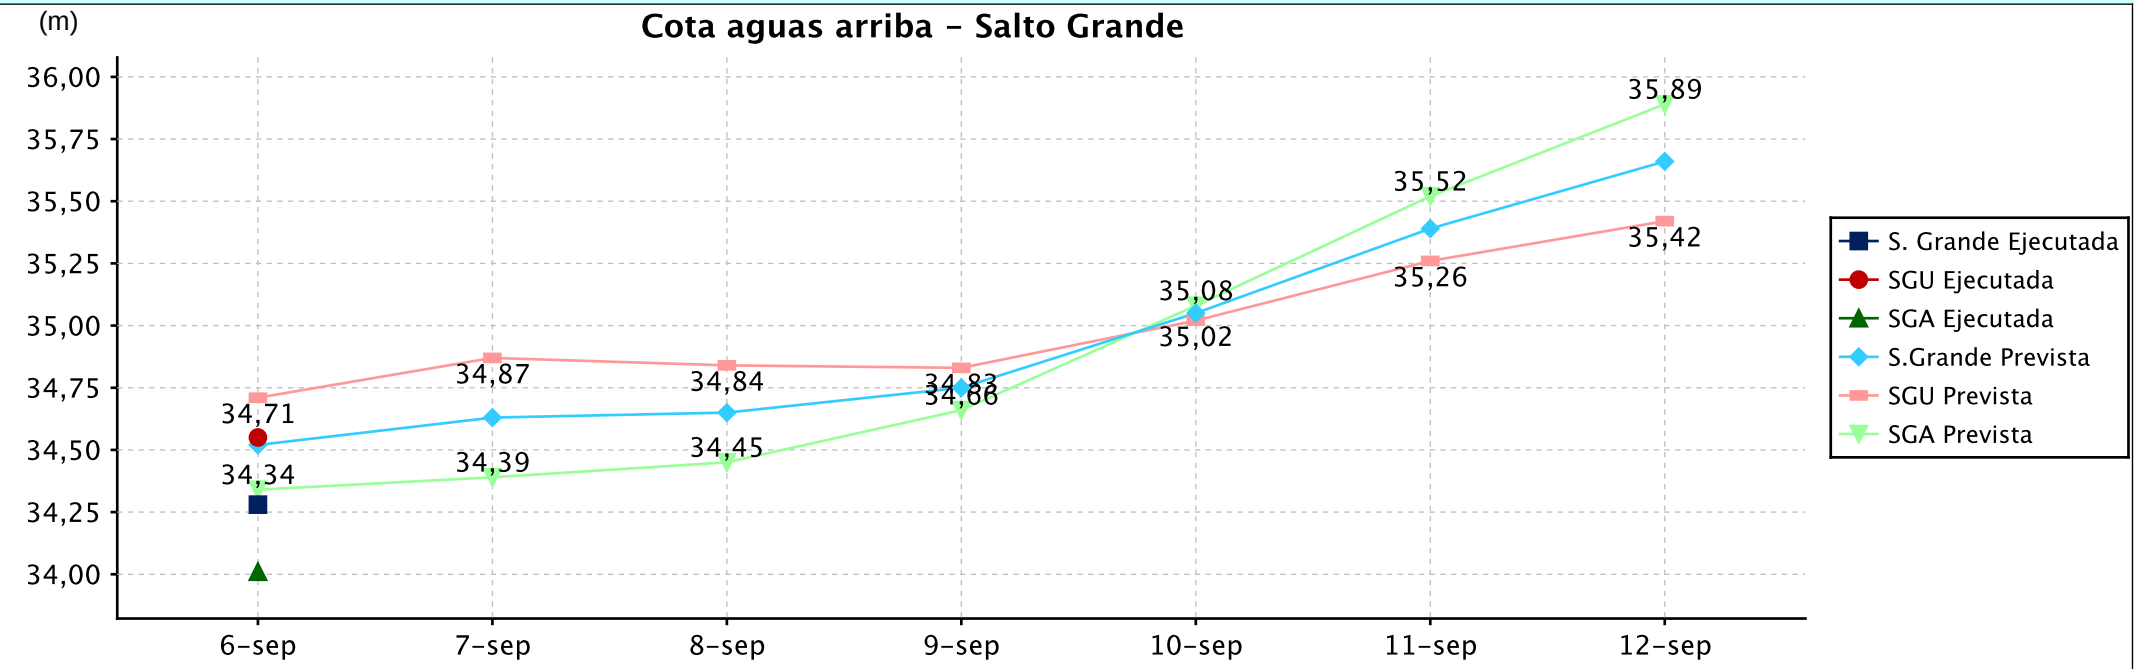

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,55
Cota Vista Arg	34,01
Cota real	34,28
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	11.654

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	667	650
Baygorria	629	629
Palmar	550	528
SGU	2.474	2.244

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	417
Baygorria	68	33
Palmar	159	-629
SGU	2.400	2.358

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
