



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 08 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.738
C. Baygorria	1.100
C. Palmar	324
C. Salto Grande	18.514
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.079
TOTAL Generación	27.658

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.658
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.880
Diferencia (MWh)	-2.222
Ejecutada - Programada	-7,44 %

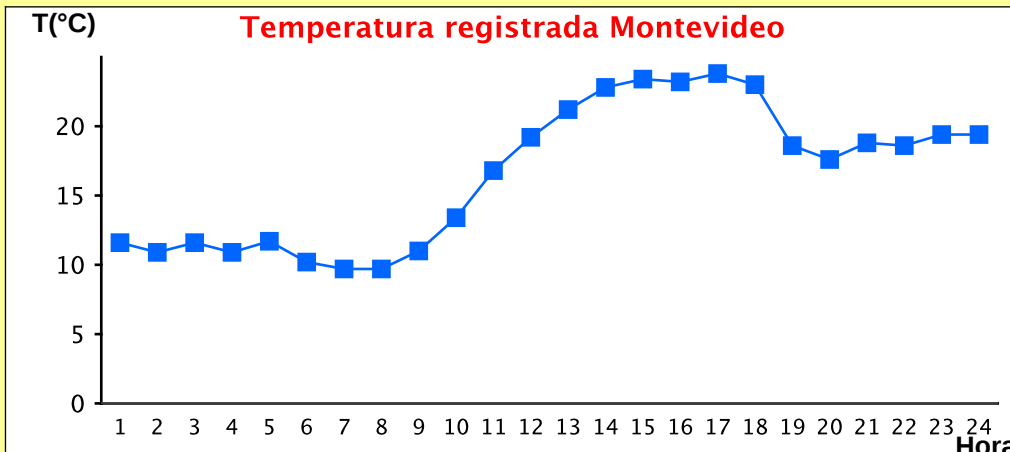
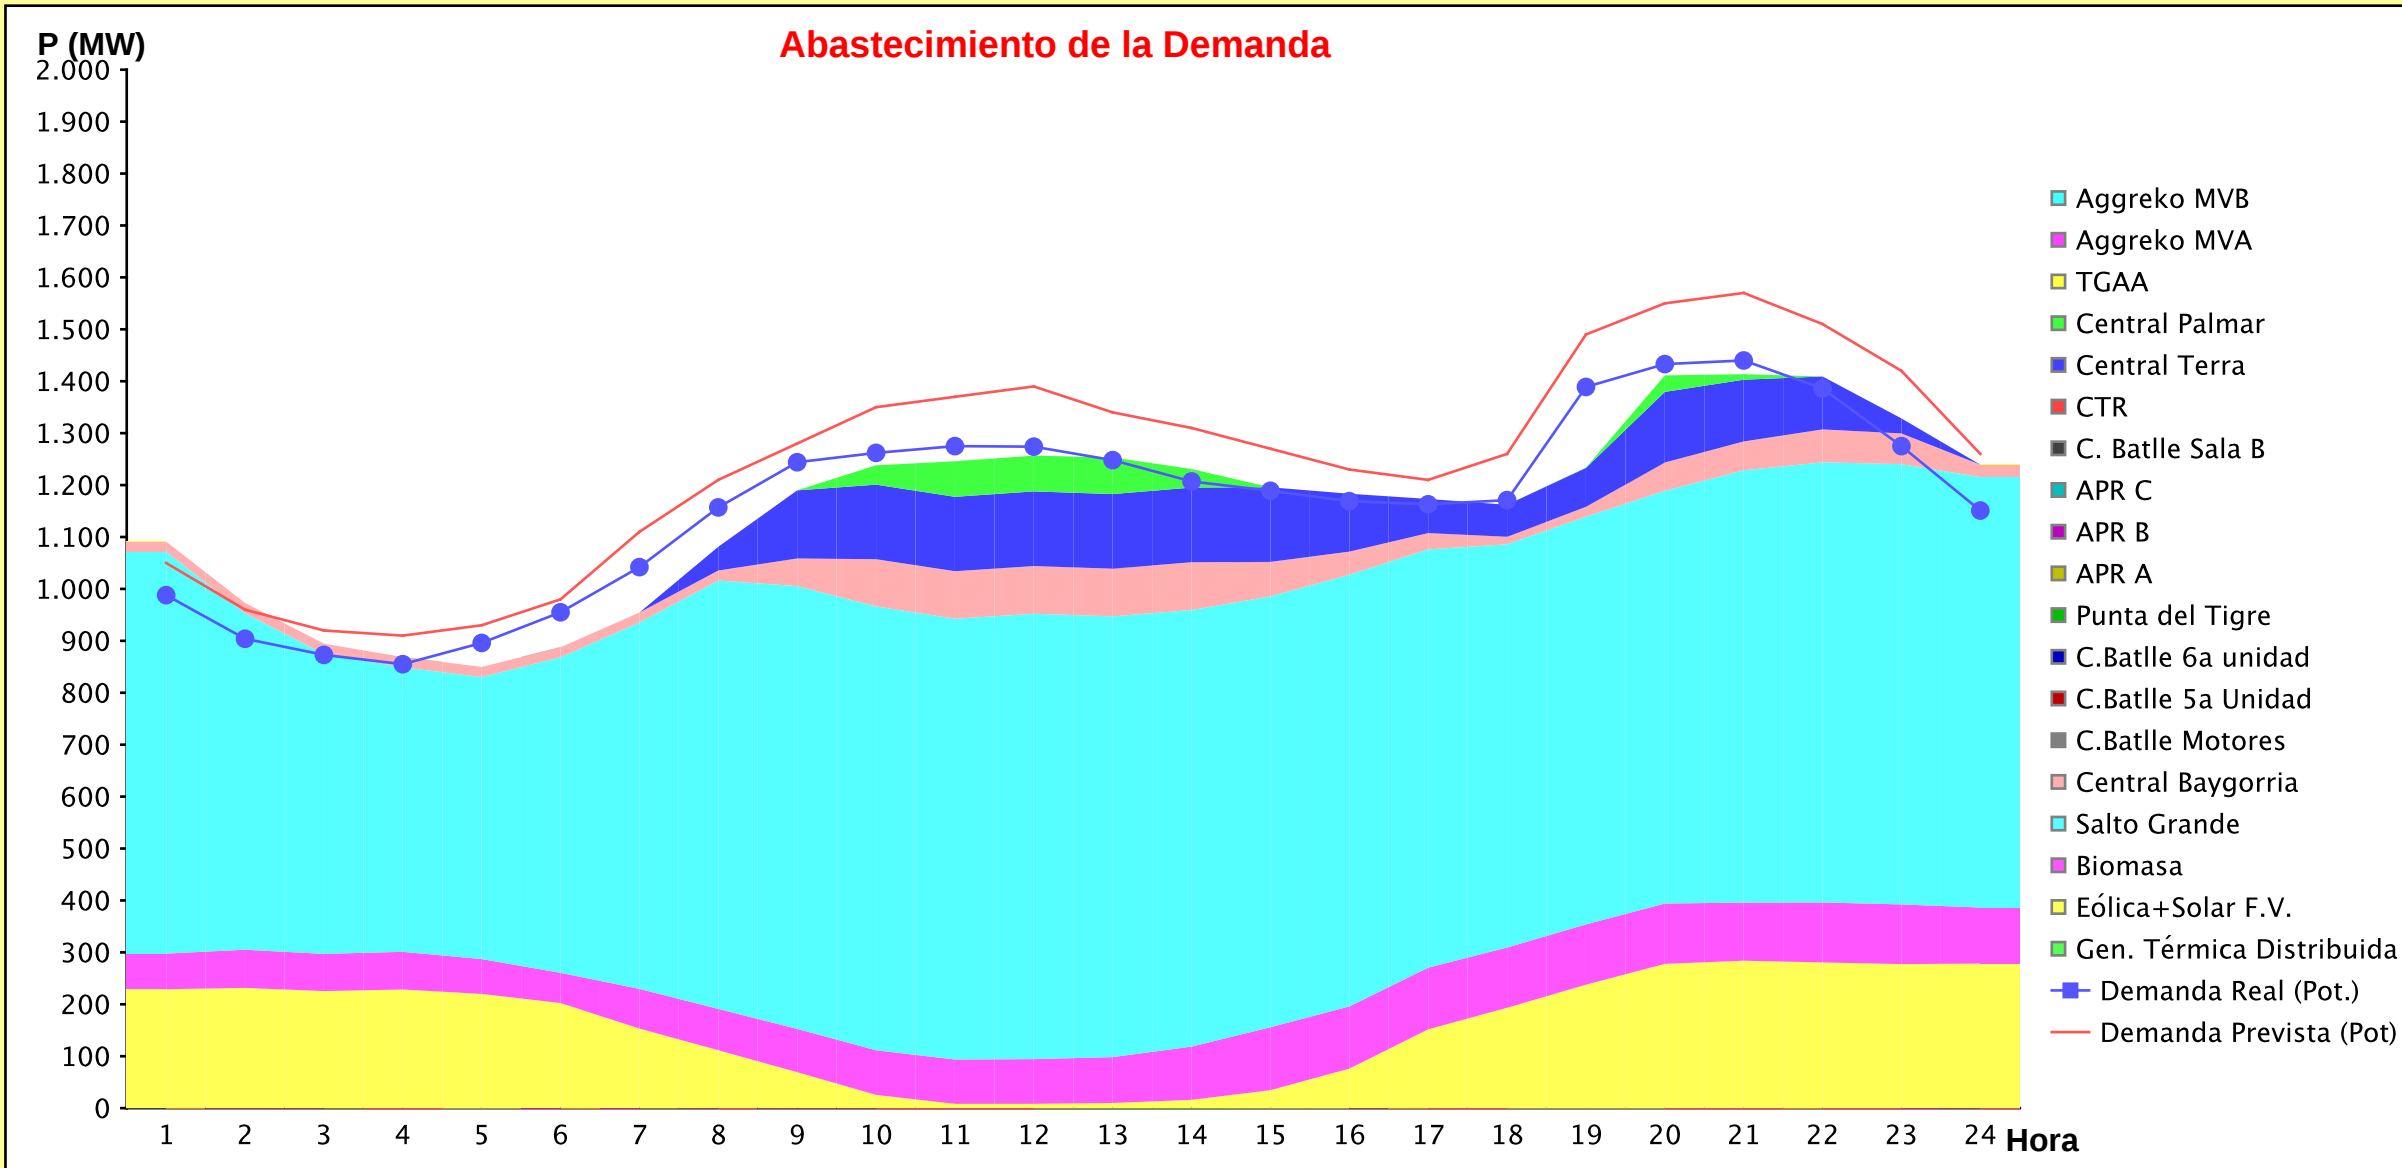


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1289,19 Hora 11:49
Potencia mínima:	848,14 Hora 03:30
Pico noche:	1453,97 Hora 20:36

Generación Media (MW)	
Eólica	160,0
Biomasa	95,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


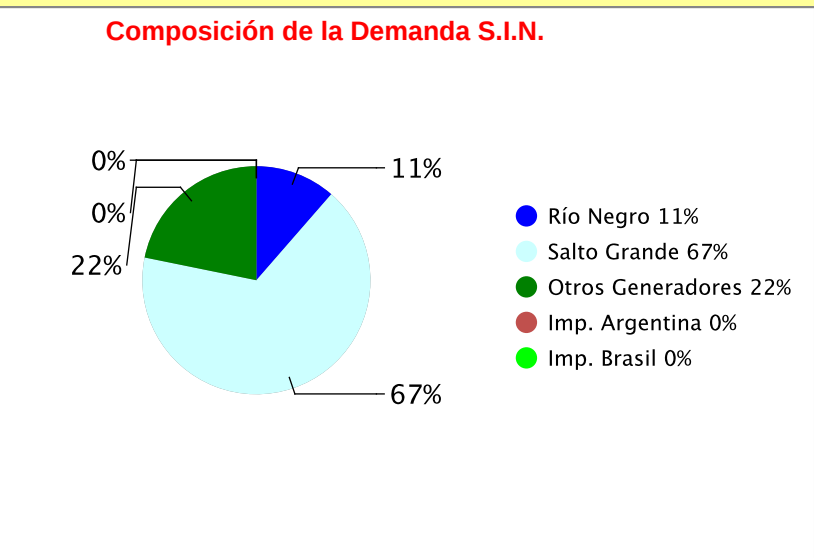


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

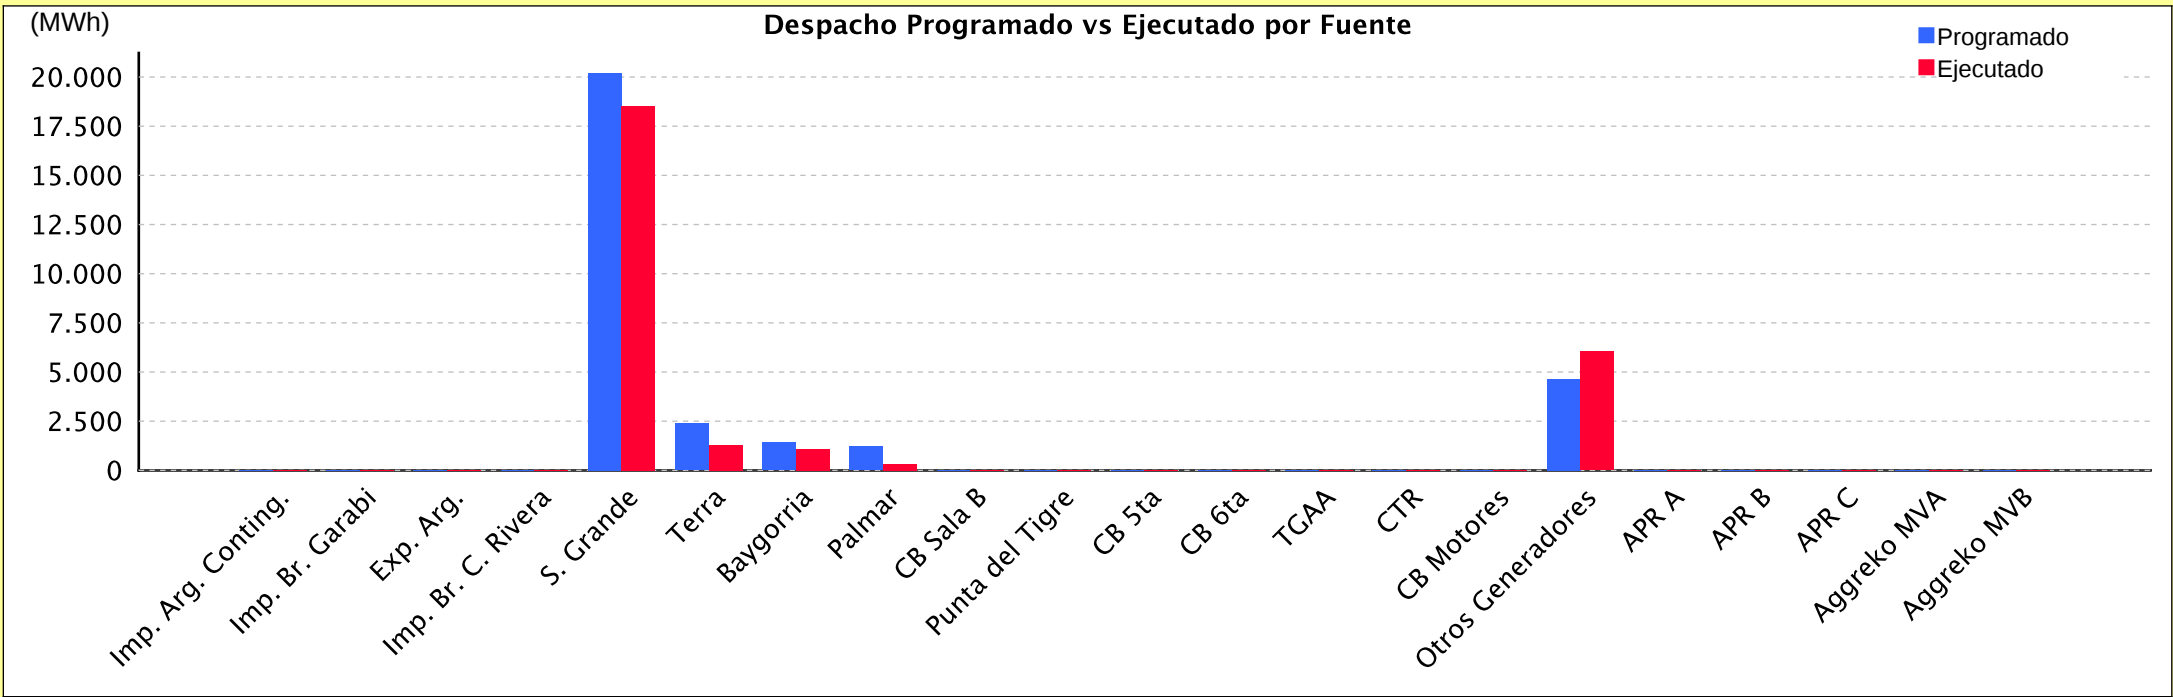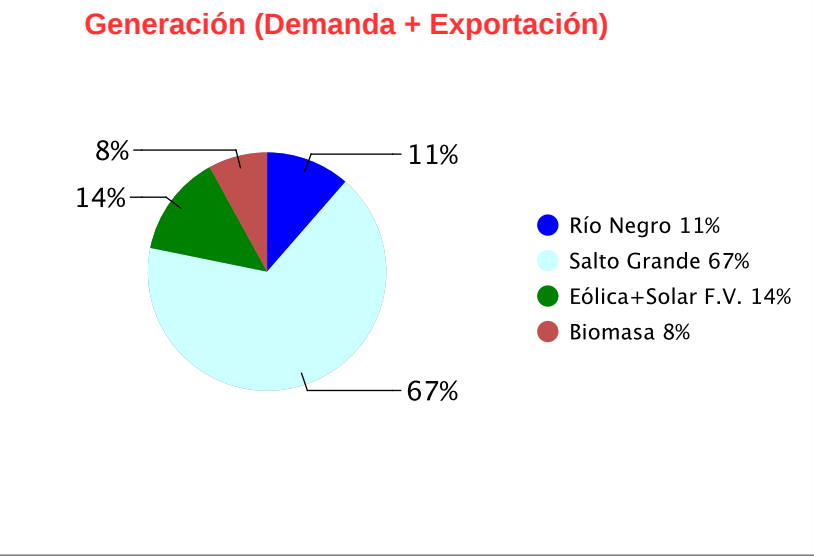



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

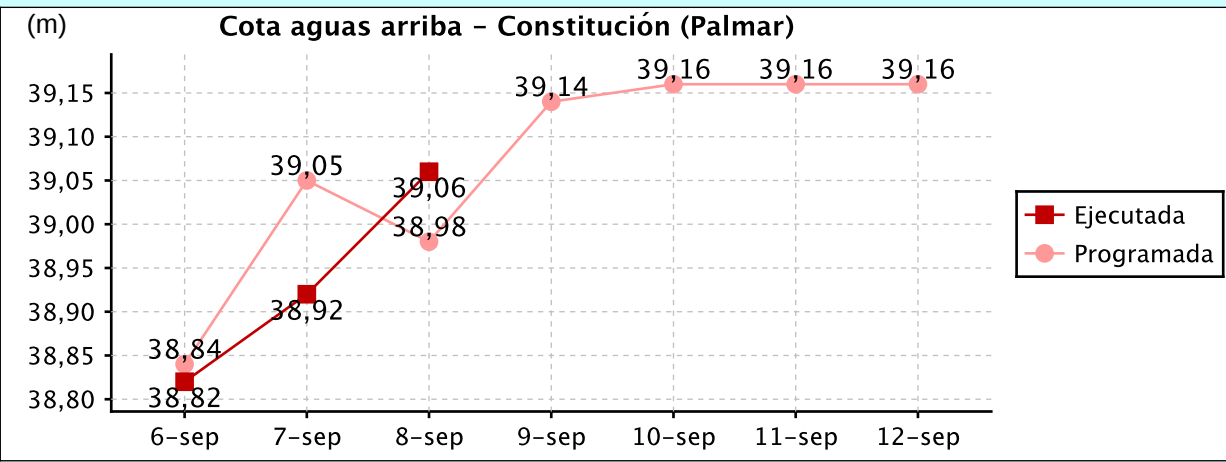
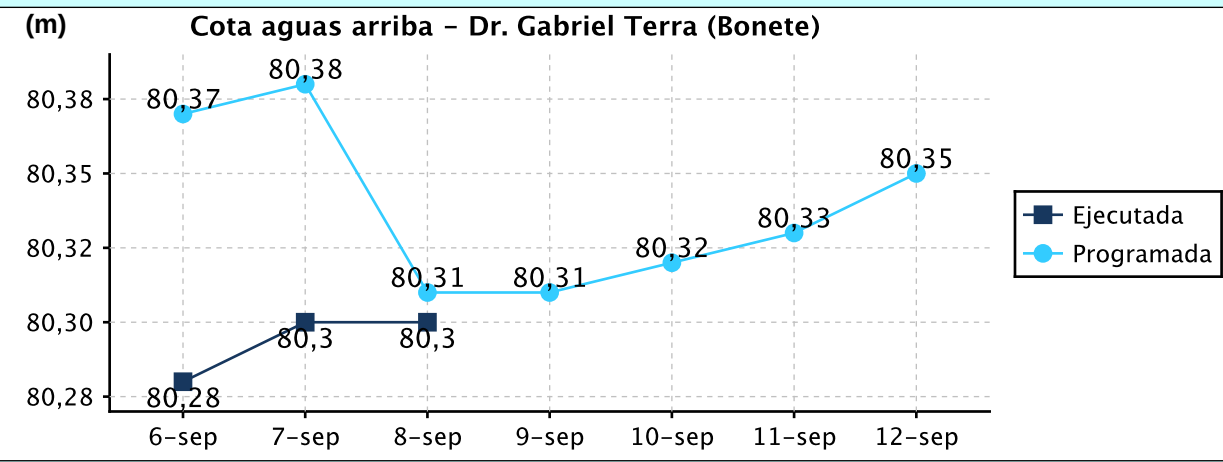


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,31	80,3
Baygorria	53,66	53,68
Palmar	38,98	39,06
SGU	34,55	34,7

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

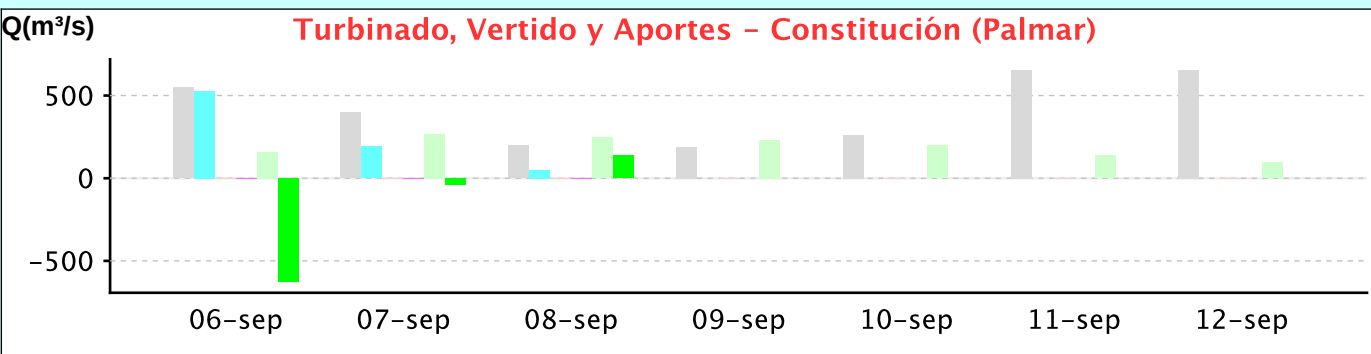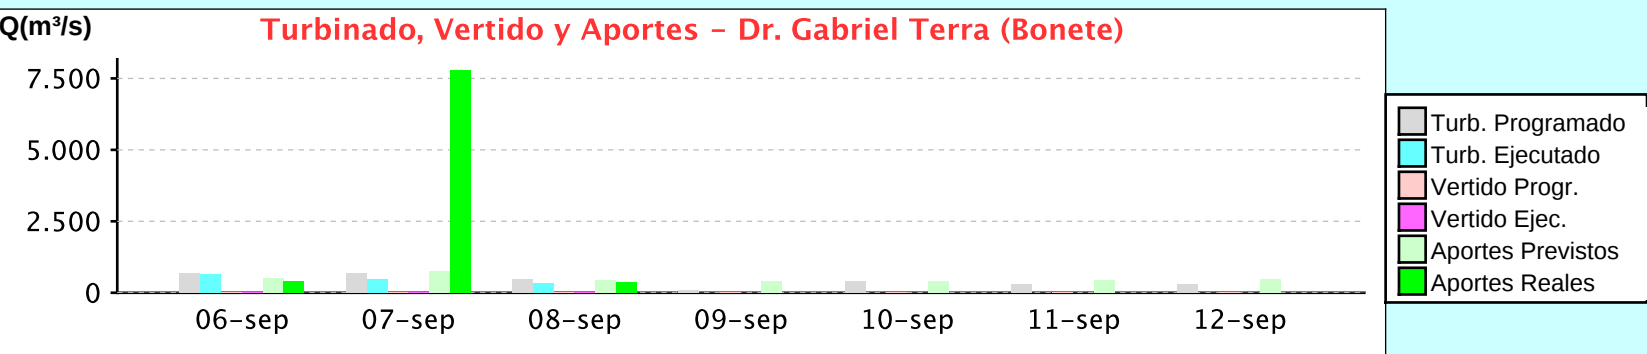

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

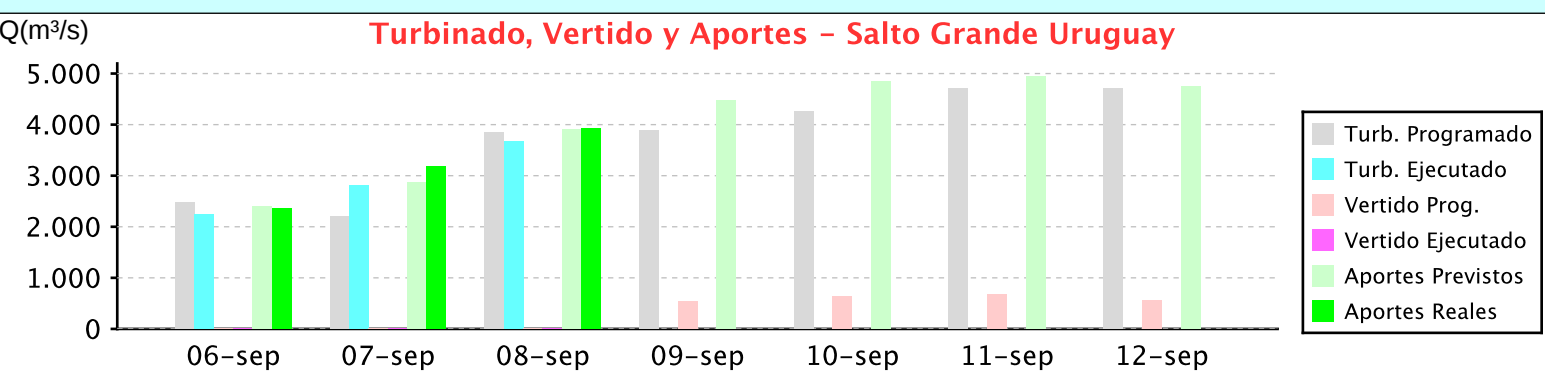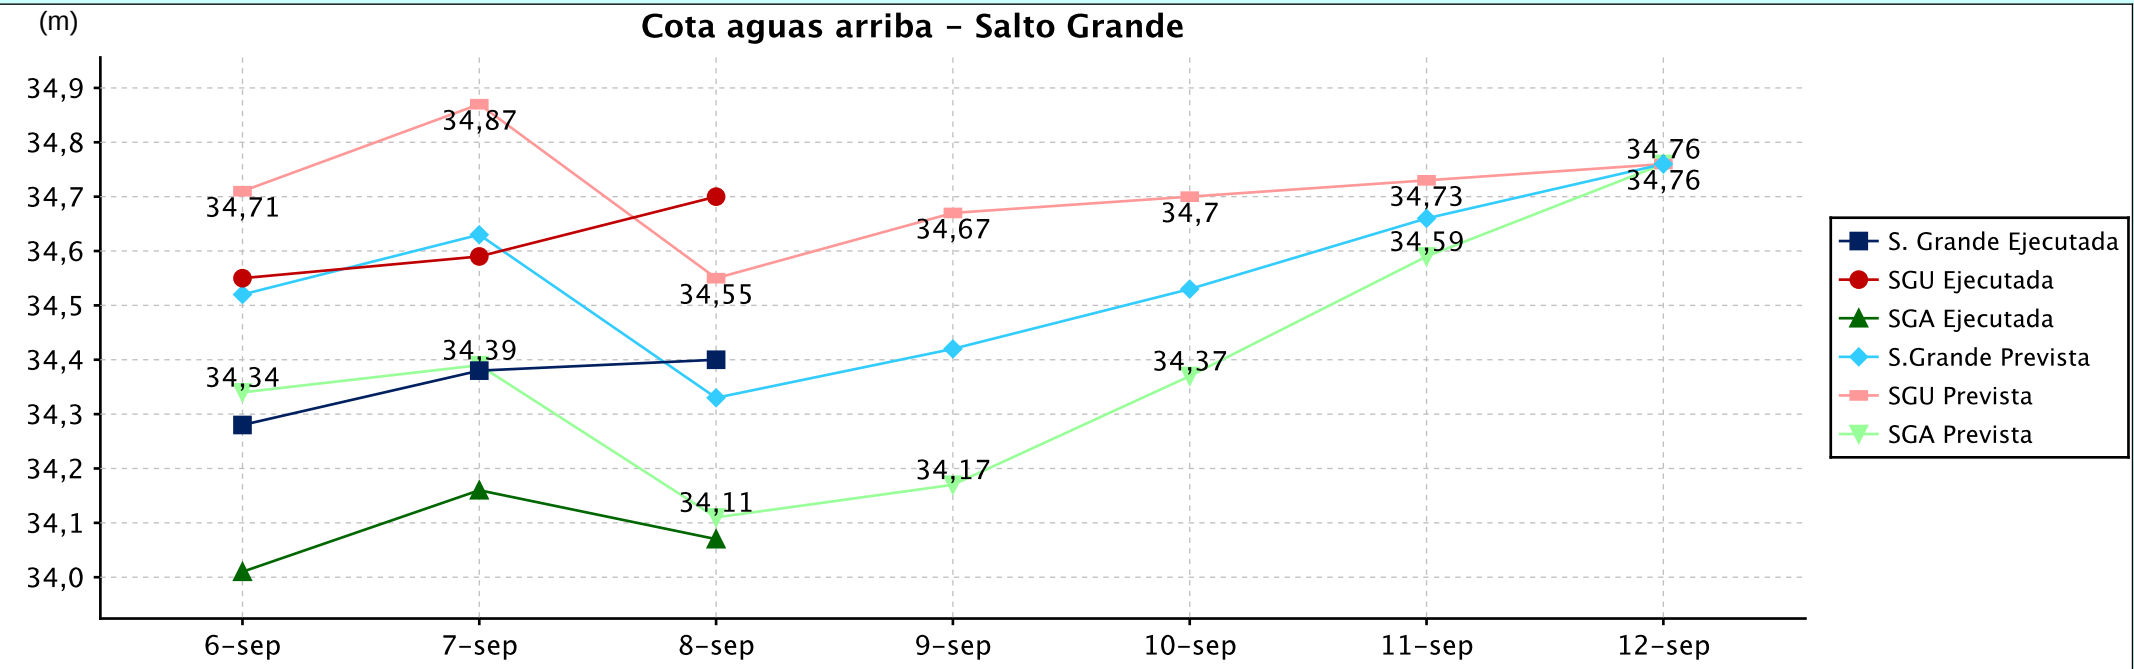

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,70
Cota Vista Arg	34,07
Cota real	34,40

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.782
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	457	332
Baygorria	497	370
Palmar	199	50
SGU	3.842	3.674

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	439	377
Baygorria	25	103
Palmar	245	138
SGU	3.900	3.922

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
