



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 10 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.046
C. Baygorria	421
C. Palmar	3.585
C. Salto Grande	20.661
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.134
TOTAL Generación	29.752

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	631
Hidráulica	631
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	631




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.121
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.750
Diferencia (MWh)	-629
Ejecutada - Programada	-2,11 %

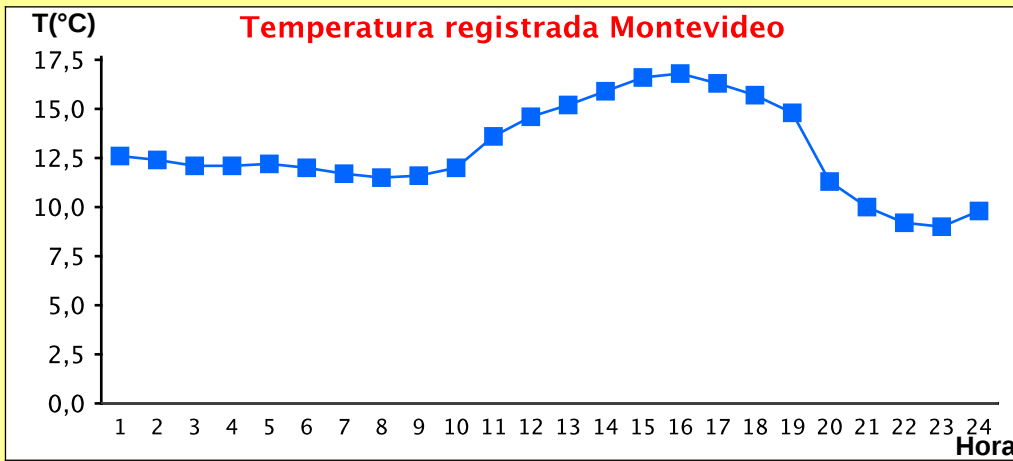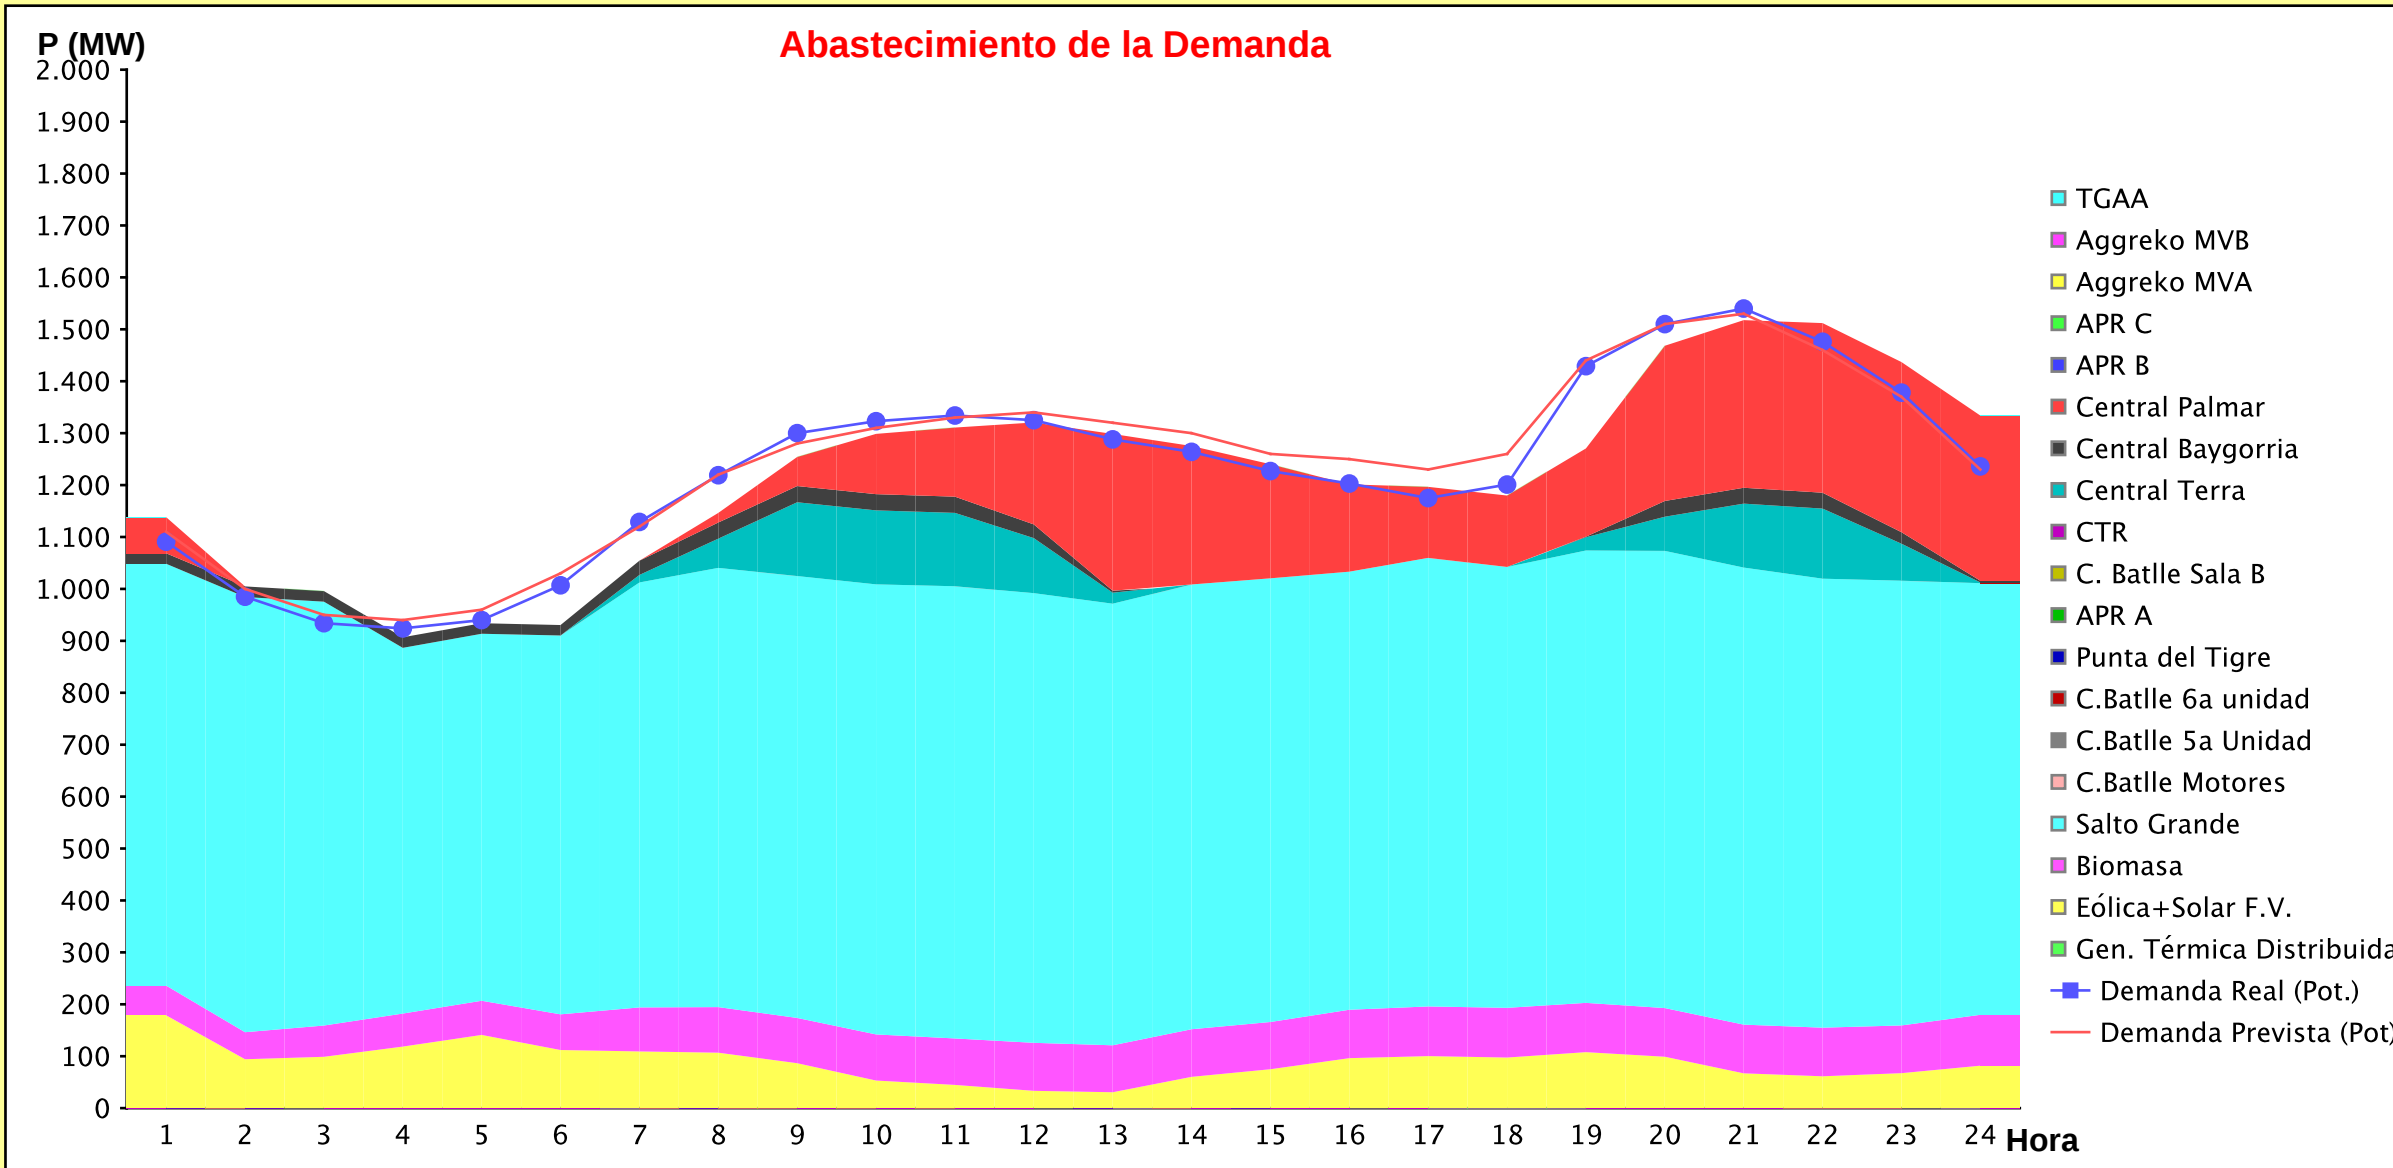



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1355,33 Hora 11:32
Potencia mínima:	909,77 Hora 03:33
Pico noche:	1546,23 Hora 21:01

Generación Media (MW)	
Eólica	88,8
Biomasa	84,7
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

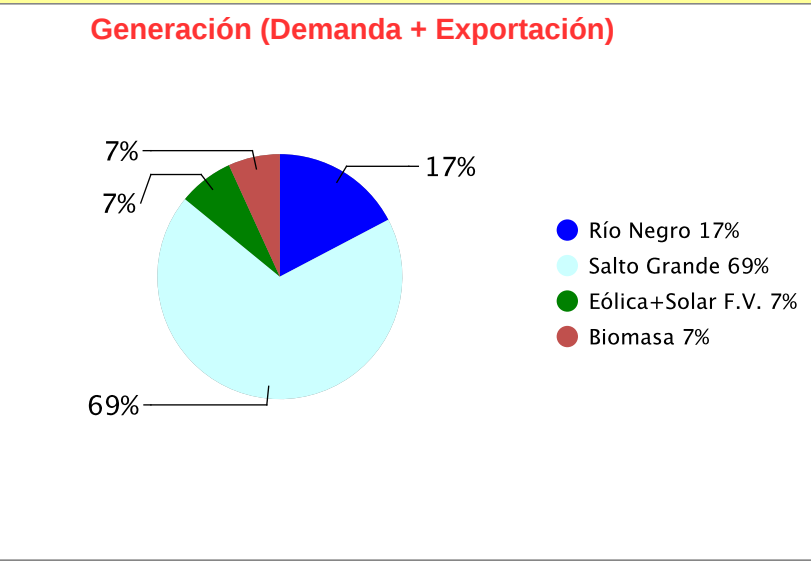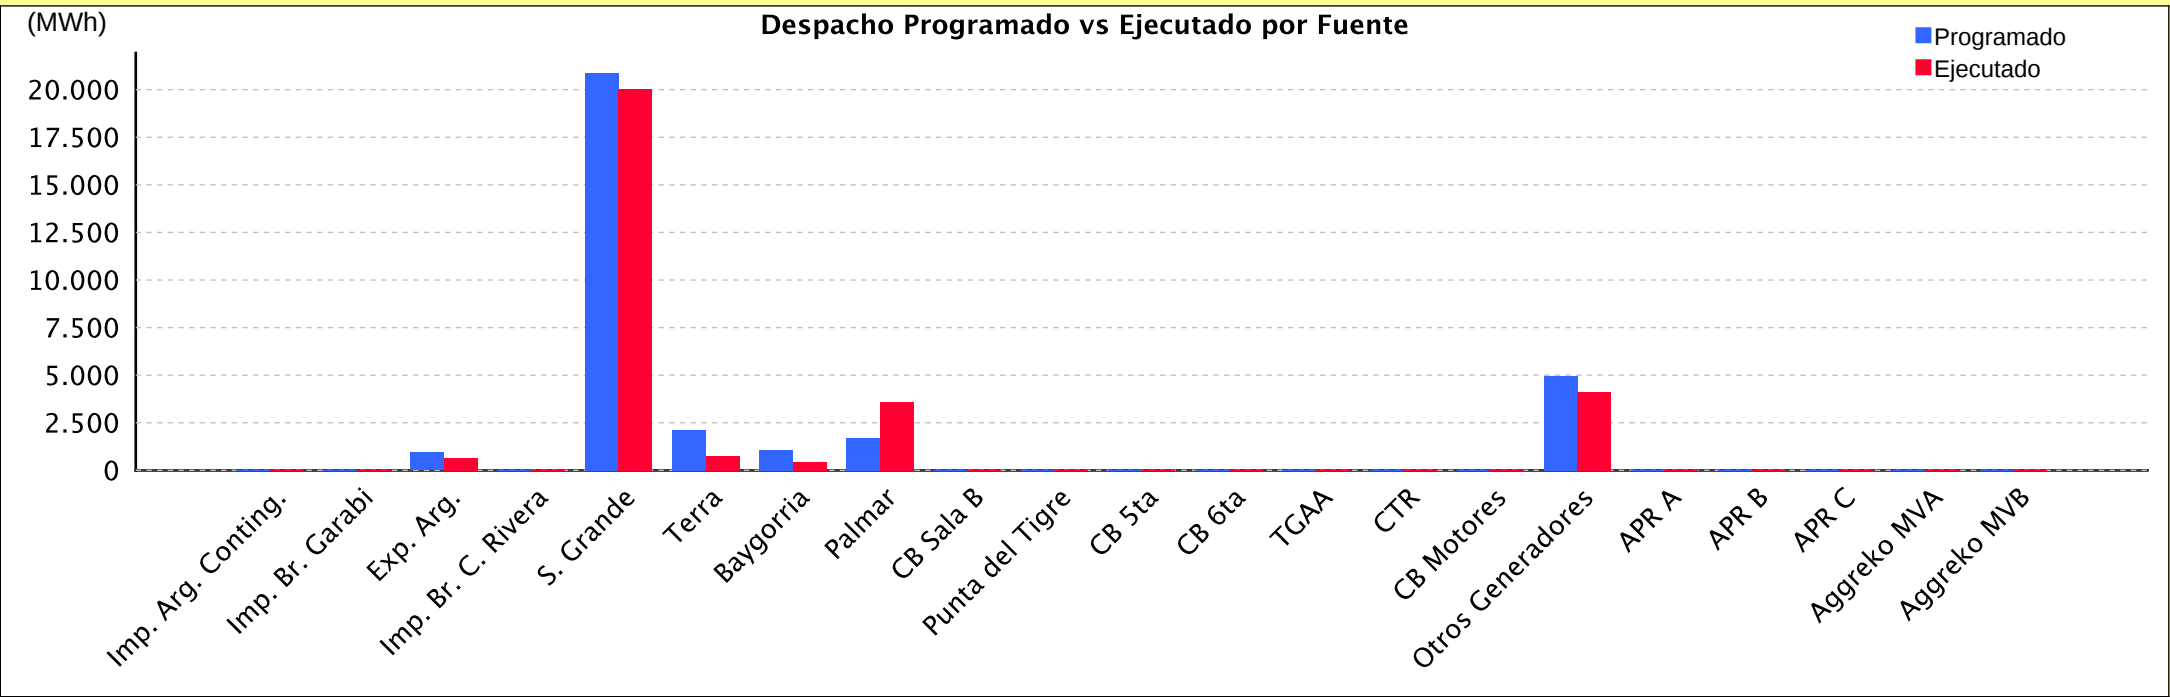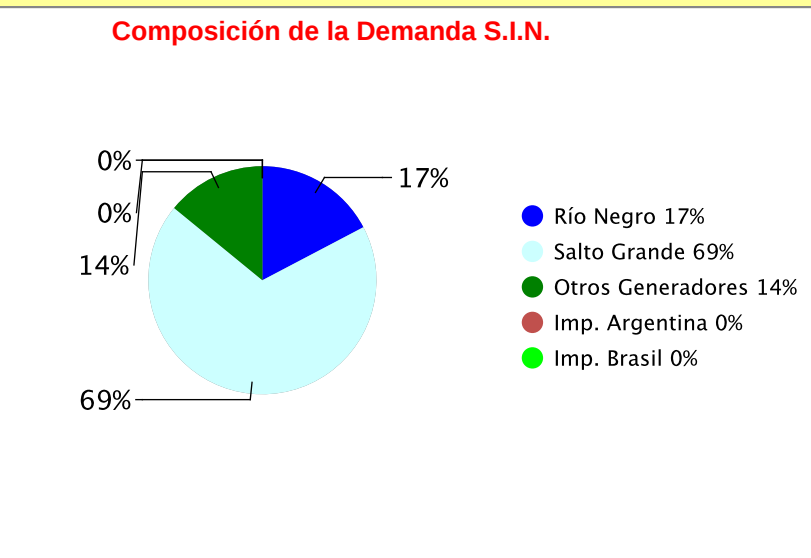



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

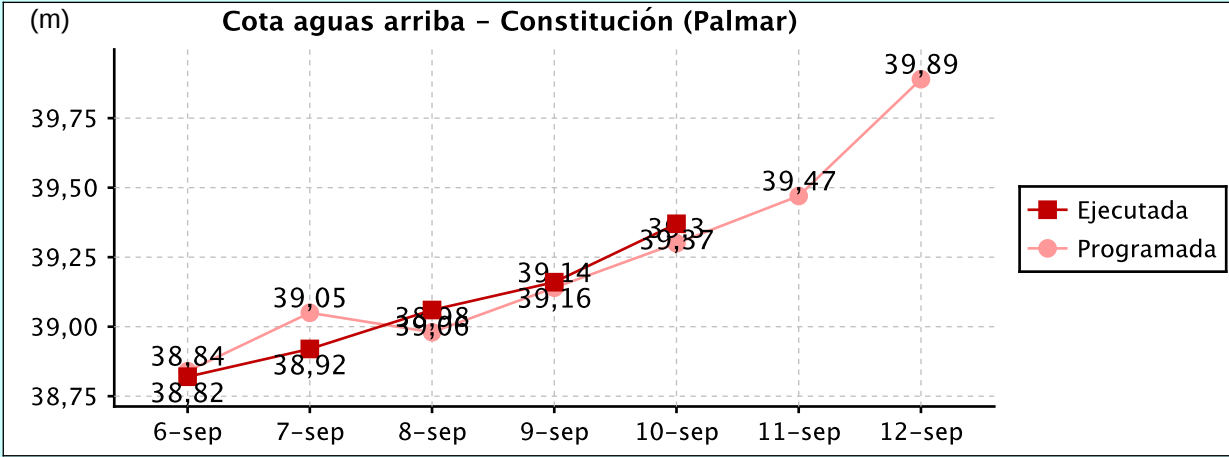
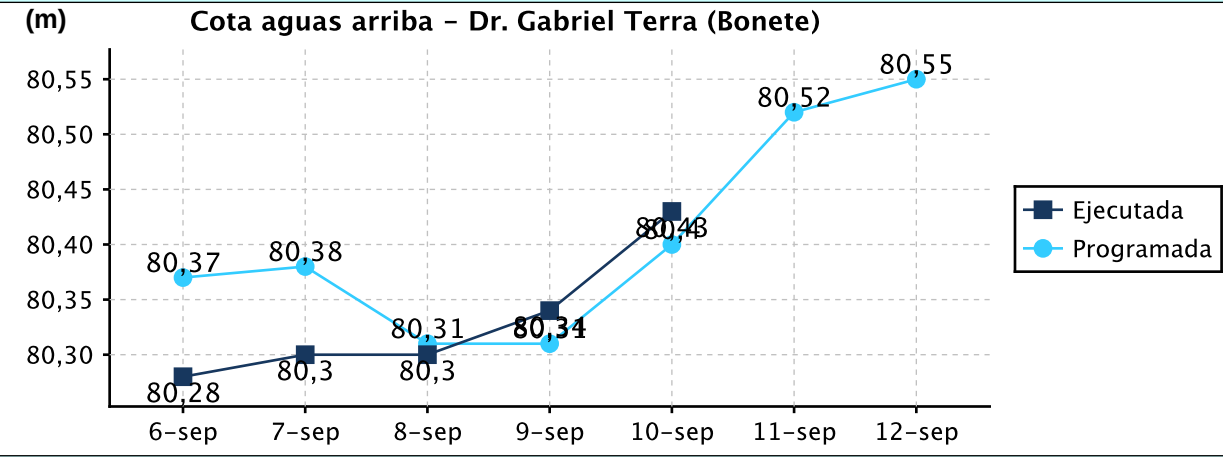


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,40	80,43
Baygorria	53,81	53,8
Palmar	39,30	39,37
SGU	35,19	35,21

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

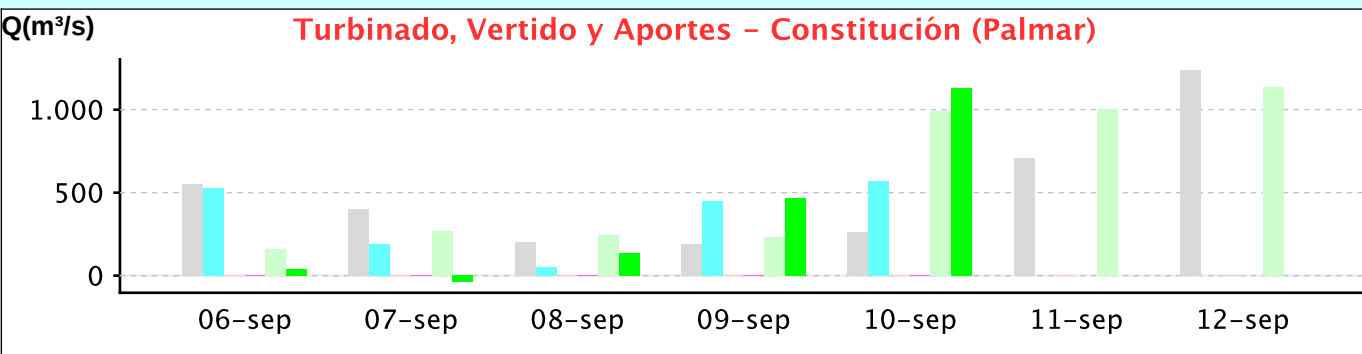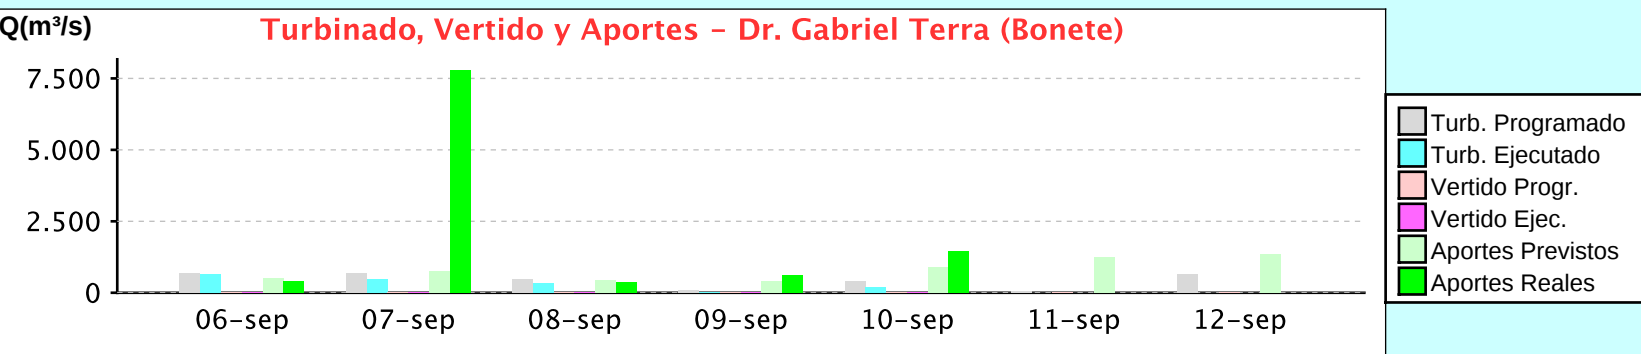

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

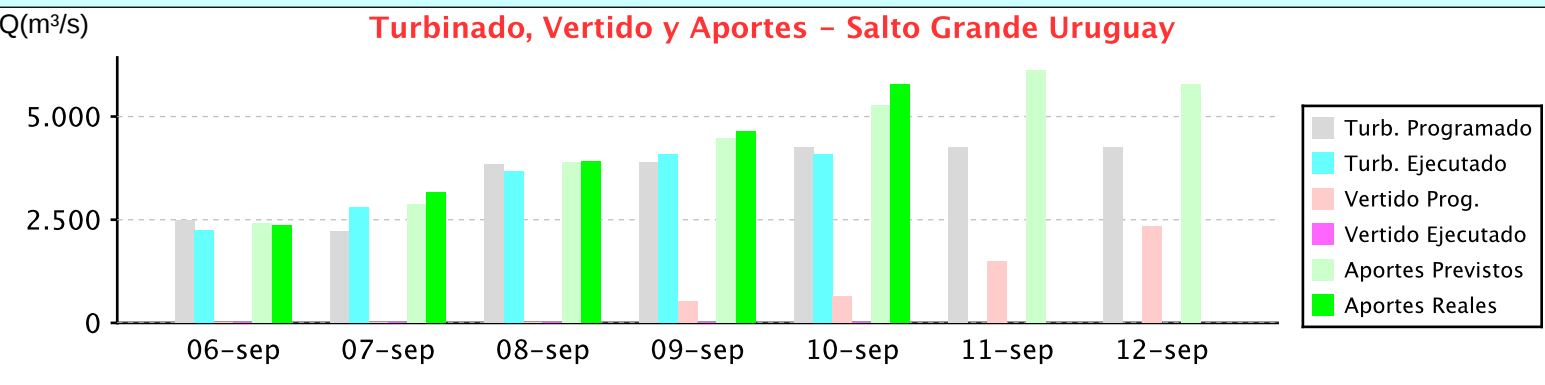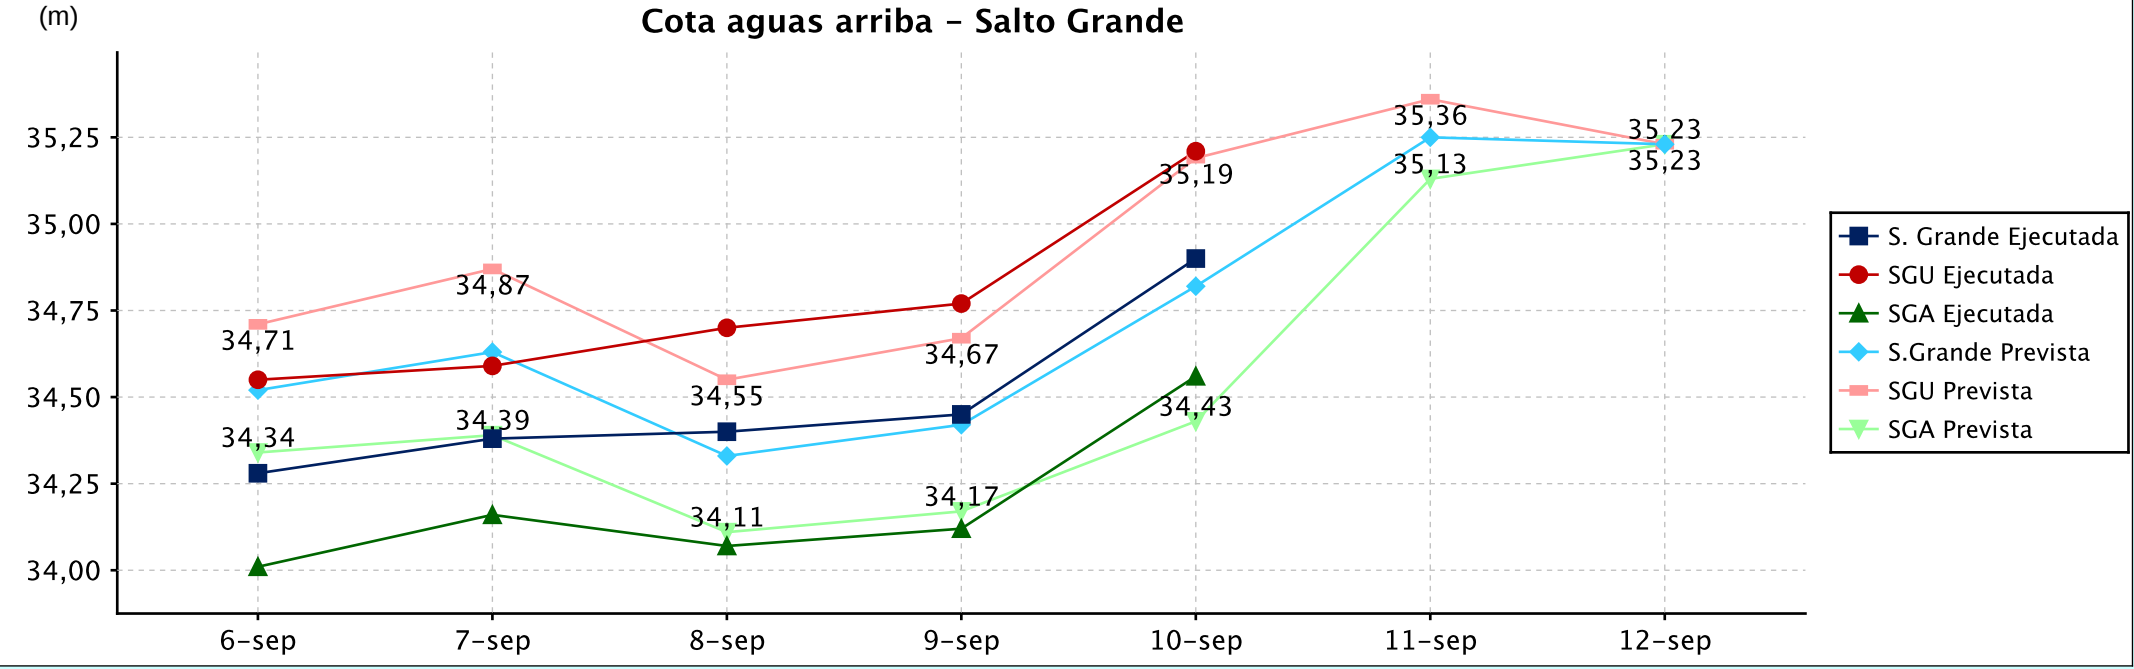

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,21
Cota Vista Arg	34,56
Cota real	34,90
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	14.999

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	386	198
Baygorria	360	140
Palmar	262	570
SGU	4.263	4.091

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	883	1.459
Baygorria	279	274
Palmar	989	1.131
SGU	5.275	5.778

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	635	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
