



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 14 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.276
C. Baygorria	1.967
C. Palmar	7.838
C. Salto Grande	21.168
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.839
TOTAL Generación	38.981

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.039
Hidráulica	13.039
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.039


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.942
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.380
Diferencia (MWh)	1.562
Ejecutada - Programada	6,41 %

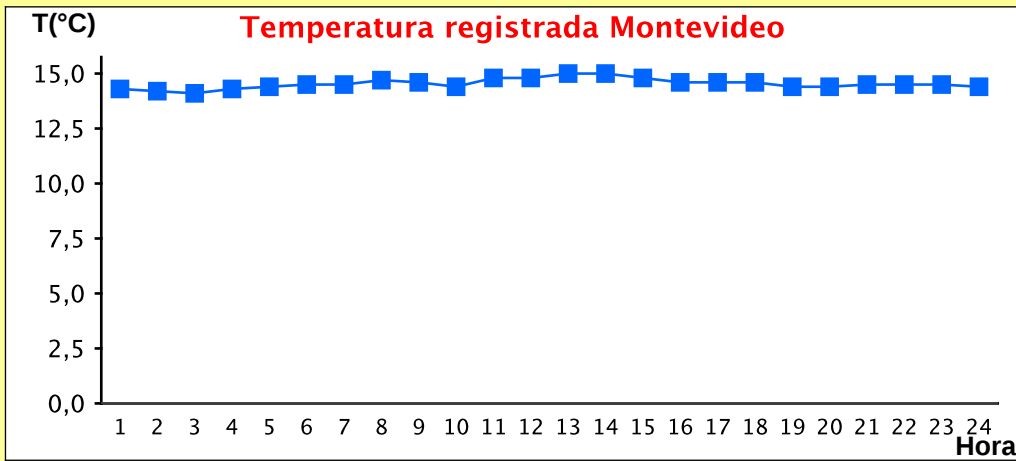
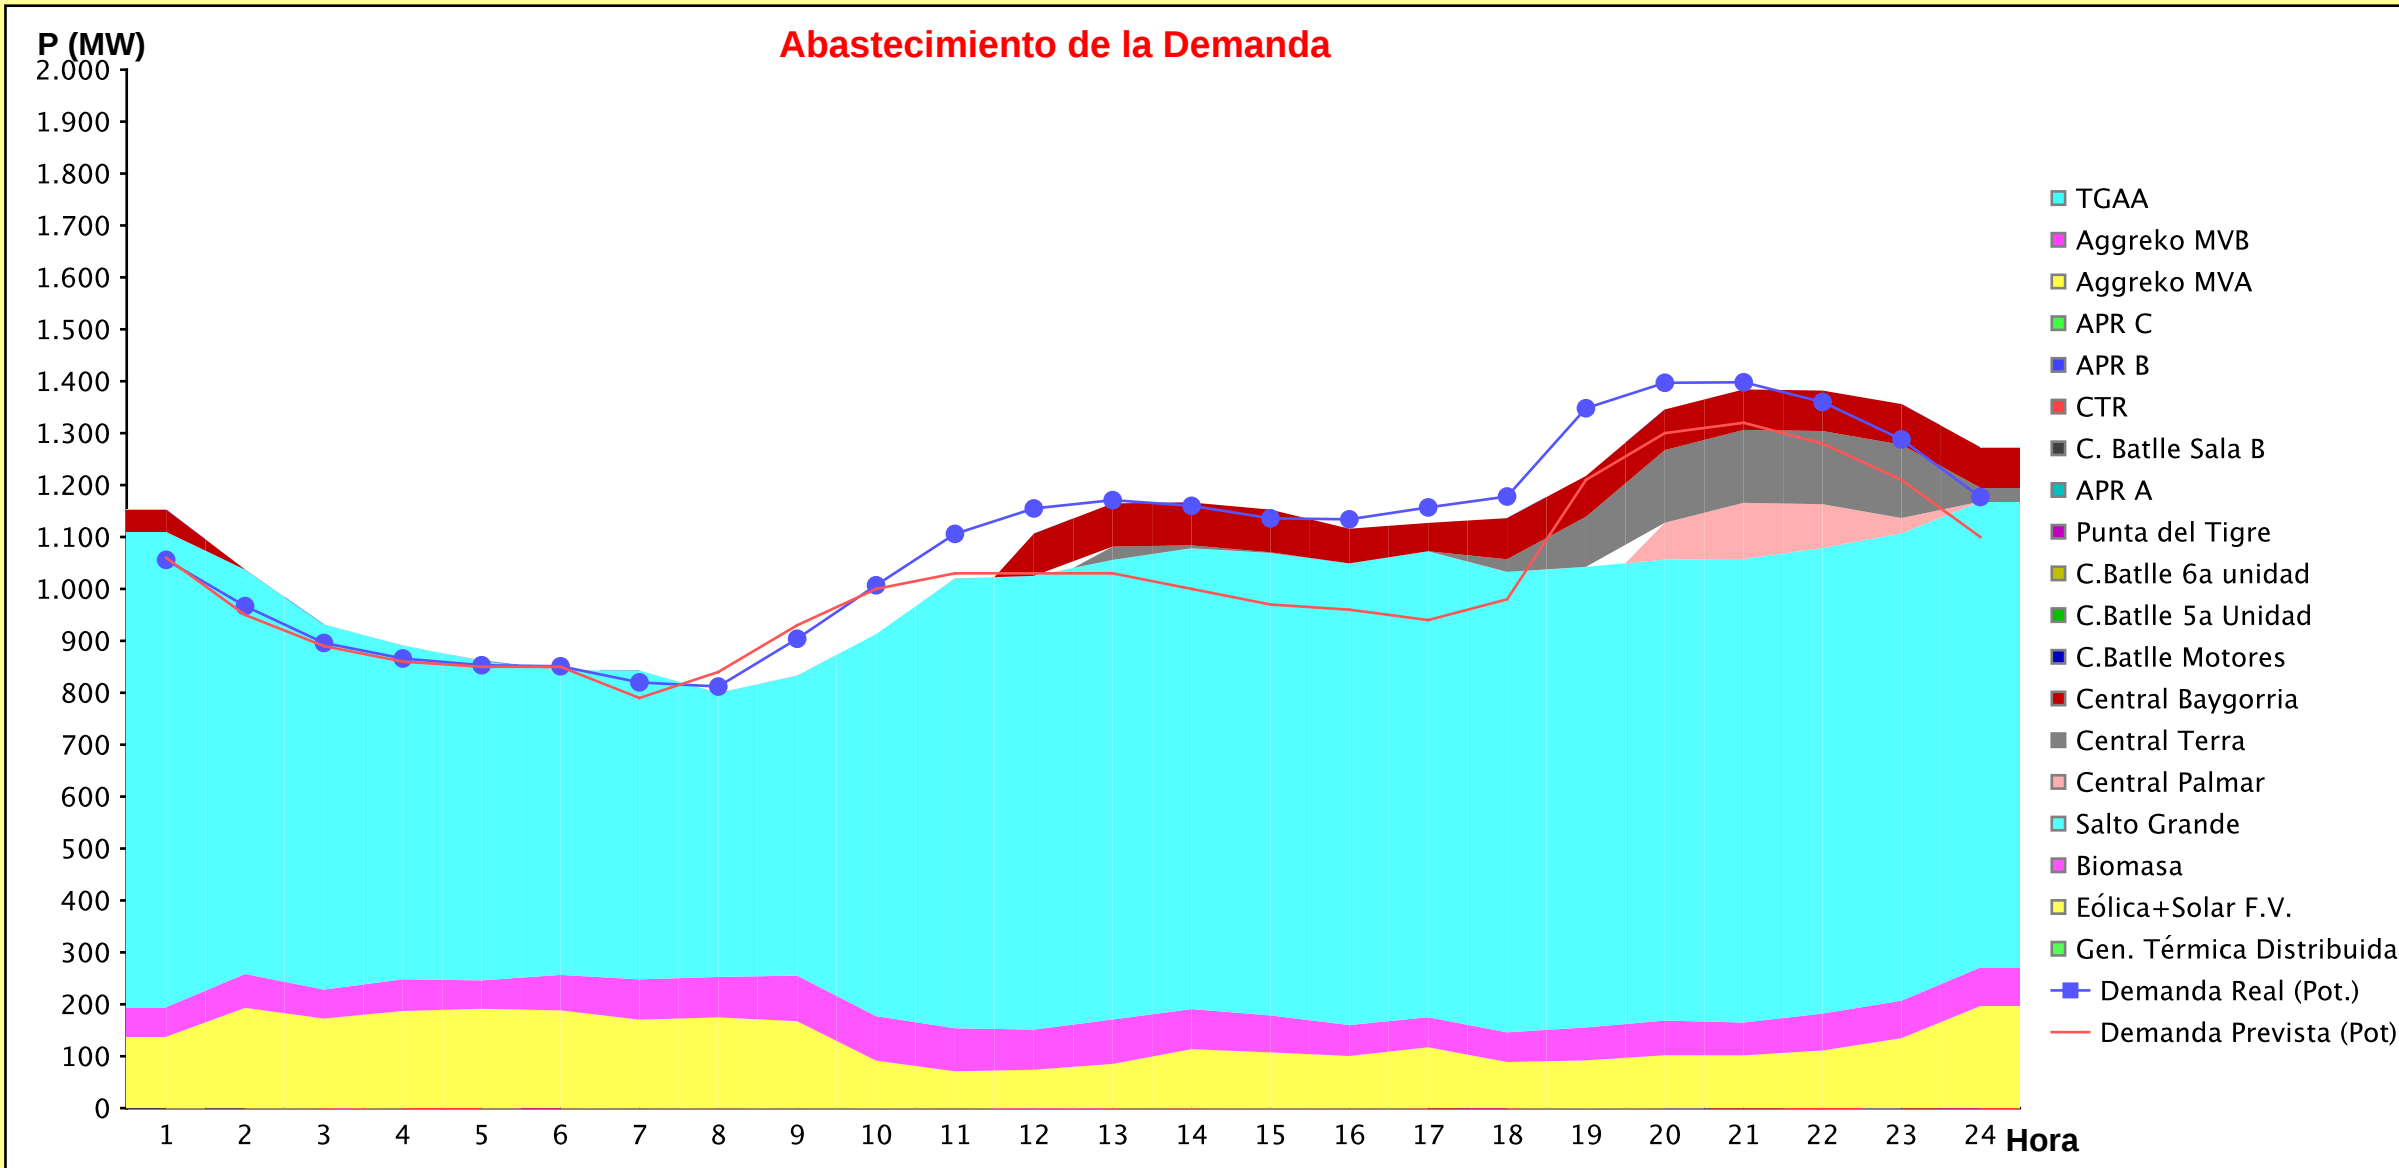


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1186,65 Hora 13:06
Potencia mínima:	794,06 Hora 07:28
Pico noche:	1409,85 Hora 20:16

Generación Media (MW)	
Eólica	132,4
Biomasa	70,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


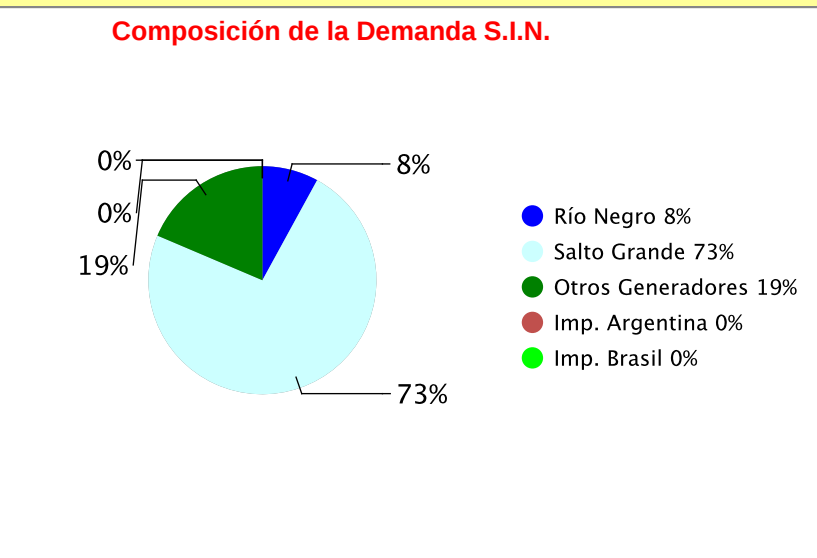


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

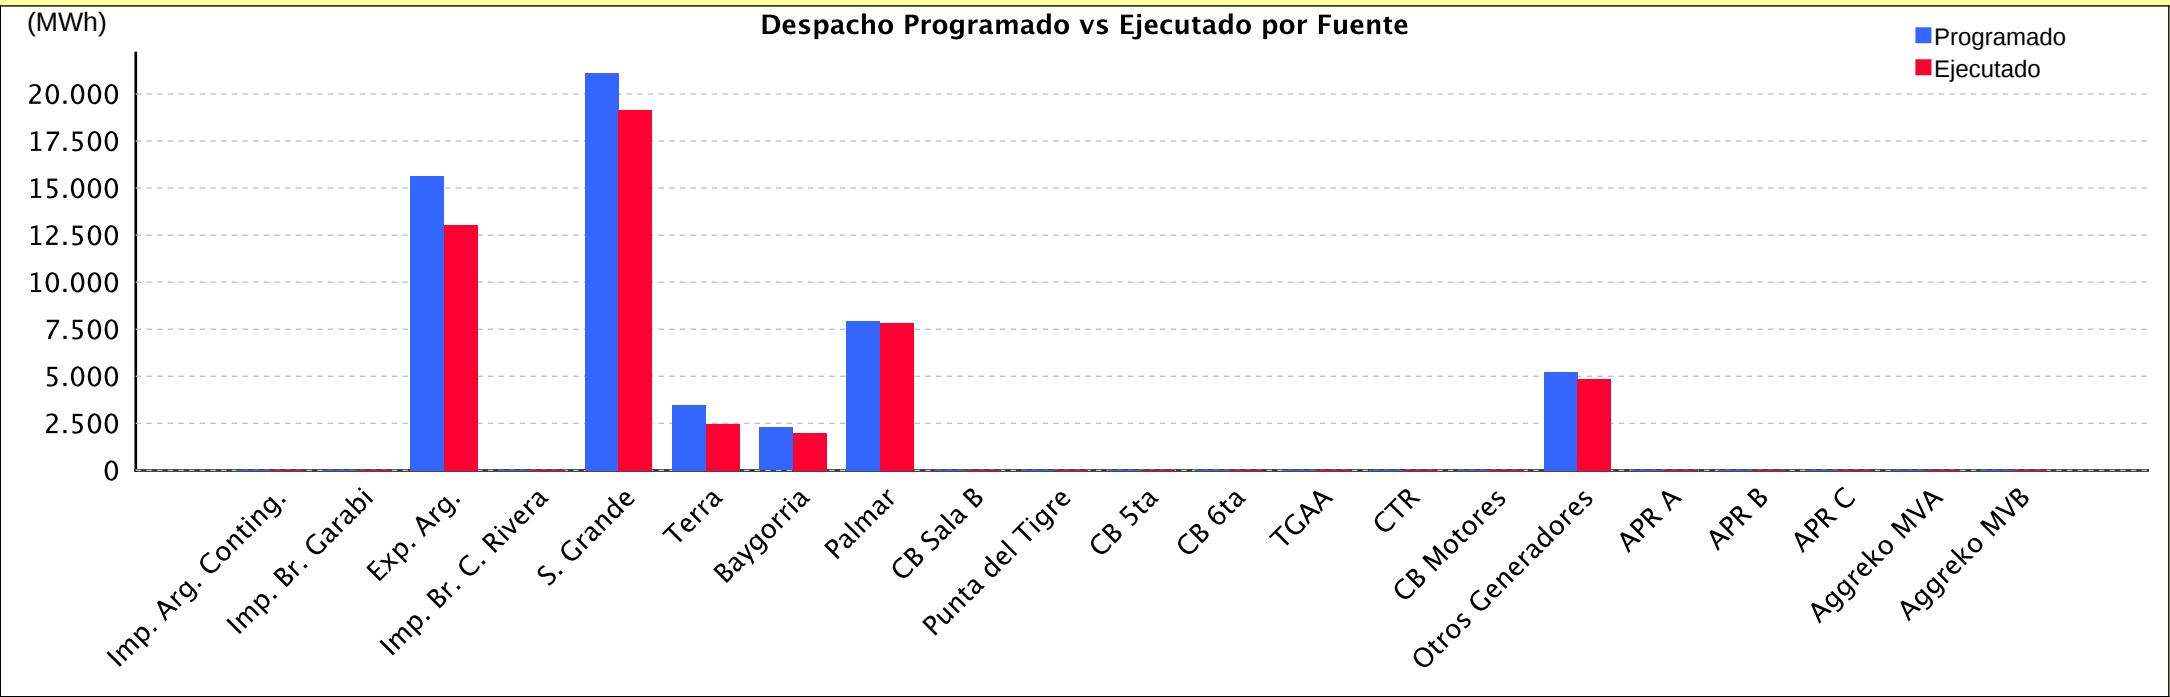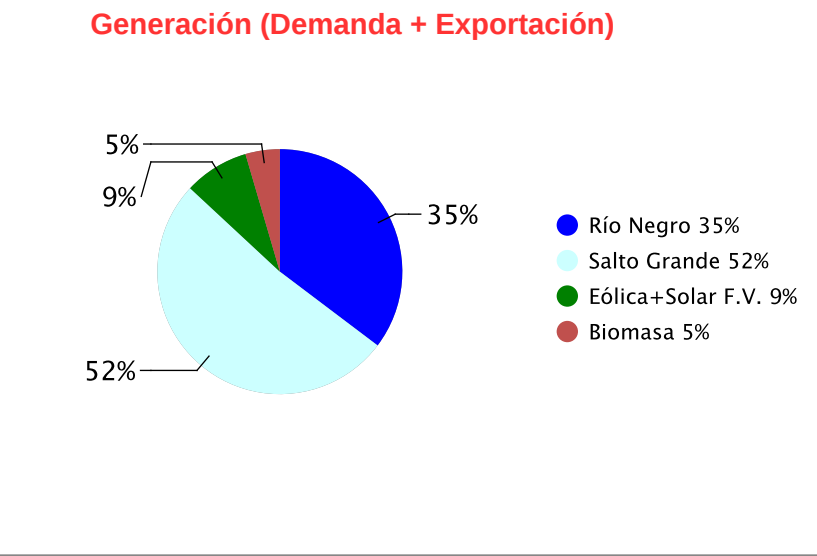



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

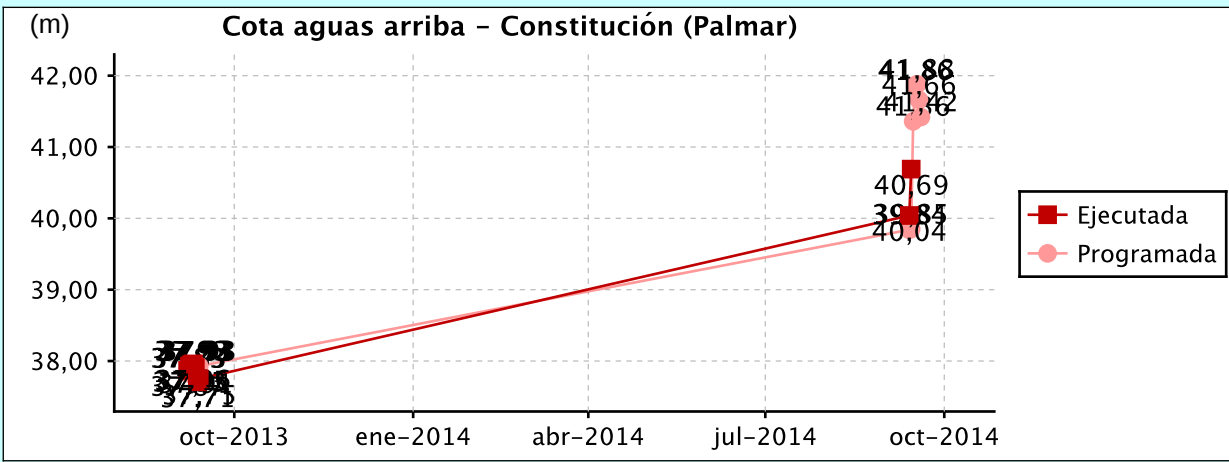
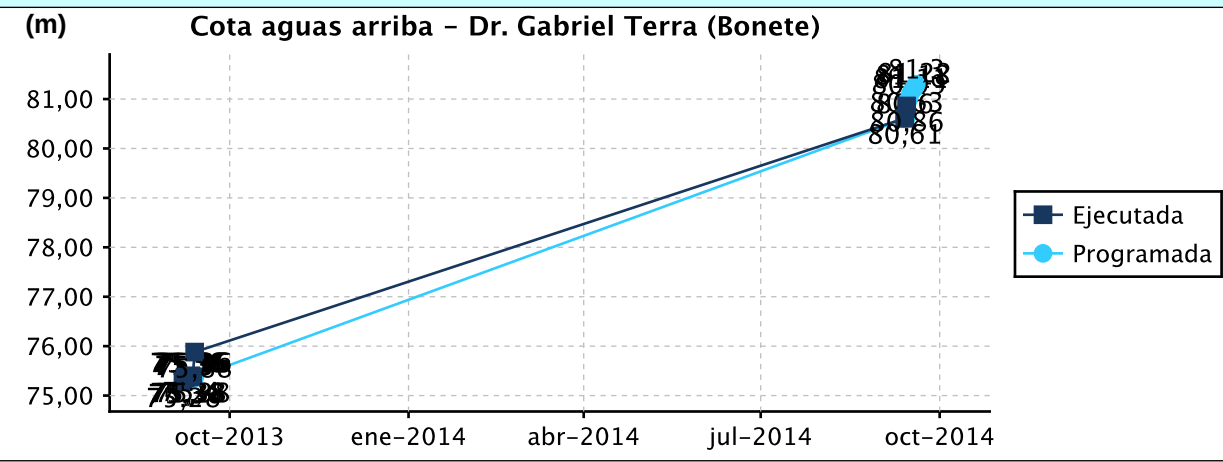


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,63	80,86
Baygorria	53,75	54,22
Palmar	39,85	40,69
SGU	35,61	35,44

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

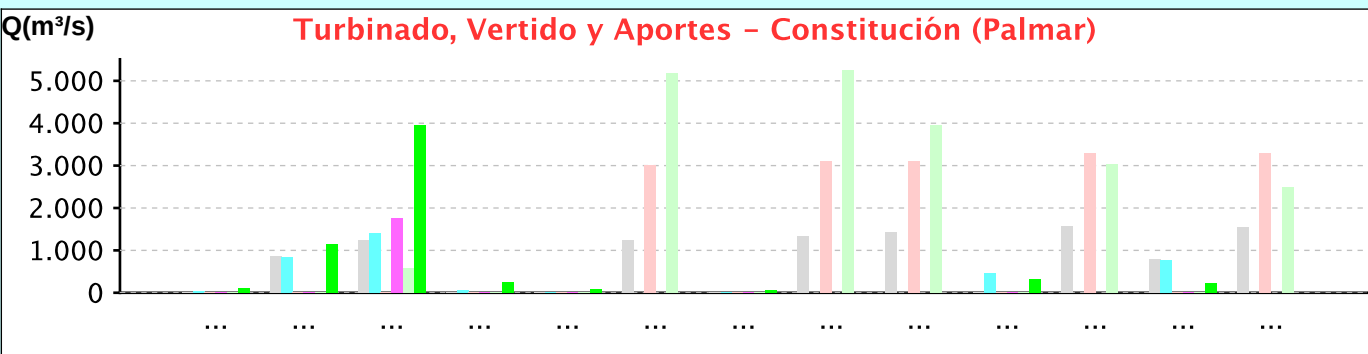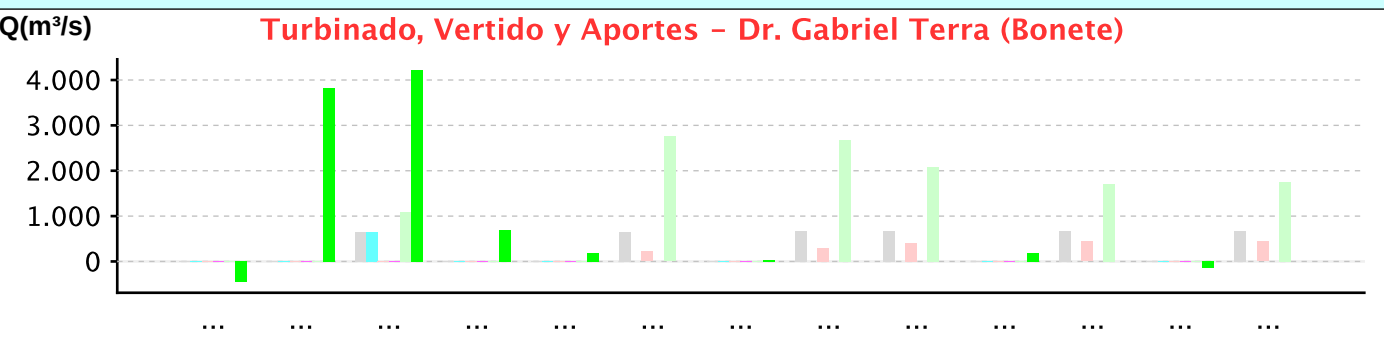

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

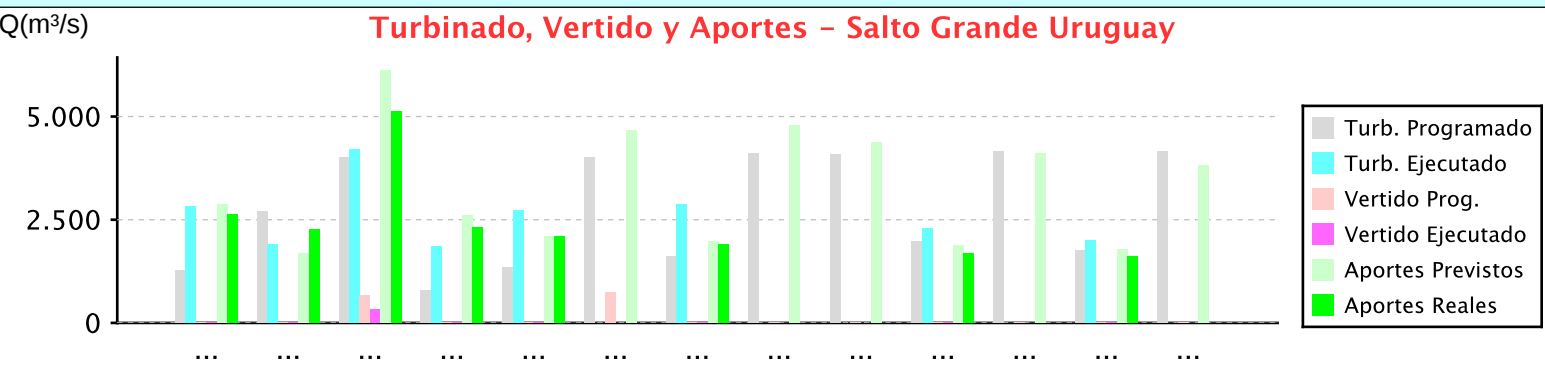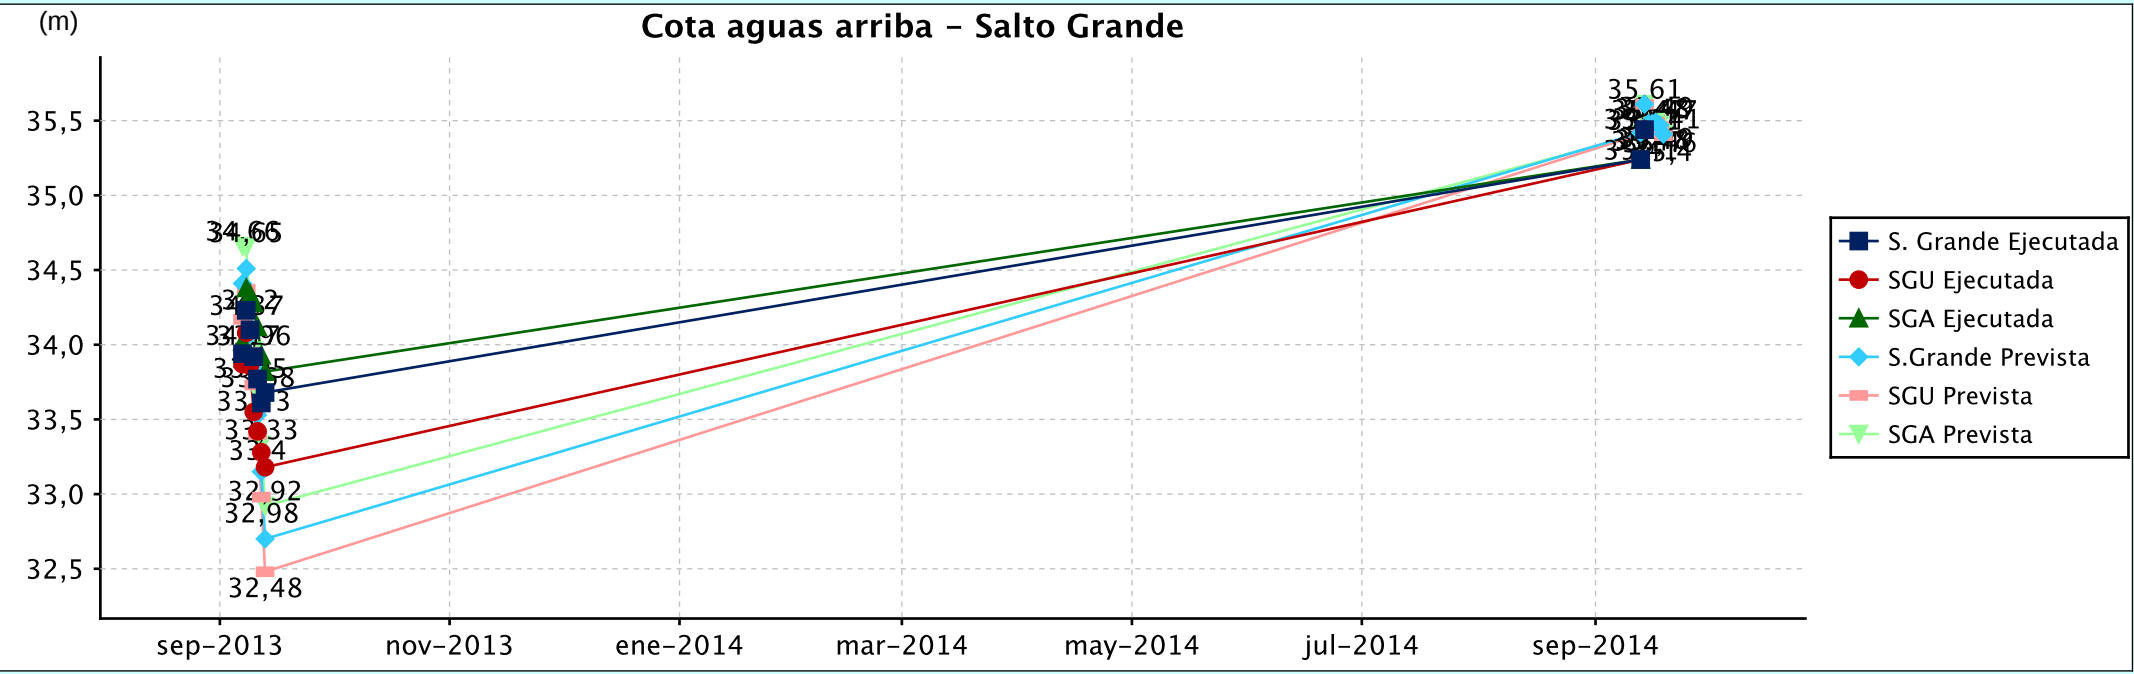

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,44
Cota Vista Arg	35,44
Cota real	35,44
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	641	646
Baygorria	778	780
Palmar	1.243	1.410
SGU	4.016	4.204

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.099	4.223
Baygorria	0	1.375
Palmar	567	3.953
SGU	6.125	5.114

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	725
Palmar	0	1.747
SGU	677	320

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 543 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Por problemas técnicos no es posible mostrar los valores de cotas de las centrales hidroeléctricas.
Se solucionará a la brevedad.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

19/09/2014 16:01
