



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 16 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-39
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.417
C. Baygorria	1.276
C. Palmar	7.757
C. Salto Grande	22.127
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.459
TOTAL Generación	36.978

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.055
Hidráulica	8.055
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.055



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.923
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.615
Diferencia (MWh)	-692
Ejecutada - Programada	-2,34 %

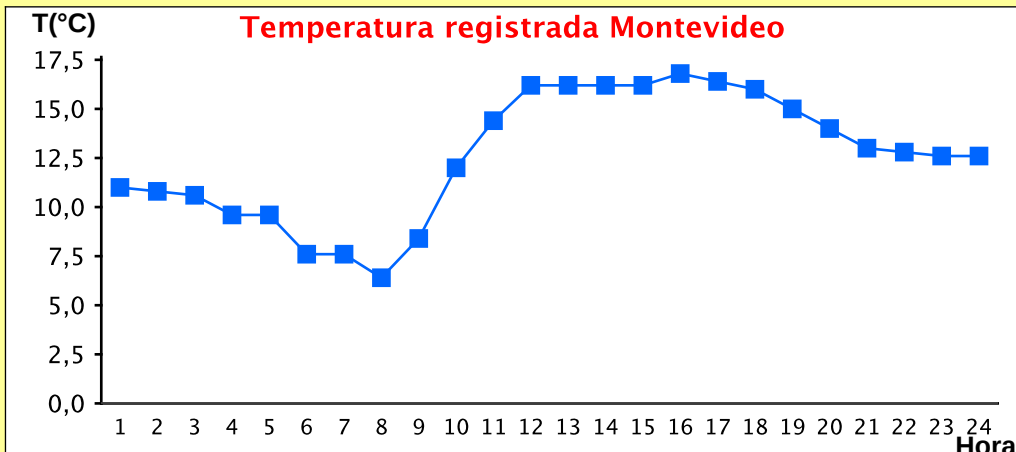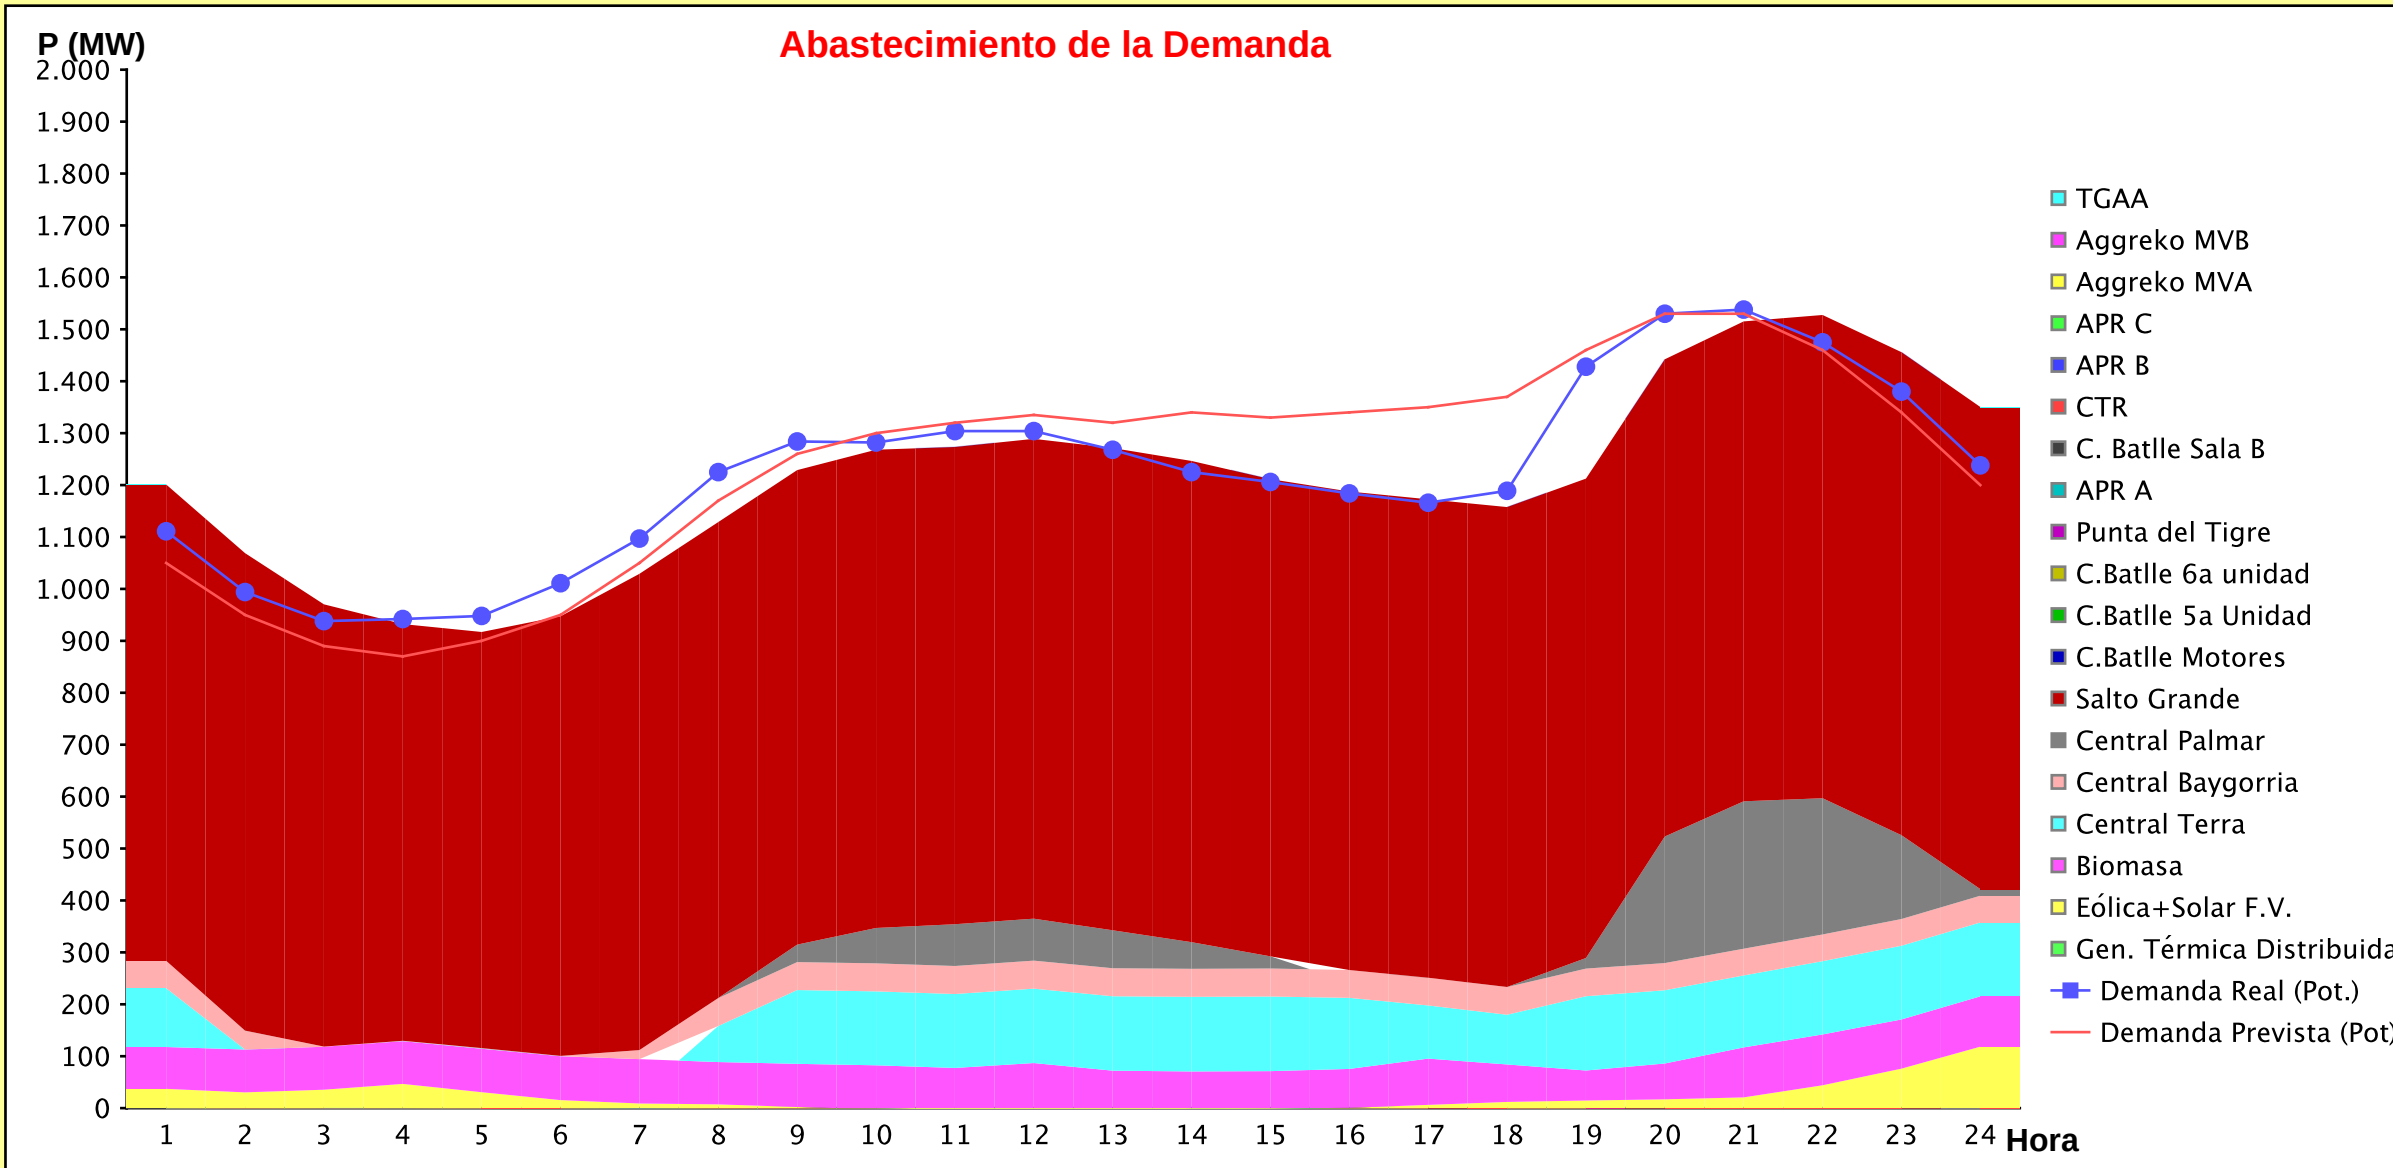


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1319,25 Hora 11:49
Potencia mínima:	915,21 Hora 03:50
Pico noche:	1550,26 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	22,8
Biomasa	82,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

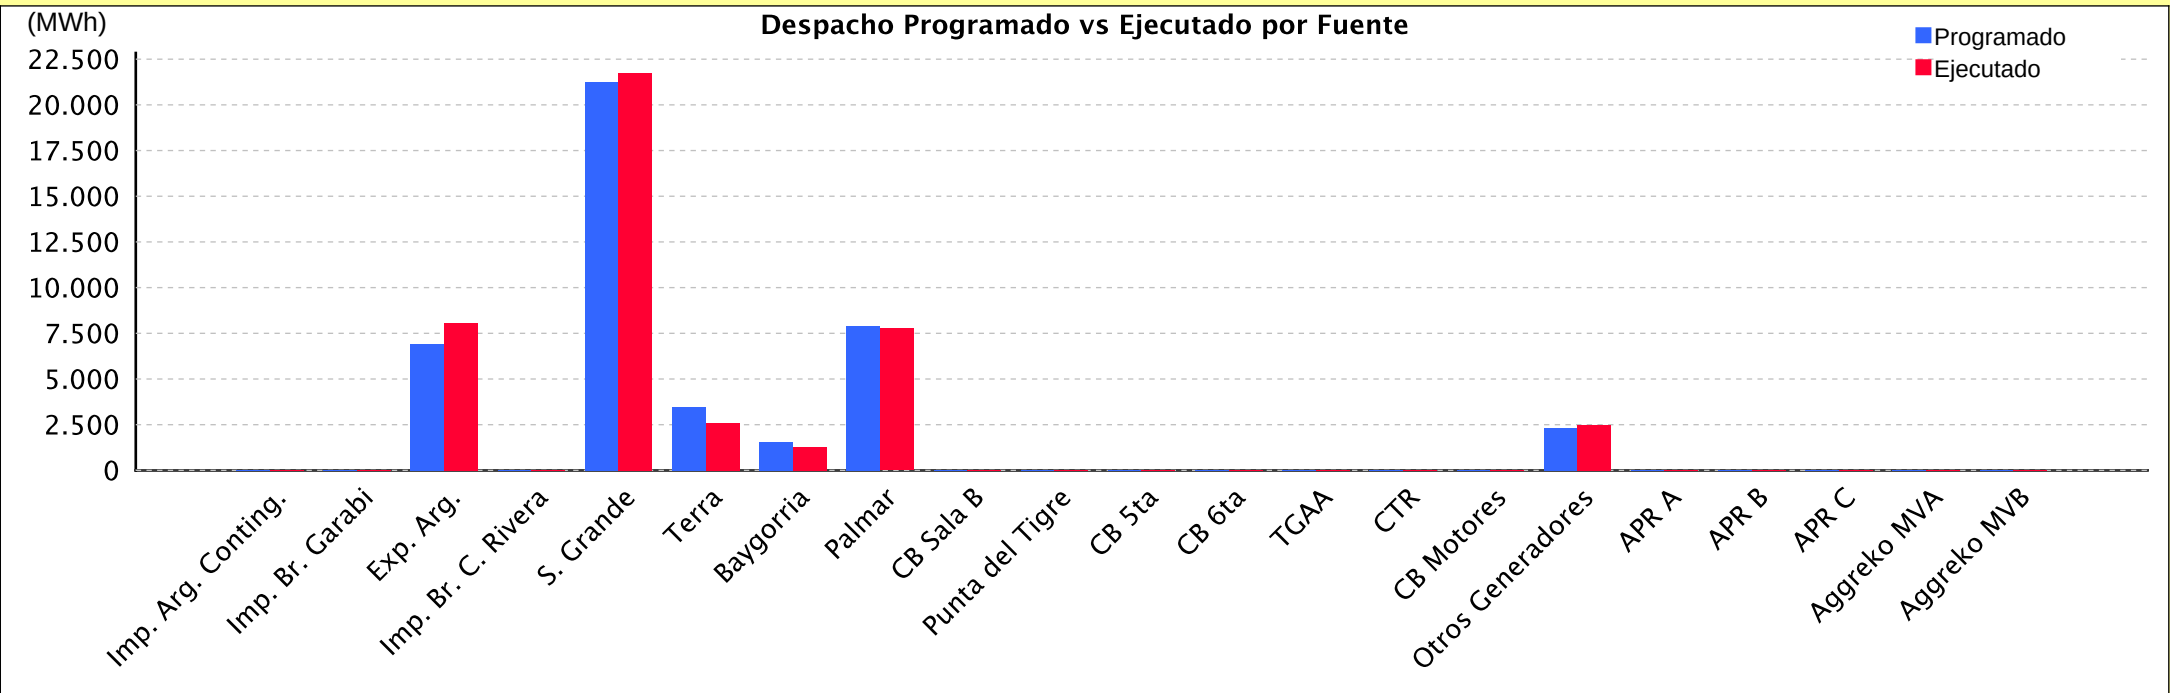
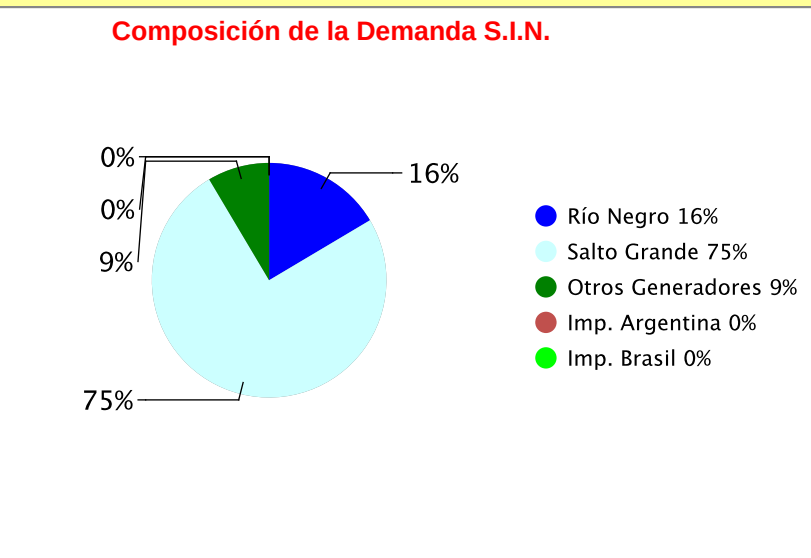


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

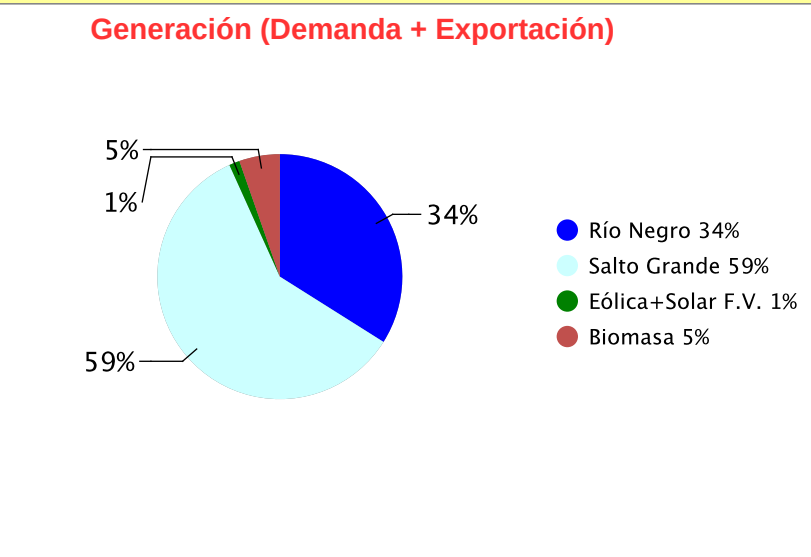



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

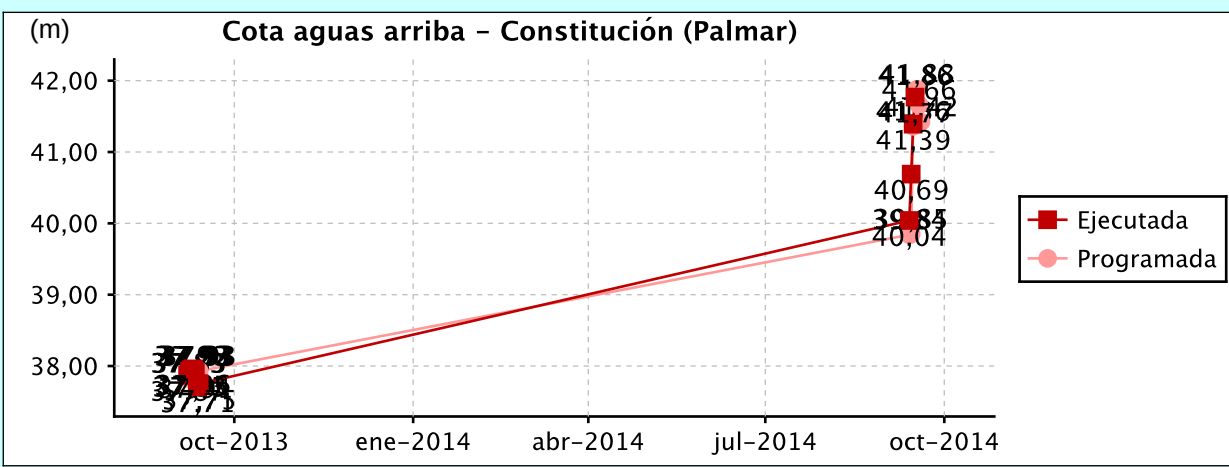
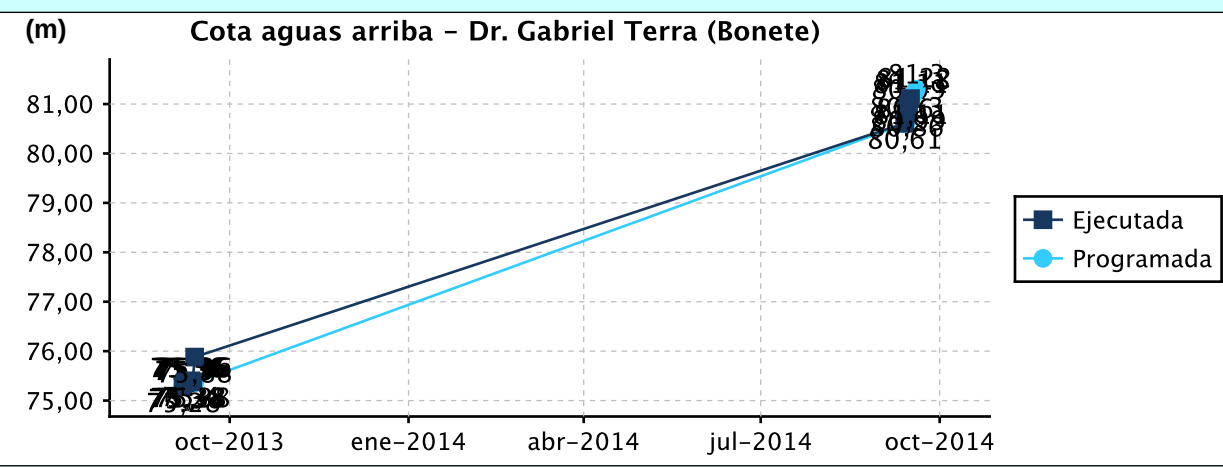


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,11	81,11
Baygorria	54,25	54,14
Palmar	41,86	41,77
SGU	35,48	35,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

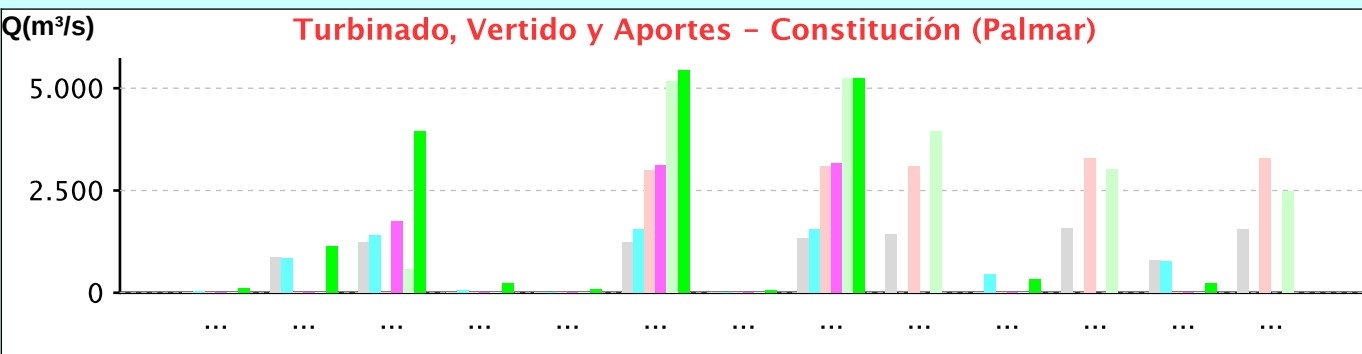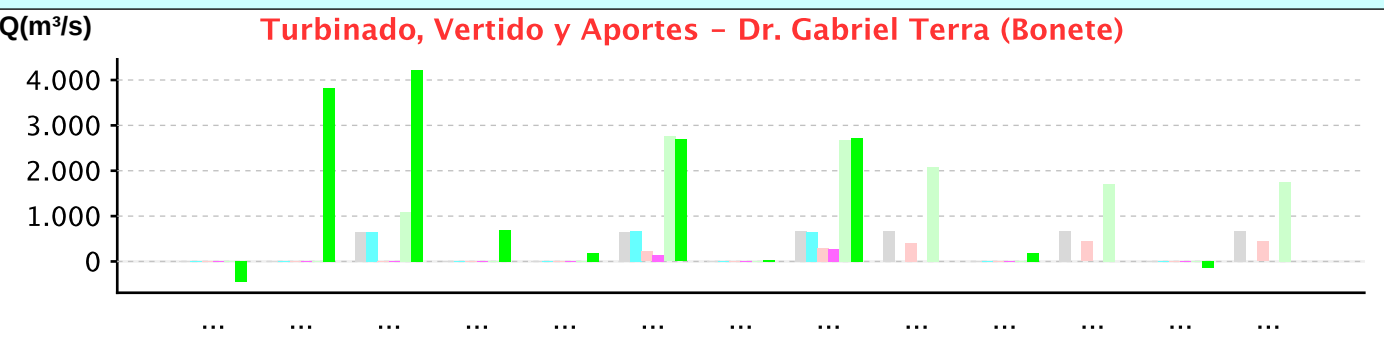

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

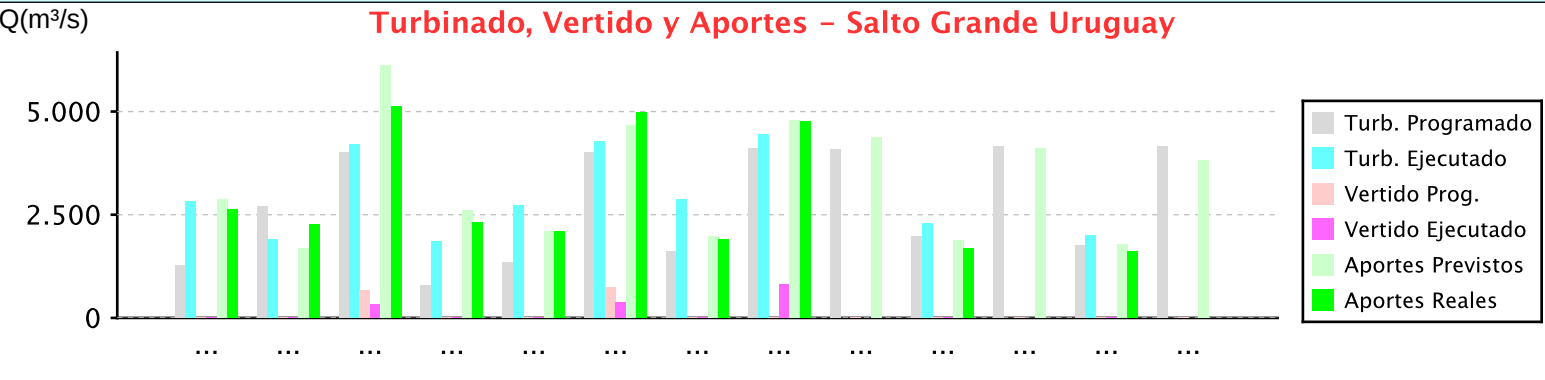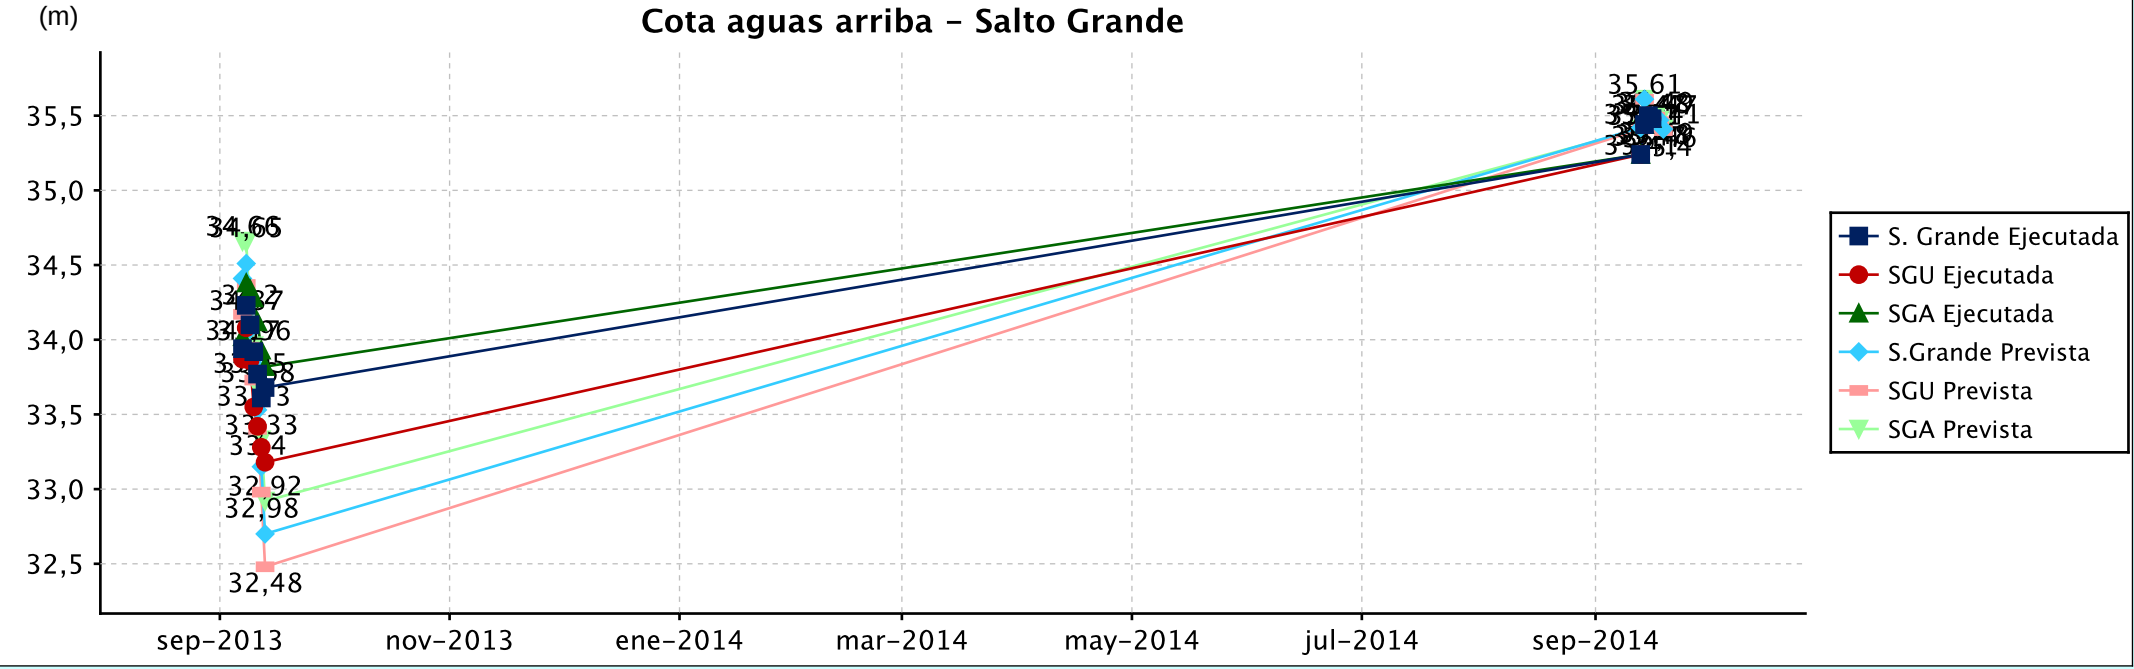

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,48
Cota Vista Arg	35,48
Cota real	35,48

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	676	654
Baygorria	598	512
Palmar	1.344	1.556
SGU	4.097	4.453

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.680	2.719
Baygorria	496	211
Palmar	5.245	5.242
SGU	4.775	4.753

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	300	270
Baygorria	600	545
Palmar	3.100	3.168
SGU	0	816

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 336 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Por problemas técnicos no es posible mostrar los valores de cotas de las centrales hidroeléctricas.
Se solucionará a la brevedad.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

19/09/2014 16:09
