




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 20 de septiembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.363
C. Baygorria	1.280
C. Palmar	7.810
C. Salto Grande	19.833
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.456
TOTAL Generación	38.683

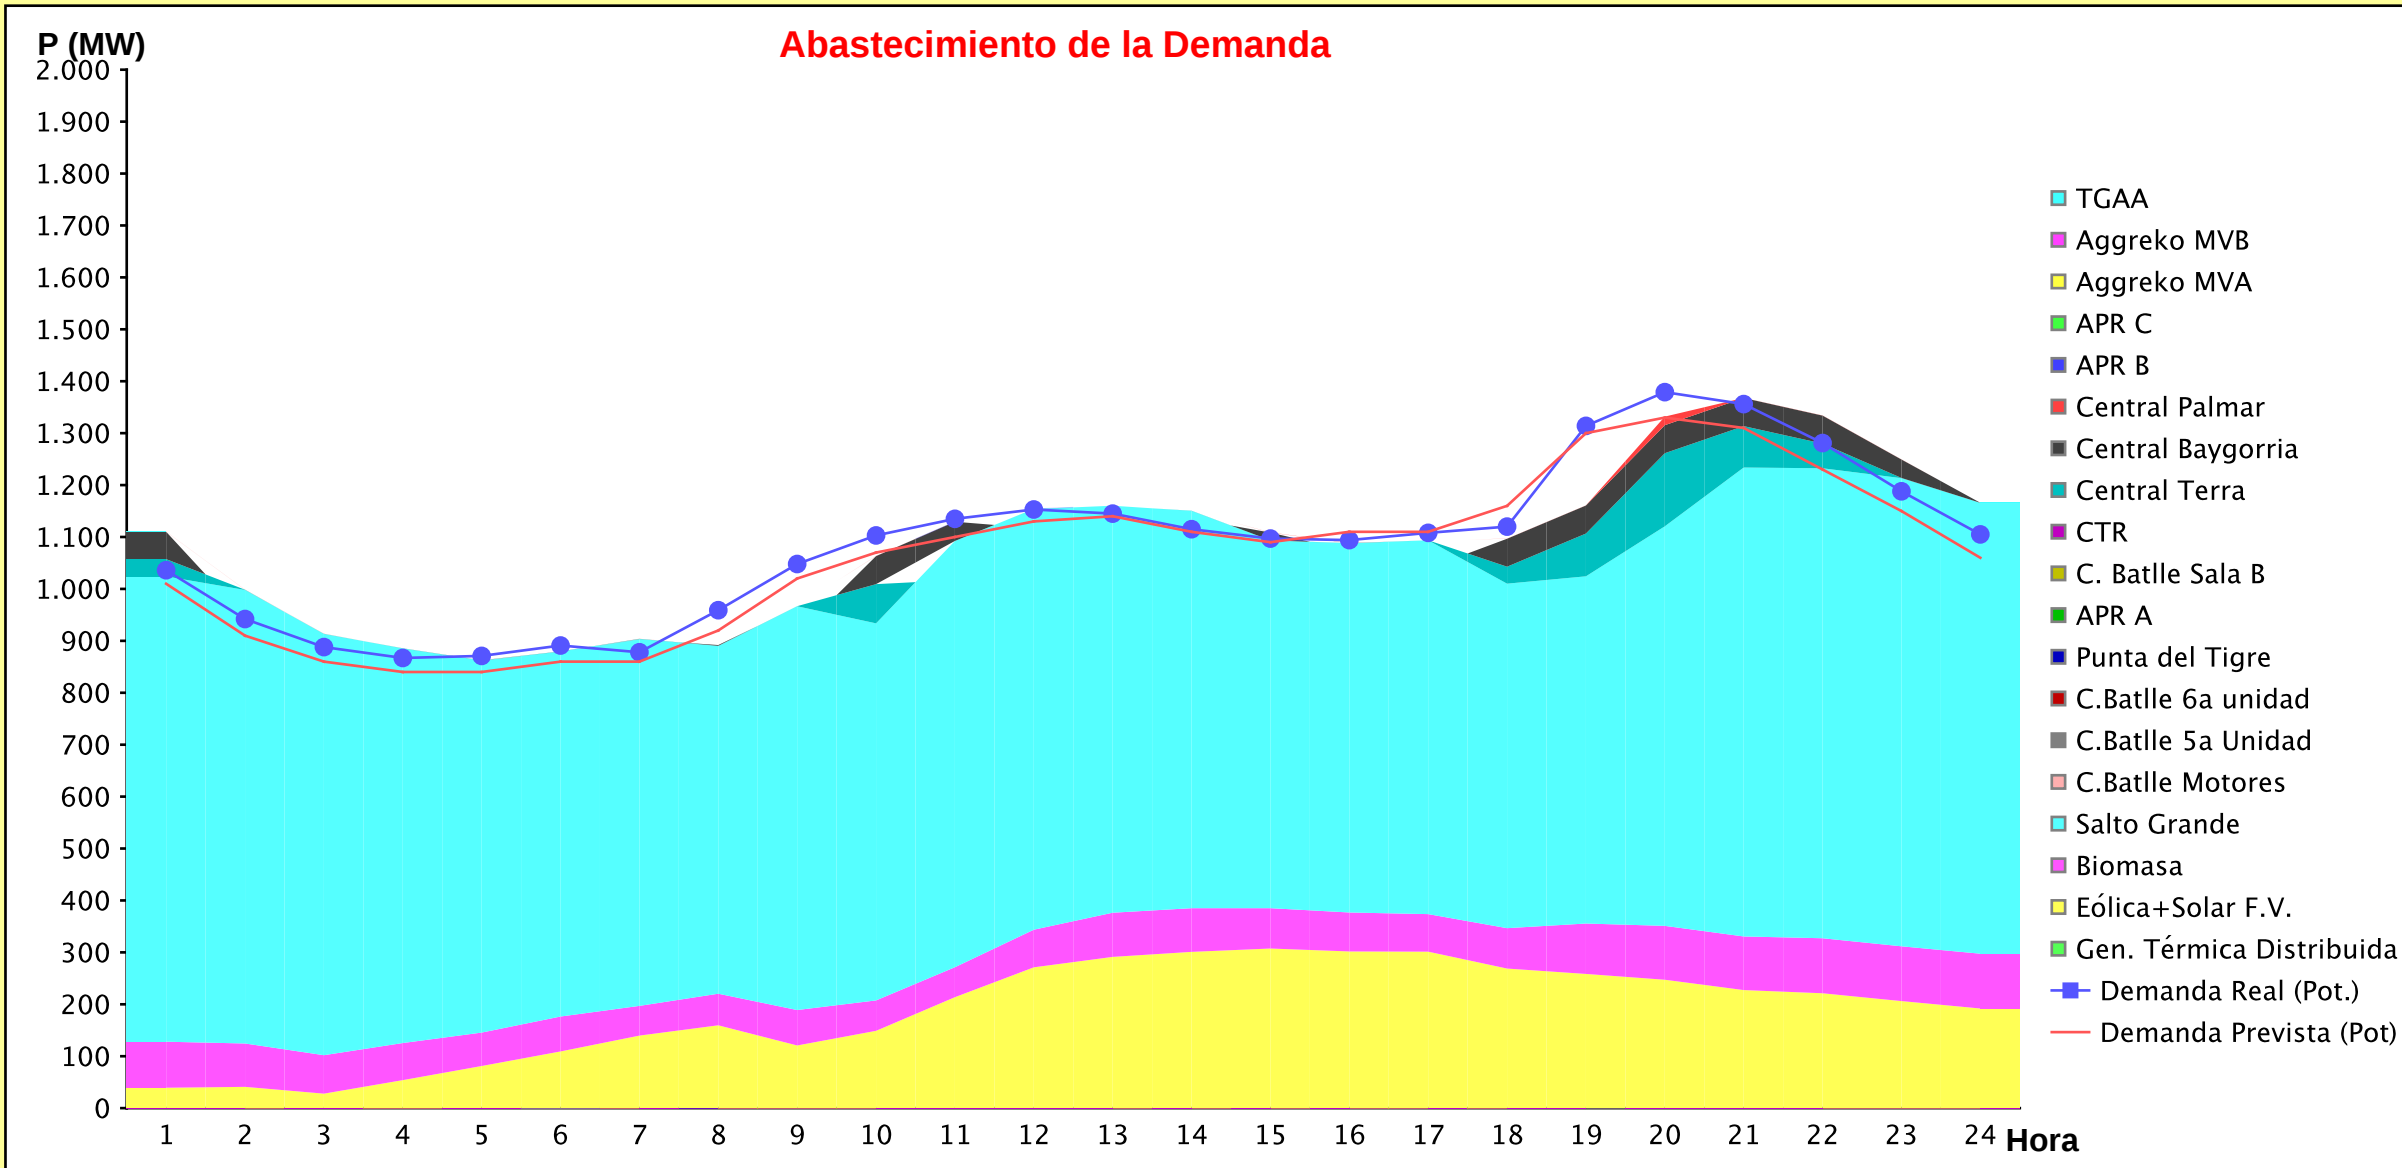

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.670
Hidráulica	12.670
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.670


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.013
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.520
Diferencia (MWh)	493
Ejecutada - Programada	1,93 %


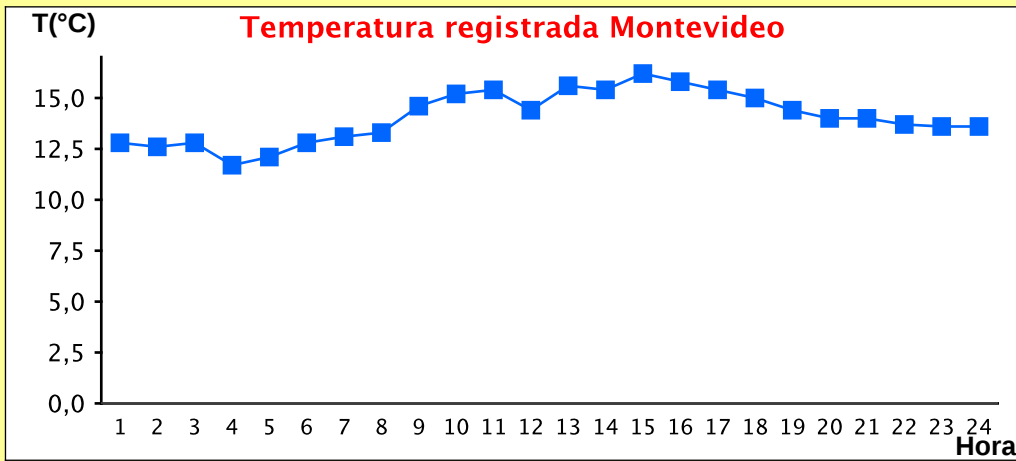


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1165,08 Hora 12:37
Potencia mínima:	860,57 Hora 04:14
Pico noche:	1392,77 Hora 19:51

Generación Media (MW)	
Eólica	189,0
Biomasa	80,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


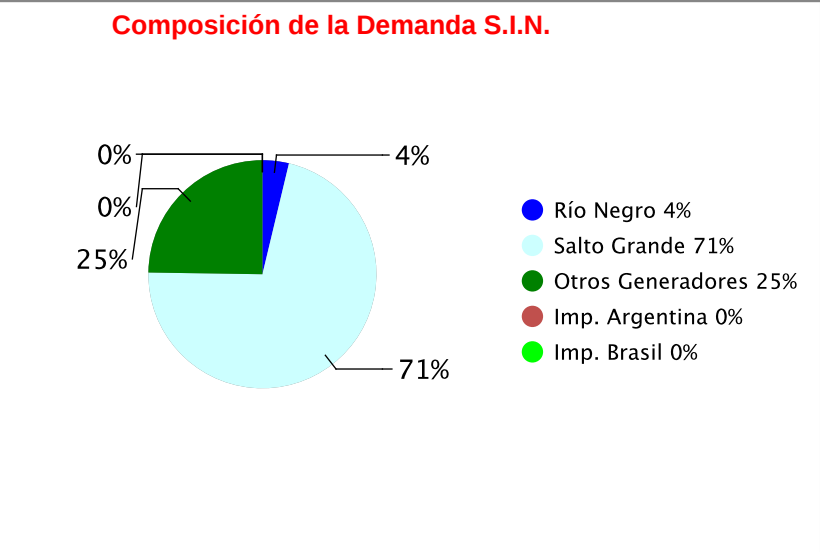


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

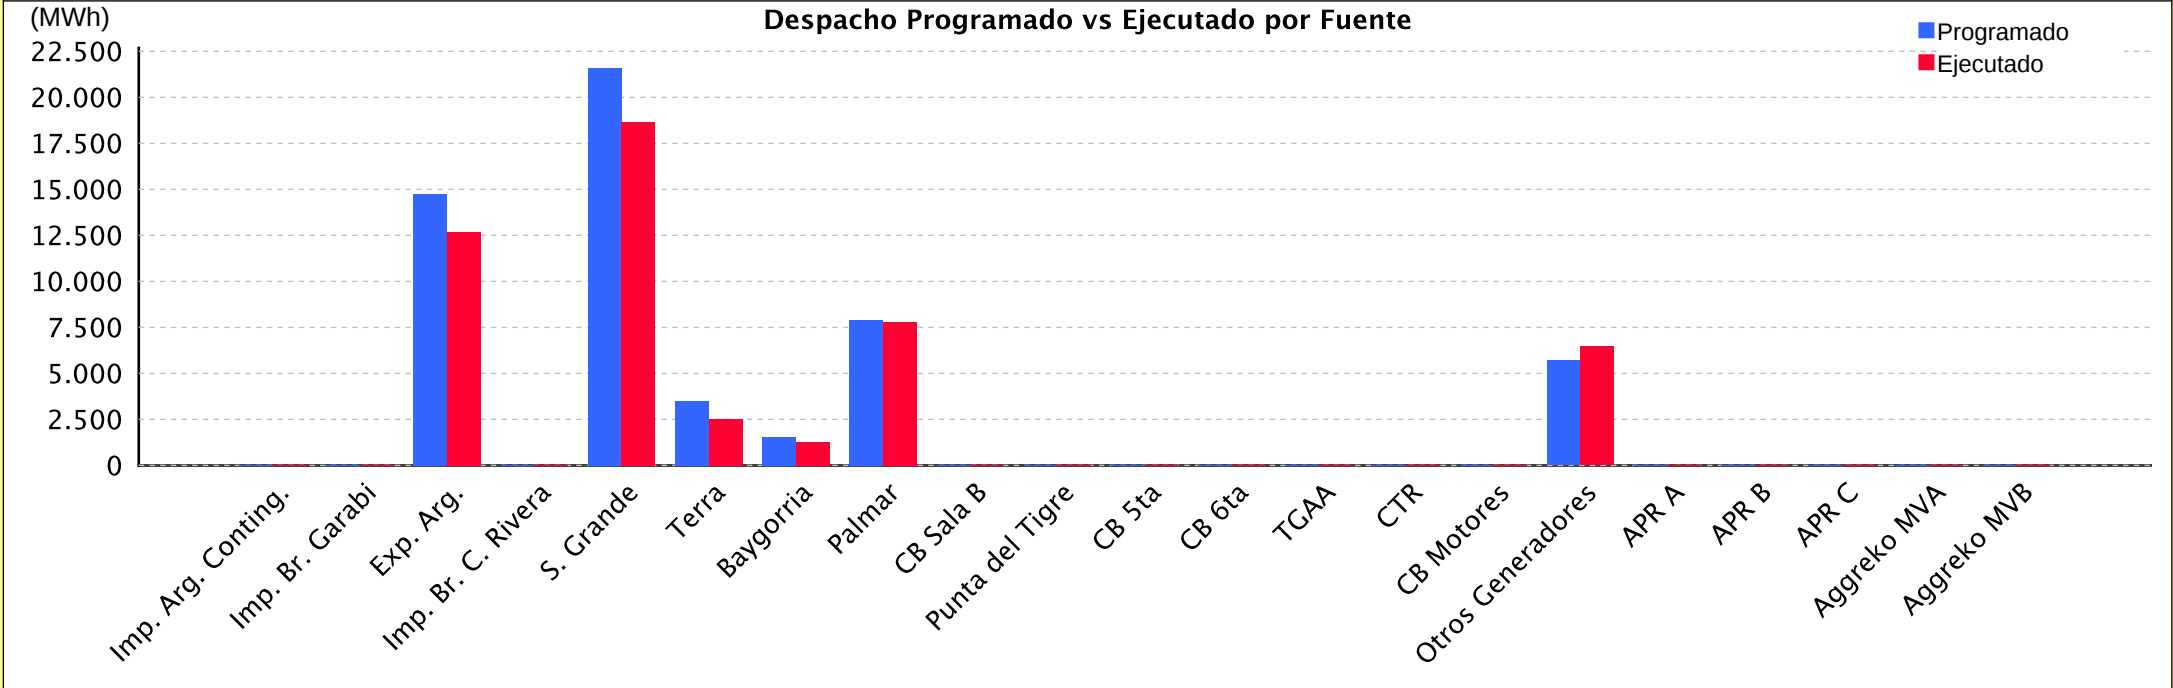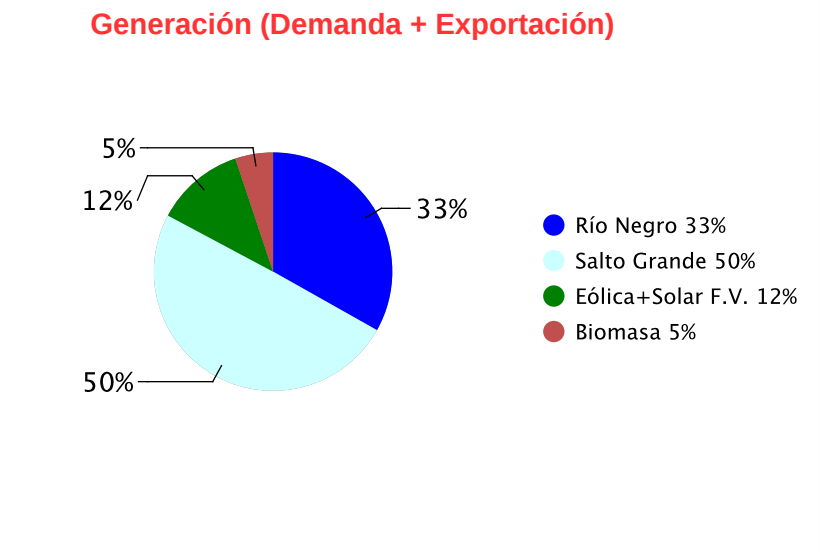



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

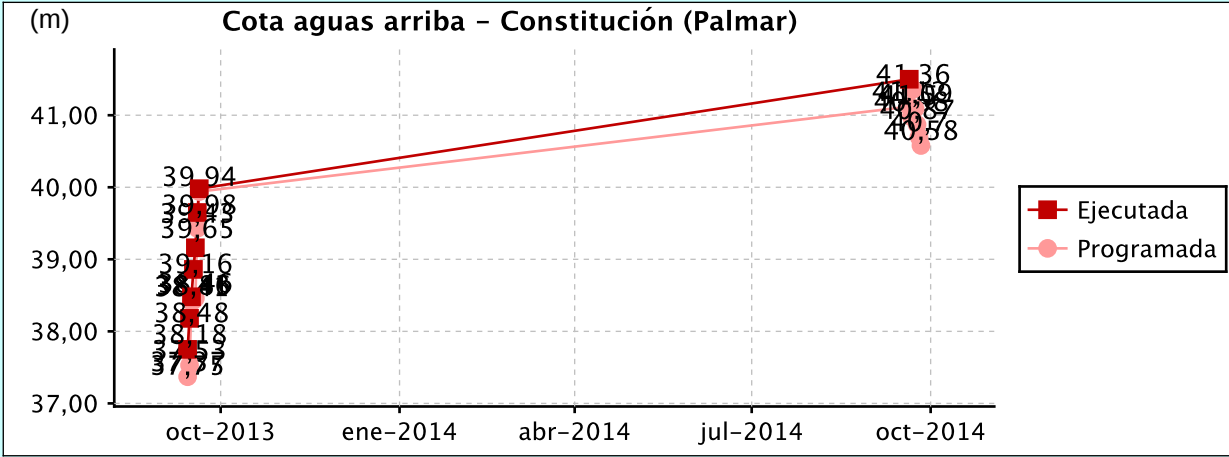
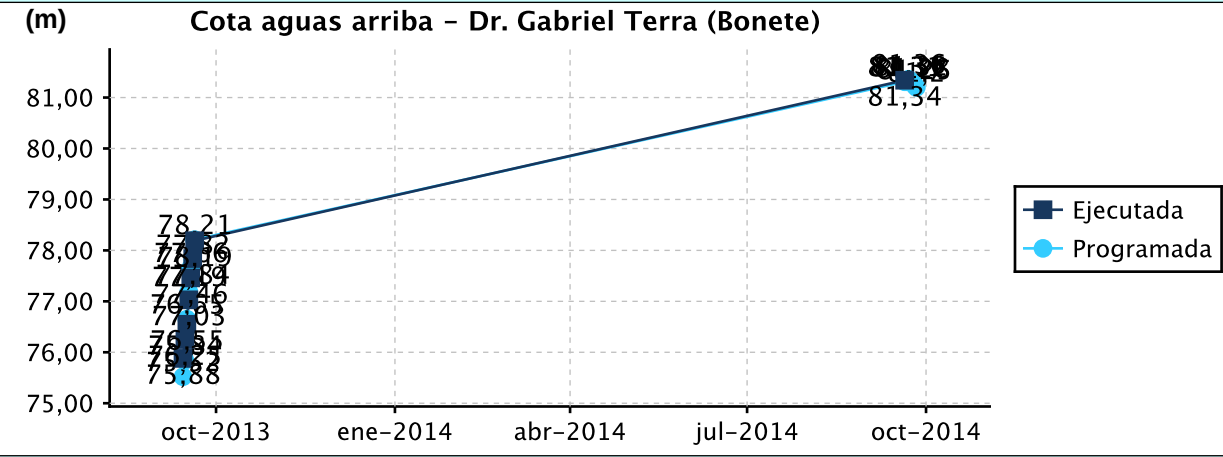


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,31	81,34
Baygorria	54,22	54,2
Palmar	41,12	41,5
SGU	35,26	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

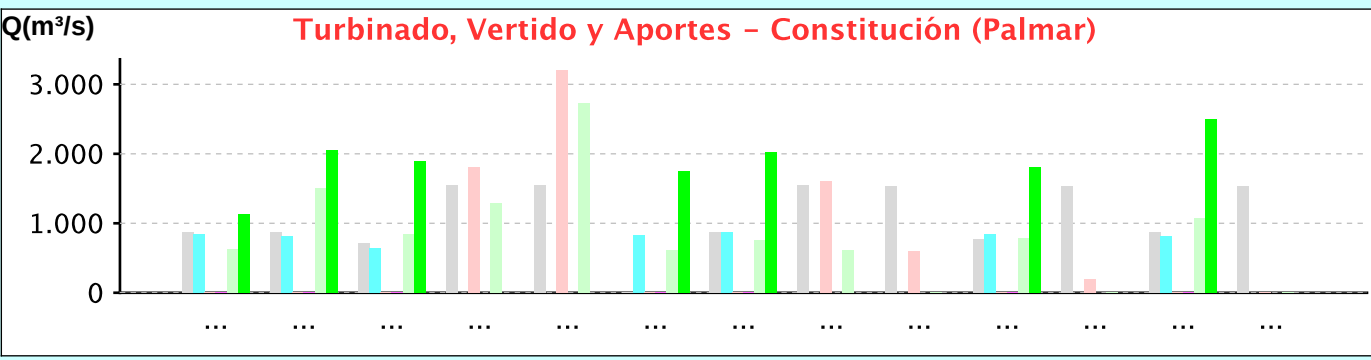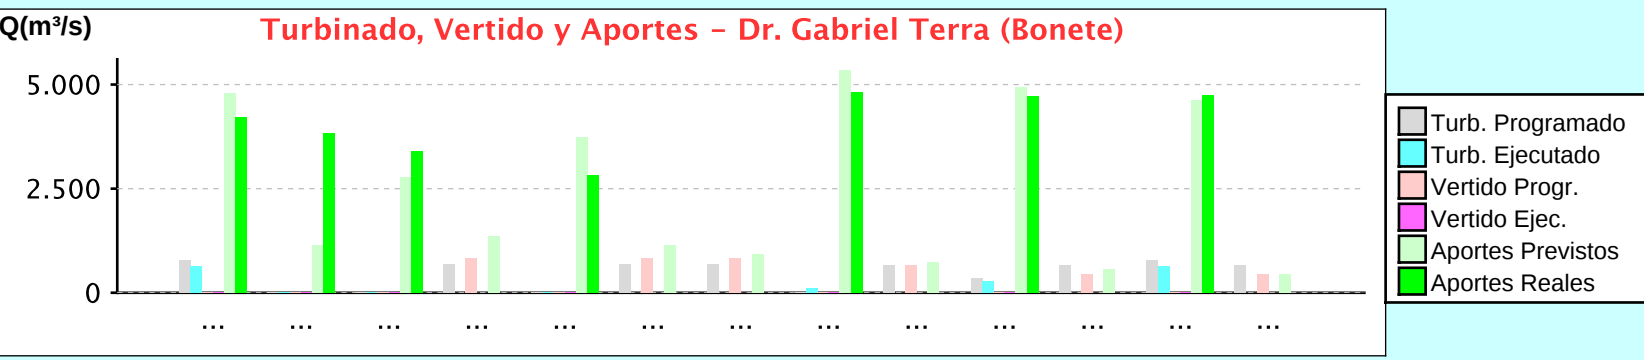

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

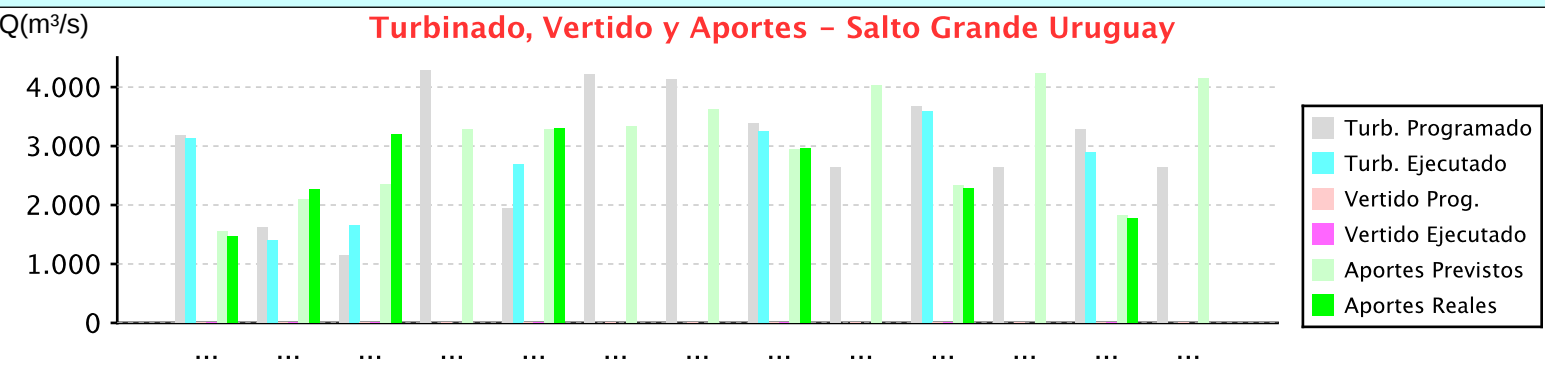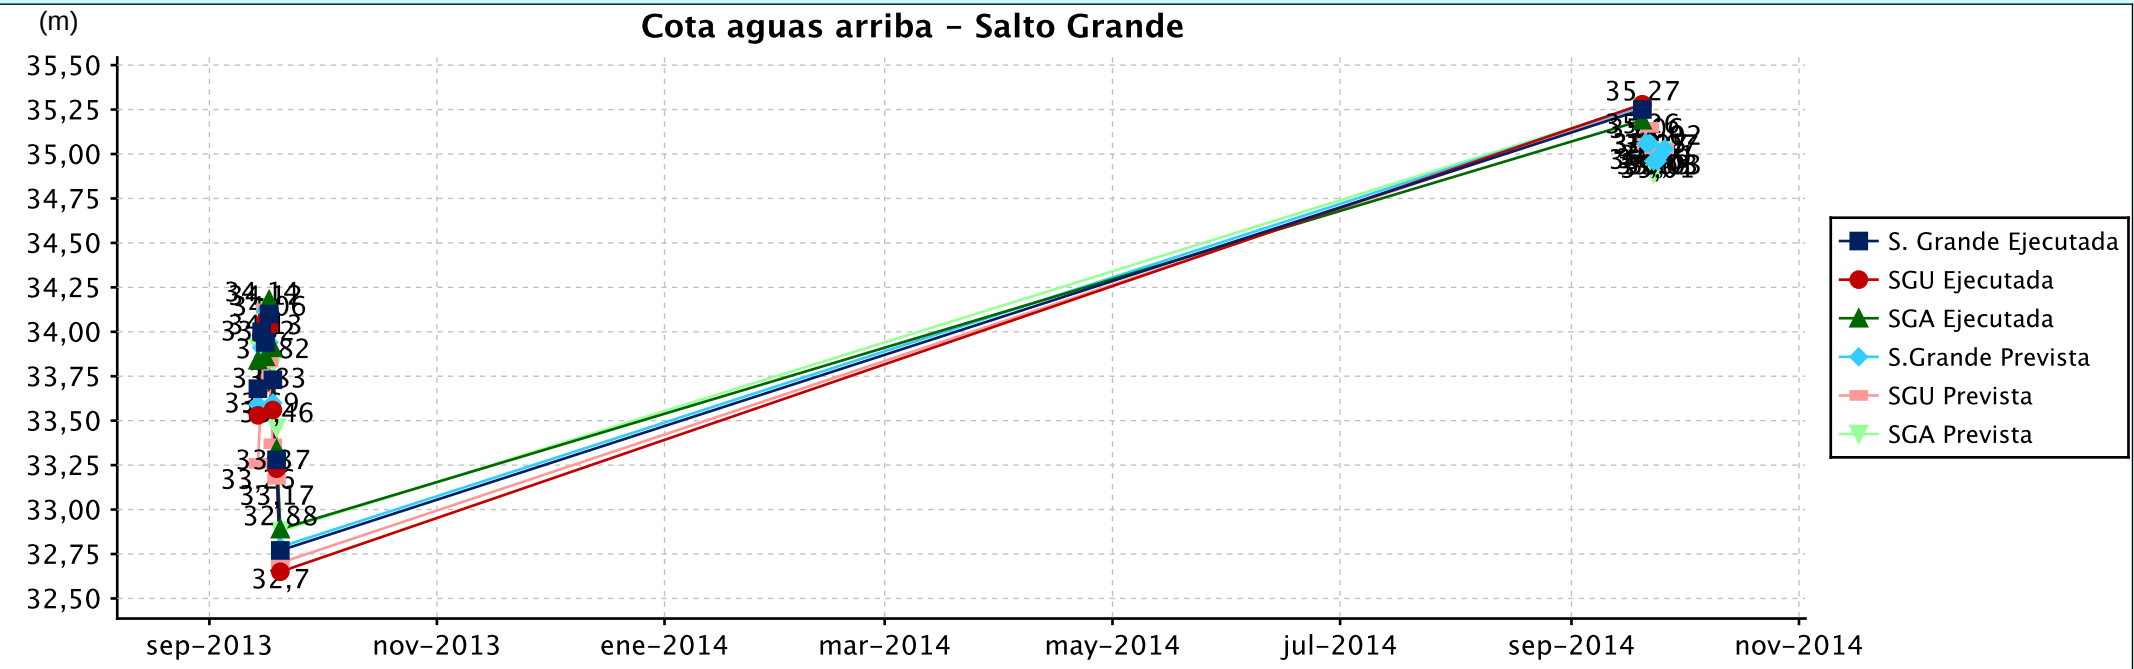

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	35,19
Cota real	35,25
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	2.123

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	675	656
Baygorria	623	510
Palmar	1.554	1.541
SGU	4.265	3.827

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.592	1.776
Baygorria	0	-1
Palmar	1.894	3.305
SGU	3.550	3.551

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	632
Baygorria	800	663
Palmar	2.862	3.146
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Por problemas técnicos no es posible mostrar los valores de cotas de las centrales hidroeléctricas.
Se solucionará a la brevedad.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

22/09/2014 15:48
