




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 26 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-6
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.366
C. Baygorria	1.780
C. Palmar	7.887
C. Salto Grande	20.517
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.395
TOTAL Generación	38.887

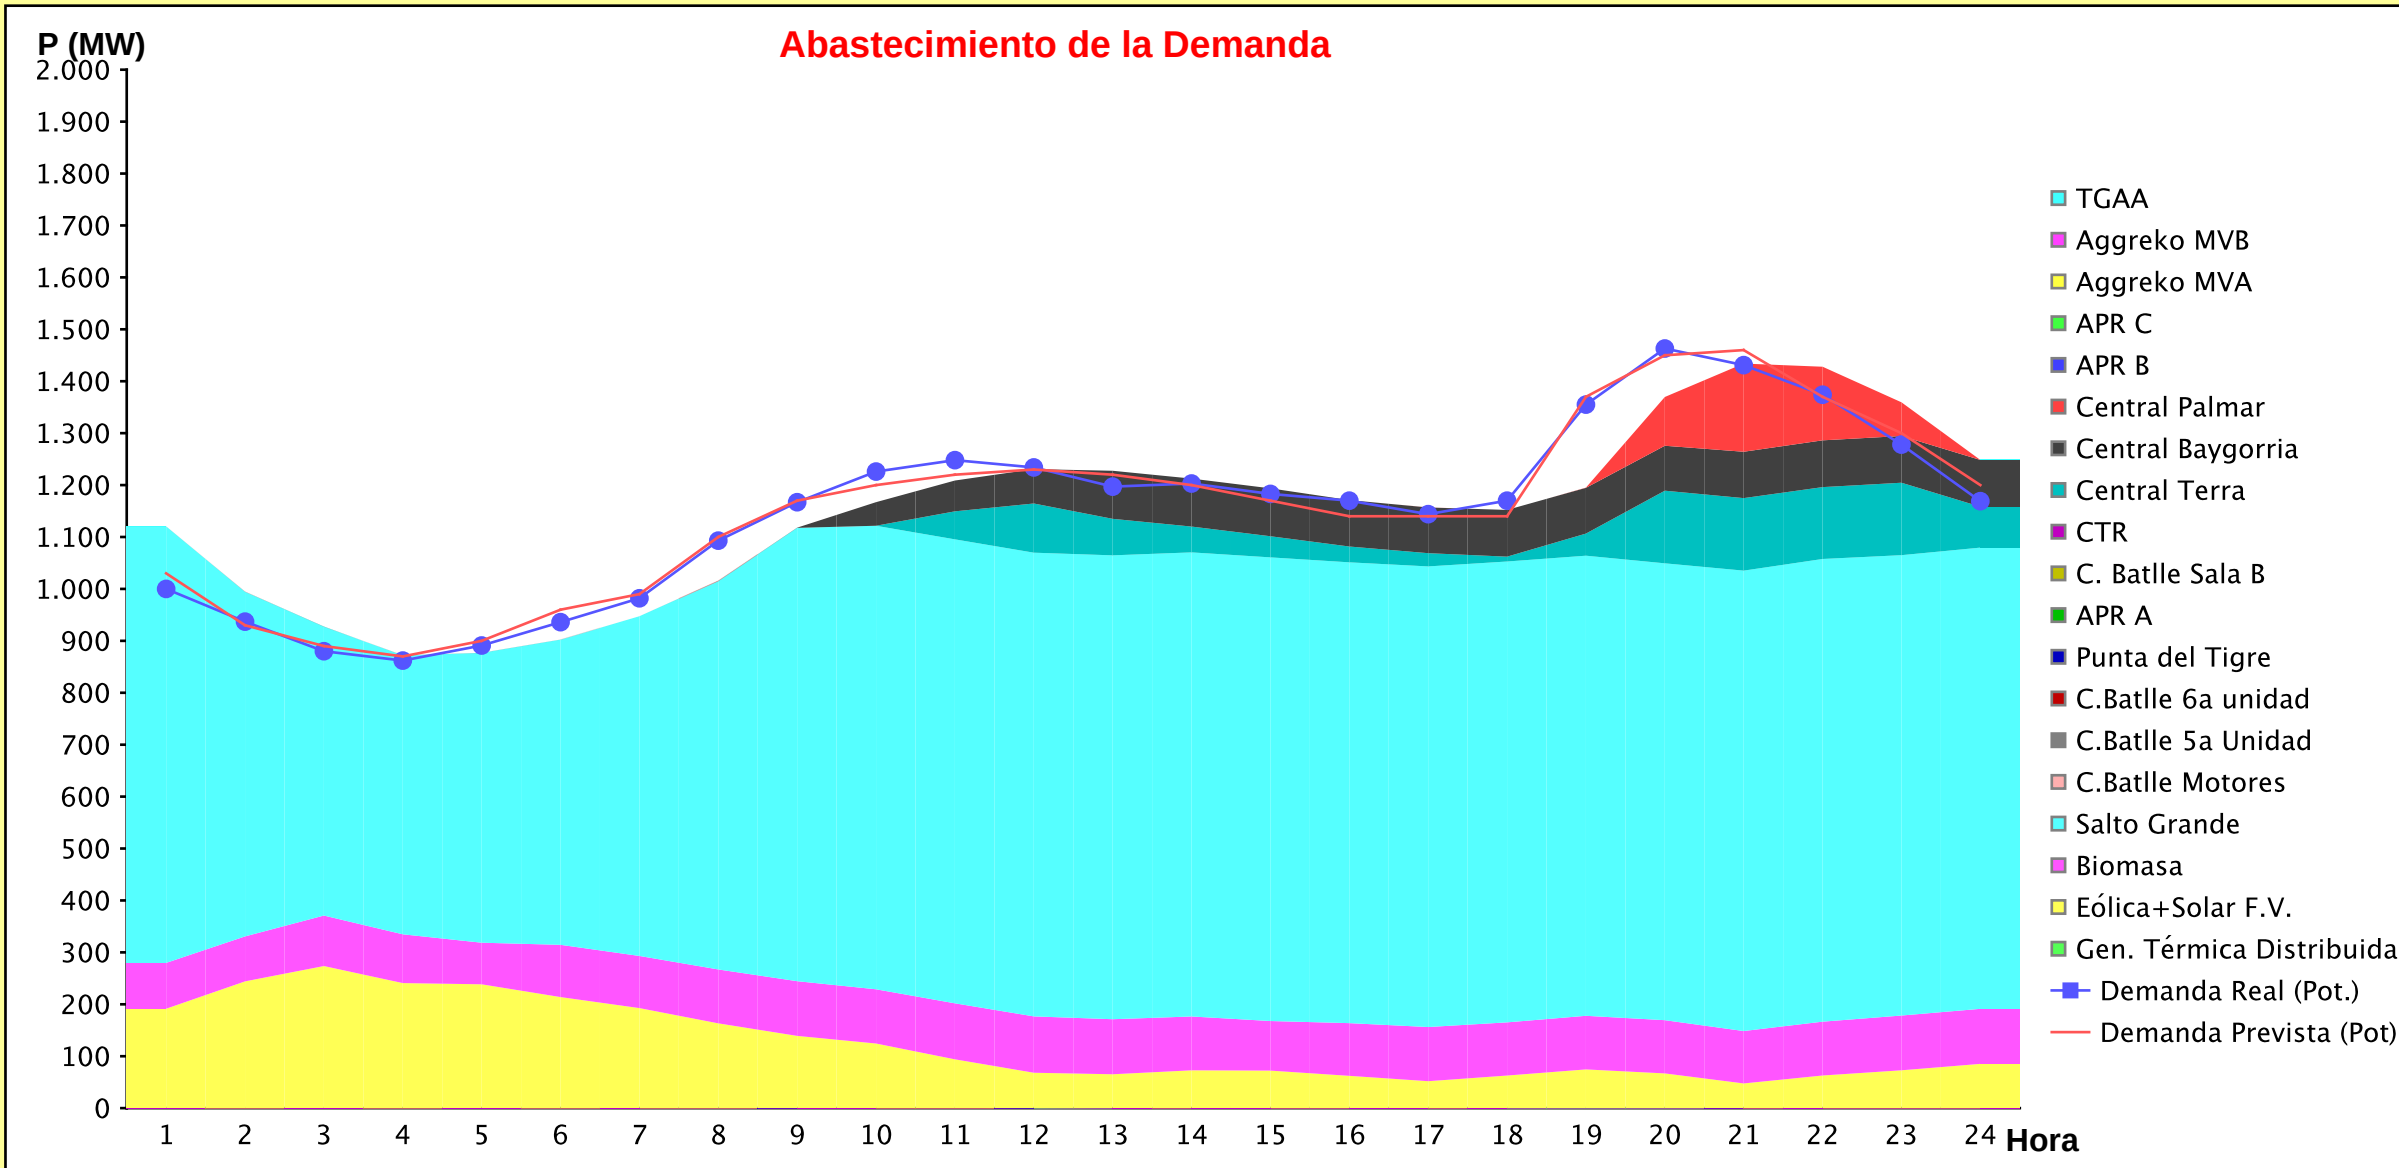




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.417
Hidráulica	11.417
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.417

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.470
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.650
Diferencia (MWh)	-180
Ejecutada - Programada	-0,65 %

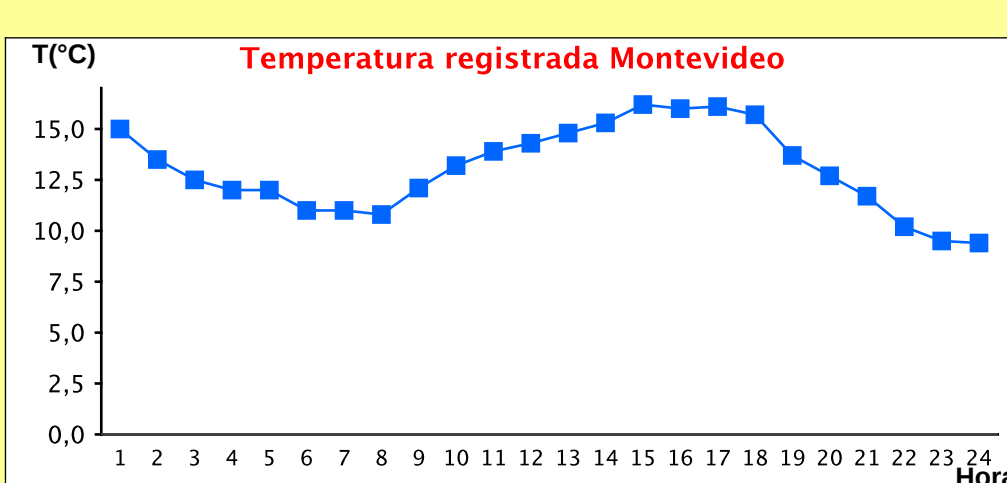



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1256,2 Hora 11:14
Potencia mínima:	850,05 Hora 03:07
Pico noche:	1467,93 Hora 19:58

Generación Media (MW)	
Eólica	124,8
Biomasa	100,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

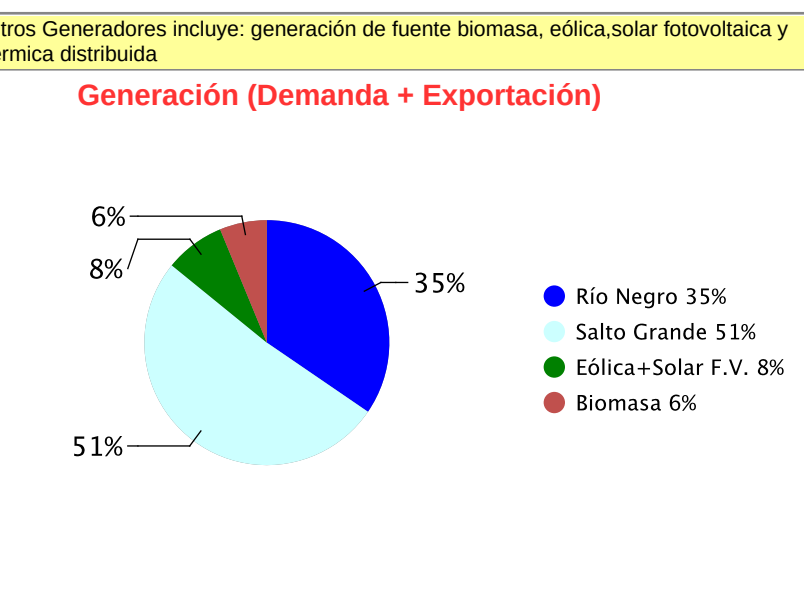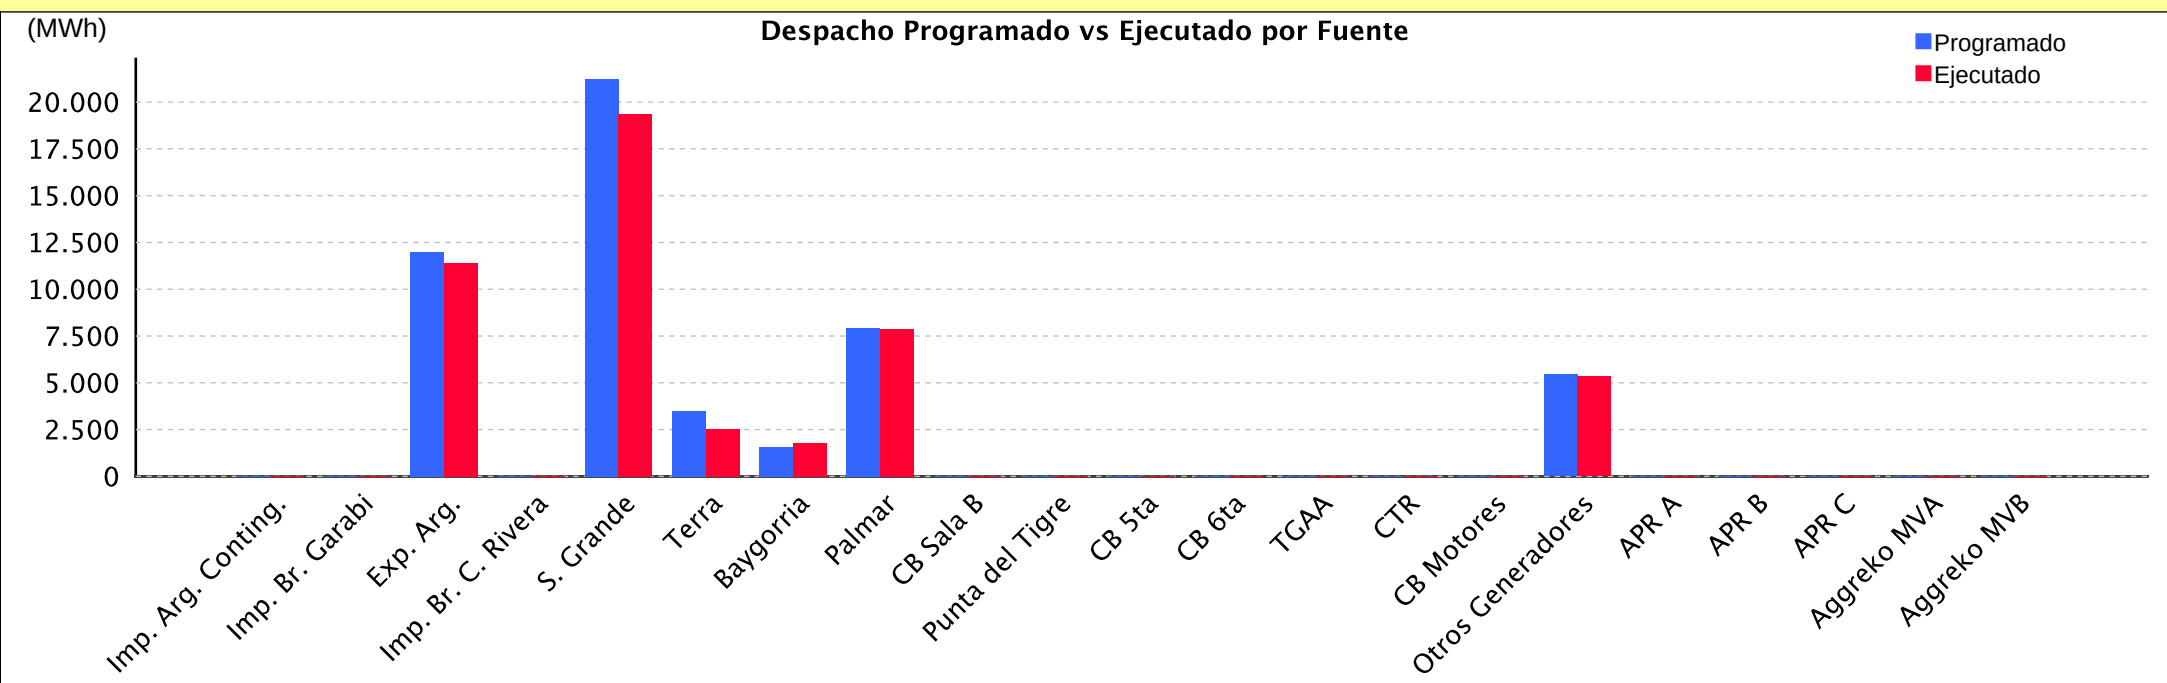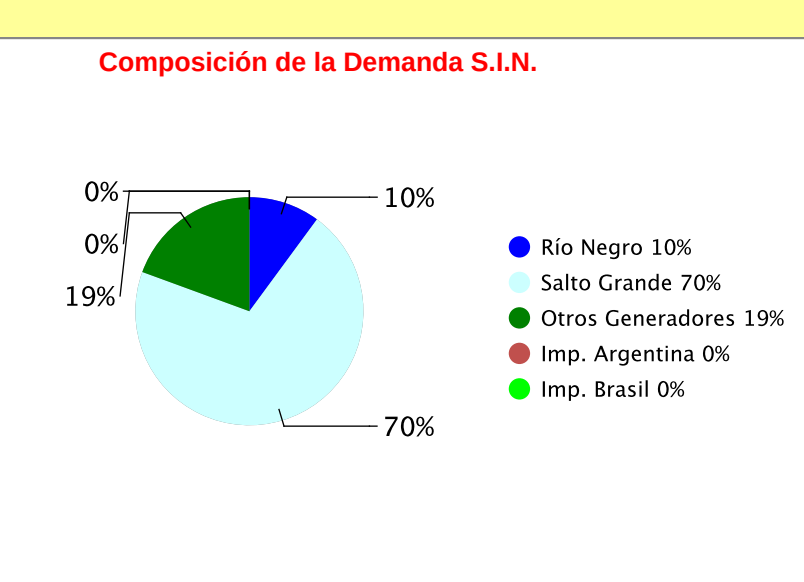



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

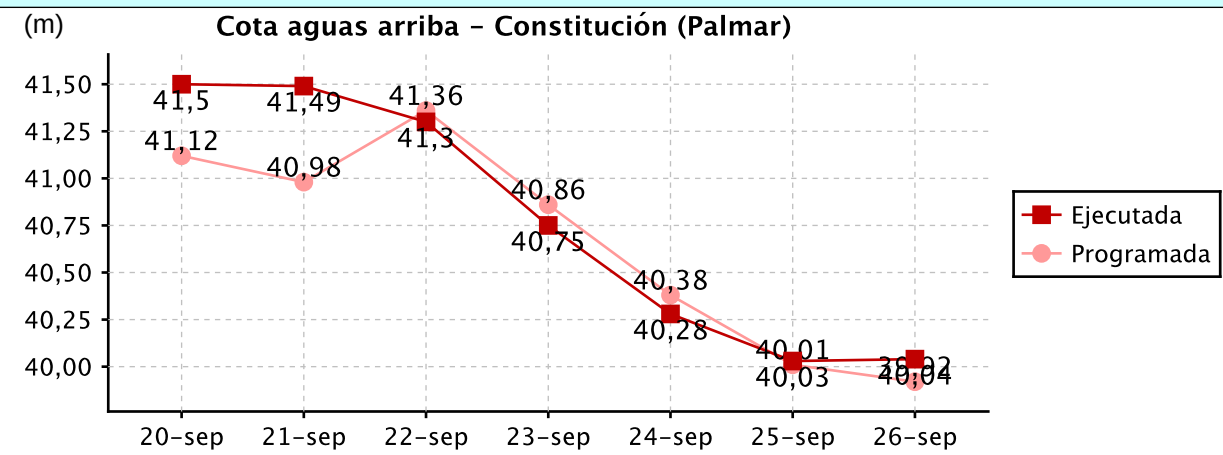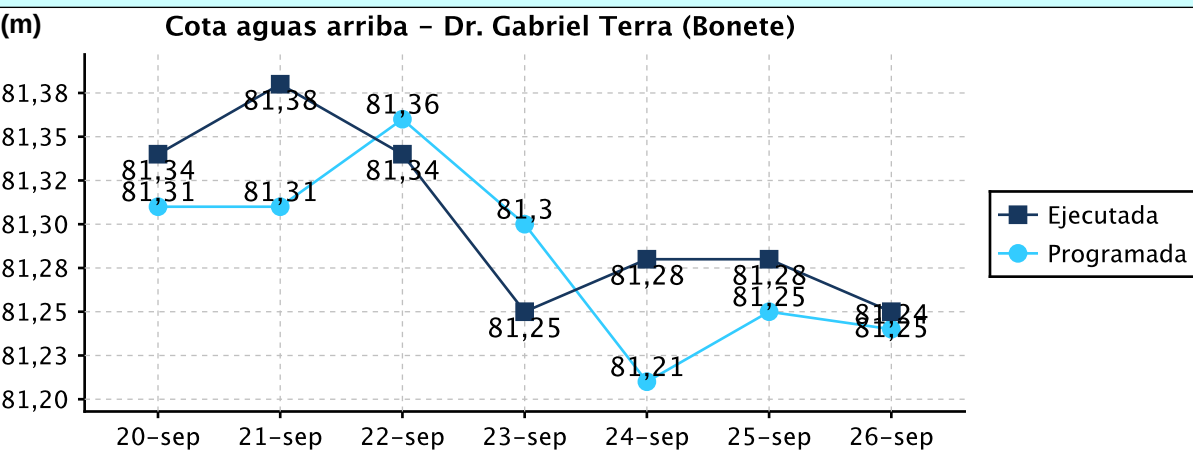


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,24	81,25
Baygorria	54,28	54,17
Palmar	39,92	40,04
SGU	35,32	35,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

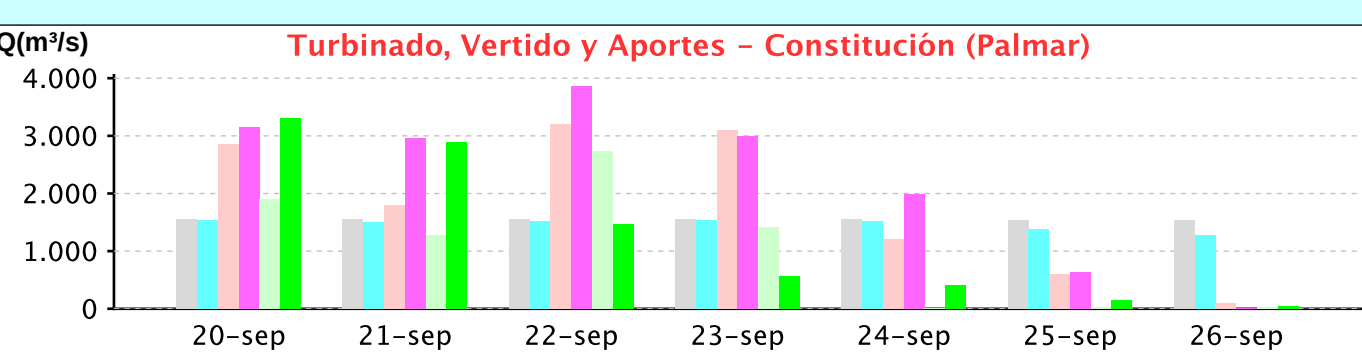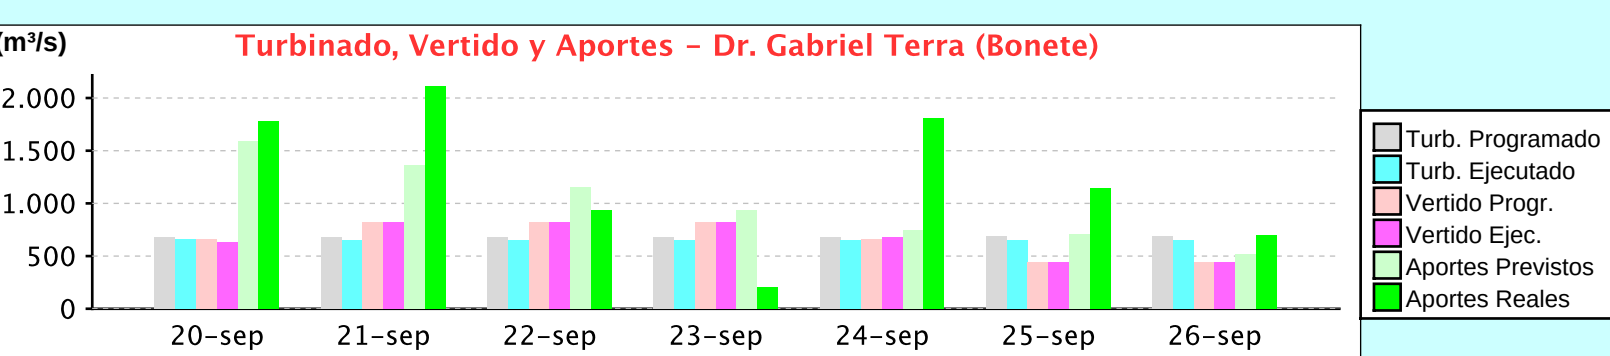


Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

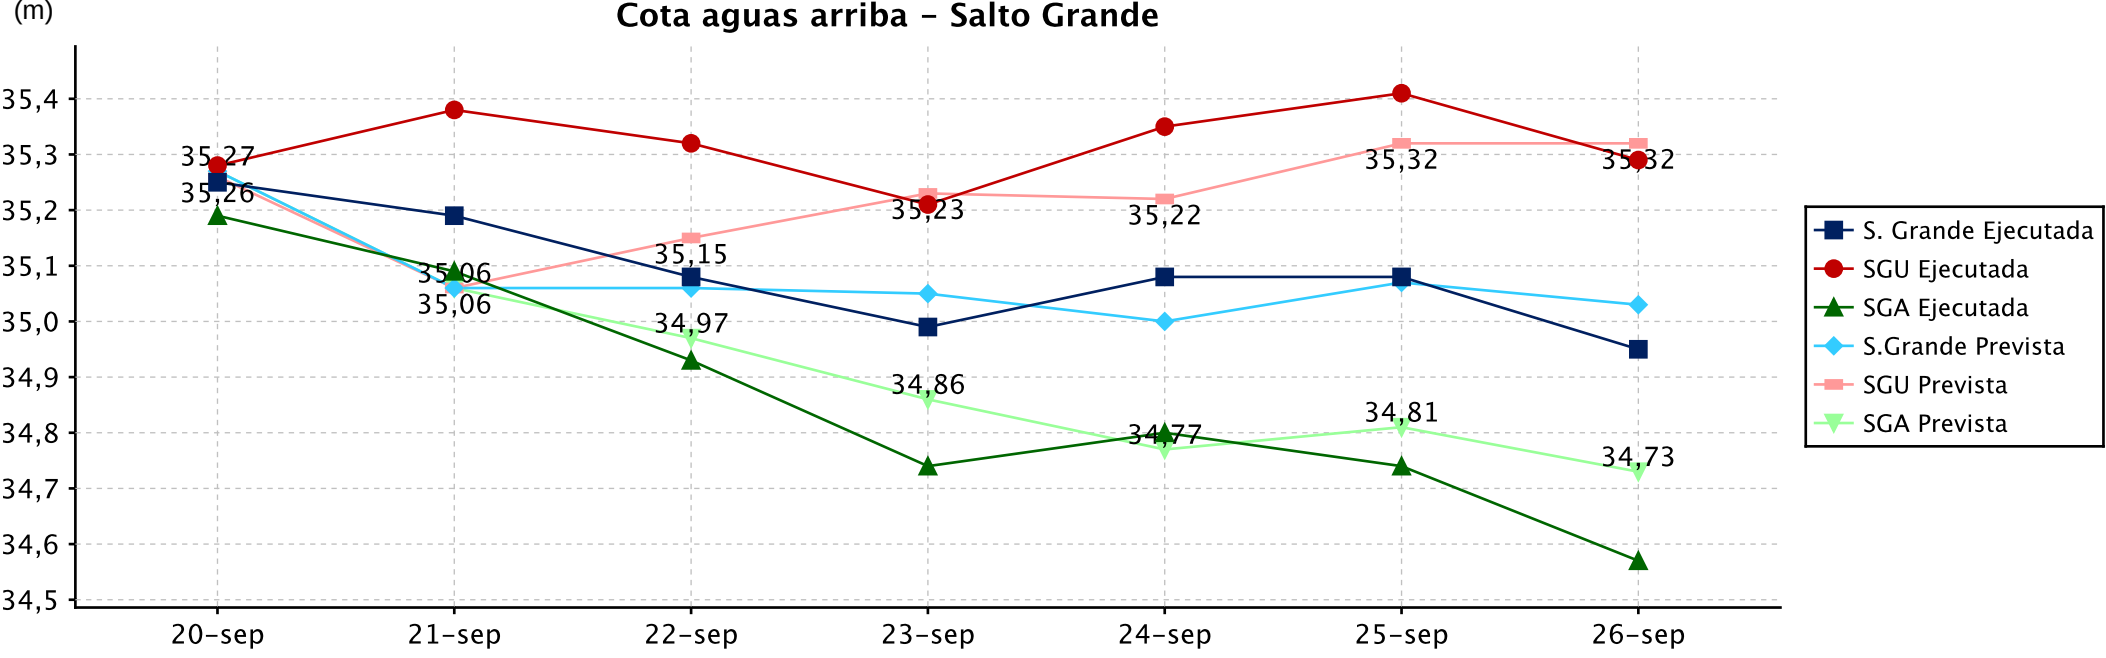

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	685	651
Baygorria	631	659
Palmar	1.530	1.273
SGU	4.095	3.980

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	515	702
Baygorria	0	53
Palmar	24	51
SGU	3.850	3.684

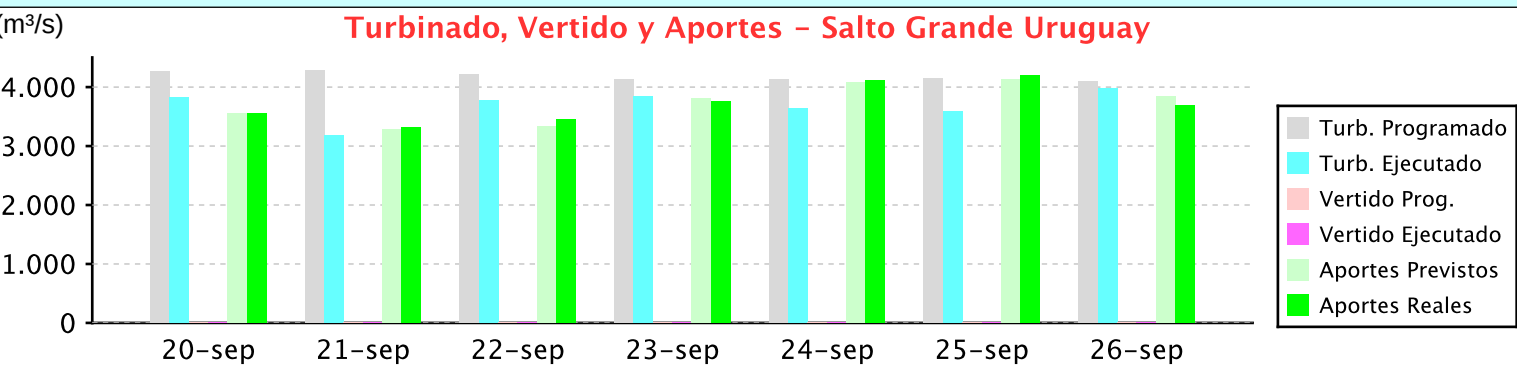

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,29
Cota Vista Arg	34,57
Cota real	34,95

Dif. Energ. (U-A)	16.809
Acumulado MWh	

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	442
Baygorria	575	617
Palmar	100	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
