




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 27 de septiembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.348
C. Baygorria	2.179
C. Palmar	7.889
C. Salto Grande	18.200
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.286
TOTAL Generación	37.843

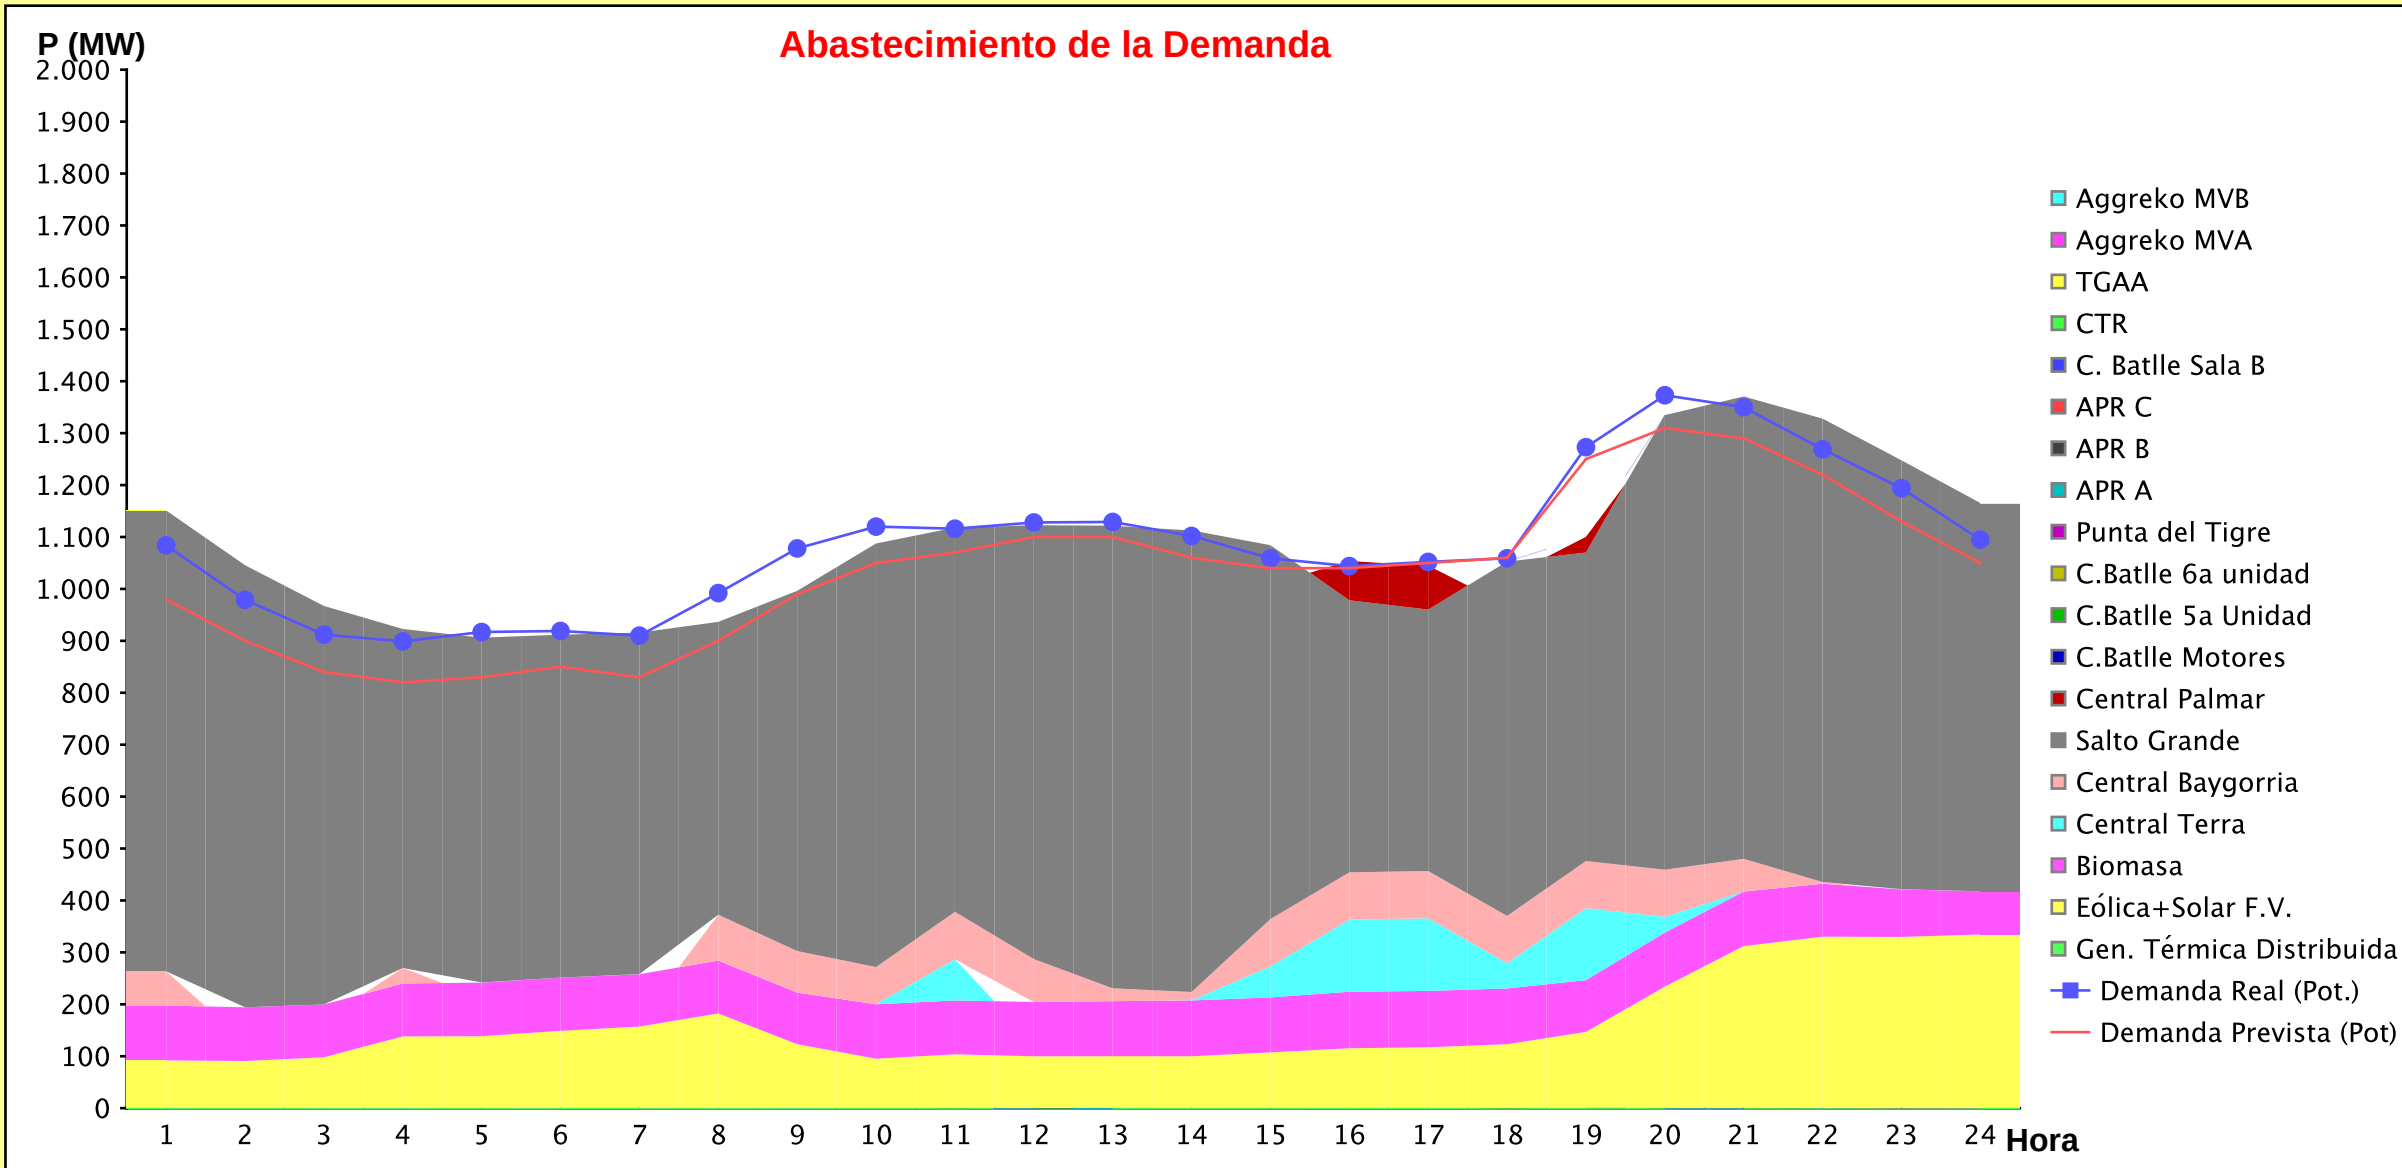

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.808
Hidráulica	11.808
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.808




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.035
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.760
Diferencia (MWh)	1.275
Ejecutada - Programada	5,15 %

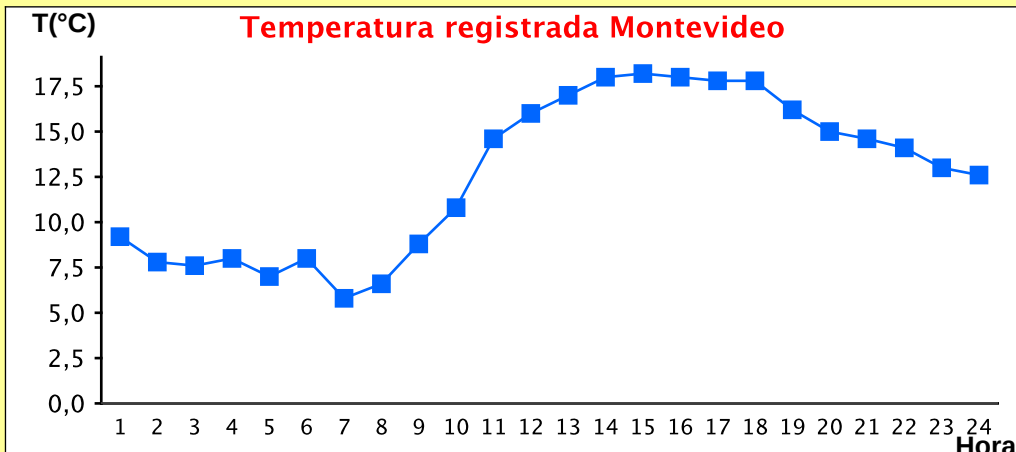



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1144,29 Hora 12:45
Potencia mínima:	890,44 Hora 06:36
Pico noche:	1378,15 Hora 19:56

Generación Media (MW)	
Eólica	159,6
Biomasa	102,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

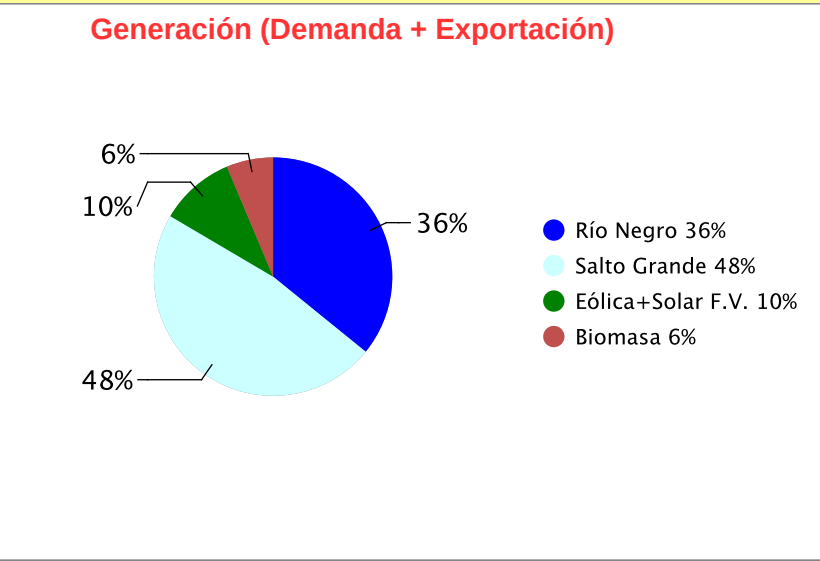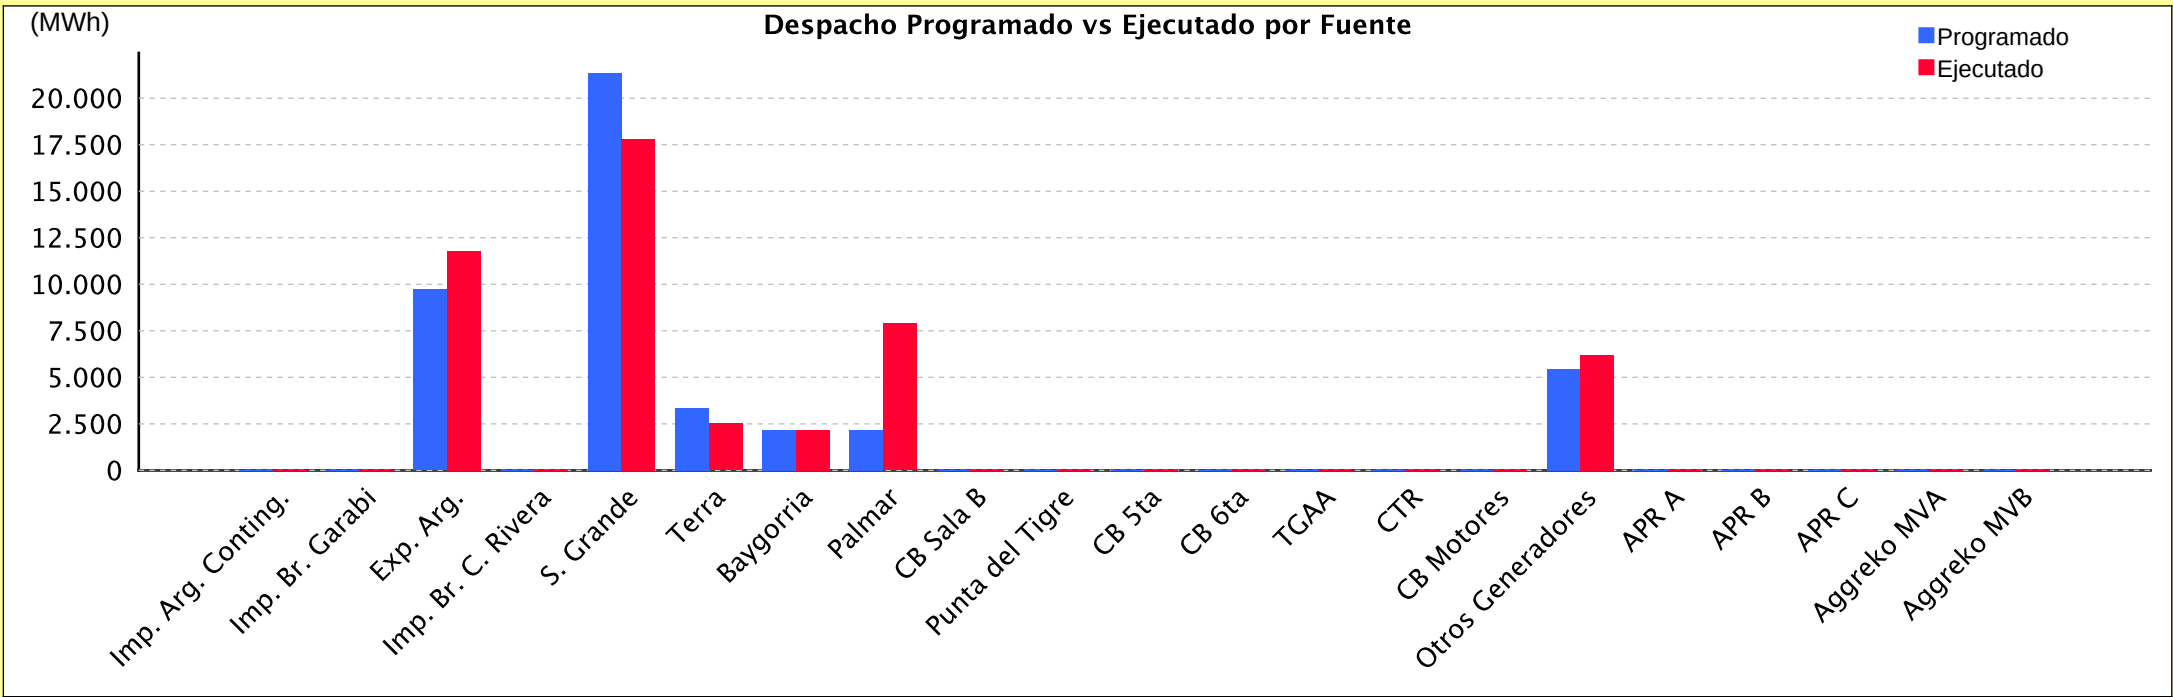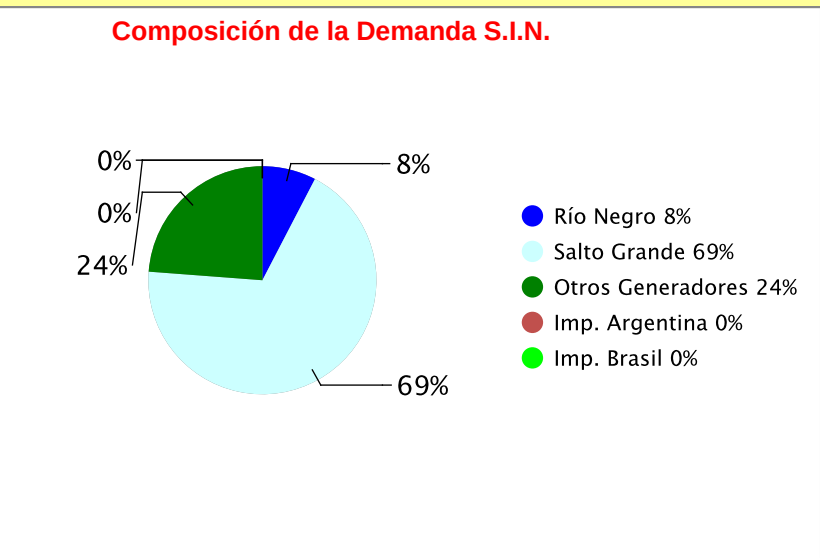



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

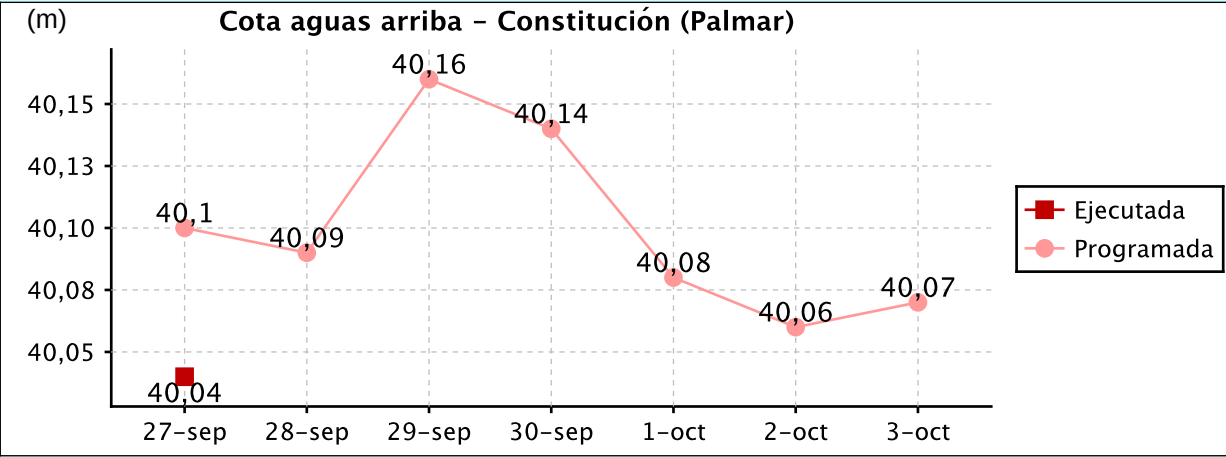
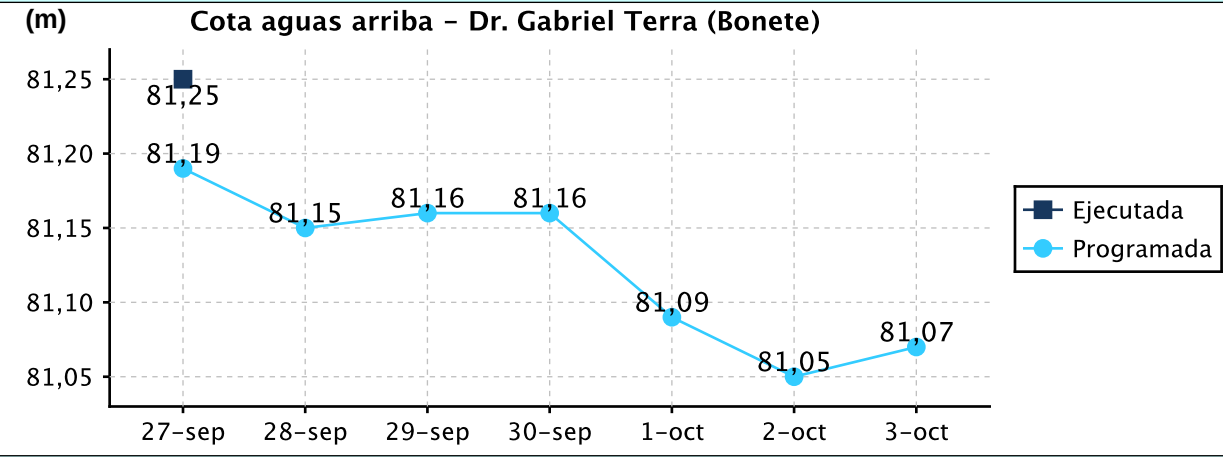


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,19	81,25
Baygorria	54,29	54,13
Palmar	40,10	40,04
SGU	35,18	35,24

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

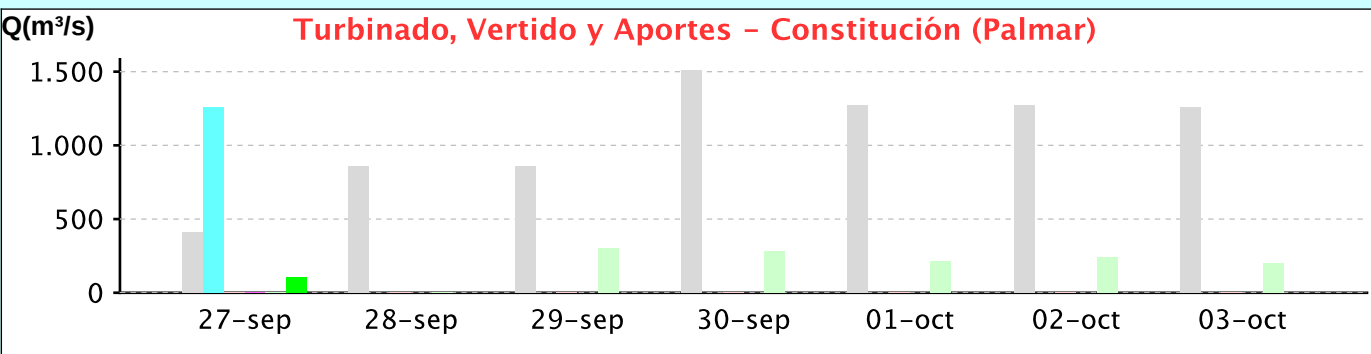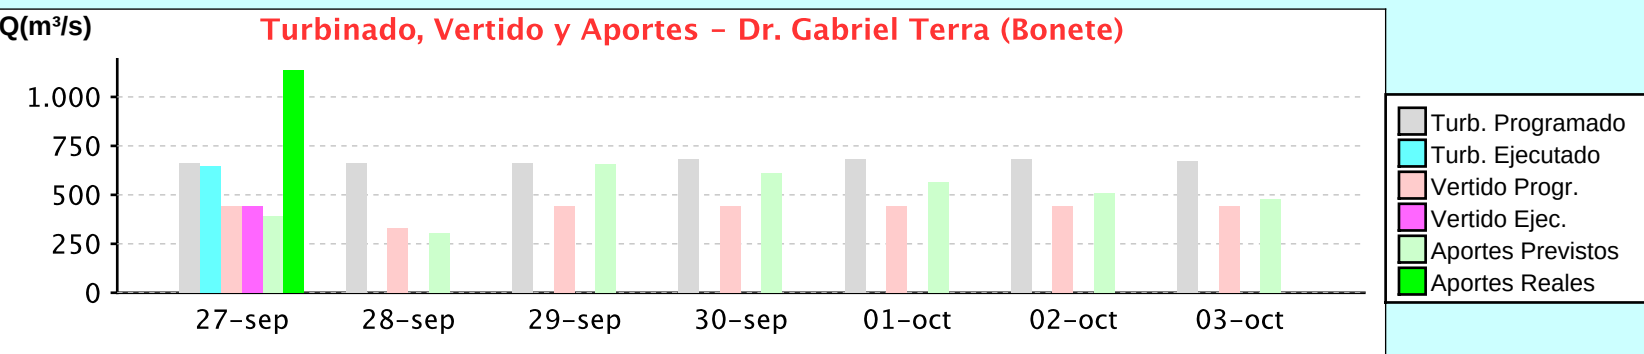

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

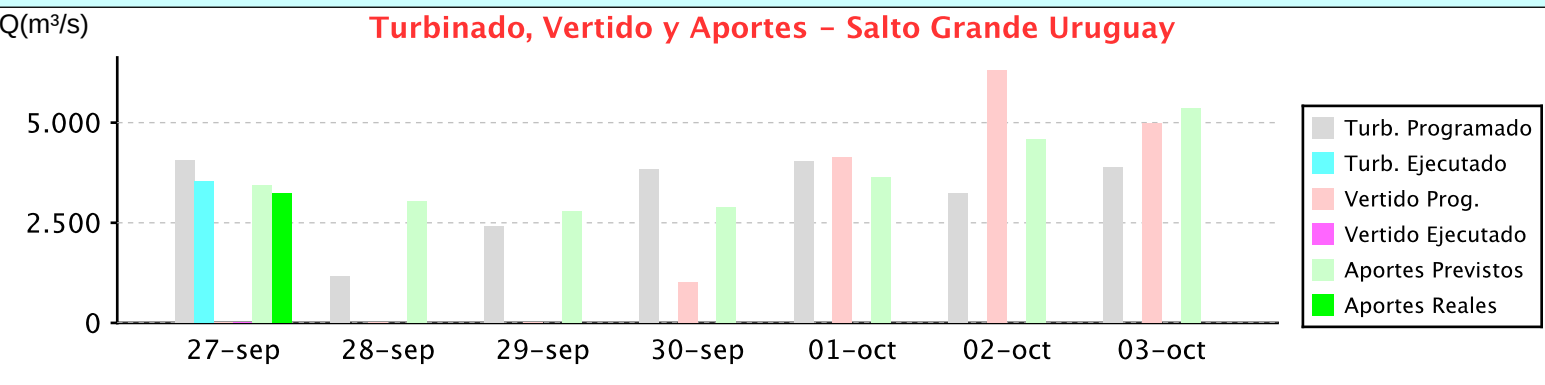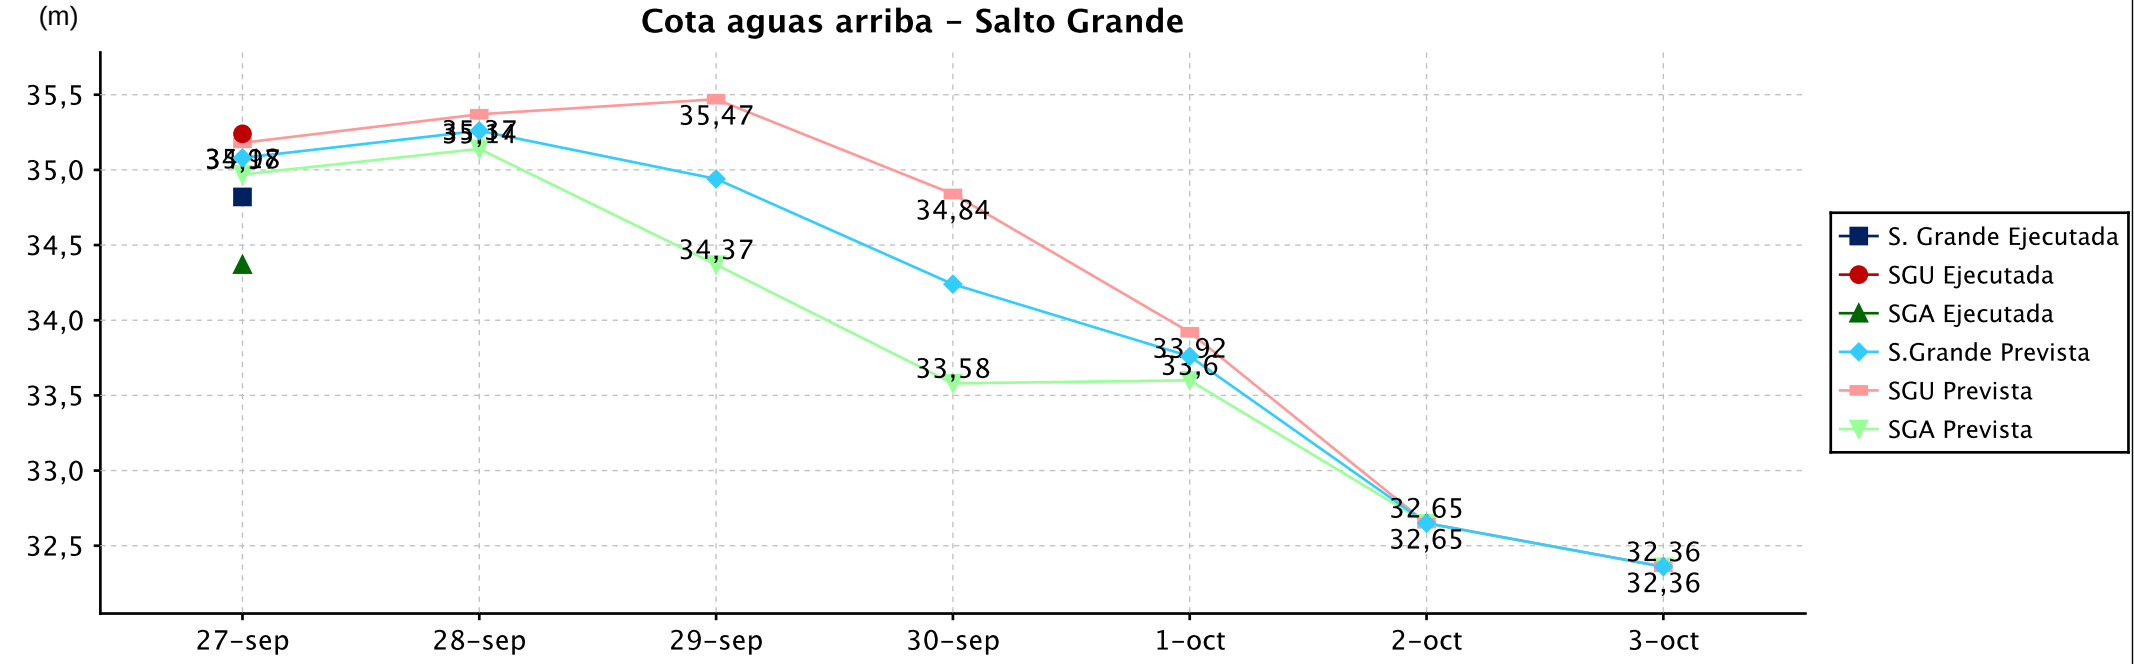

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,24
Cota Vista Arg	34,37
Cota real	34,82
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
20.028	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	644
Baygorria	850	813
Palmar	411	1.261
SGU	4.061	3.523

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	390	1.135
Baygorria	0	49
Palmar	0	108
SGU	3.425	3.233

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	443
Baygorria	240	361
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 492 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
