



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 29 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.363
C. Baygorria	2.029
C. Palmar	7.863
C. Salto Grande	13.649
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.155
TOTAL Generación	32.005

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.965
Hidráulica	4.965
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.965




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.040
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.280
Diferencia (MWh)	-240
Ejecutada - Programada	-0,88 %

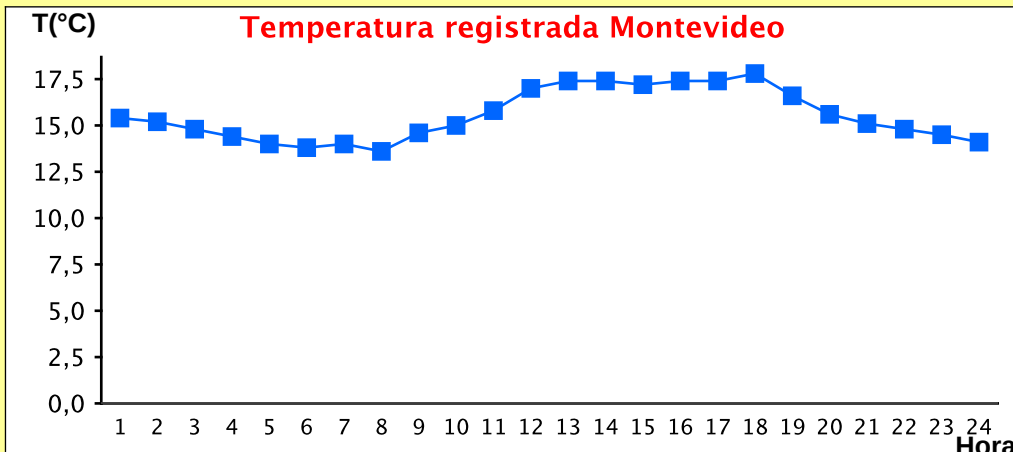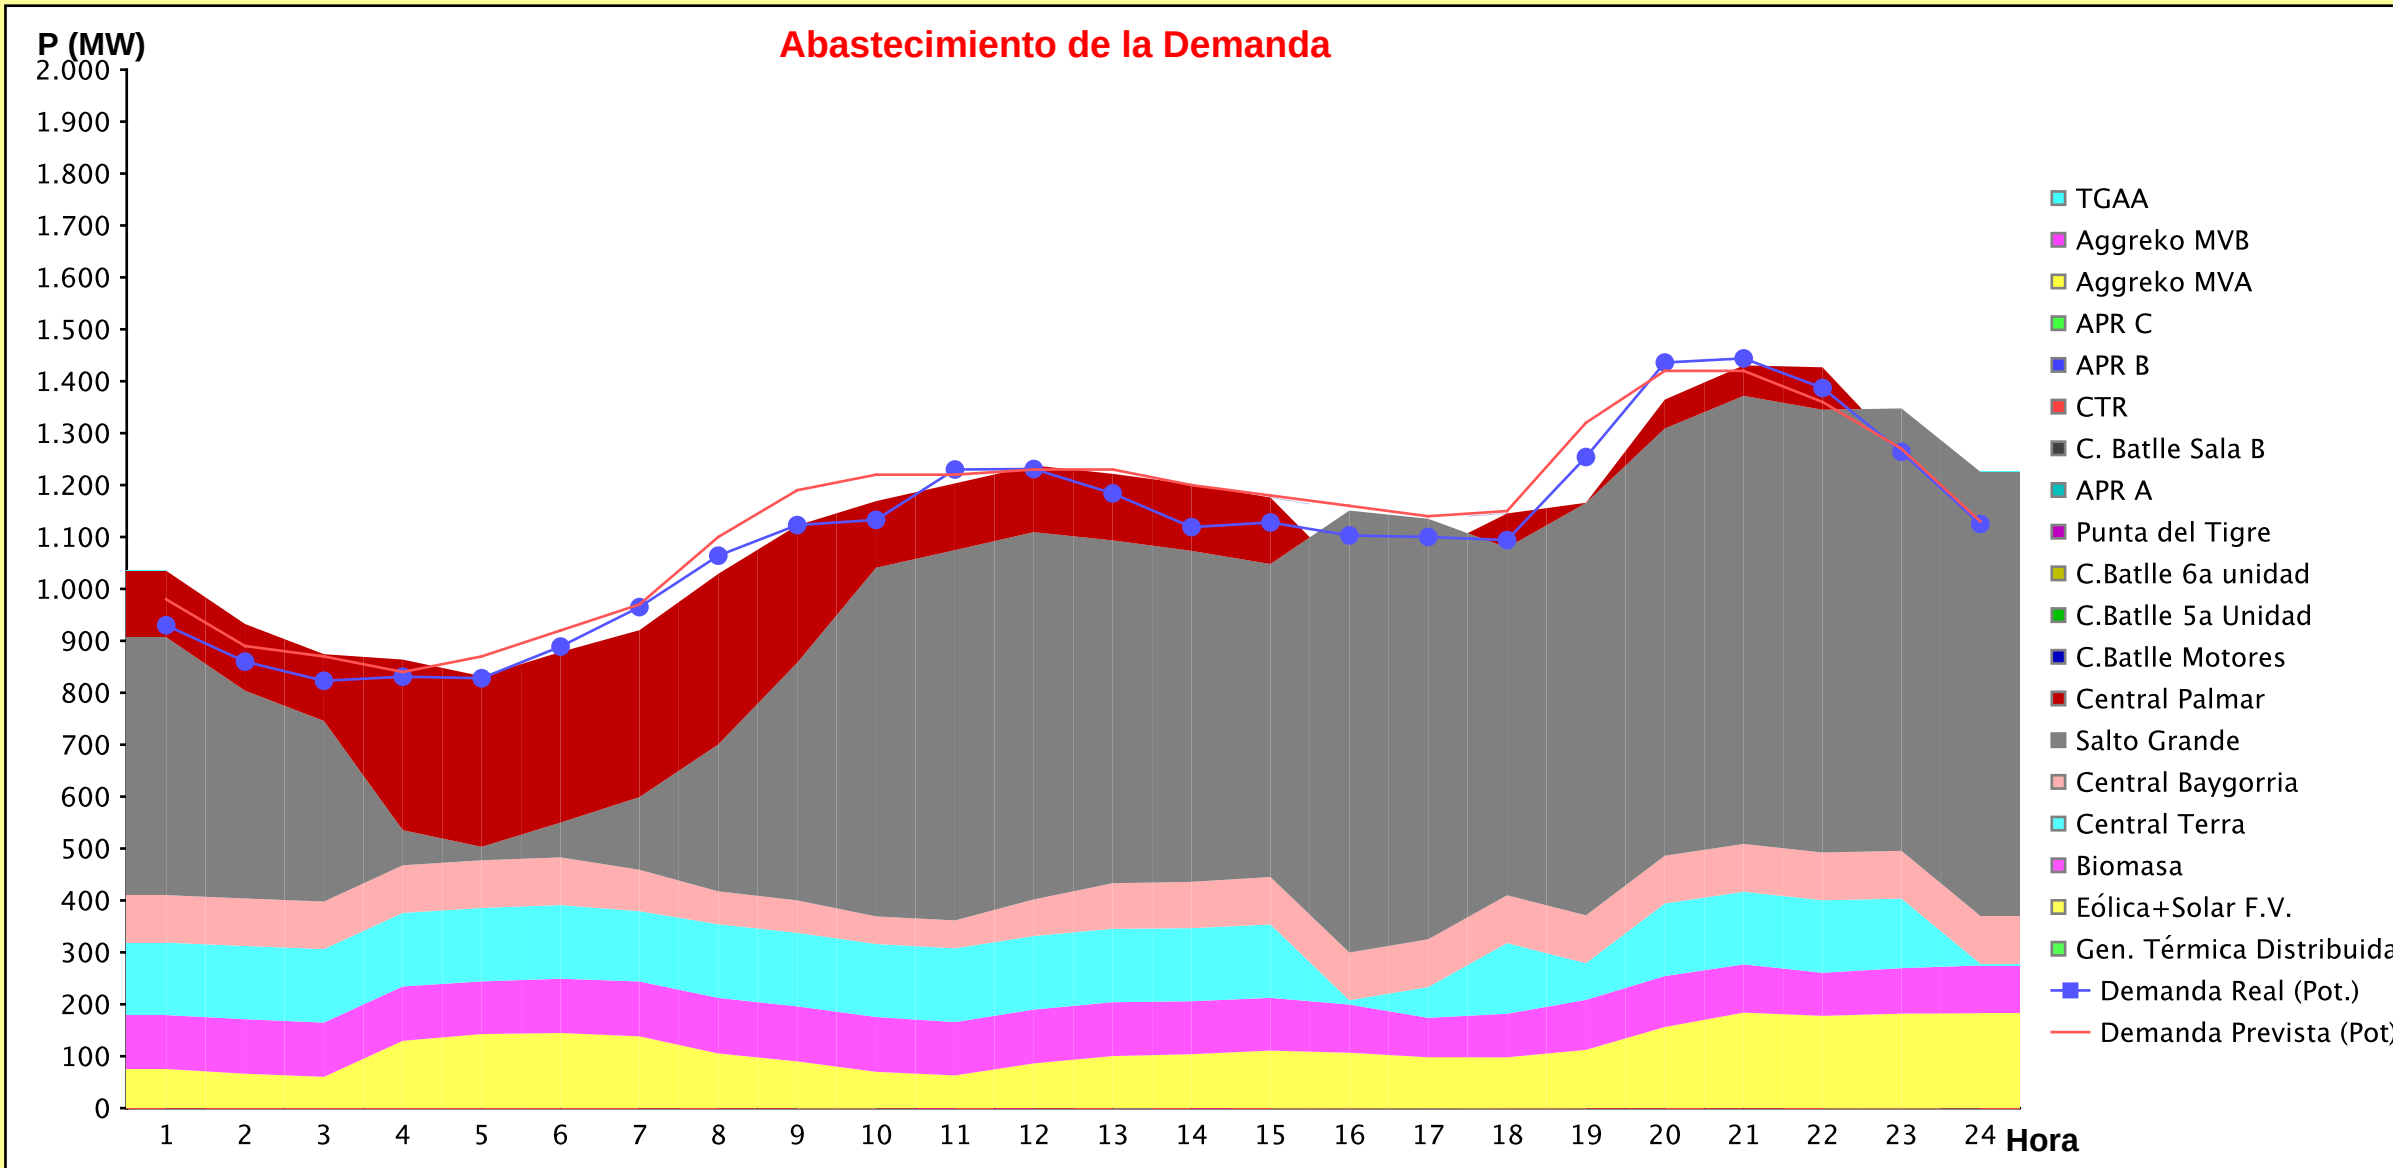



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1222,7 Hora 12:40
Potencia mínima:	661,87 Hora 04:01
Pico noche:	1458,85 Hora 21:00

Generación Media (MW)	
Eólica	116,7
Biomasa	98,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

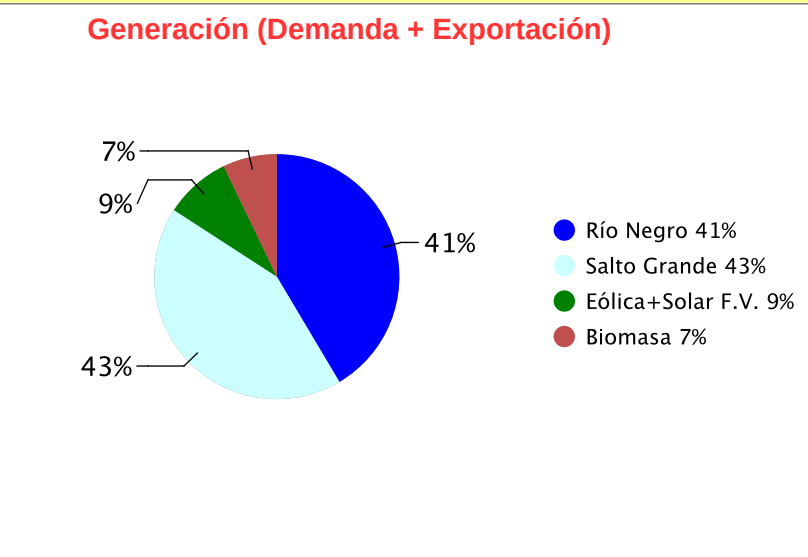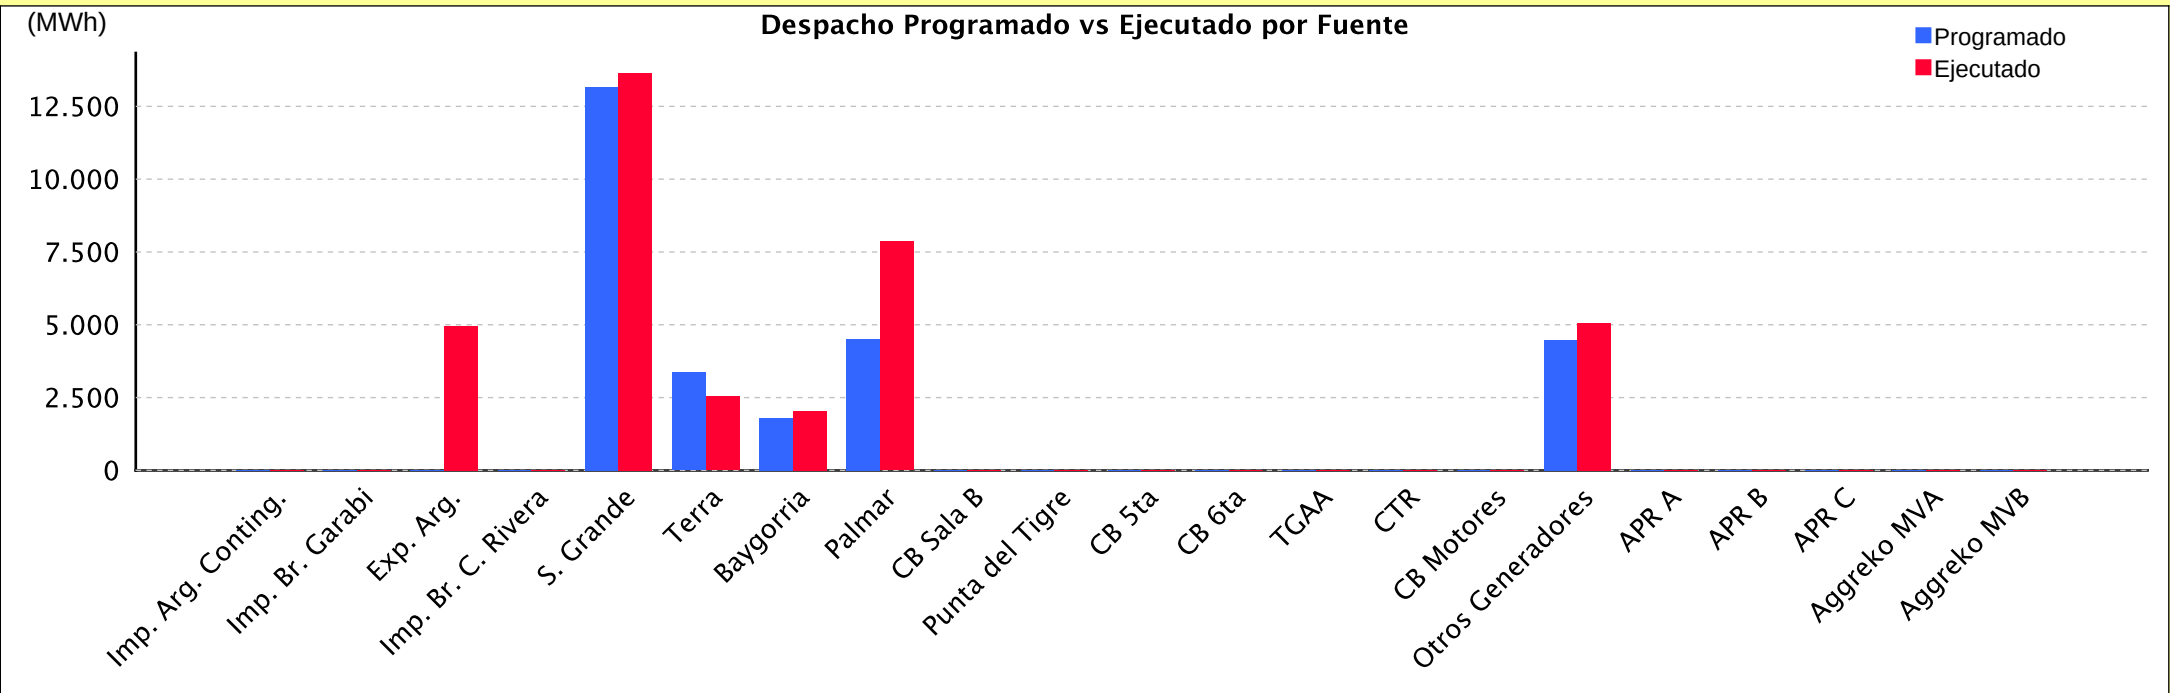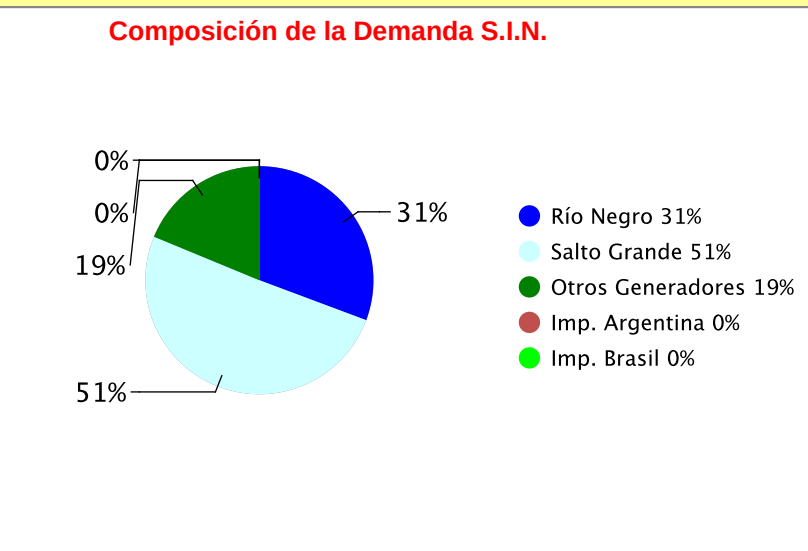



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

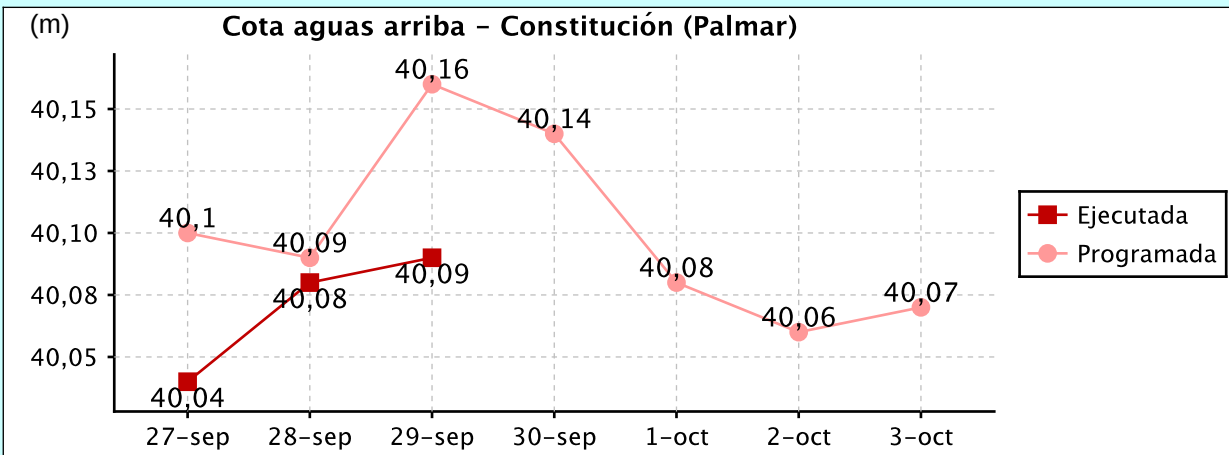
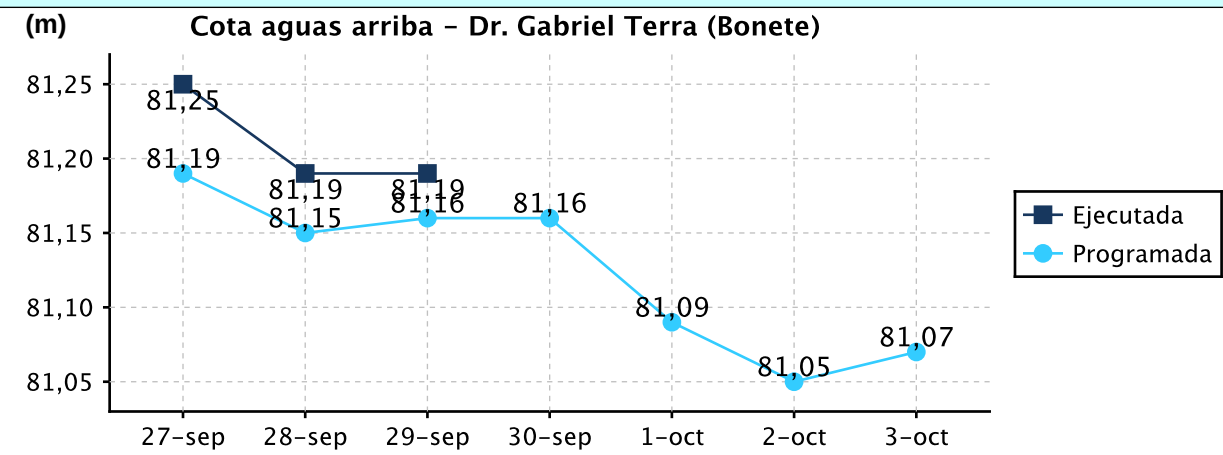


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,16	81,19
Baygorria	54,27	54,23
Palmar	40,16	40,09
SGU	35,47	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

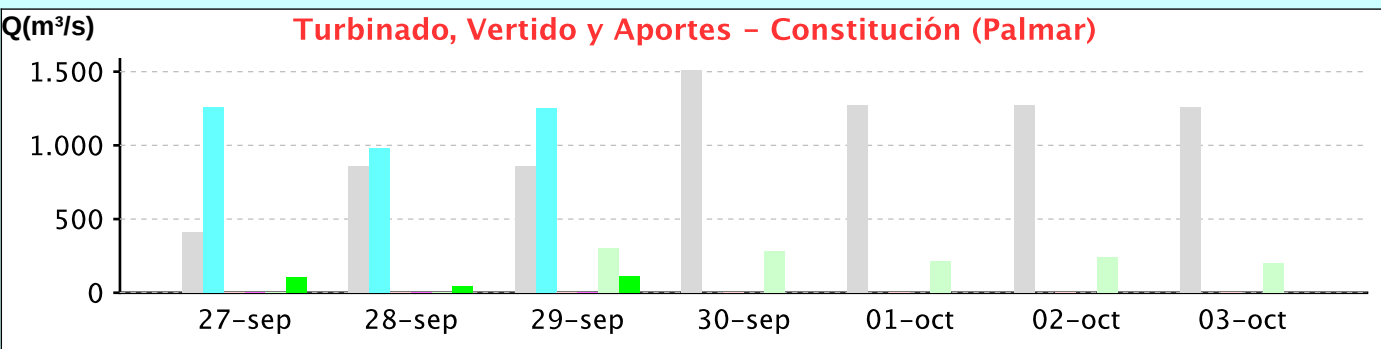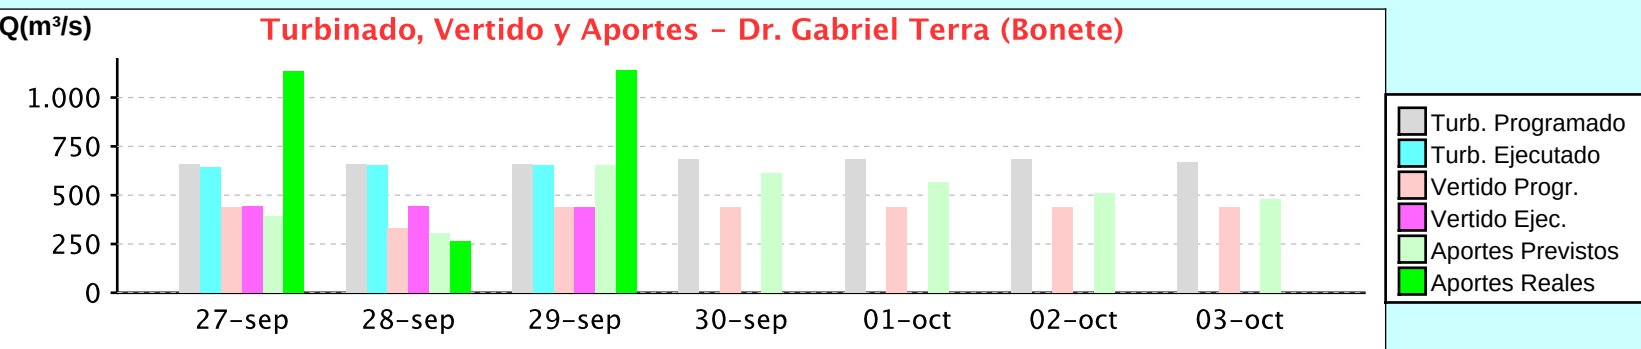

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

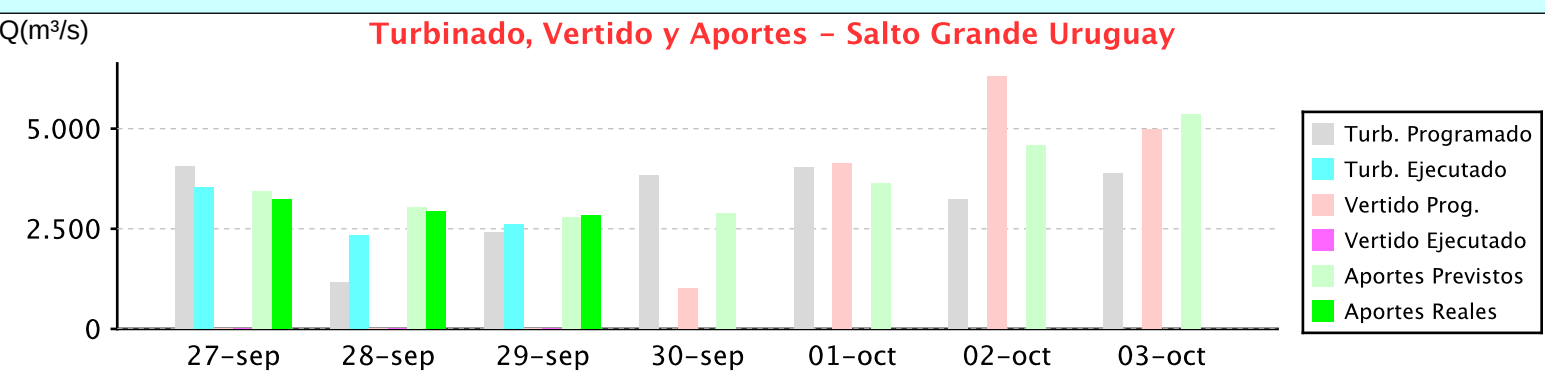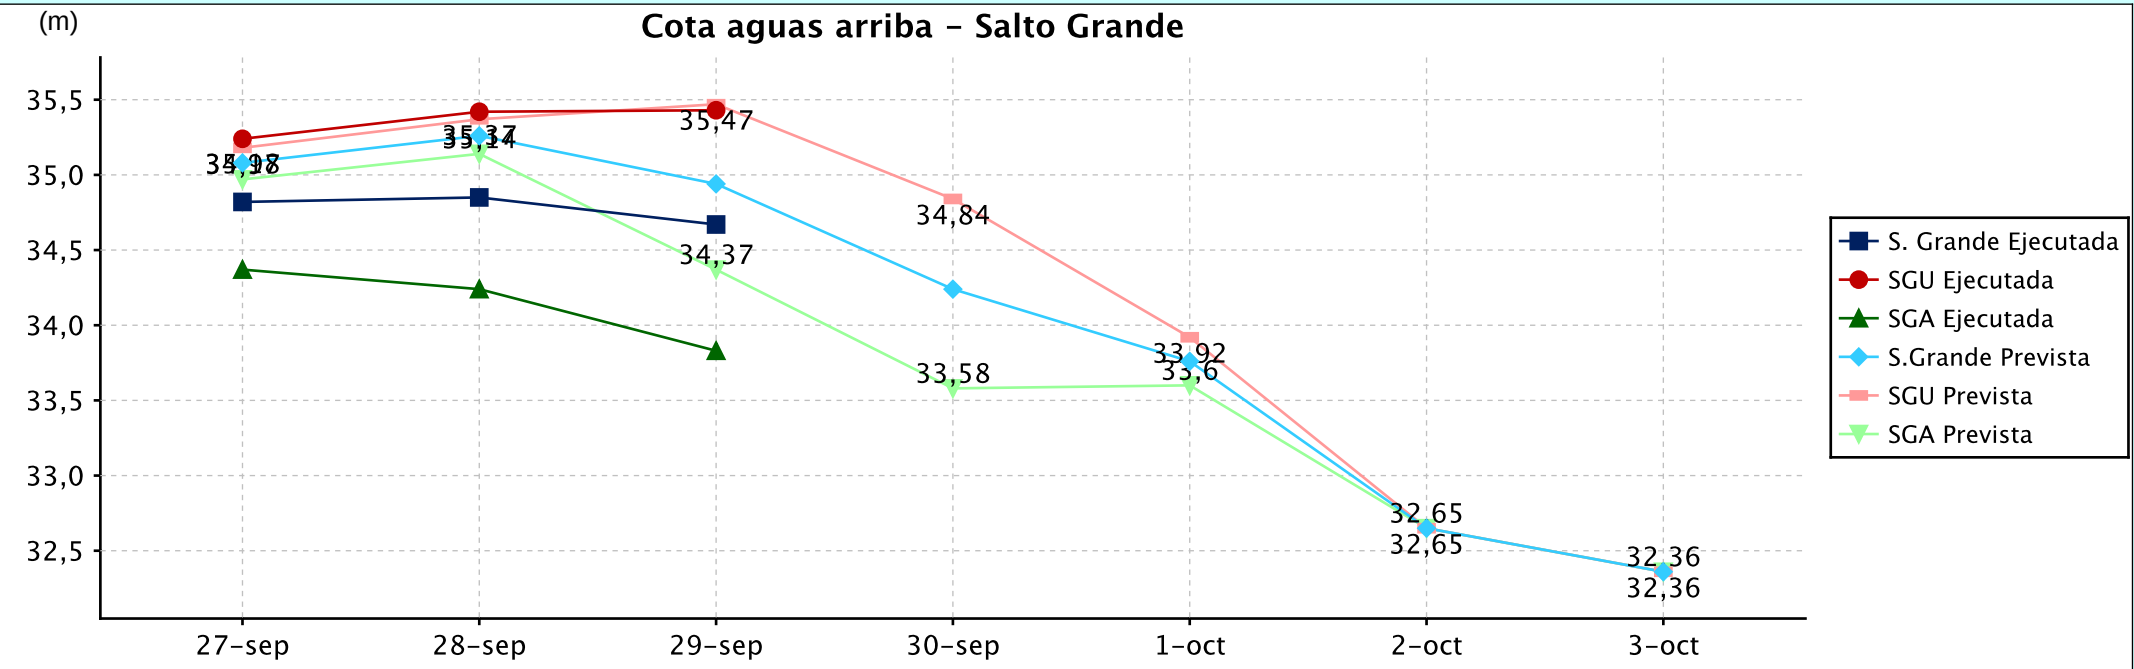

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	33,83
Cota real	34,67
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
36.108	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	660	652
Baygorria	706	747
Palmar	857	1.254
SGU	2.413	2.604

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	655	1.139
Baygorria	270	197
Palmar	300	110
SGU	2.775	2.830

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	439
Baygorria	395	452
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 207 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
