



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 02 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.342
C. Baygorria	2.233
C. Palmar	7.879
C. Salto Grande	17.514
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.249
TOTAL Generación	37.162

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.665
Hidráulica	8.665
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.665



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.497
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.850
Diferencia (MWh)	647
Ejecutada - Programada	2,32 %

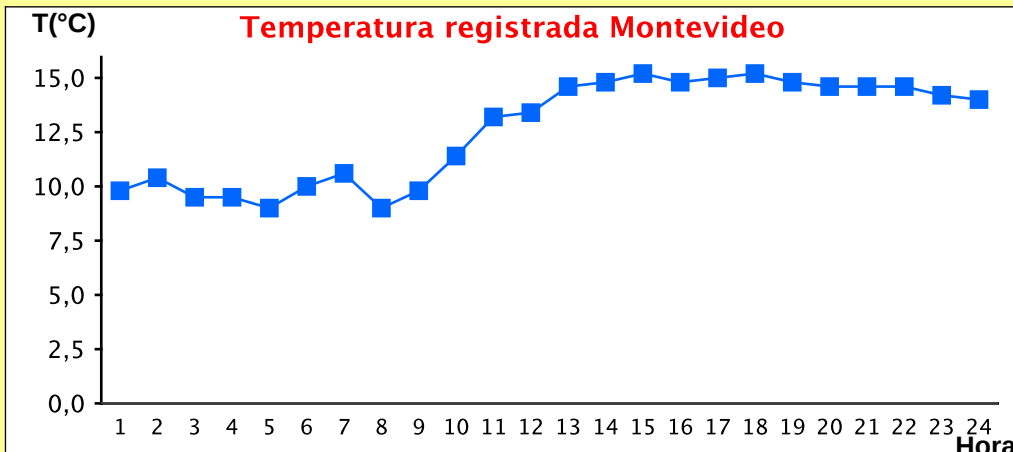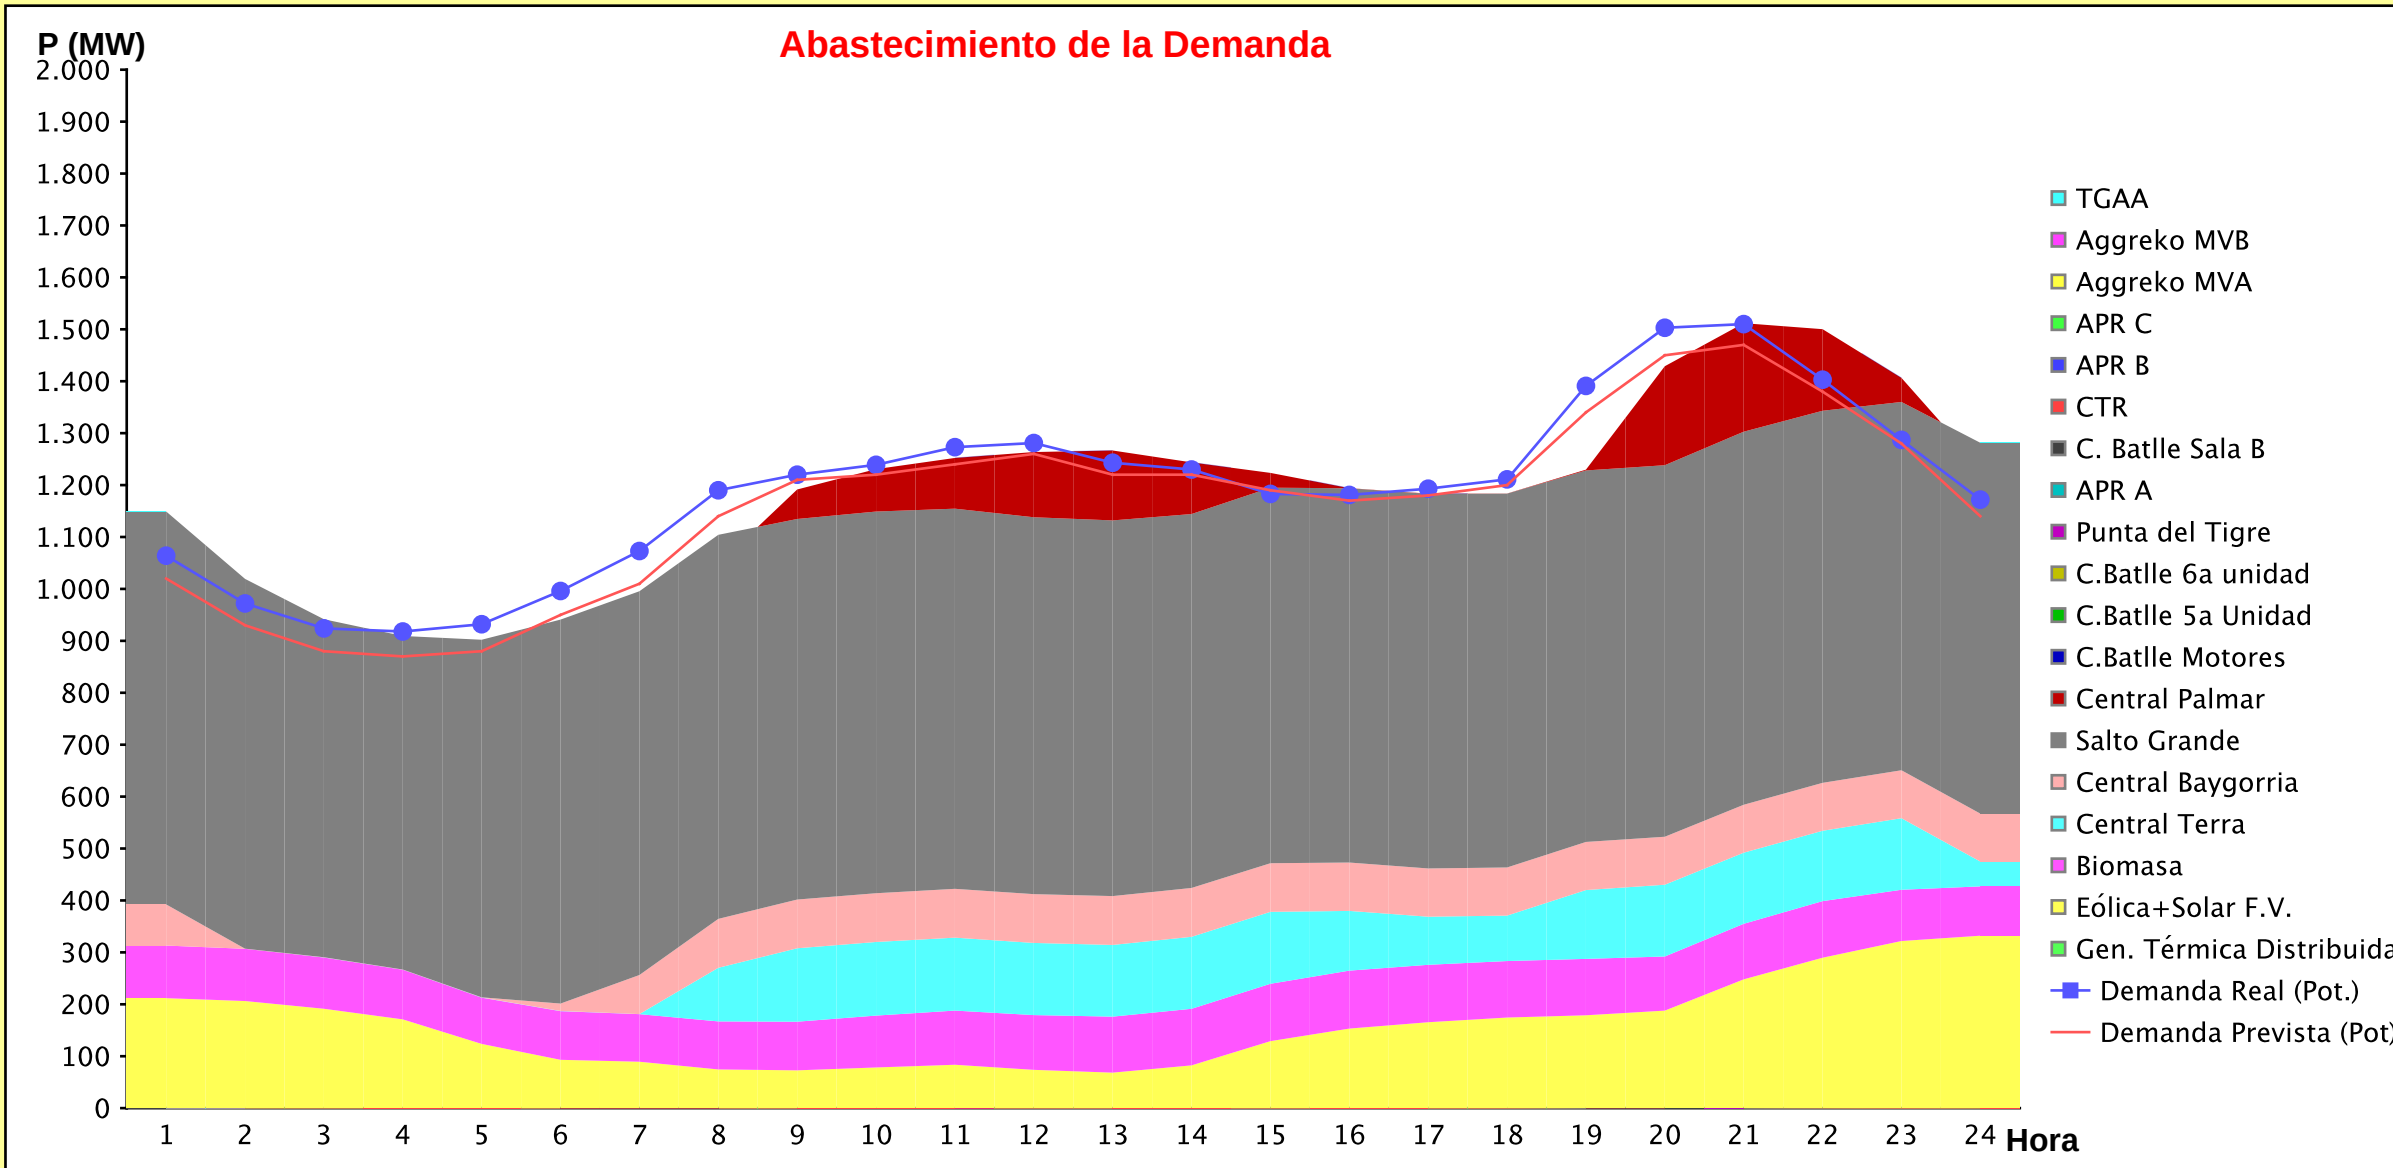


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313,97 Hora 11:50
Potencia mínima:	898,55 Hora 03:43
Pico noche:	1573,2 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	158,8
Biomasa	102,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

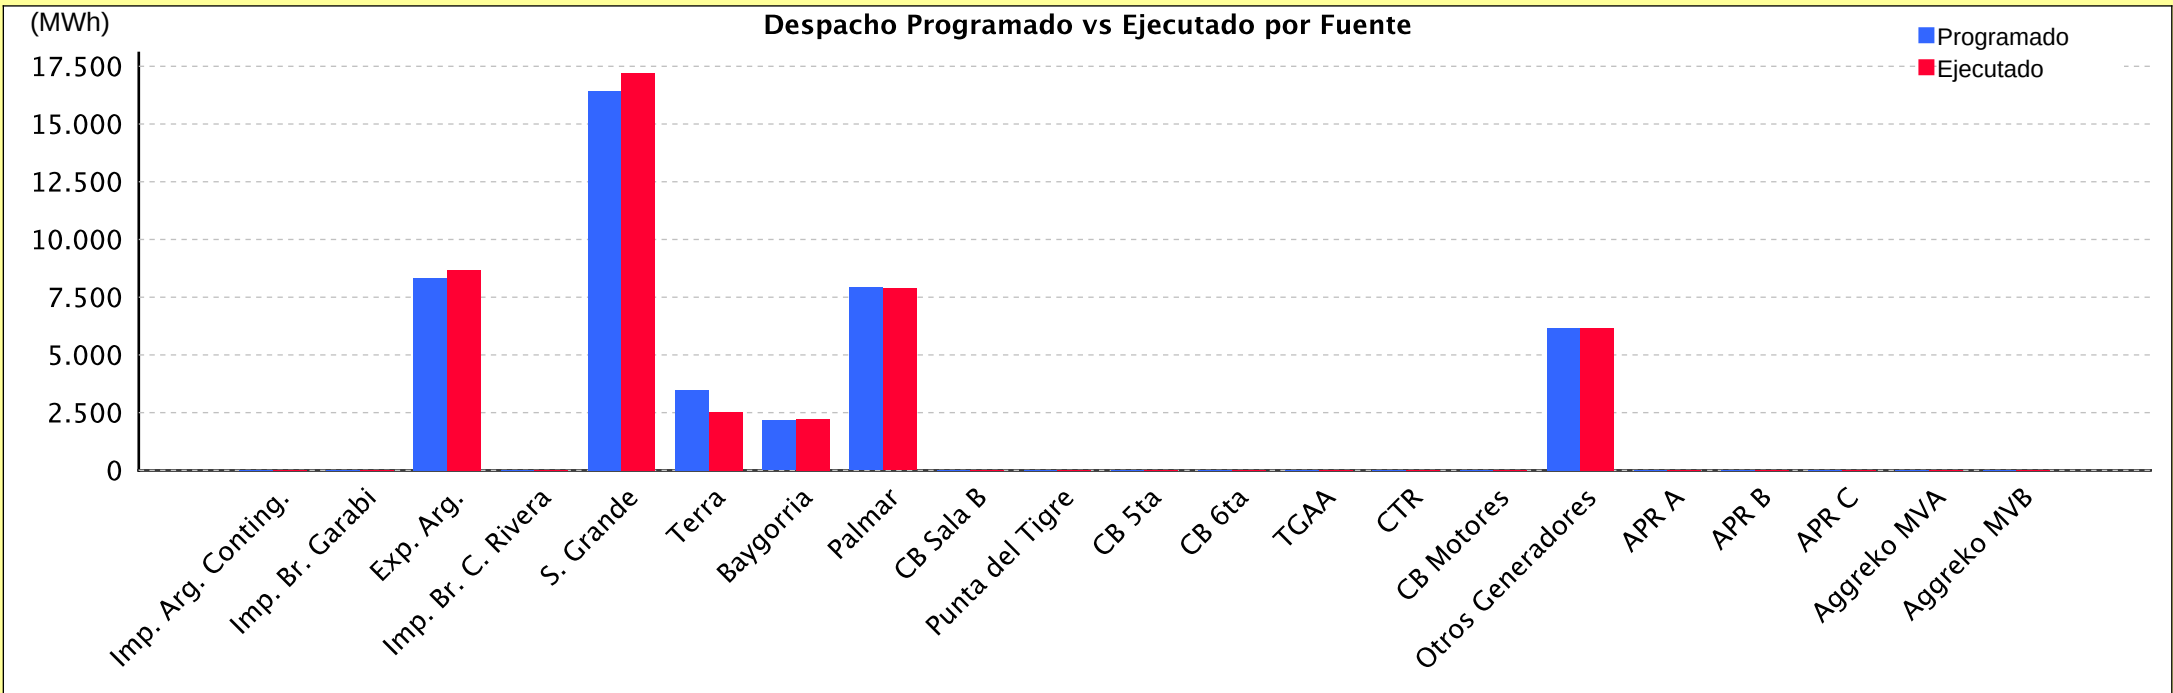
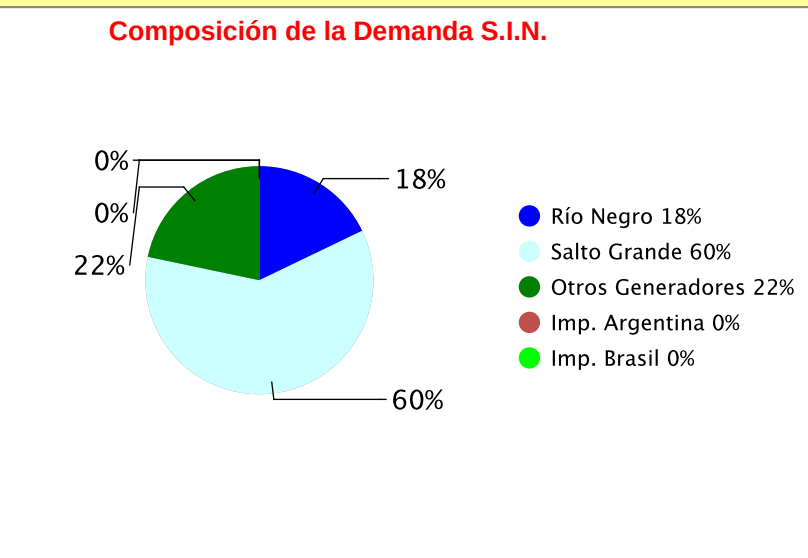


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

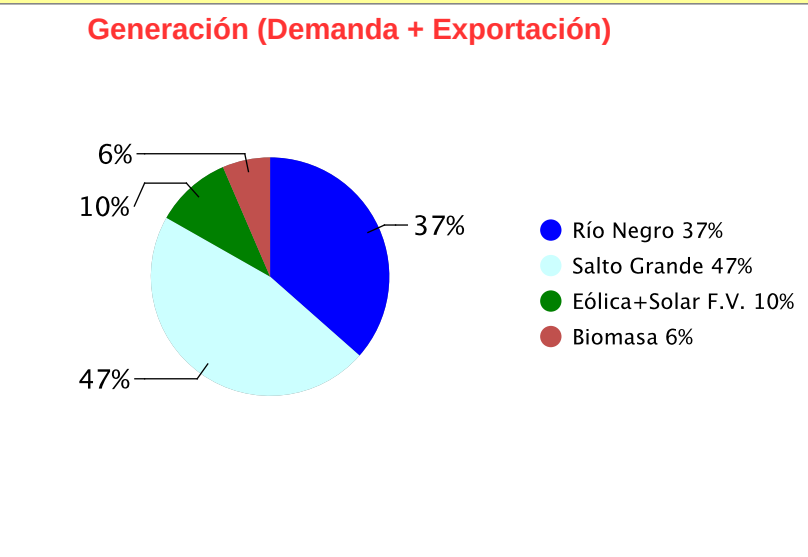



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

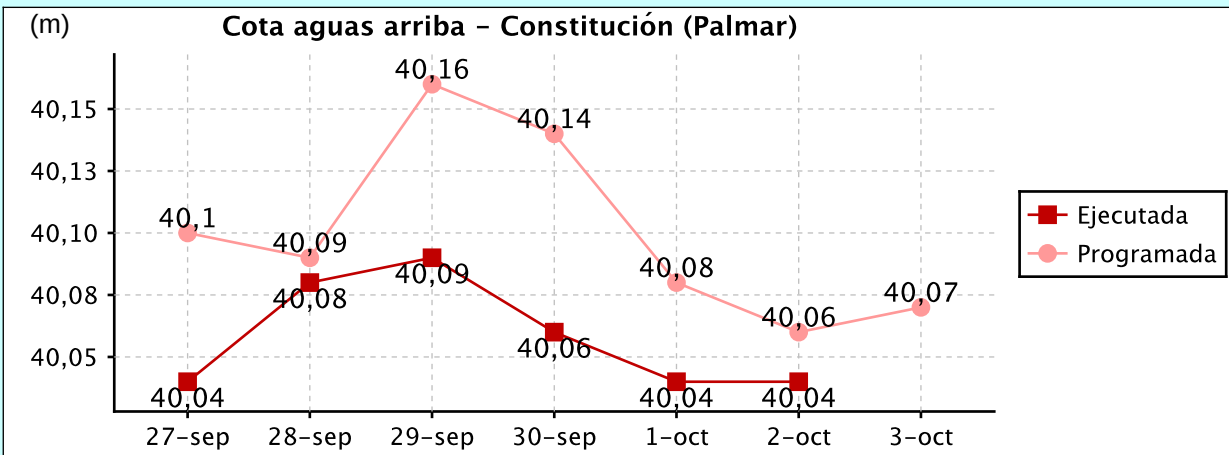
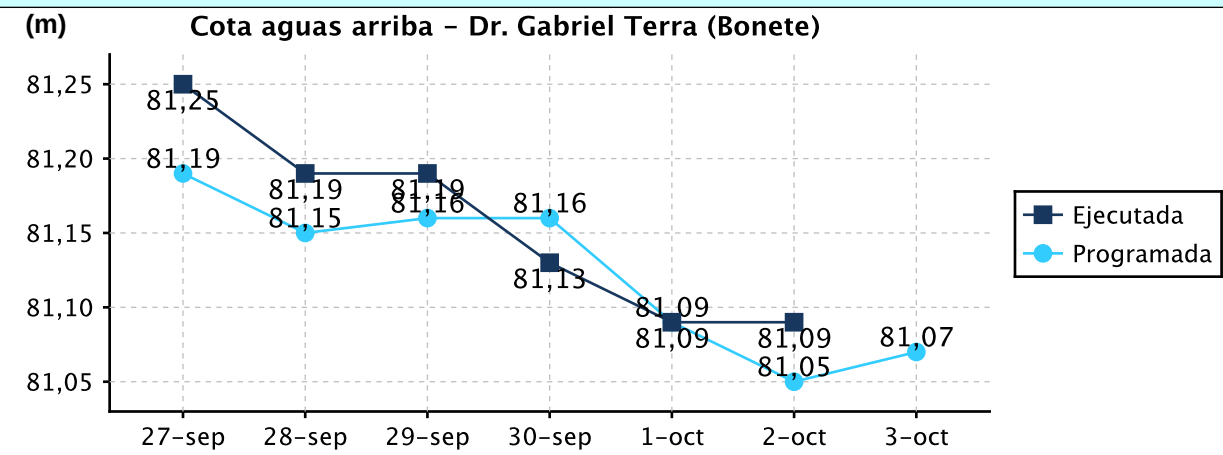


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,05	81,09
Baygorria	54,30	54,3
Palmar	40,06	40,04
SGU	32,65	32,65

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

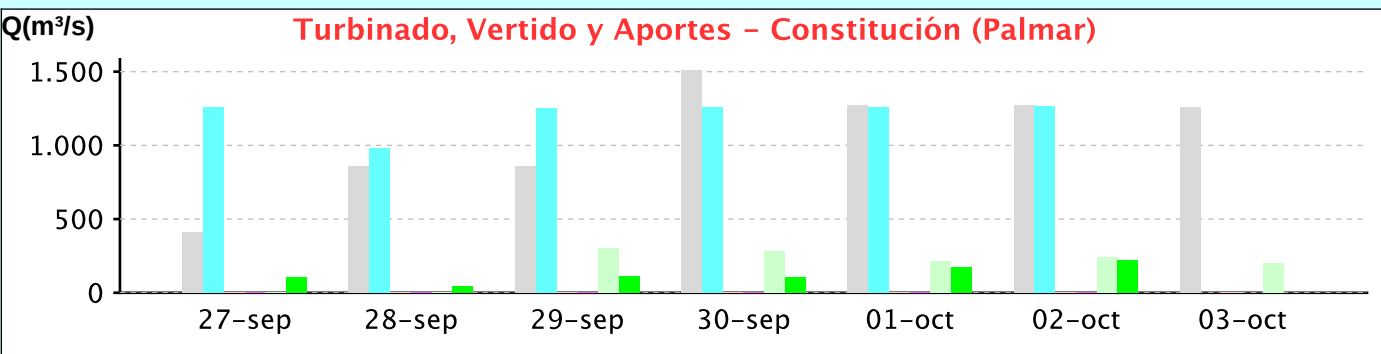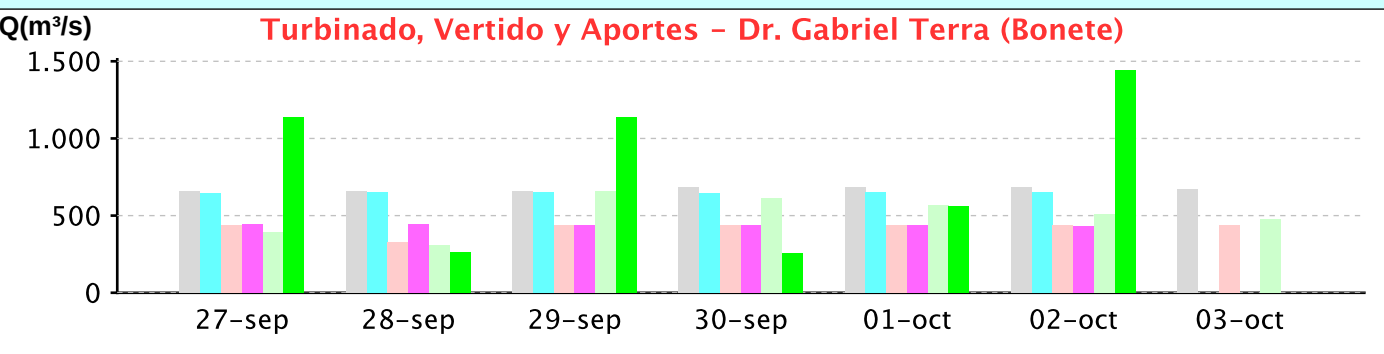

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

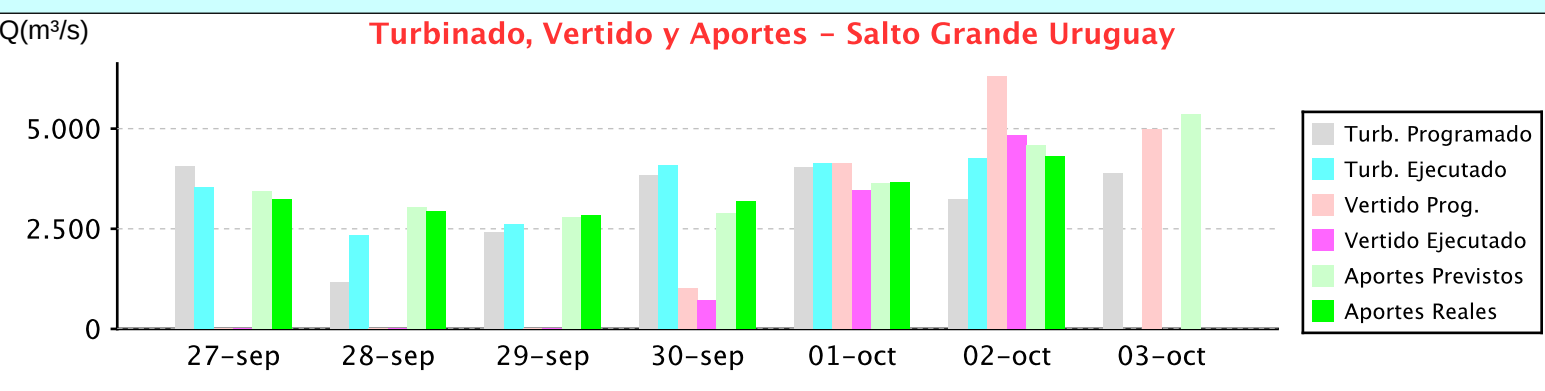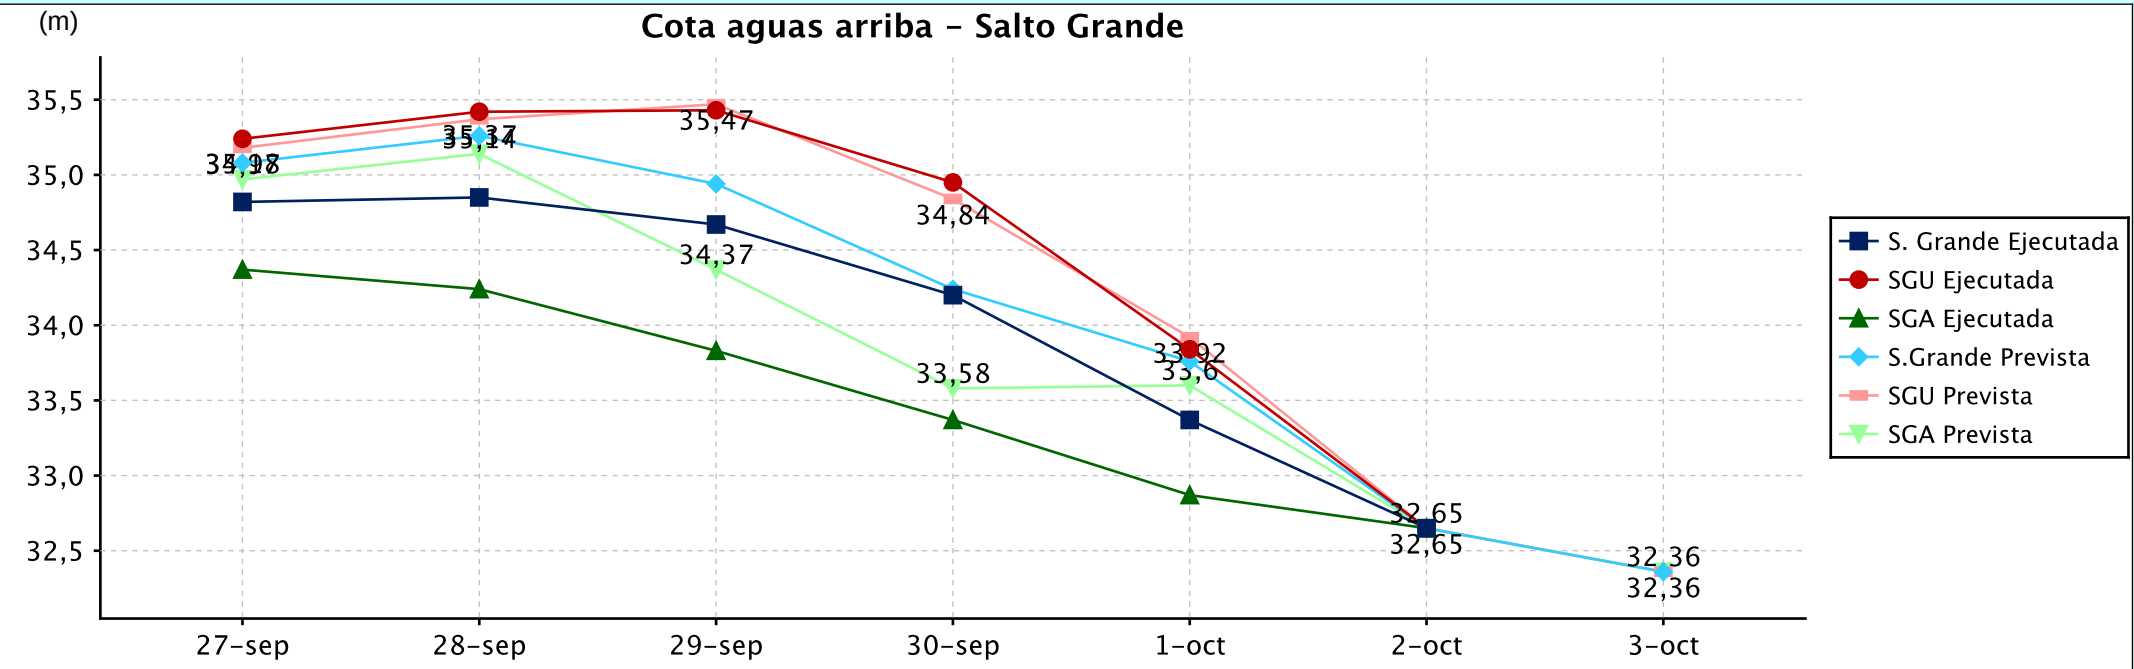

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,65
Cota Vista Arg	32,65
Cota real	32,65
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	650
Baygorria	850	812
Palmar	1.273	1.265
SGU	3.222	4.254

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	1.441
Baygorria	0	32
Palmar	238	219
SGU	4.575	4.304

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	434
Baygorria	300	328
Palmar	0	0
SGU	6.312	4.842

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 361 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
