




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 03 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.340
C. Baygorria	2.195
C. Palmar	7.756
C. Salto Grande	16.901
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.036
TOTAL Generación	39.174



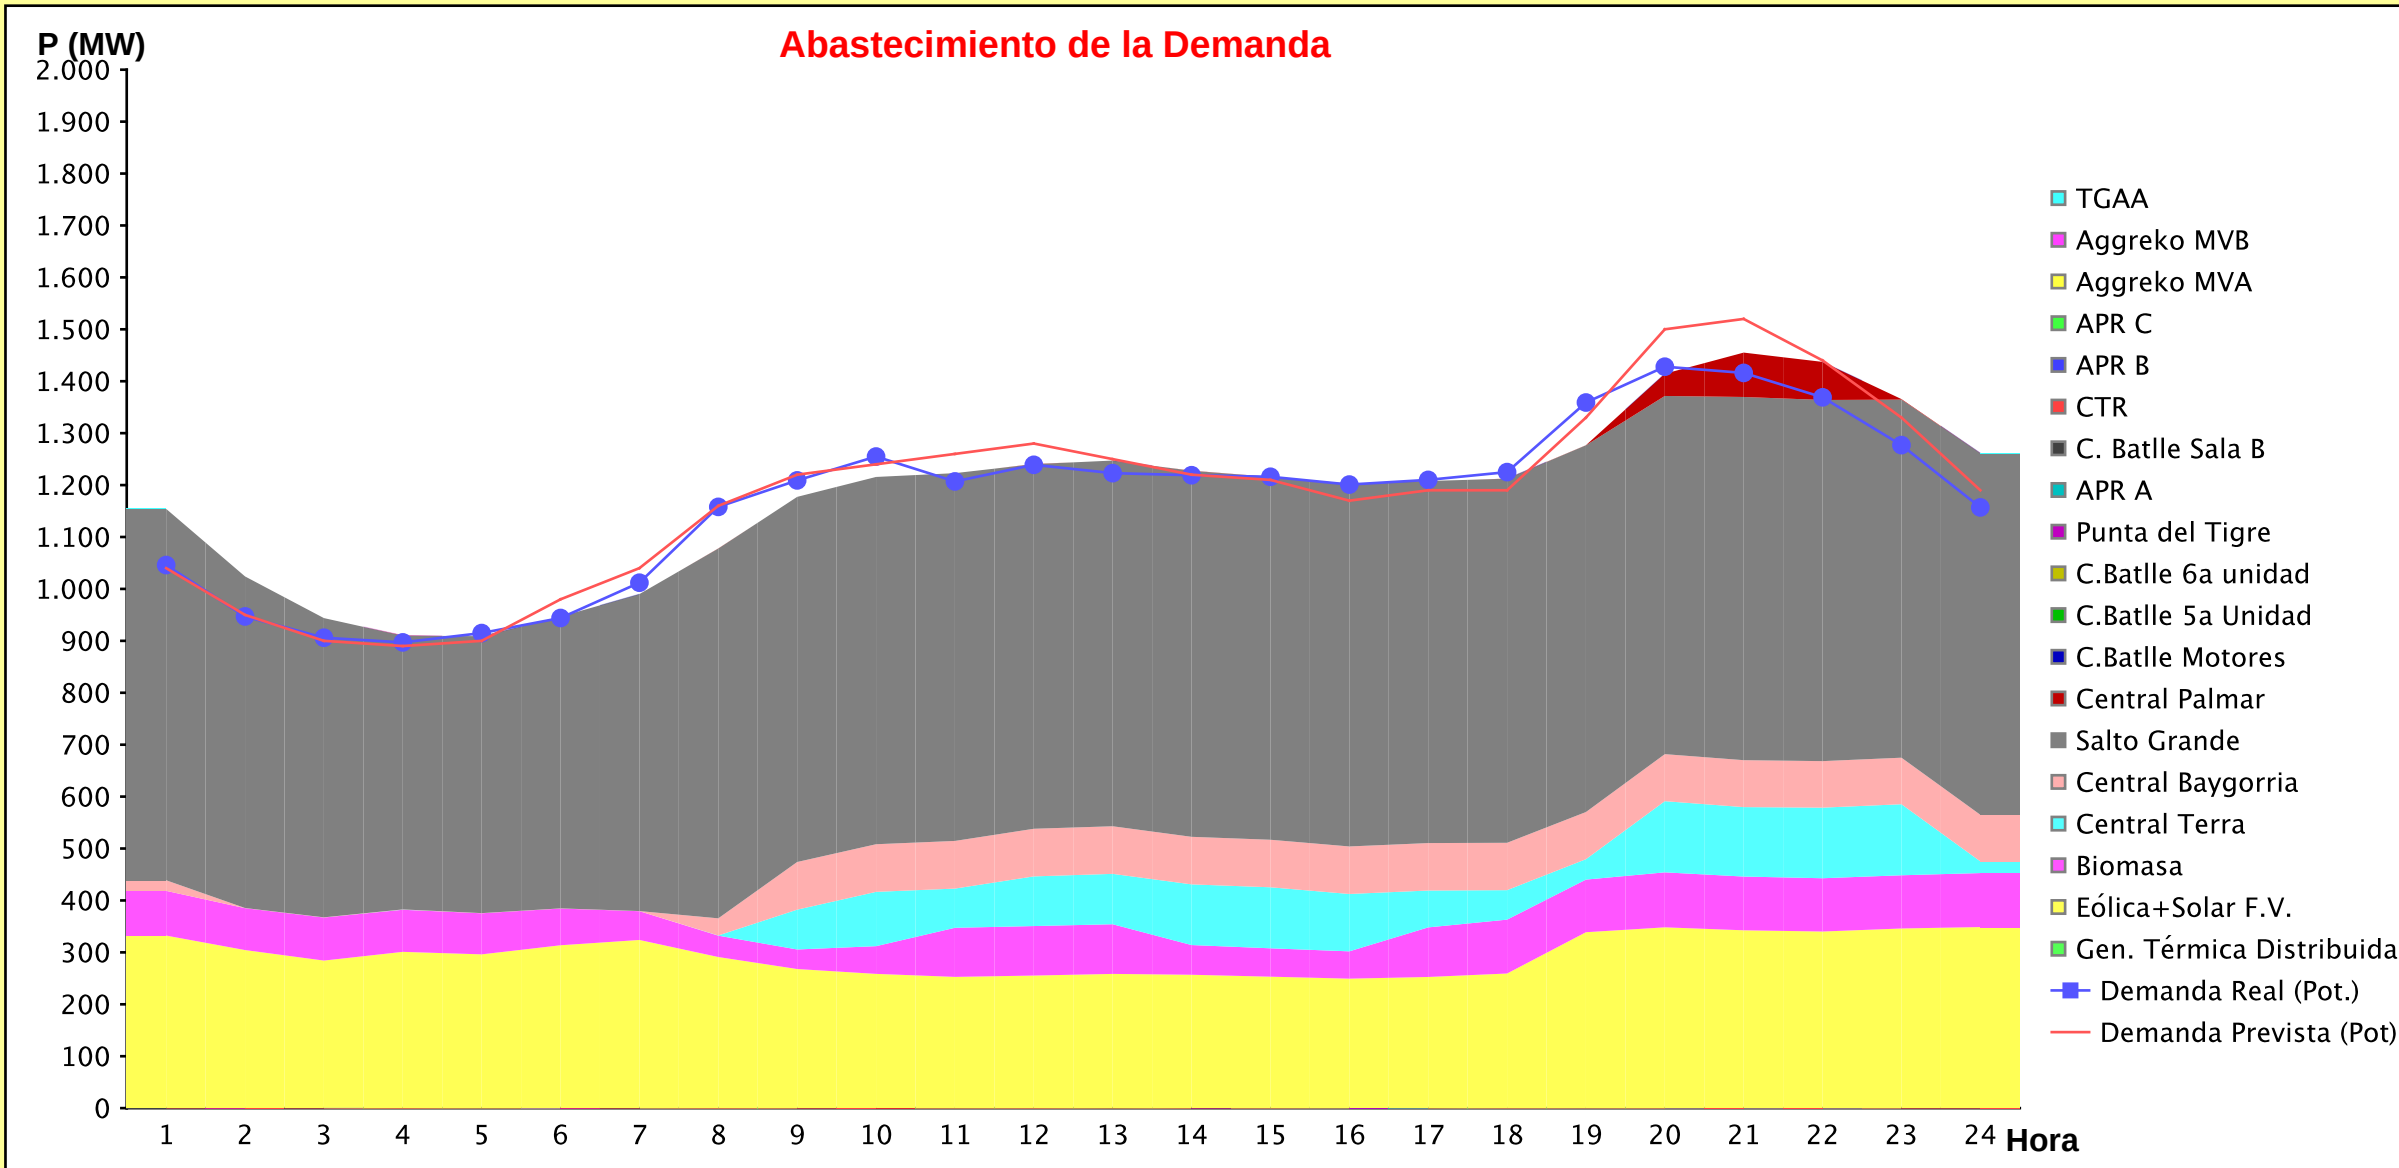


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	10.872
Hidráulica	10.872
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	10.872

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.302
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.400
Diferencia (MWh)	-98
Ejecutada - Programada	-0,35 %


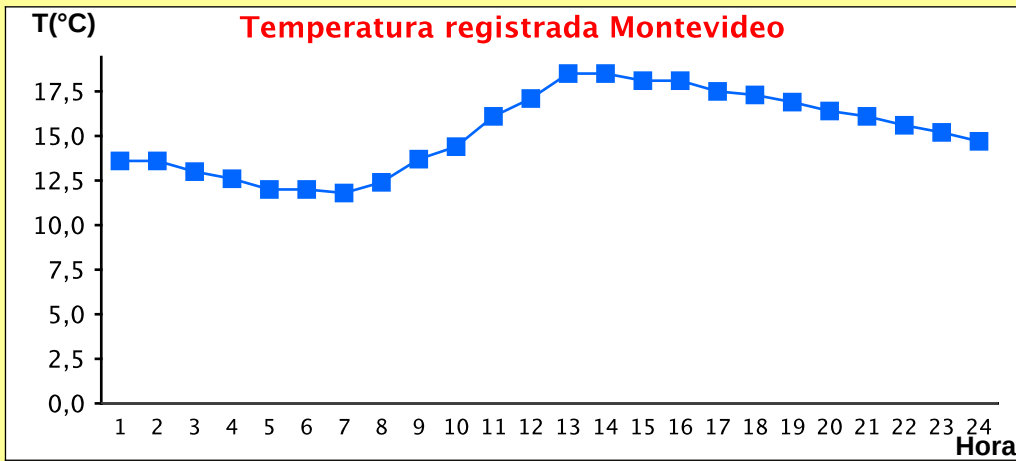


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1265,57 Hora 13:12
Potencia mínima:	924,19 Hora 03:48
Pico noche:	1503 Hora 20:31
Generación Media (MW)	
Eólica	294,9
Biomasa	81,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

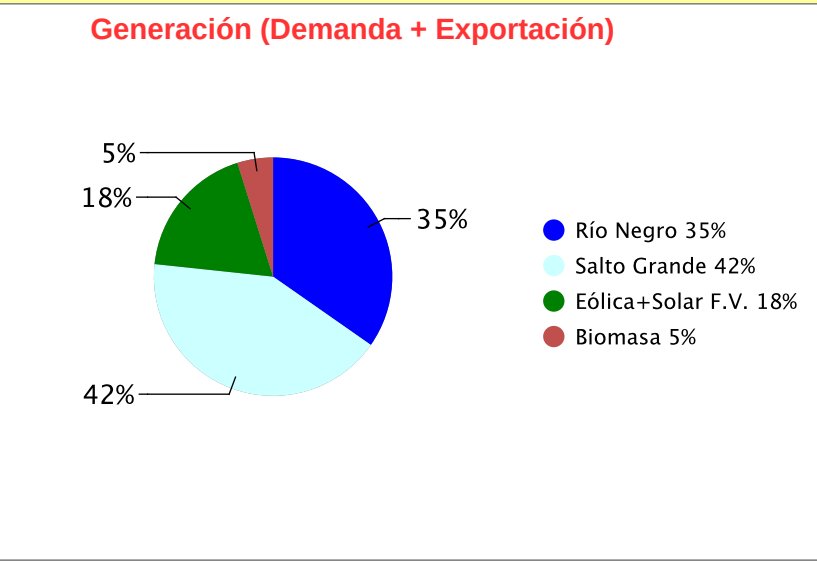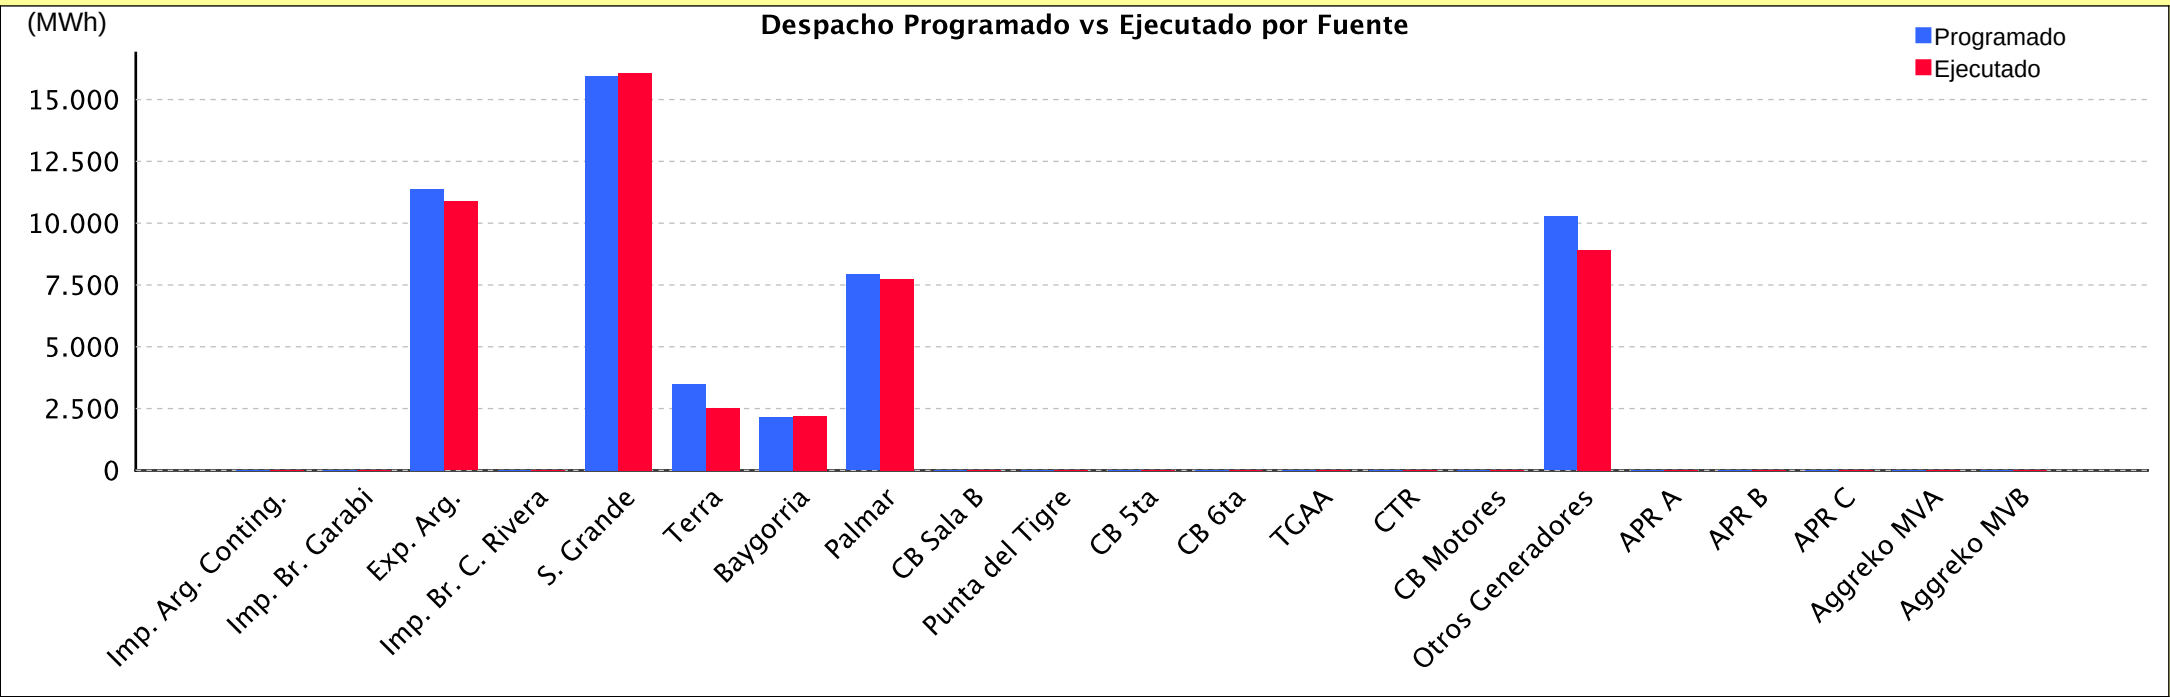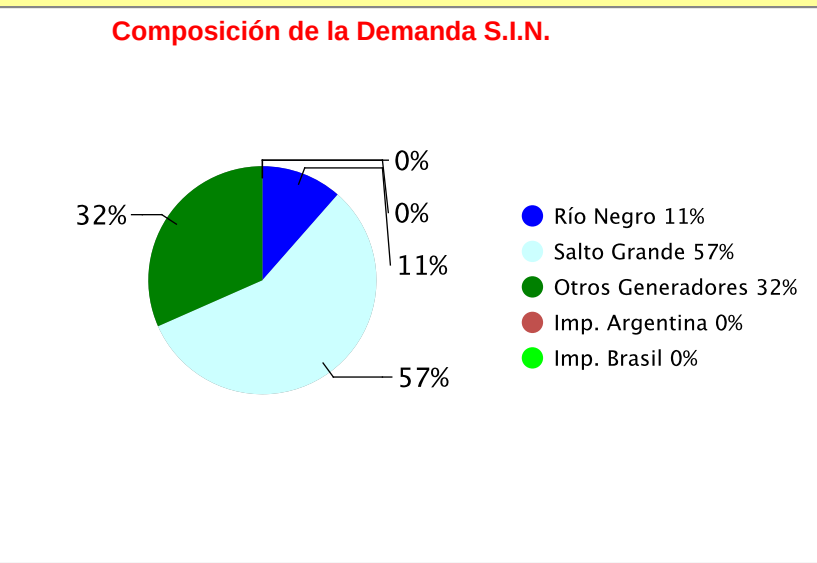



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

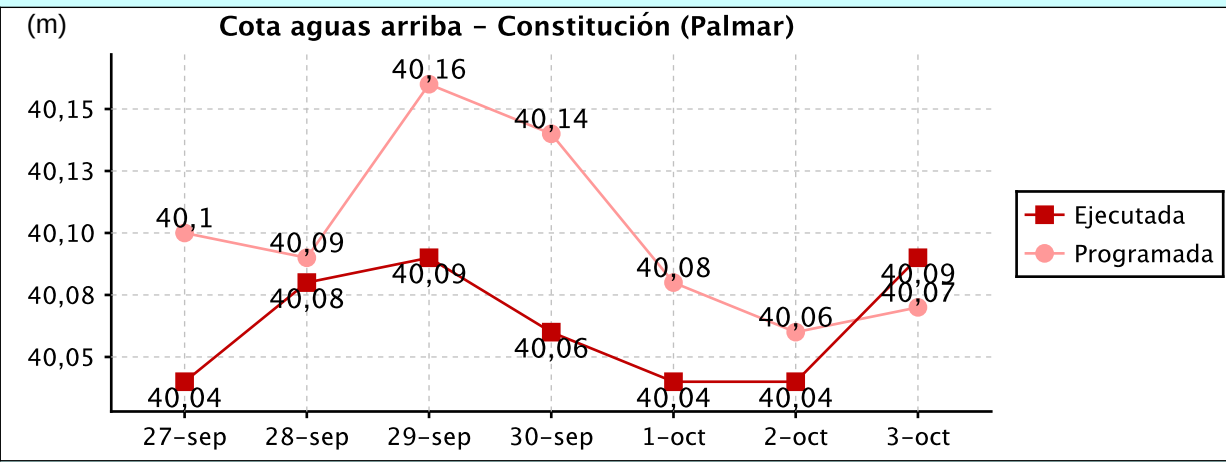
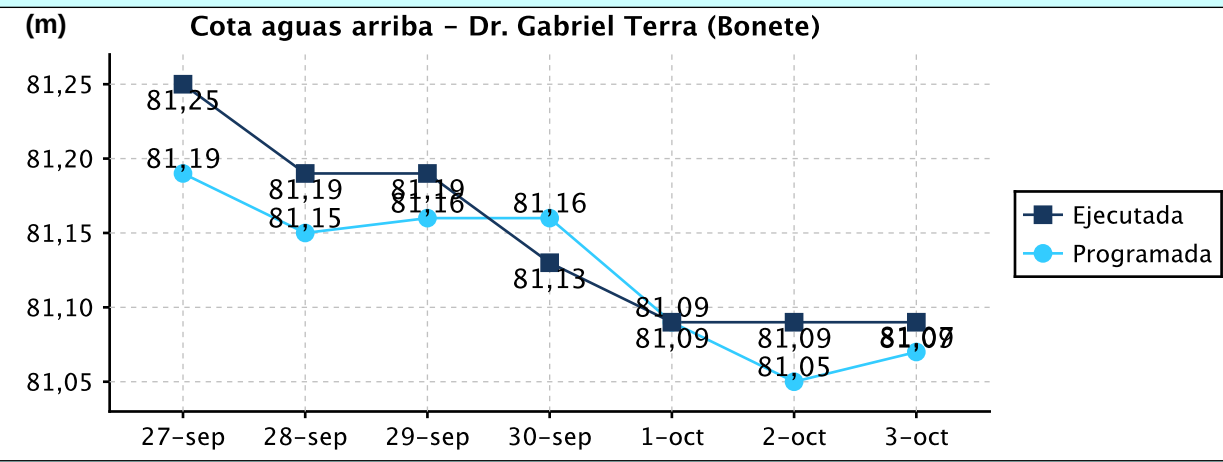


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,07	81,09
Baygorria	54,27	54,16
Palmar	40,07	40,09
SGU	32,36	32,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

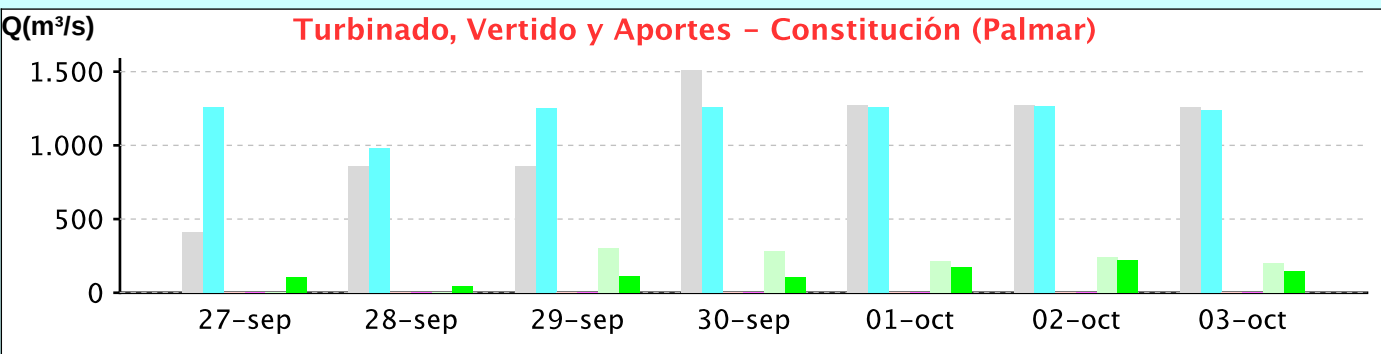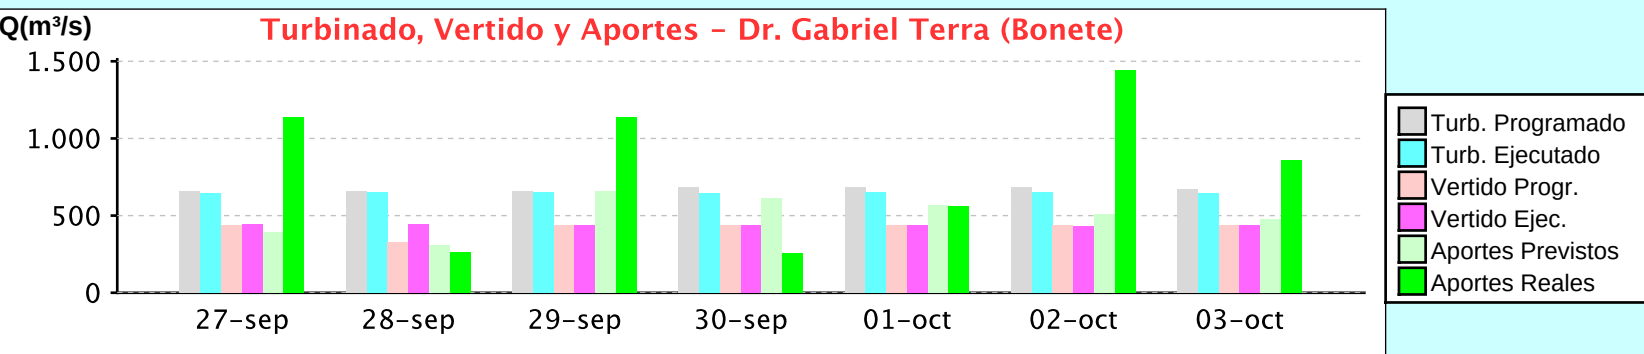

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

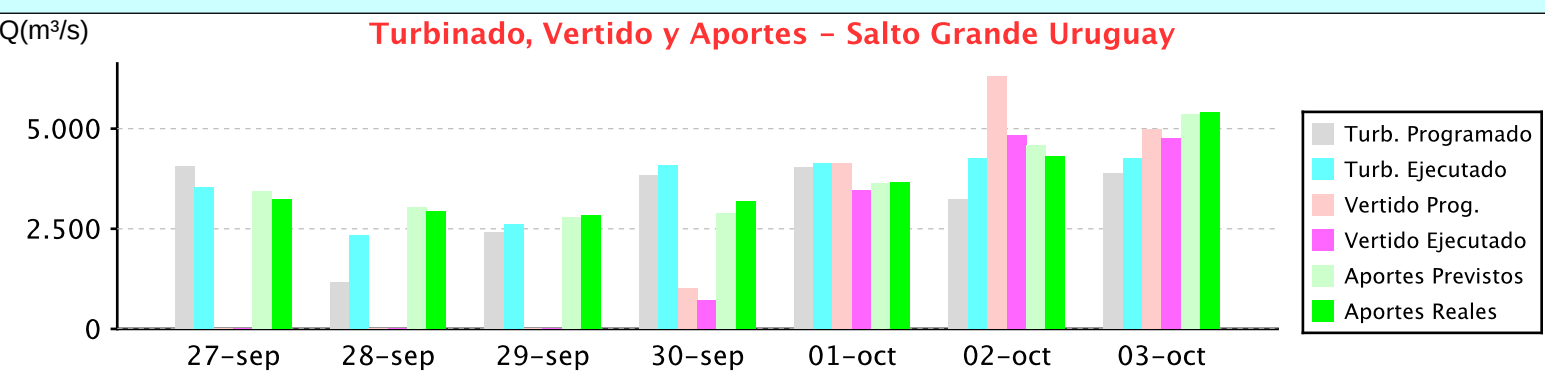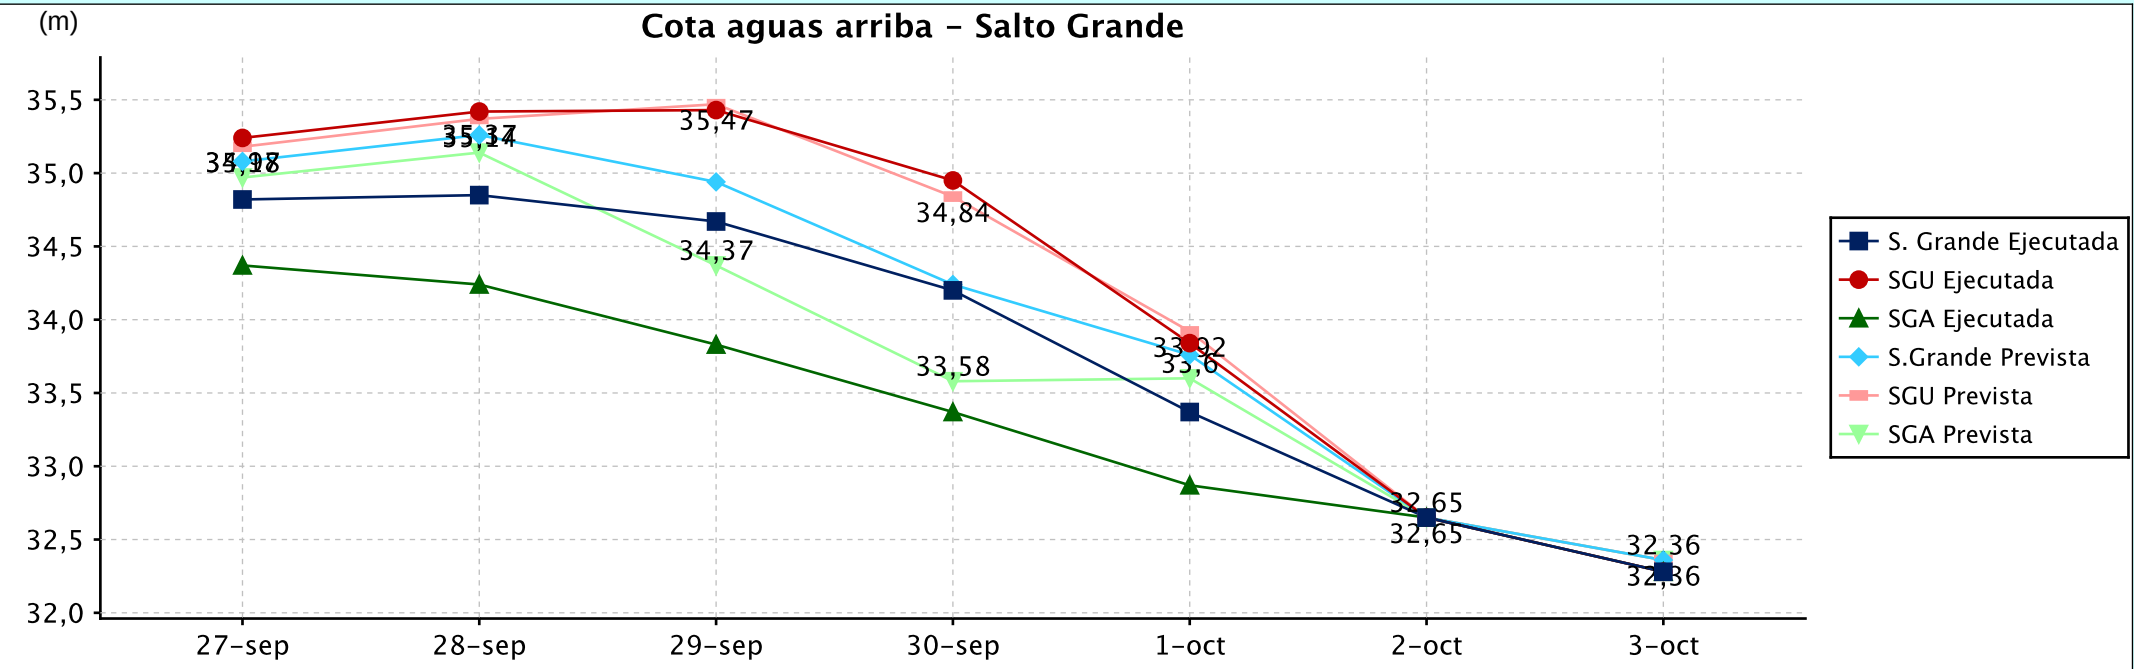

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,28
Cota Vista Arg	32,28
Cota real	32,28
Dif. Energ. (U-A)	0
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	647
Baygorria	794	810
Palmar	1.260	1.236
SGU	3.876	4.247

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	479	859
Baygorria	0	-3
Palmar	197	147
SGU	5.350	5.414

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	435
Baygorria	300	397
Palmar	0	0
SGU	4.989	4.763

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 453 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
