



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 14 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-4
Central P. del Tigre	-3
APR A	177
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.496
C. Baygorria	2.177
C. Palmar	7.879
C. Salto Grande	17.849
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.116
TOTAL Generación	33.678

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.726
Hidráulica	6.726
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.726



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.952
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.820
Diferencia (MWh)	-868
Ejecutada - Programada	-3,12 %

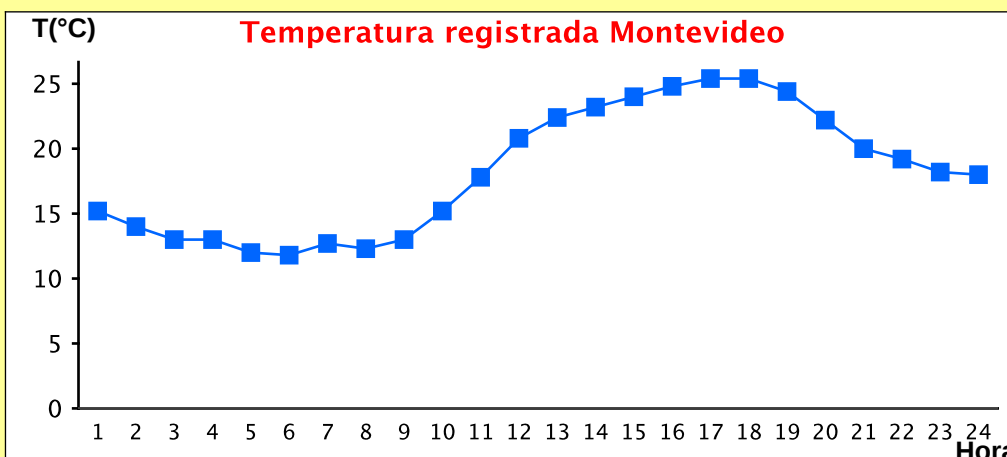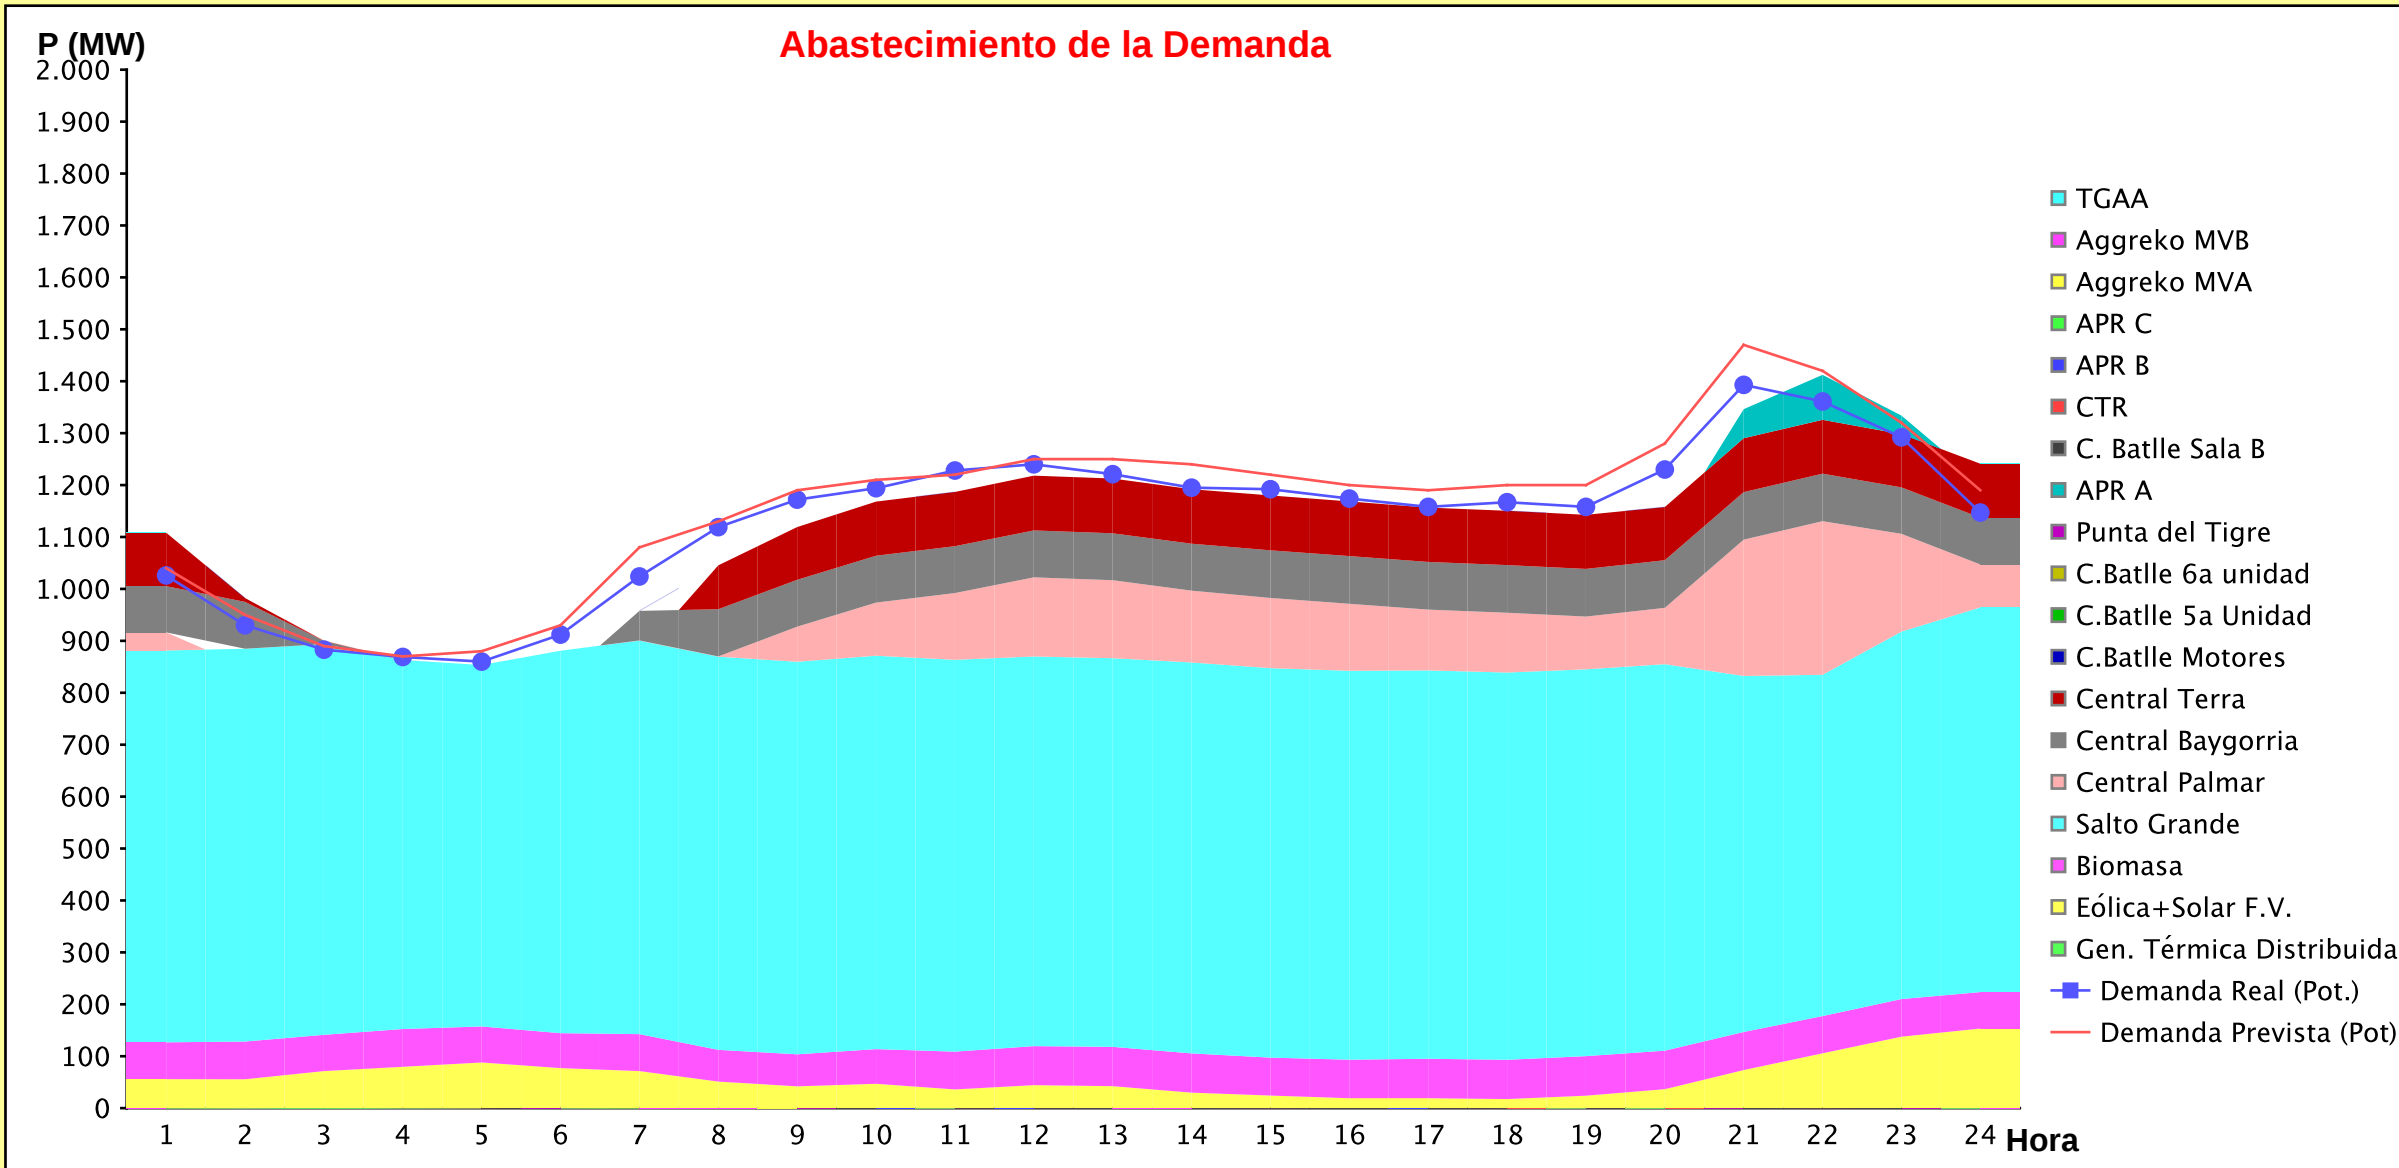


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1256,64 Hora 11:38
Potencia mínima:	845,81 Hora 04:16
Pico noche:	1413,43 Hora 21:14

Generación Media (MW)	
Eólica	59,3
Biomasa	82,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

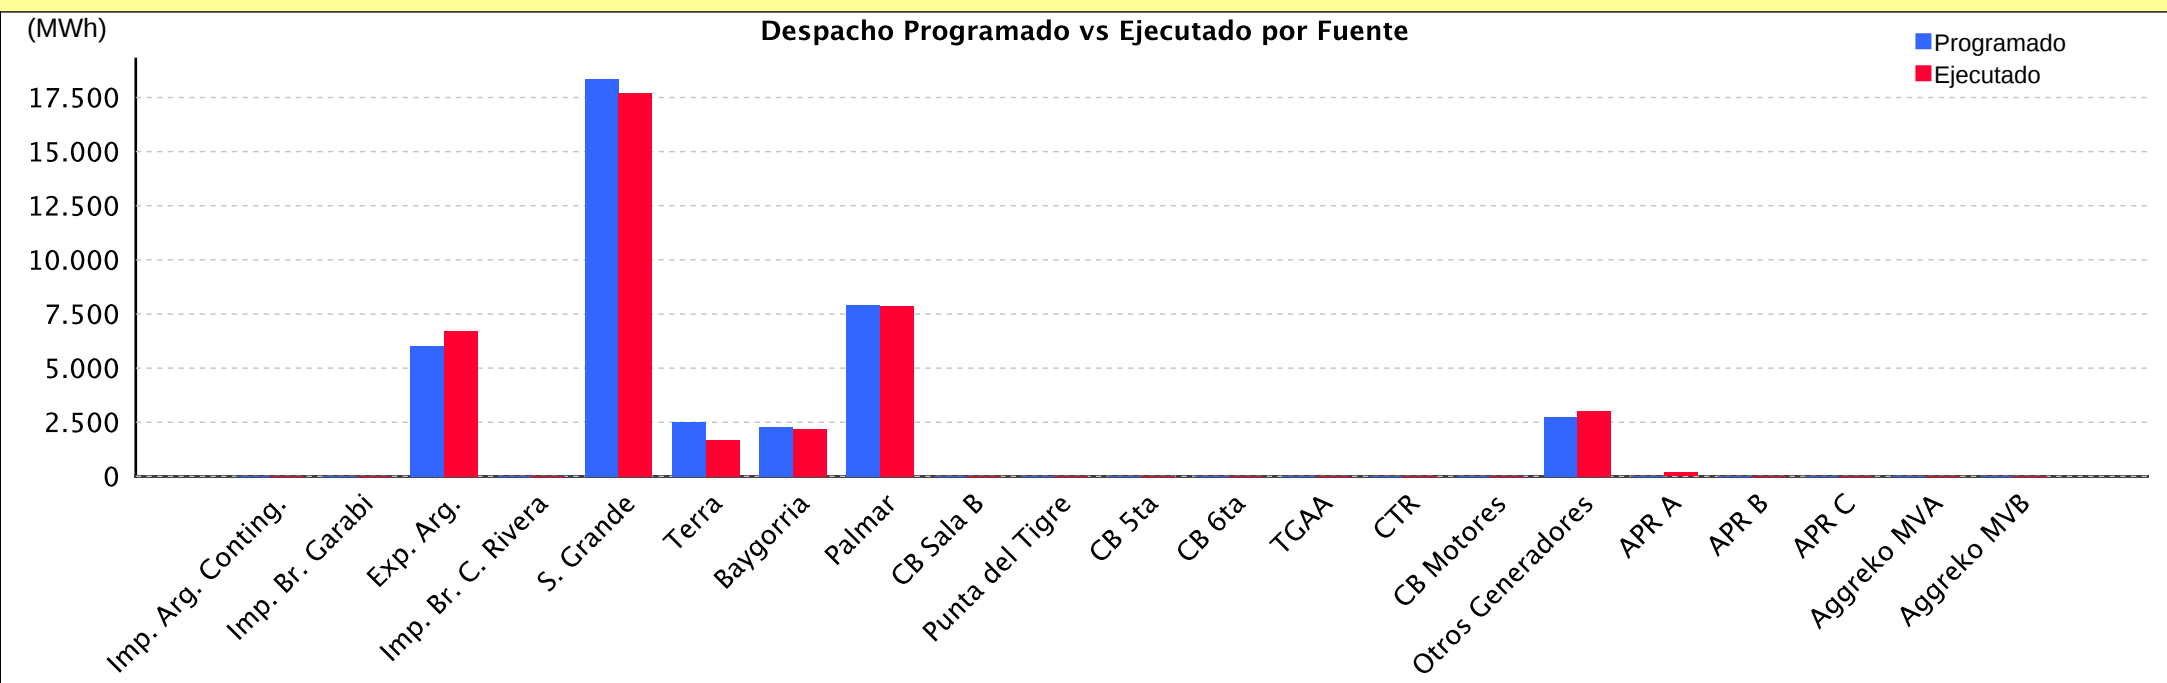
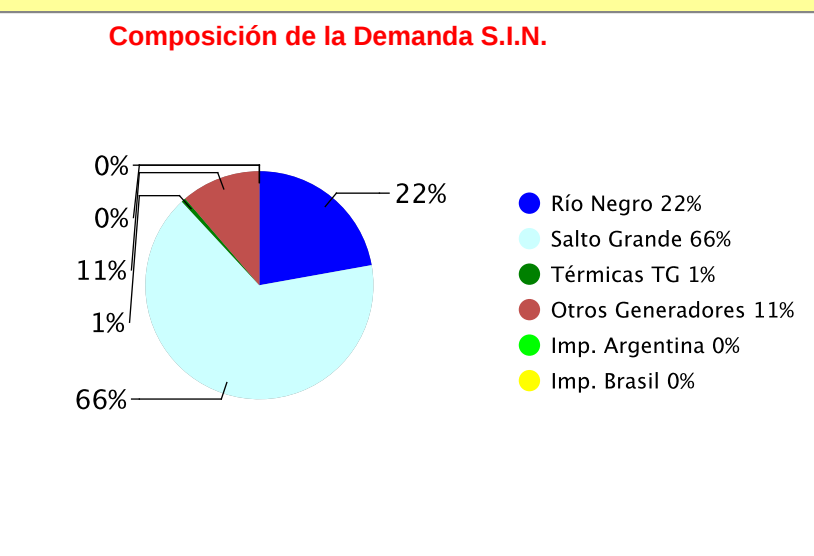


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

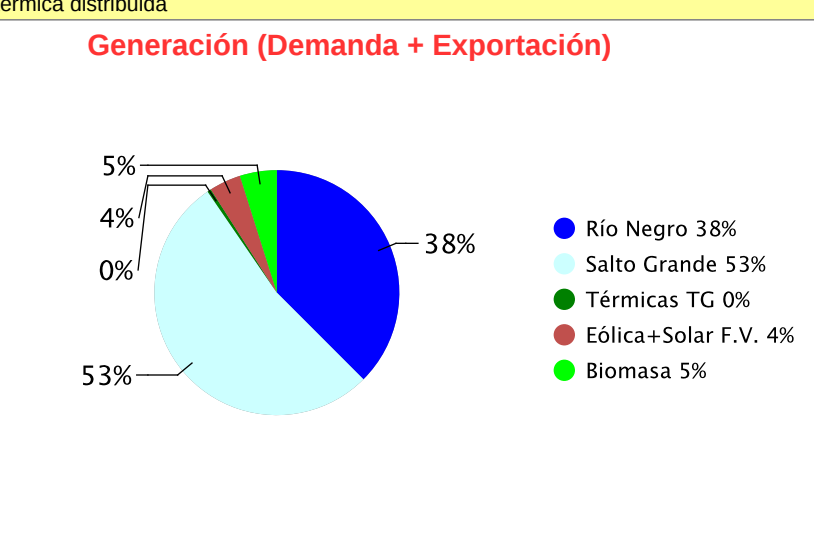



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

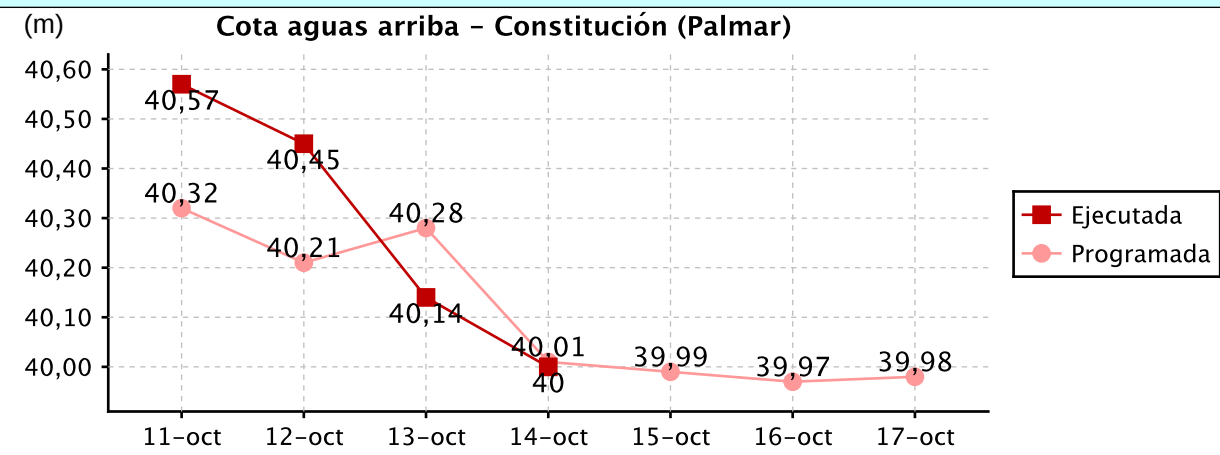
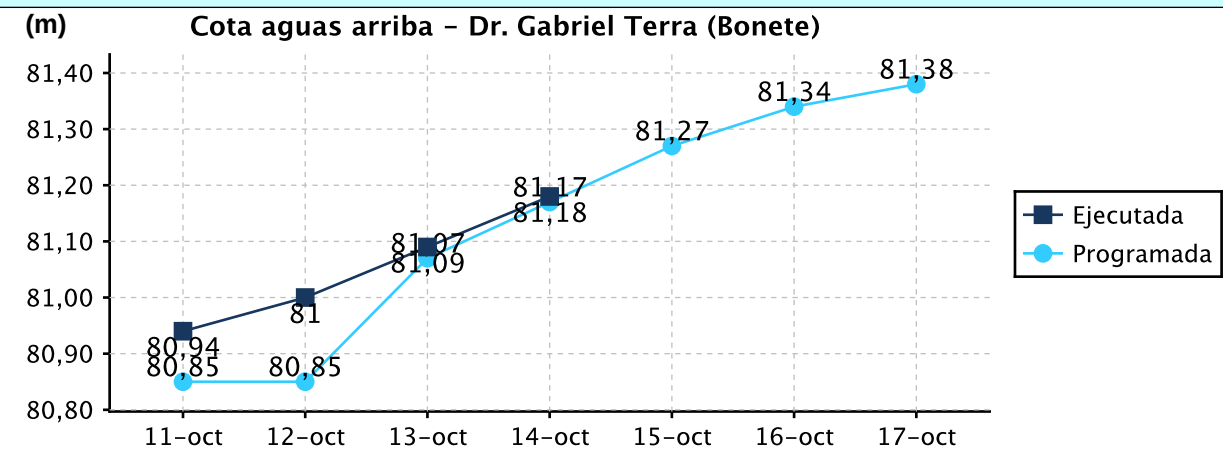


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,17	81,18
Baygorria	54,21	54,08
Palmar	40,01	40
SGU	35,94	35,75

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

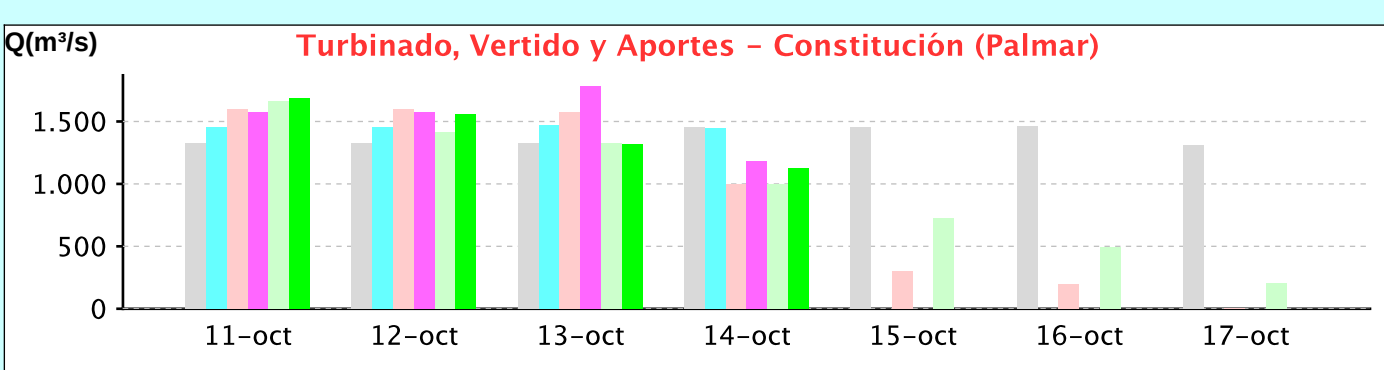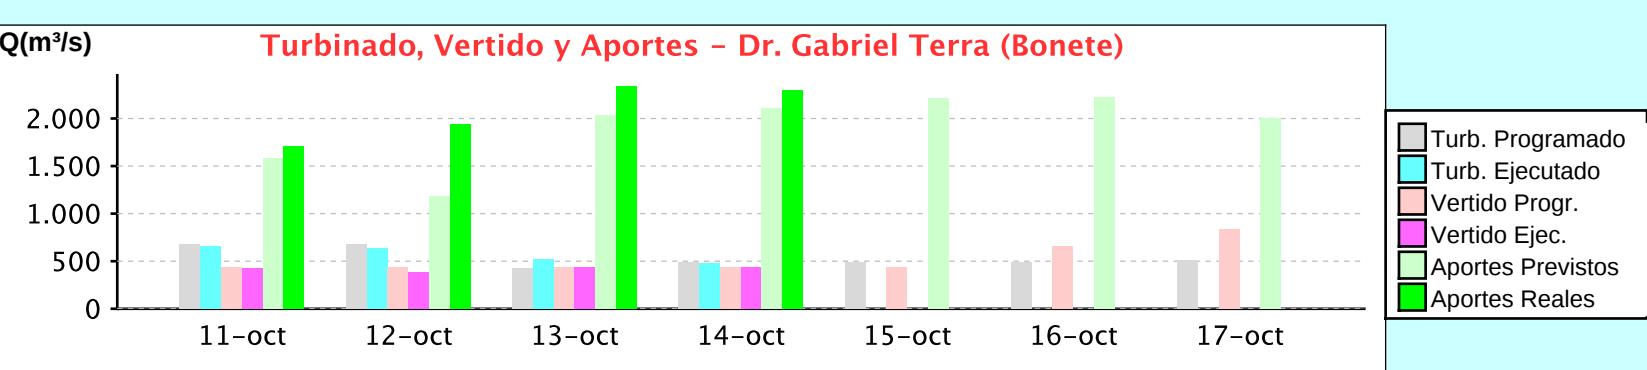

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

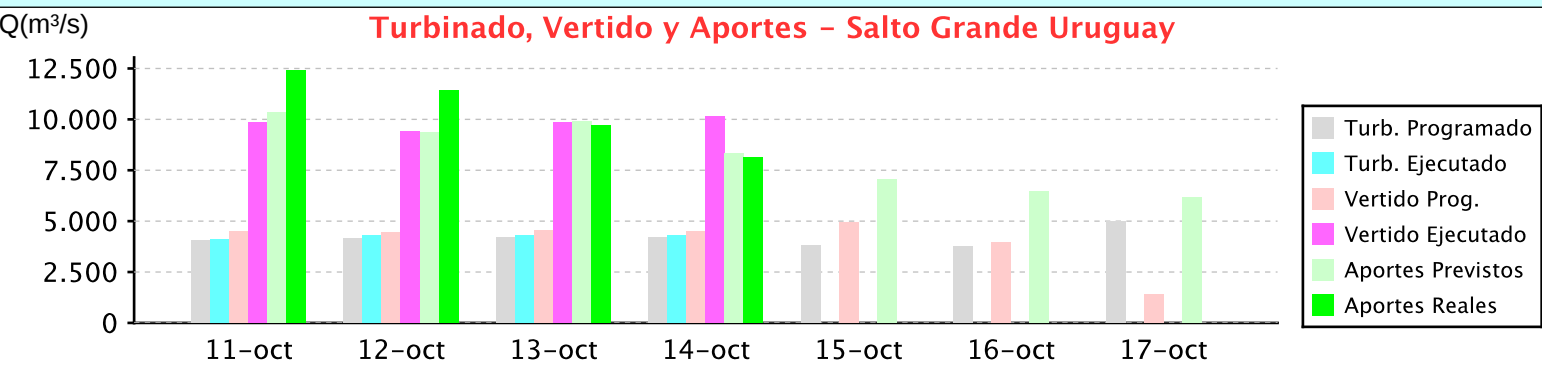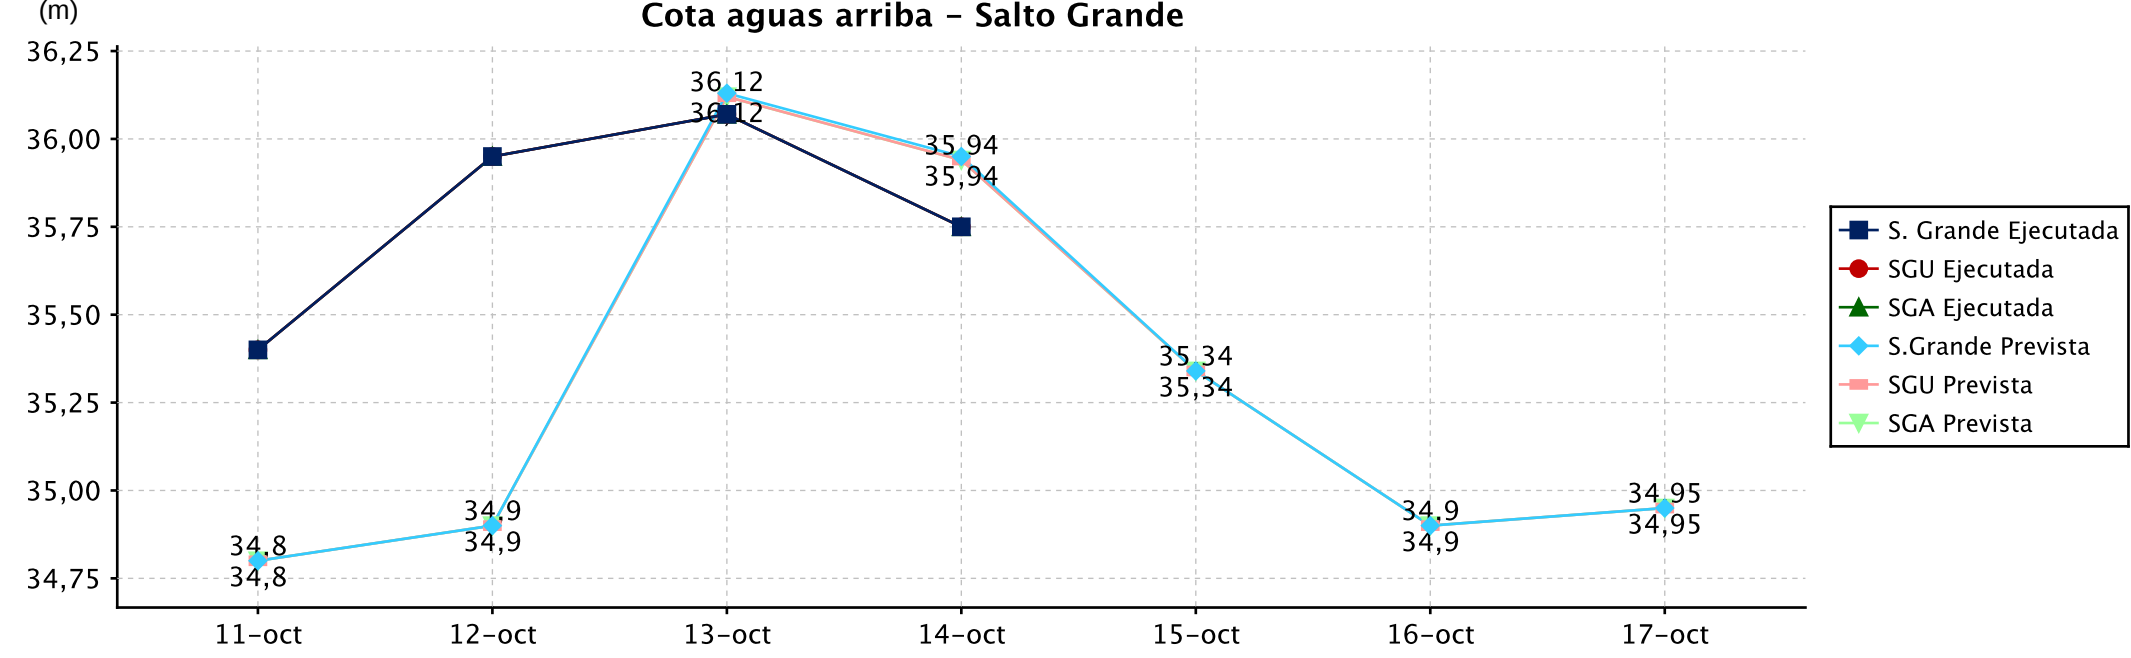

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,75
Cota Vista Arg	35,75
Cota real	35,75

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	493	478
Baygorria	849	810
Palmar	1.455	1.443
SGU	4.179	4.285

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.109	2.301
Baygorria	0	-17
Palmar	999	1.126
SGU	8.325	8.130

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	437
Baygorria	180	262
Palmar	1.000	1.181
SGU	4.486	10.165

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se despachó APR A por pruebas (forzada).
Se exportaron 280 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

15/10/2014 16:21
