




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 05 de octubre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-2
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	2
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-7
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.204
C. Baygorria	2.067
C. Palmar	7.553
C. Salto Grande	14.005
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.287
TOTAL Generación	35.061

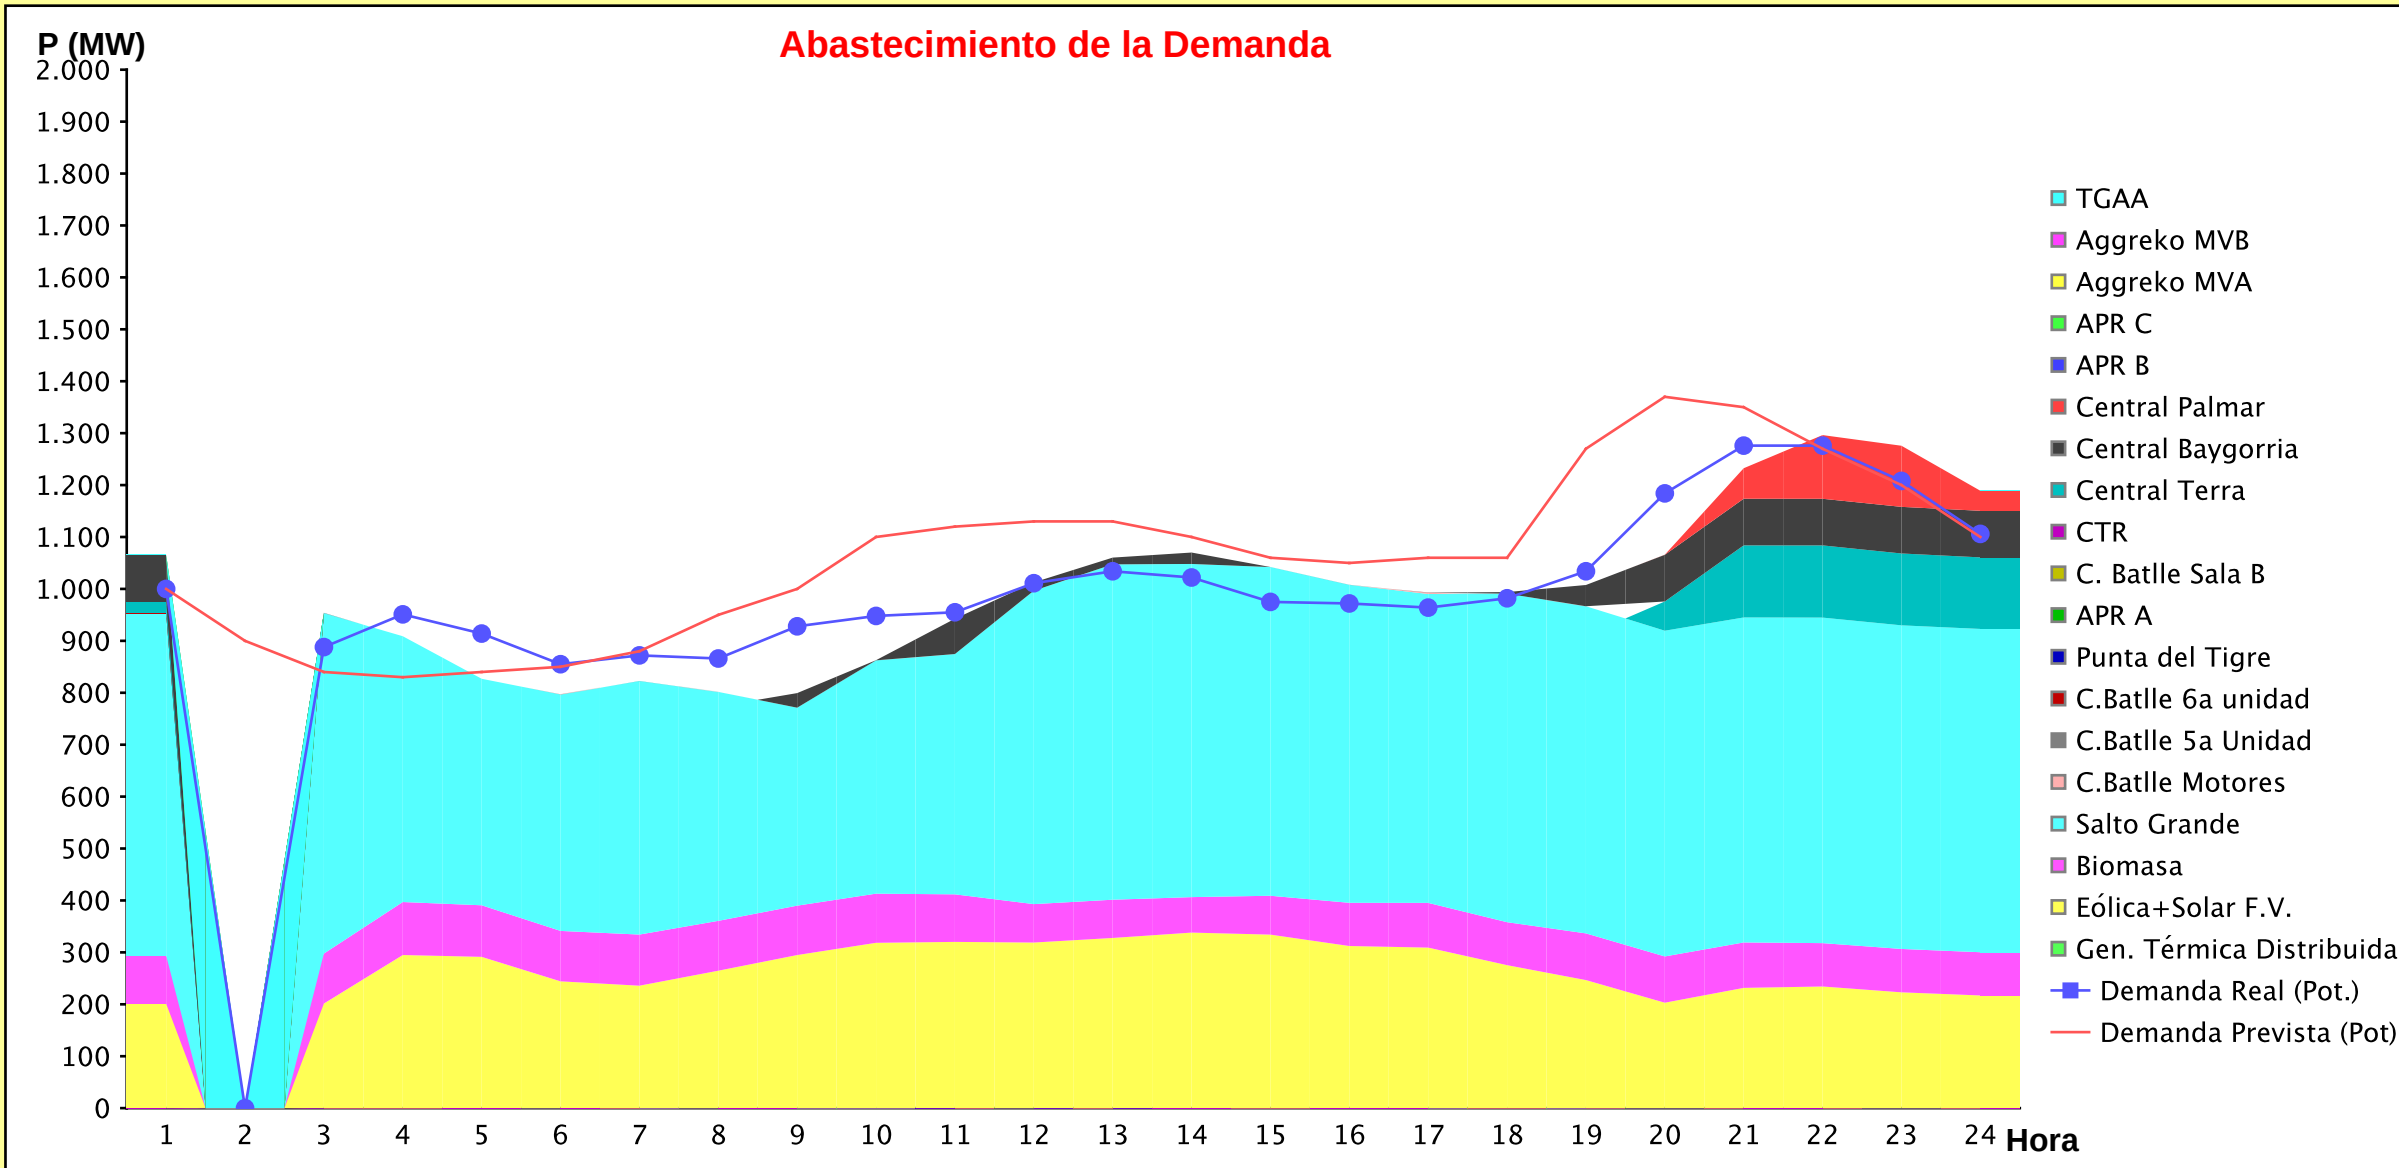

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.072
Hidráulica	12.072
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.072



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.989
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.460
Diferencia (MWh)	-2.471
Ejecutada - Programada	-9,70 %

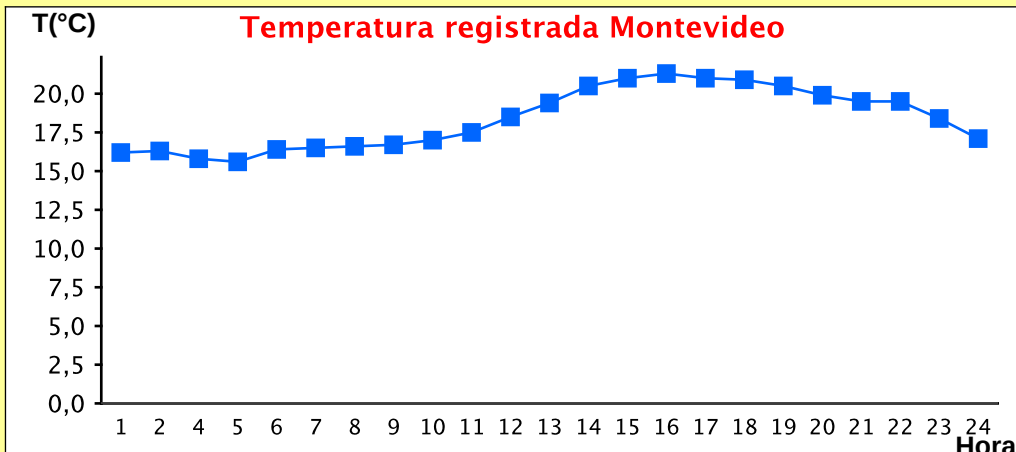


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1107,3 Hora 13:01
Potencia mínima:	788,8 Hora 07:46
Pico noche:	1340,73 Hora 22:09

Generación Media (MW)	
Eólica	260,0
Biomasa	84,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

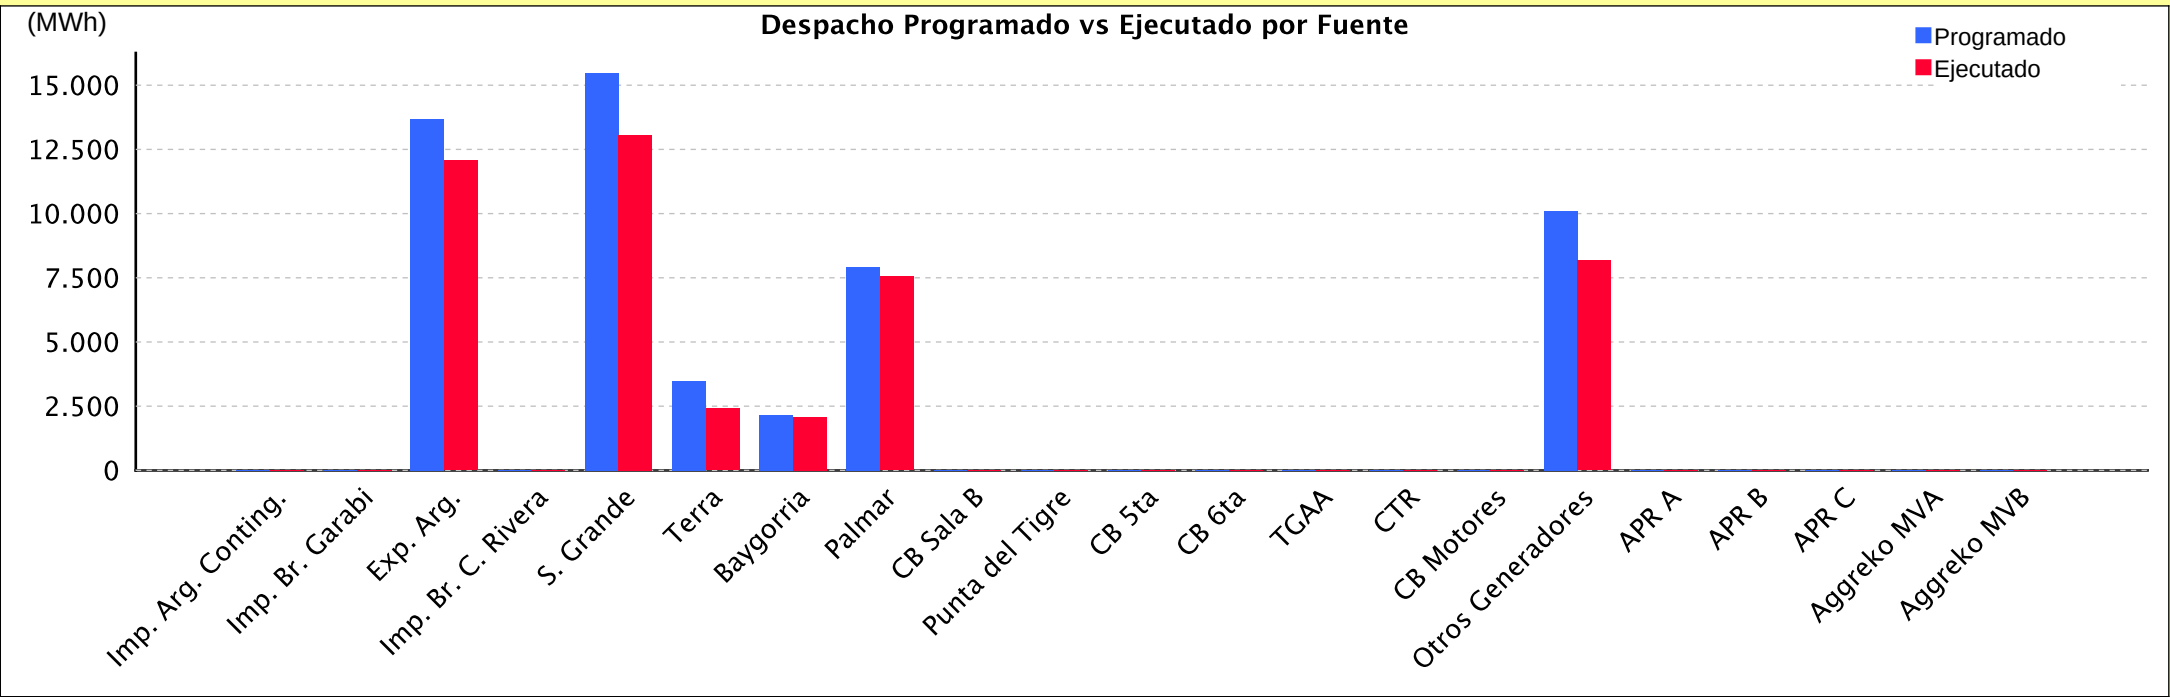
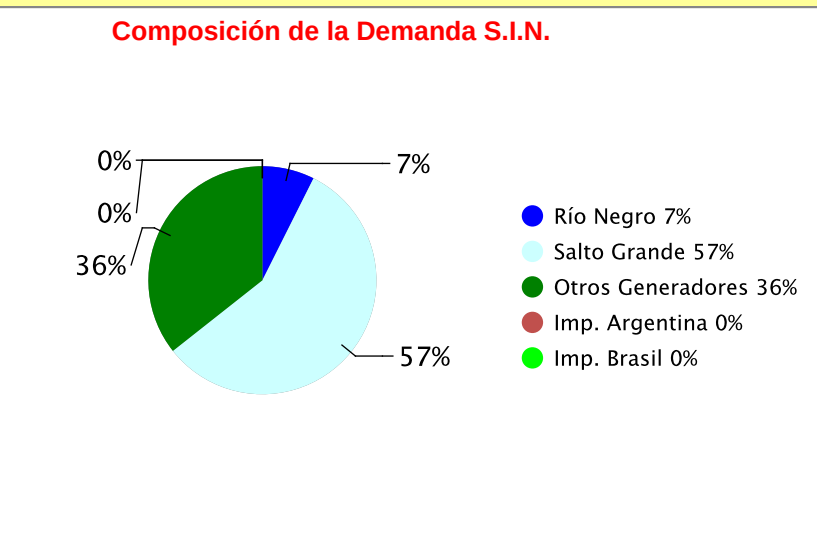


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

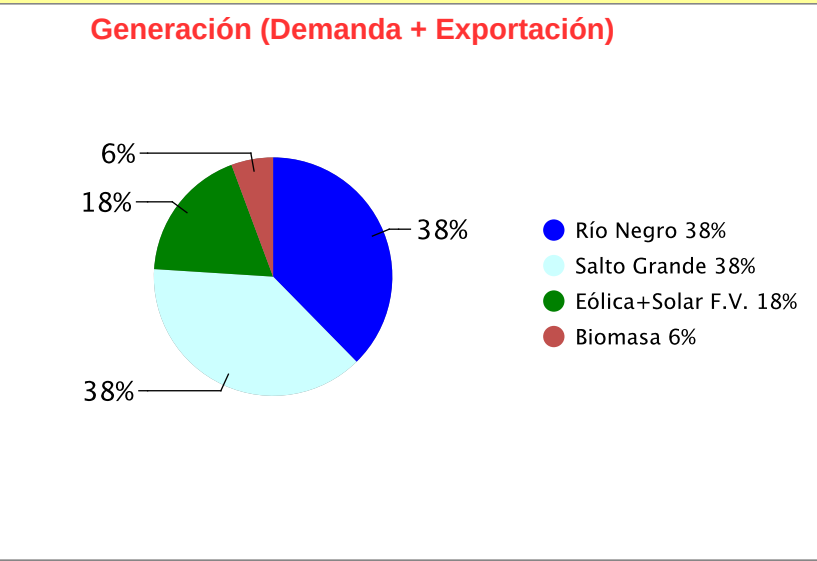



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

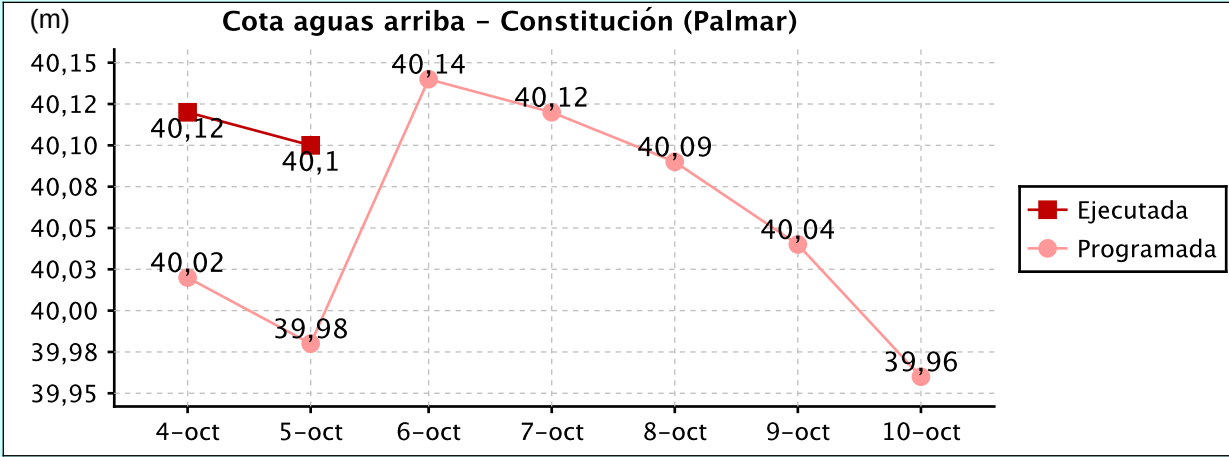
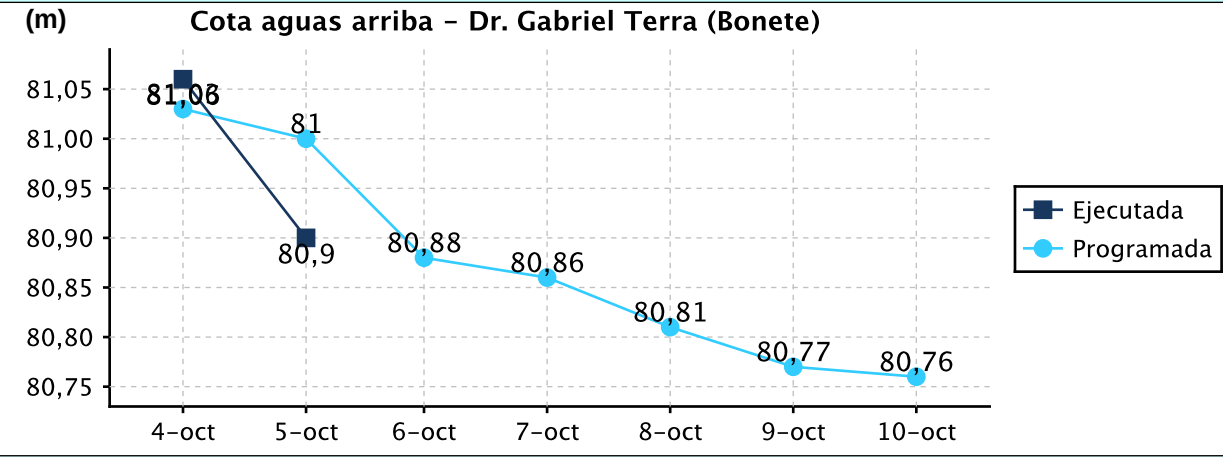


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,00	80,9
Baygorria	54,27	54,08
Palmar	39,98	40,1
SGU	32,08	31,87

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

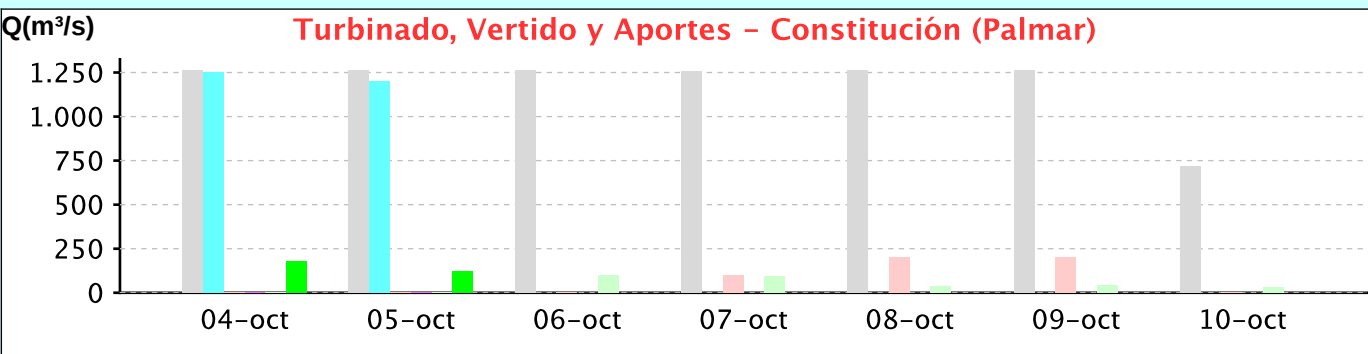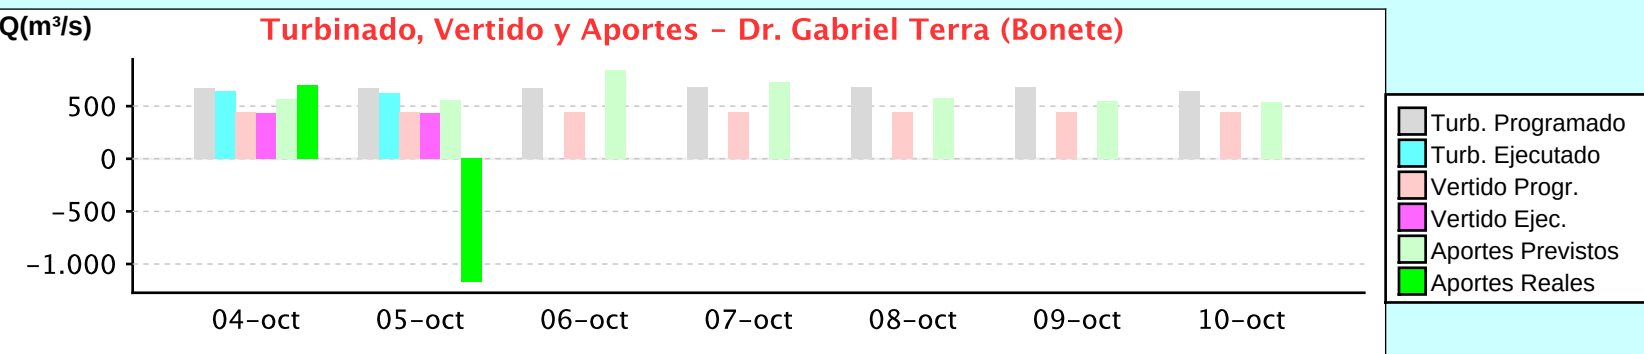

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

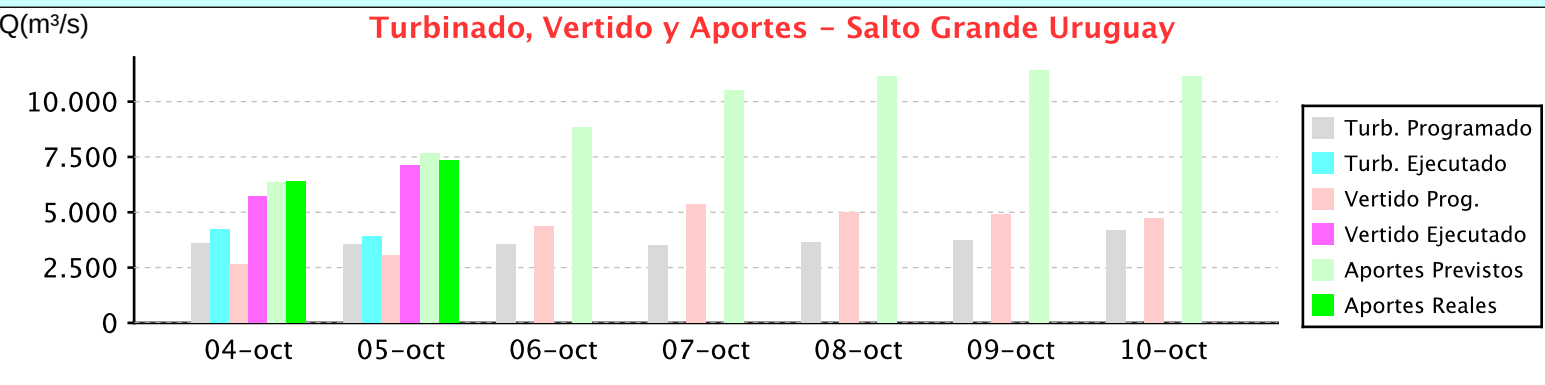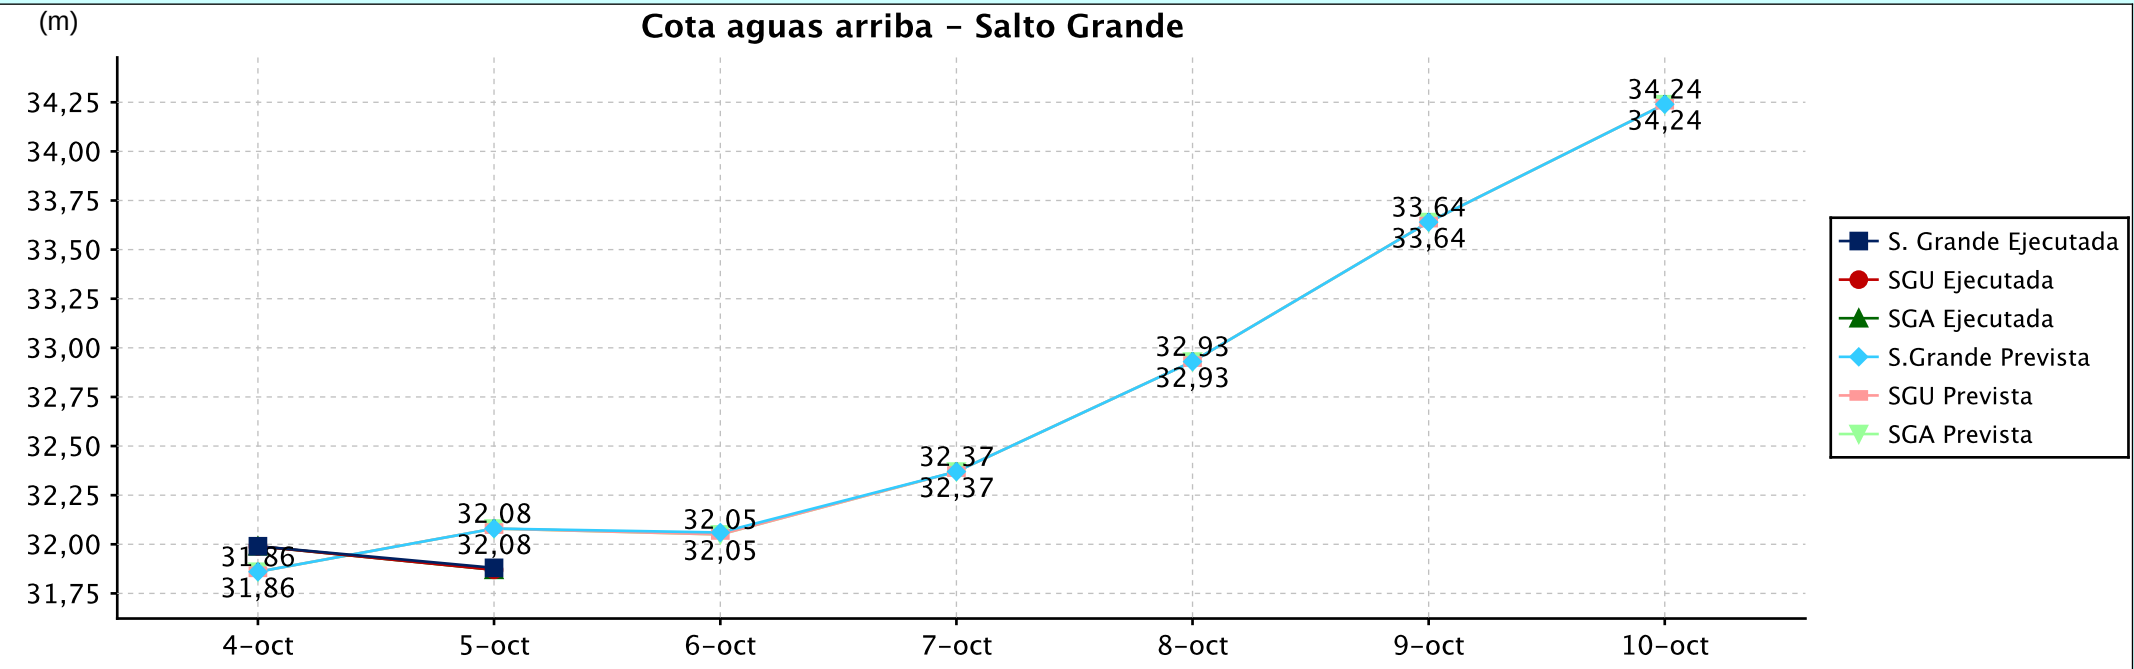

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	31,87
Cota Vista Arg	31,87
Cota real	31,88

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	624
Baygorria	792	758
Palmar	1.262	1.198
SGU	3.532	3.928

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	558	-1.172
Baygorria	0	-10
Palmar	0	121
SGU	7.675	7.362

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	428
Baygorria	300	276
Palmar	0	0
SGU	3.057	7.120

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
