




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 15 de octubre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-4
Central P. del Tigre	8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	51
Aggreko MVA	25
Aggreko MVB	26
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.478
C. Baygorria	2.185
C. Palmar	7.877
C. Salto Grande	17.316
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.412
TOTAL Generación	38.312

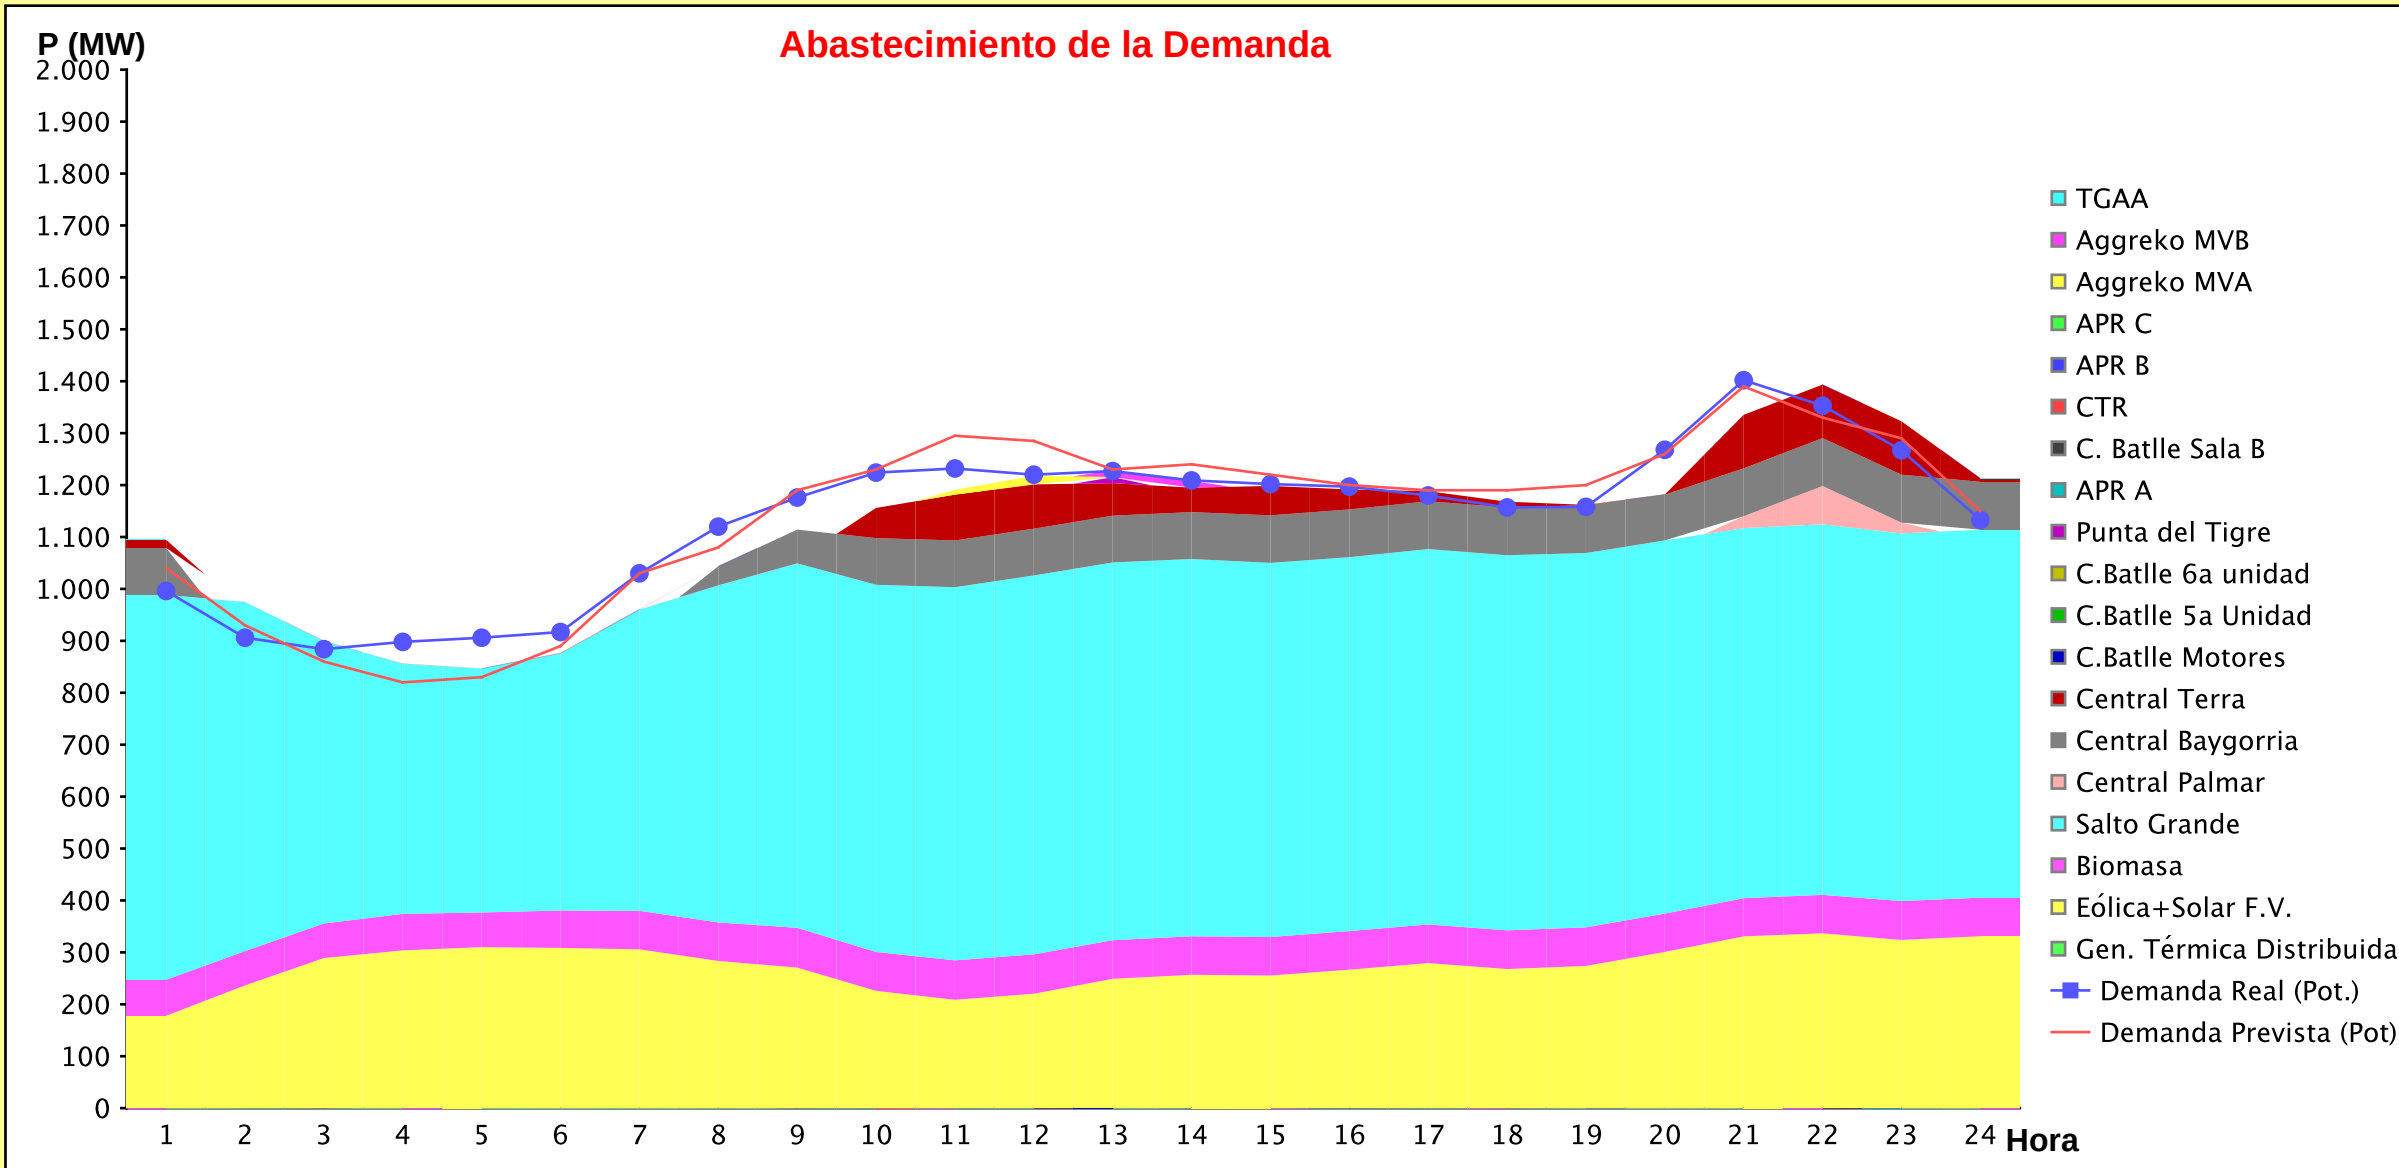

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.271
Hidráulica	11.271
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.271



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.041
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.370
Diferencia (MWh)	-329
Ejecutada - Programada	-1,20 %

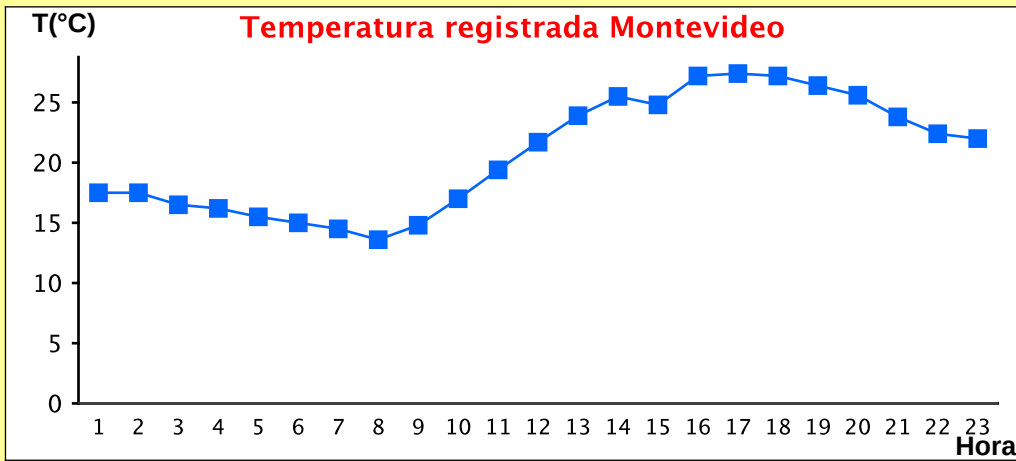


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1273,37 Hora 11:37
Potencia mínima:	817,79 Hora 03:38
Pico noche:	1410,68 Hora 20:54

Generación Media (MW)	
Eólica	275,7
Biomasa	80,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

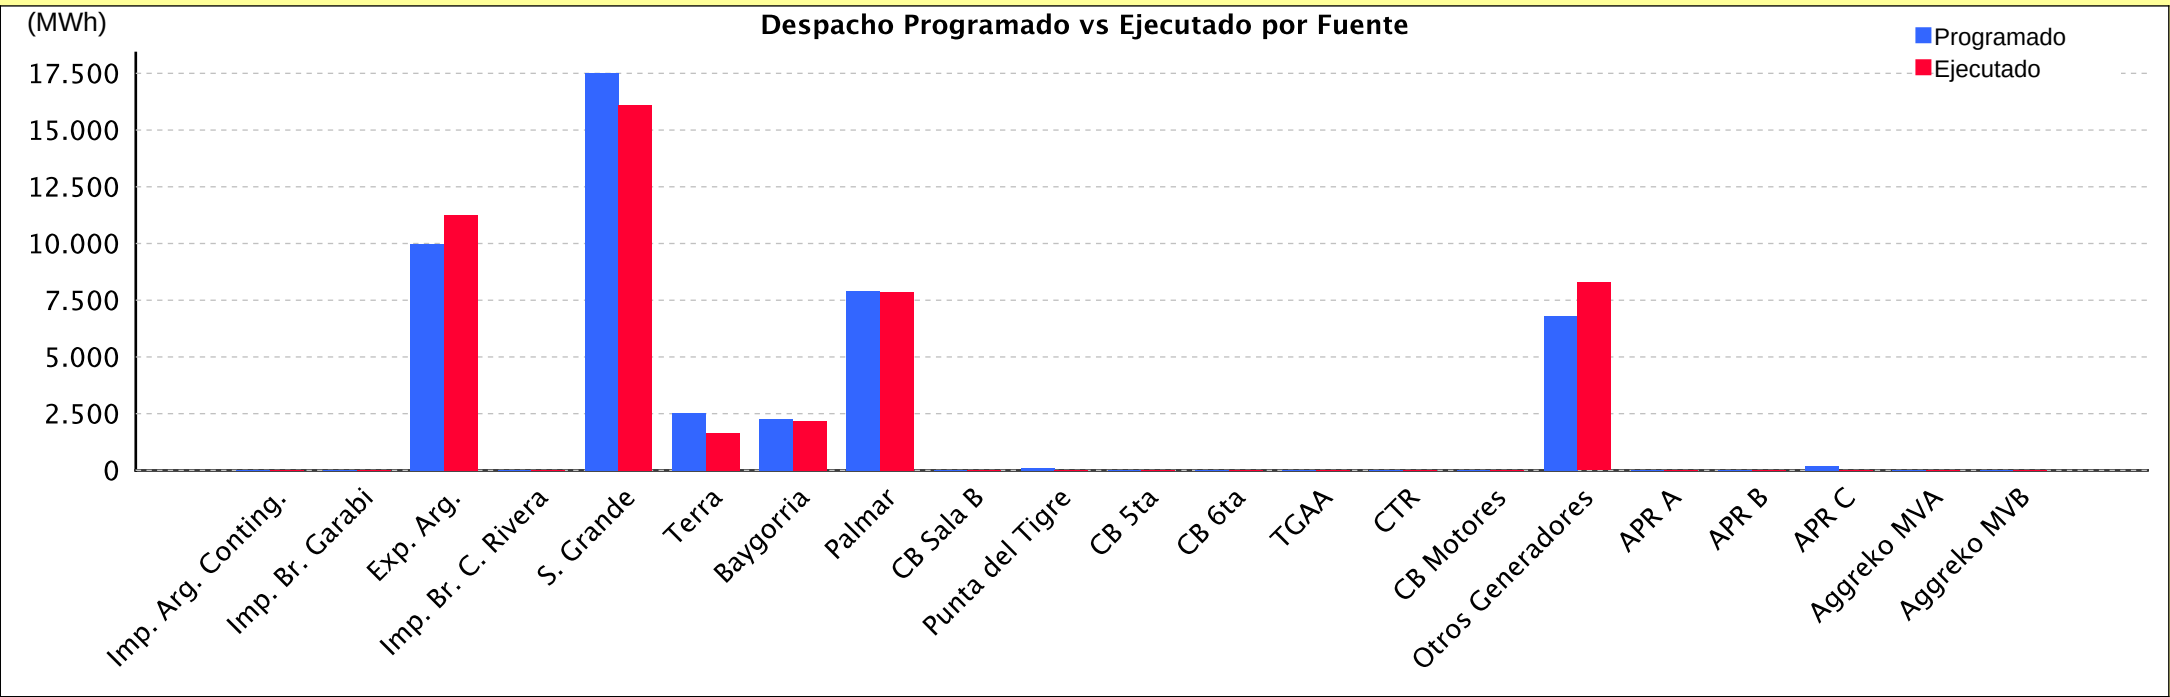
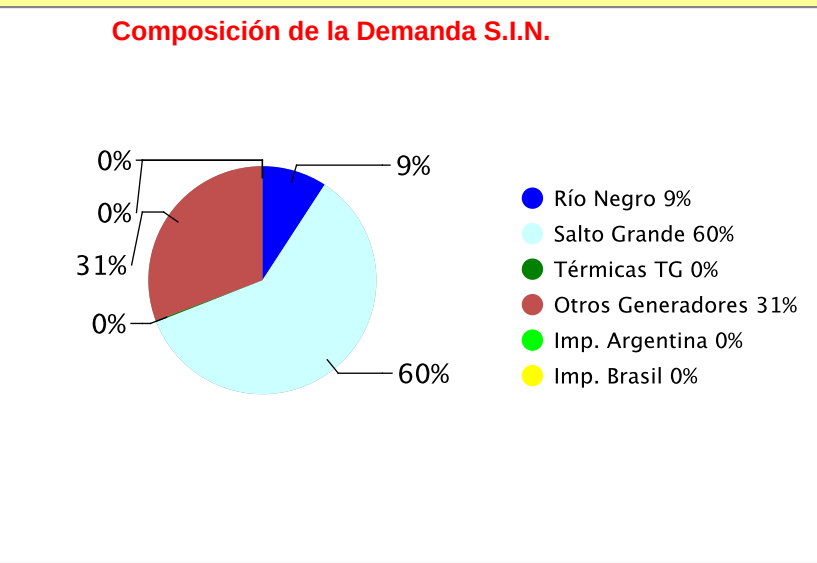


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

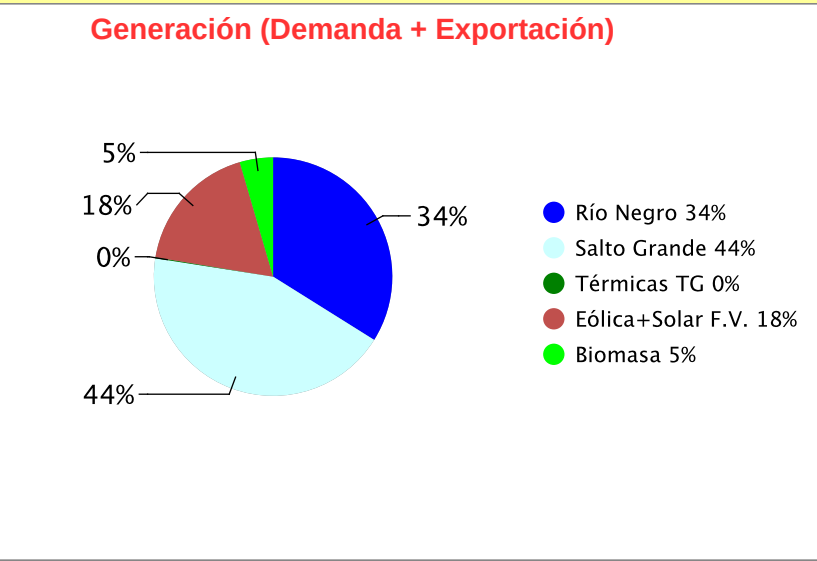



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

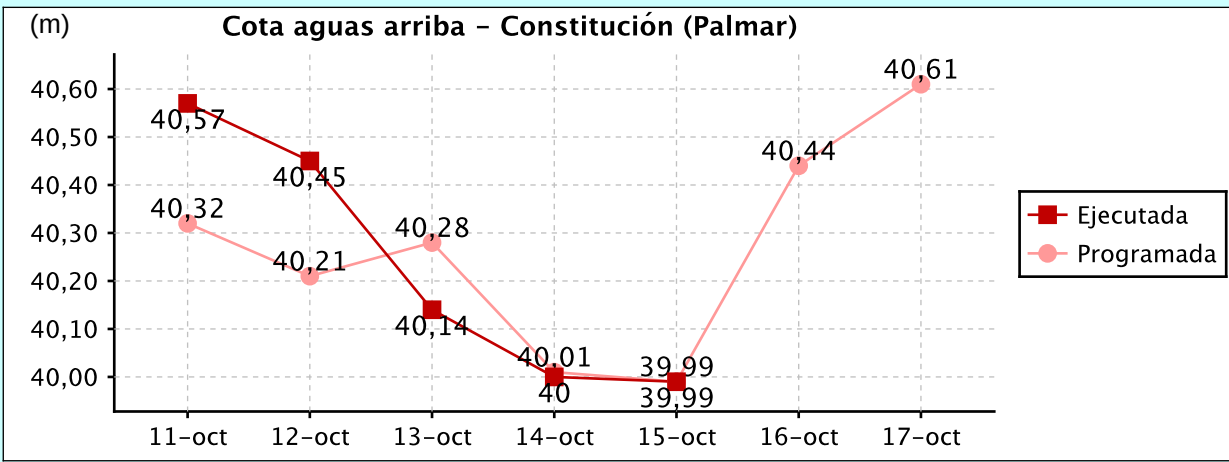
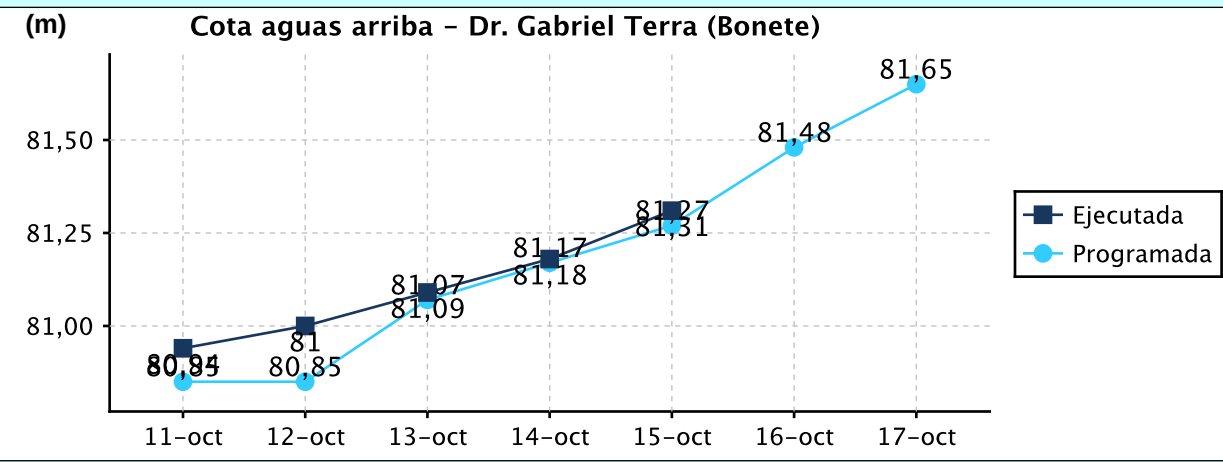


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,27	81,31
Baygorria	54,04	54,19
Palmar	39,99	39,99
SGU	35,34	35,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

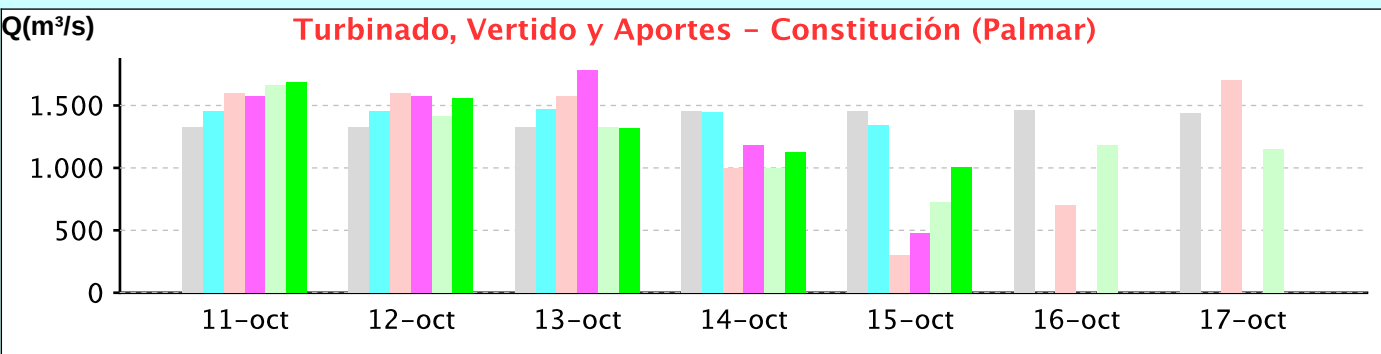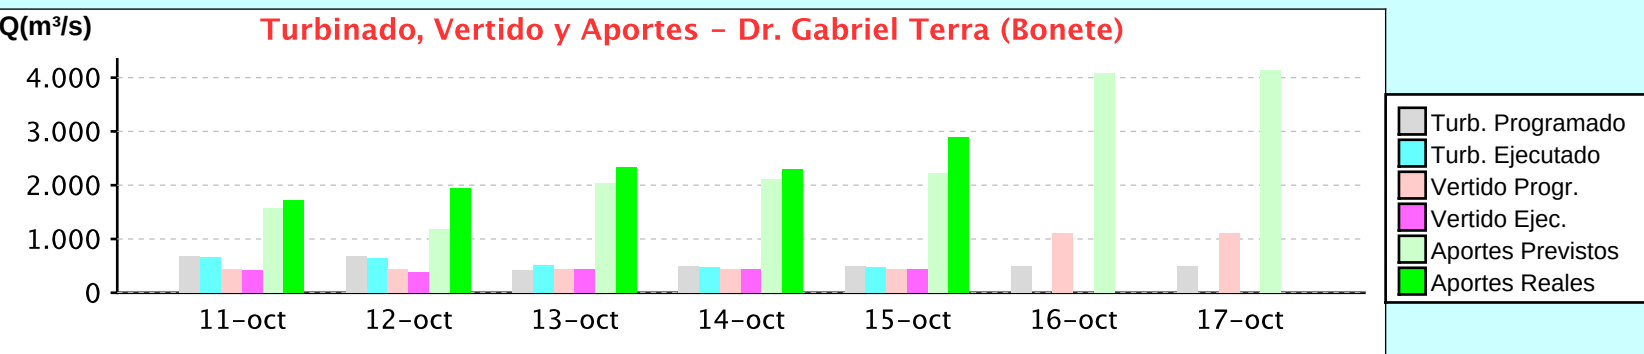

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

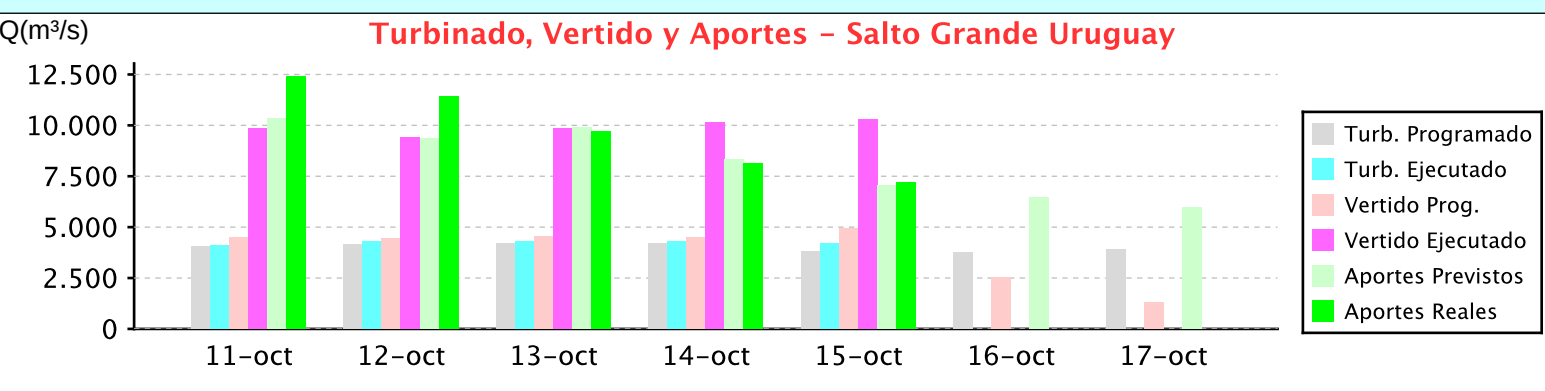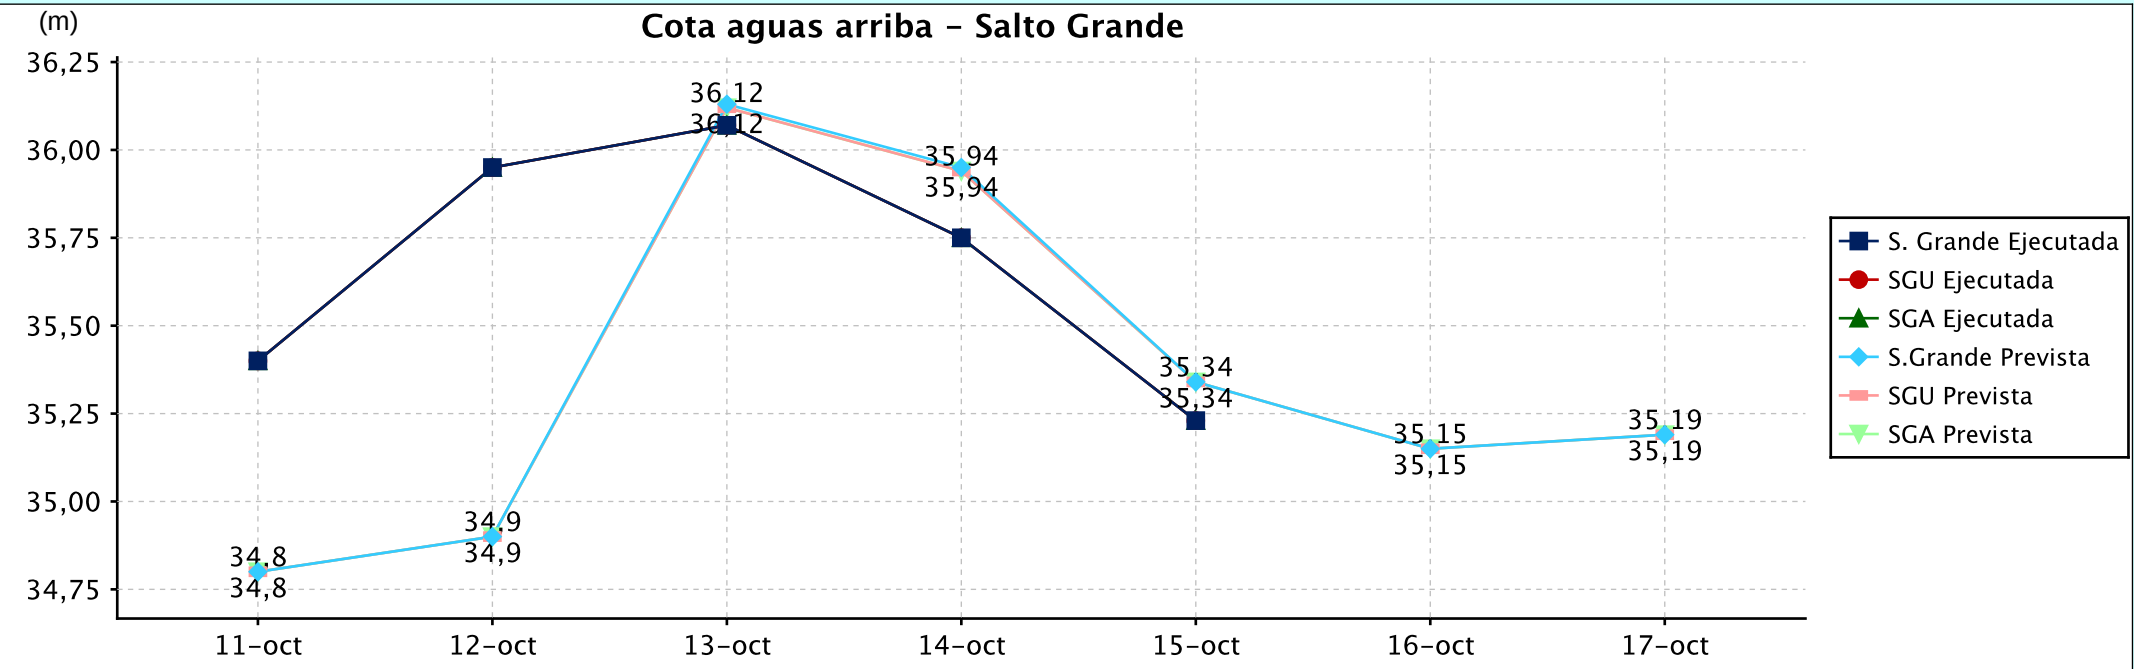

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,23
Cota Vista Arg	35,23
Cota real	35,23
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	493	472
Baygorria	849	801
Palmar	1.455	1.345
SGU	3.818	4.205

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.215	2.891
Baygorria	0	35
Palmar	724	1.009
SGU	7.075	7.179

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	442
Baygorria	180	0
Palmar	300	474
SGU	4.952	10.278

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 470 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Se despachó Aggreko (MVA y MVB) por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

16/10/2014 18:00
