




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 21 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-1
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.430
C. Baygorria	2.027
C. Palmar	7.885
C. Salto Grande	21.264
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.521
TOTAL Generación	39.114

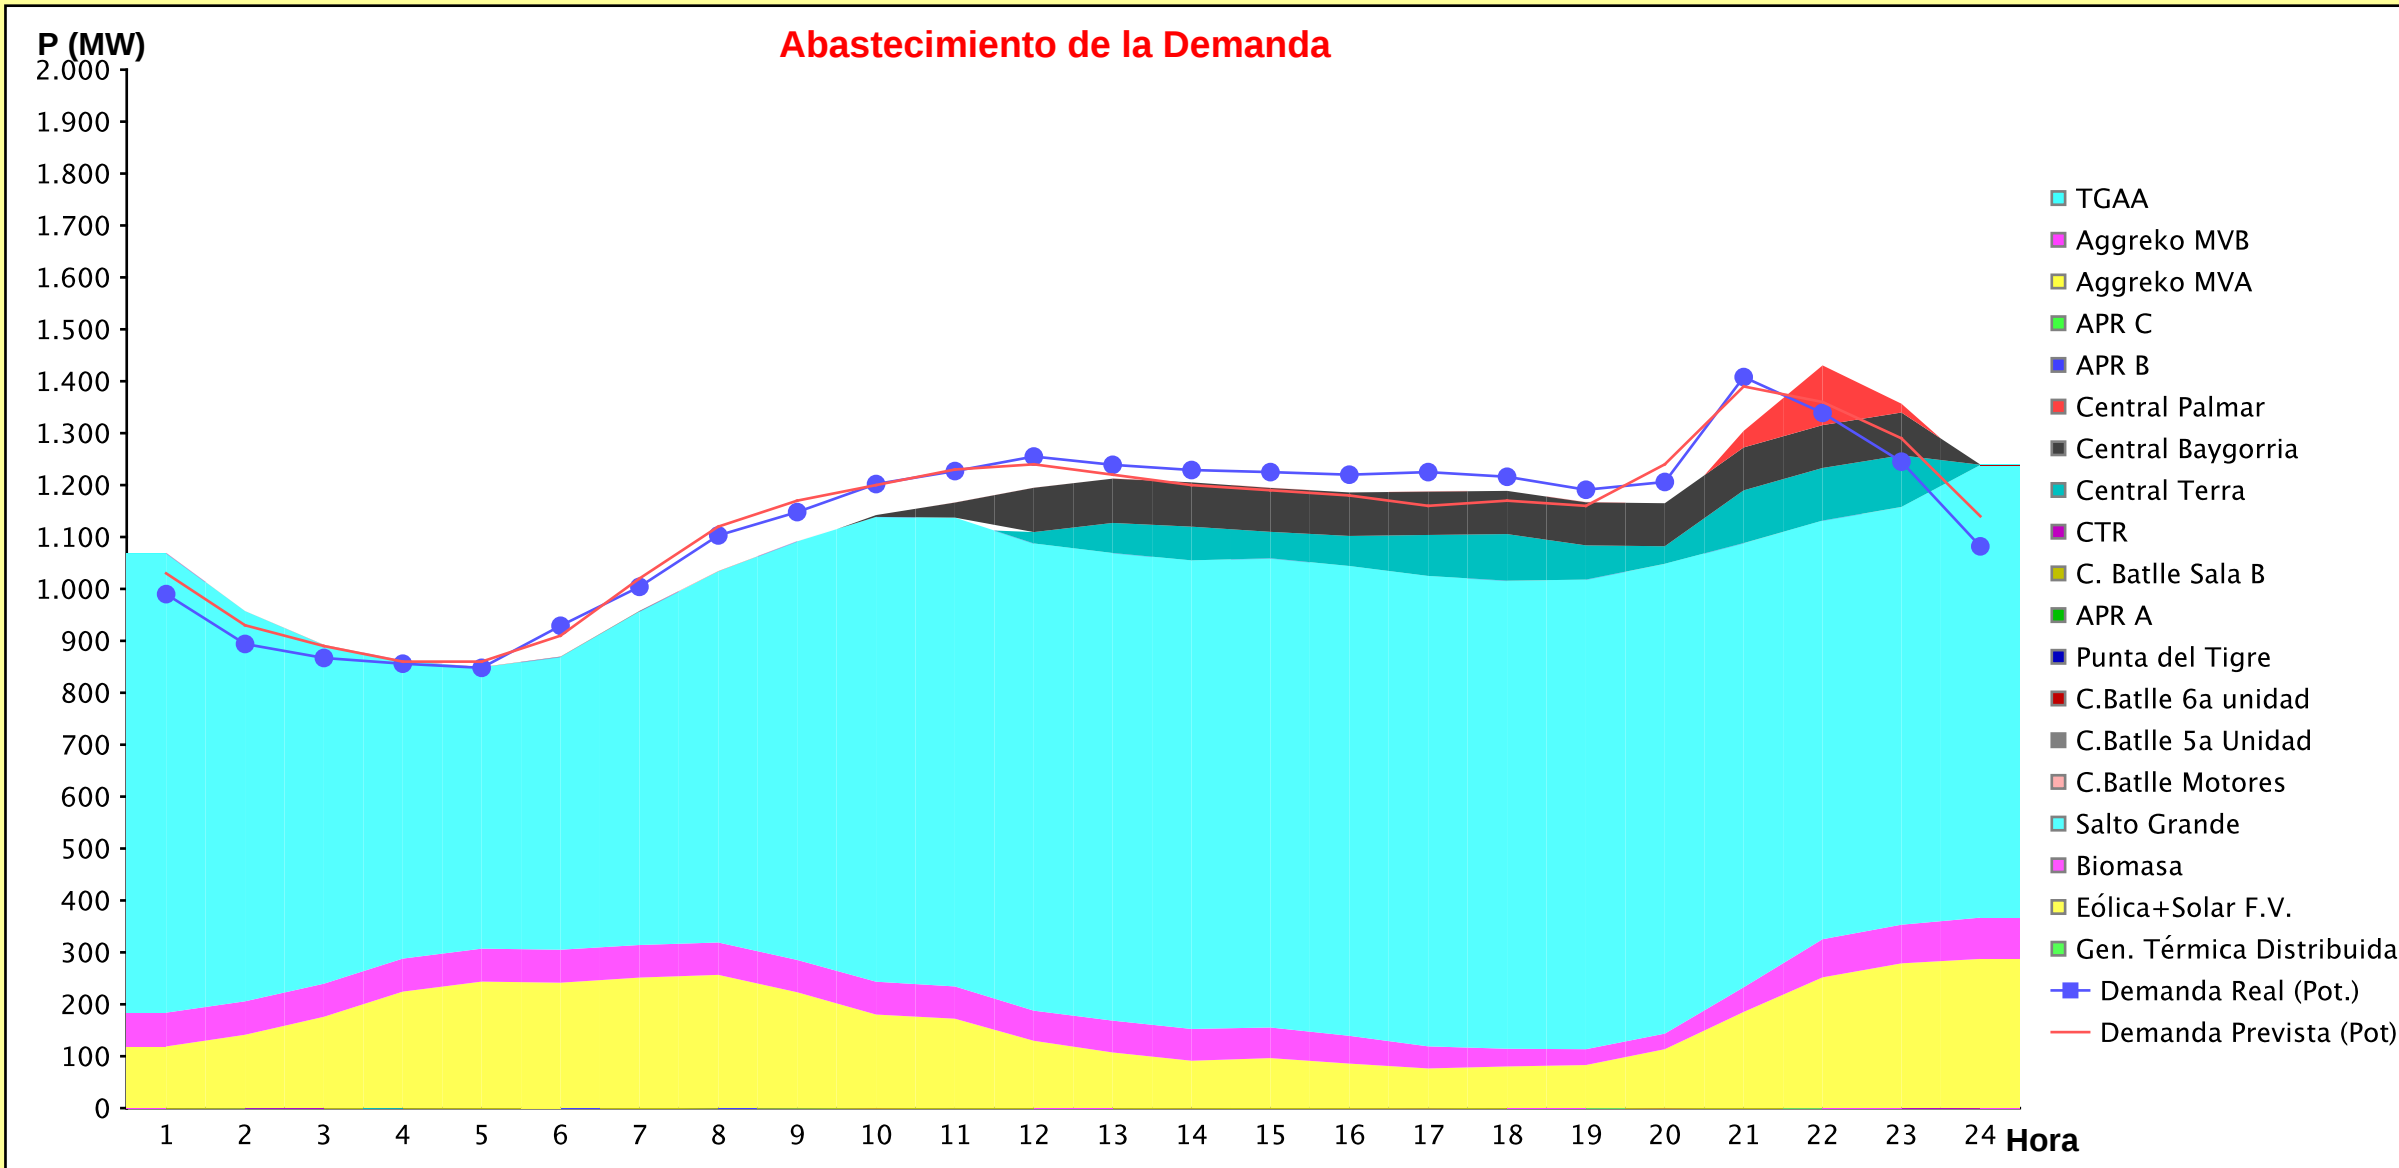




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.184
Hidráulica	12.184
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.184

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.930
(en borses de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.160
Diferencia (MWh)	-230
Ejecutada - Programada	-0,85 %

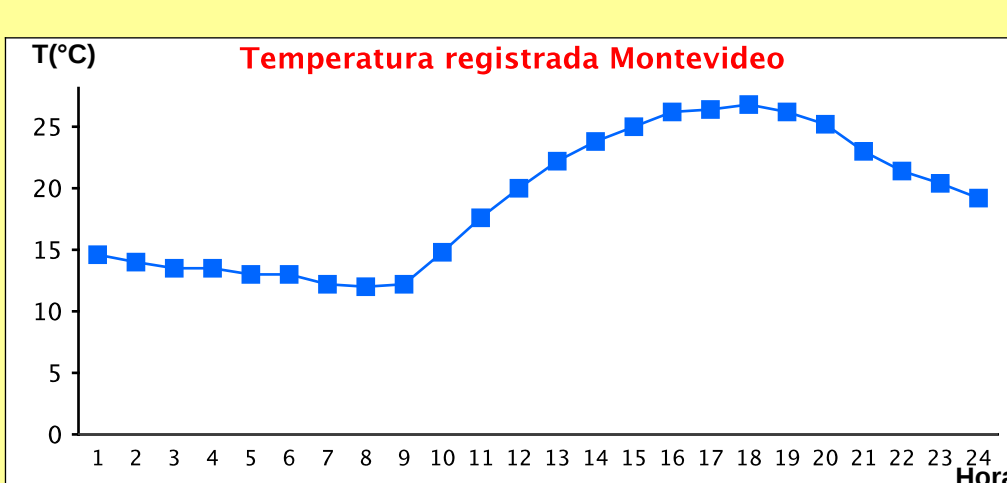



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1261,96 Hora 12:41
Potencia mínima:	824,74 Hora 03:47
Pico noche:	1435,71 Hora 21:00

Generación Media (MW)	
Eólica	170,9
Biomasa	72,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

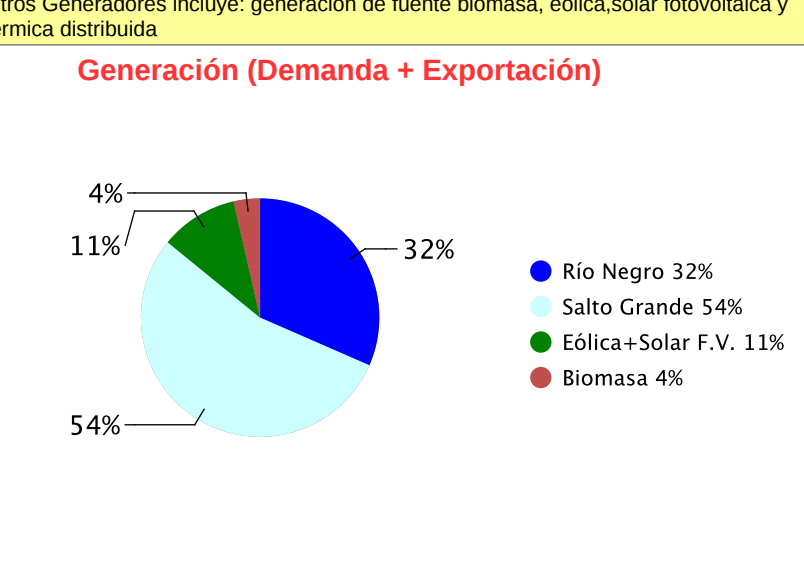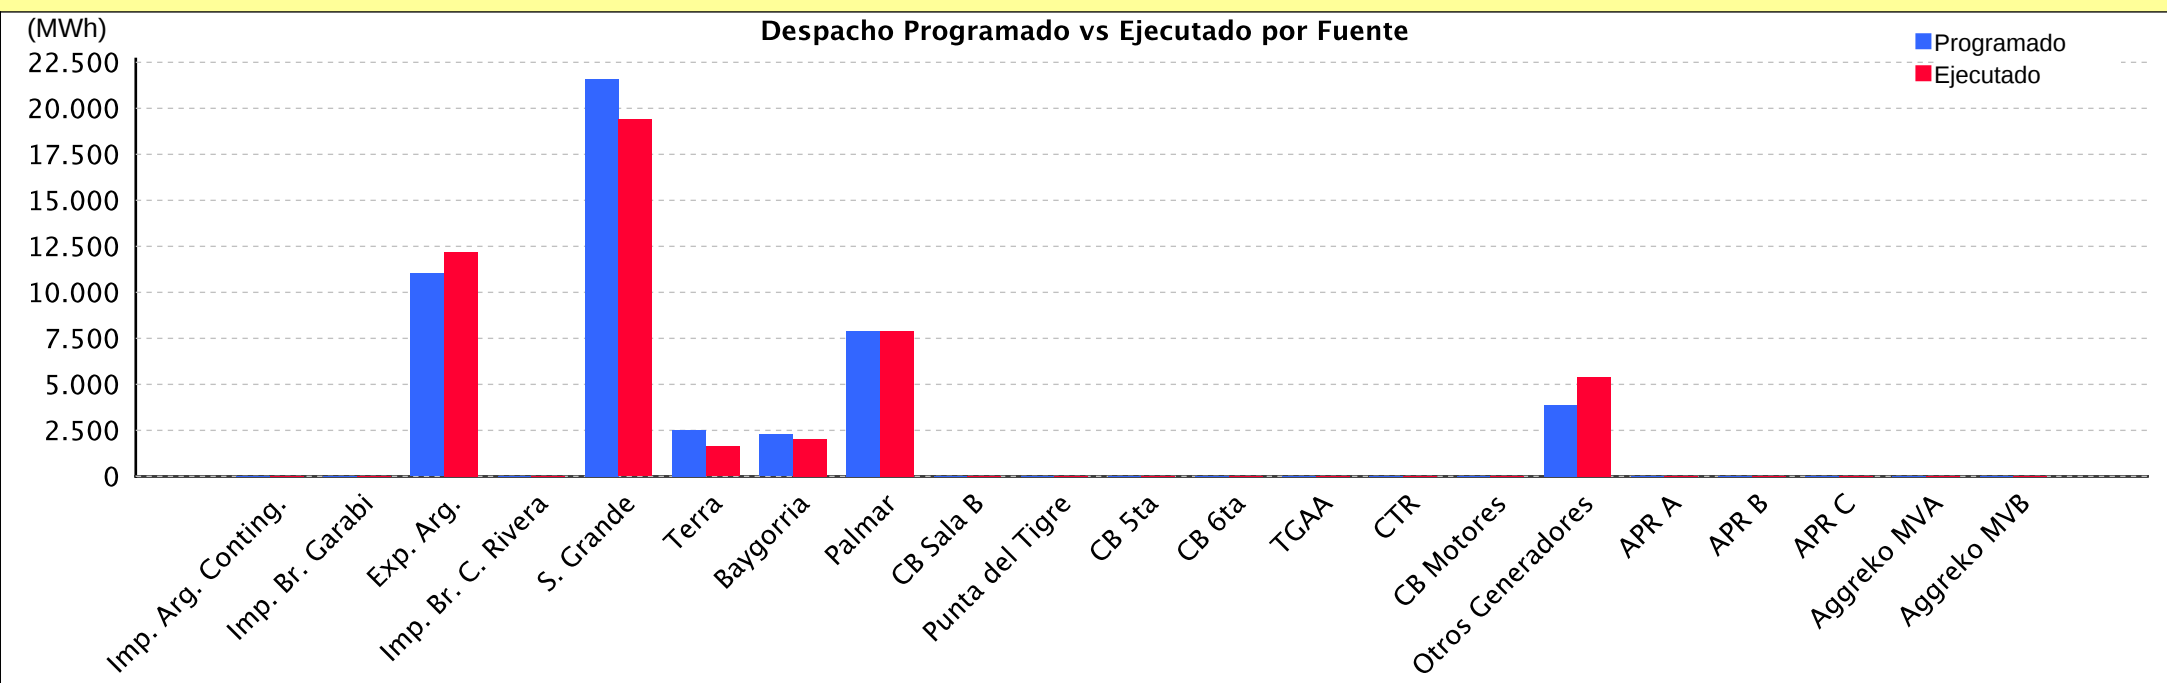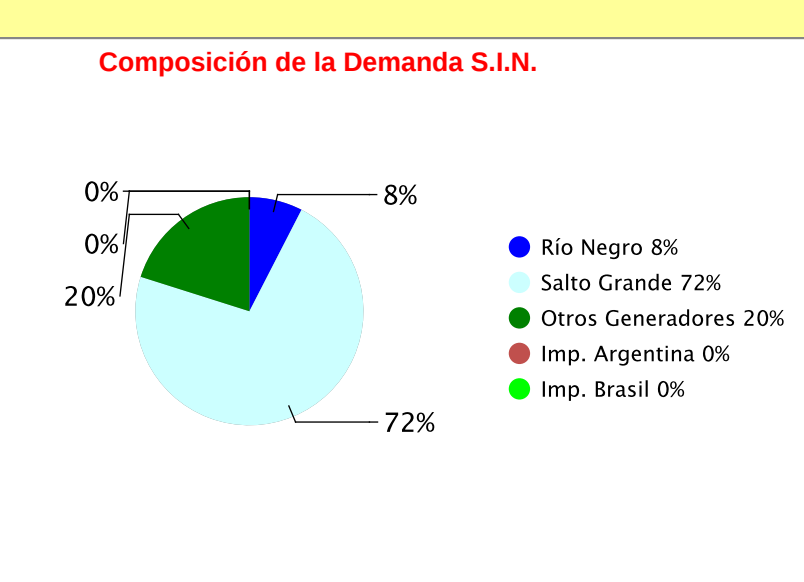



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

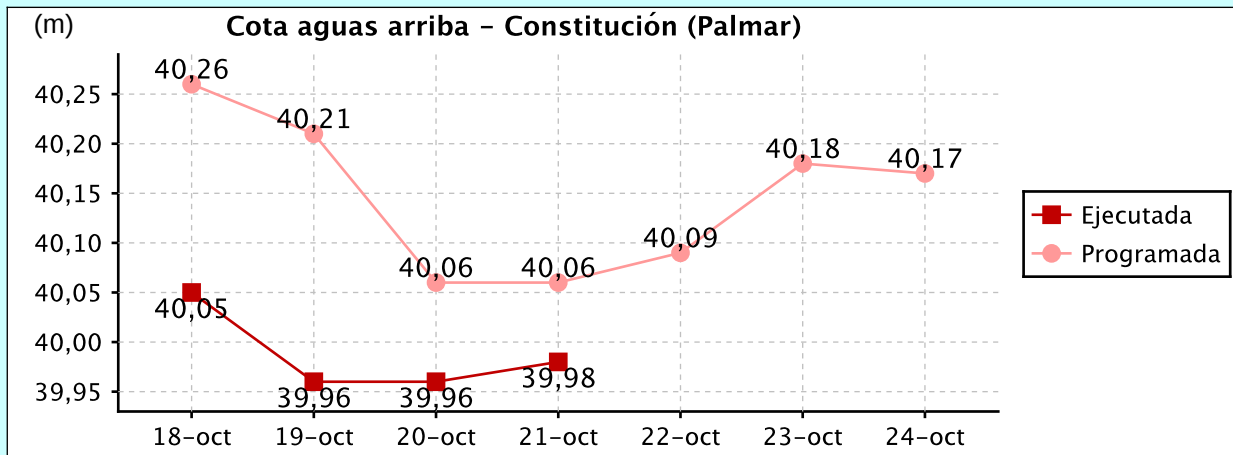
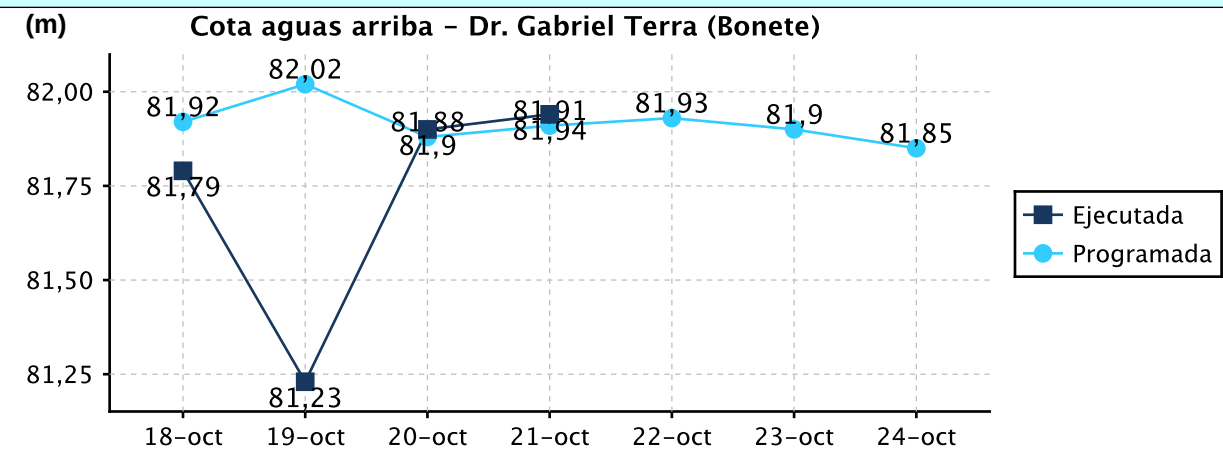


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,91	81,94
Baygorria	54,29	54,33
Palmar	40,06	39,98
SGU	35,44	35,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

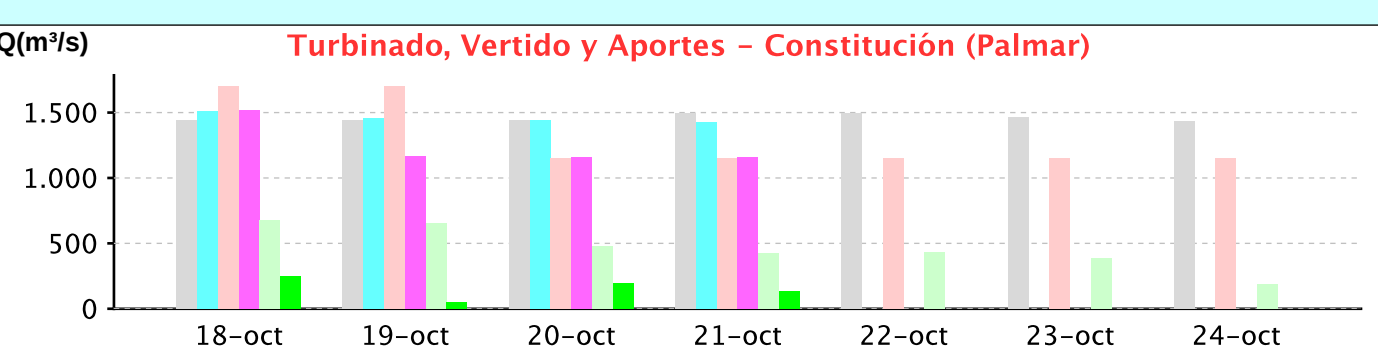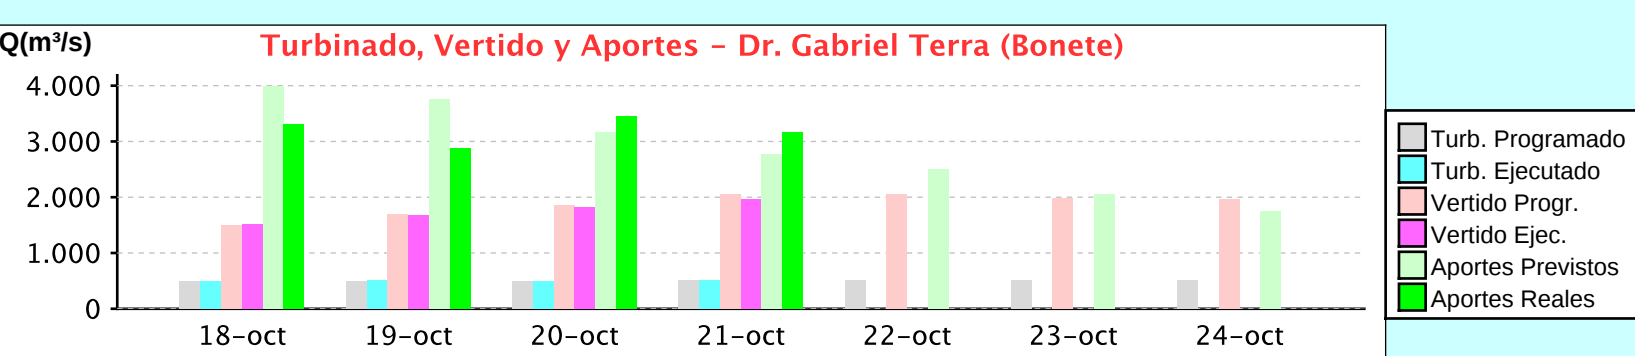

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

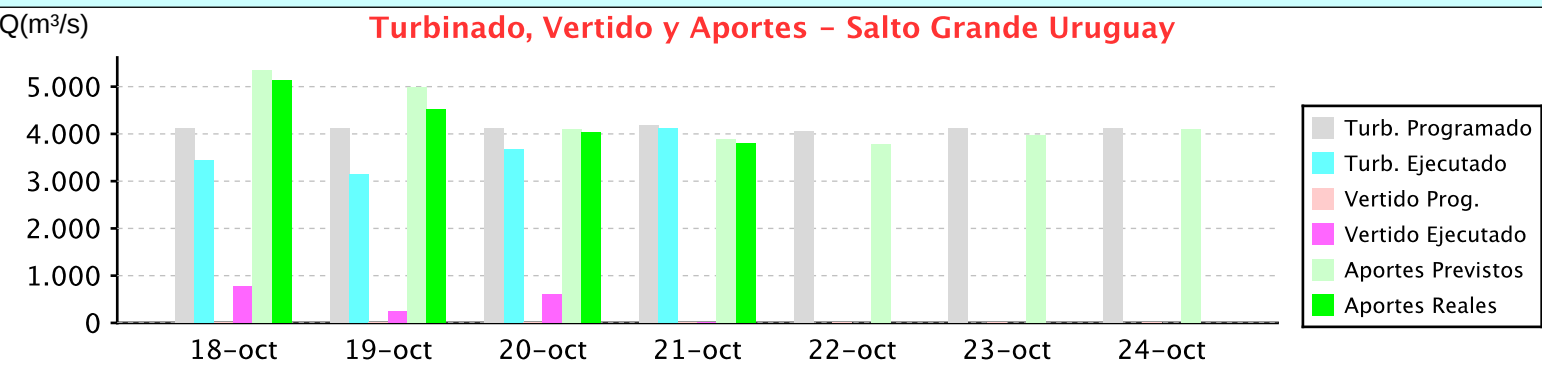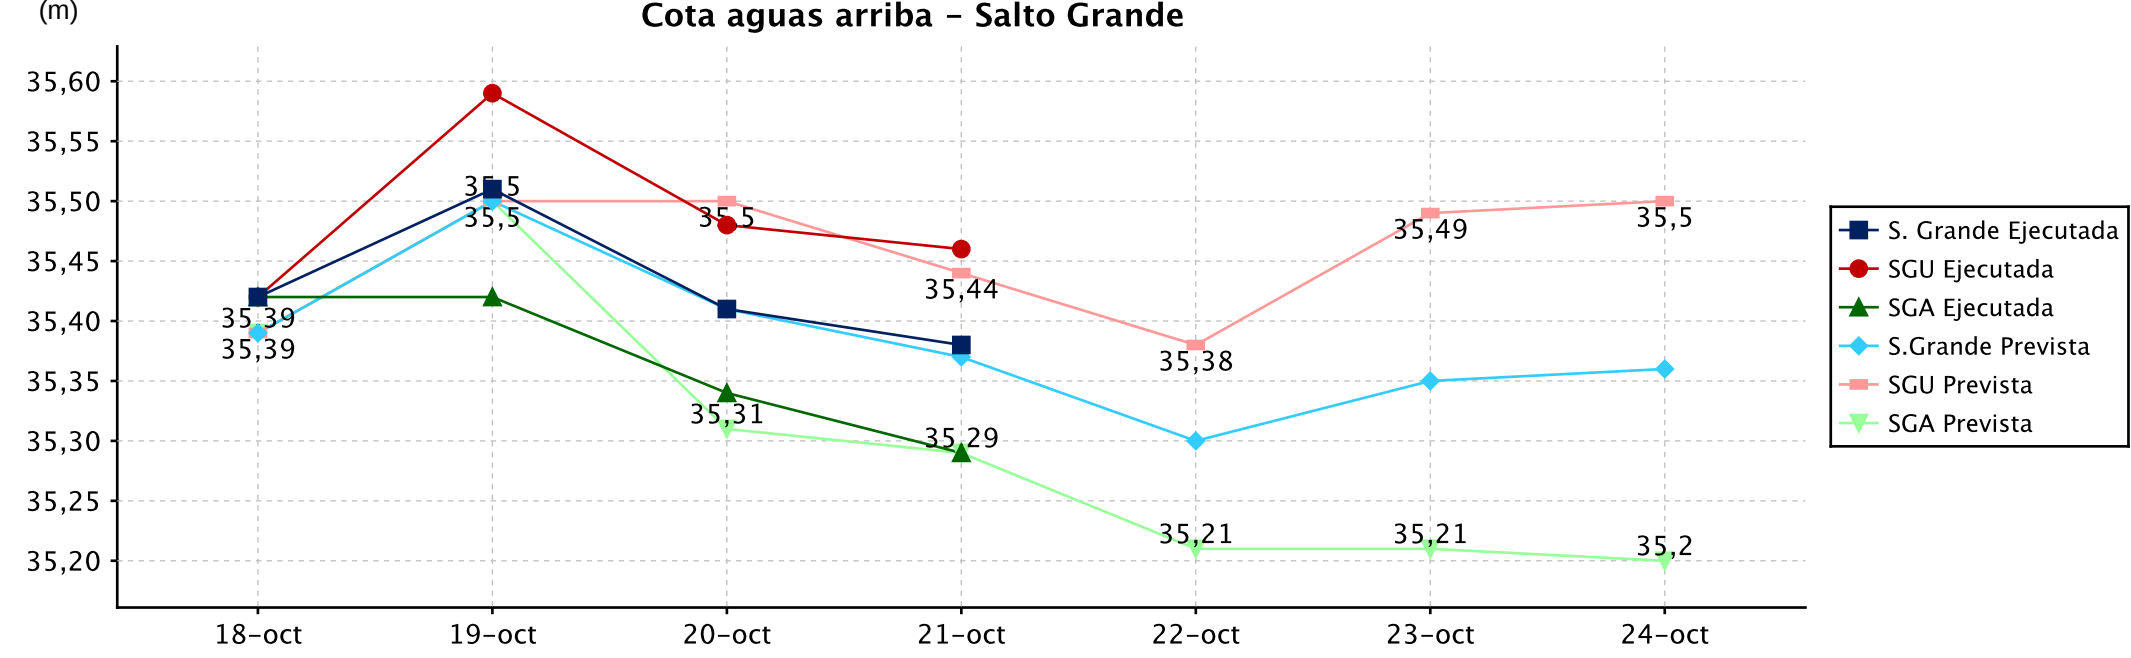

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,46
Cota Vista Arg	35,29
Cota real	35,38

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.078
---------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	512	509
Baygorria	902	818
Palmar	1.493	1.429
SGU	4.175	4.117

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.767	3.165
Baygorria	23	159
Palmar	424	136
SGU	3.875	3.792

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.050	1.972
Baygorria	1.730	1.743
Palmar	1.150	1.162
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
