




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 25 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-1
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.227
C. Baygorria	1.955
C. Palmar	7.808
C. Salto Grande	21.760
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.906
TOTAL Generación	39.642



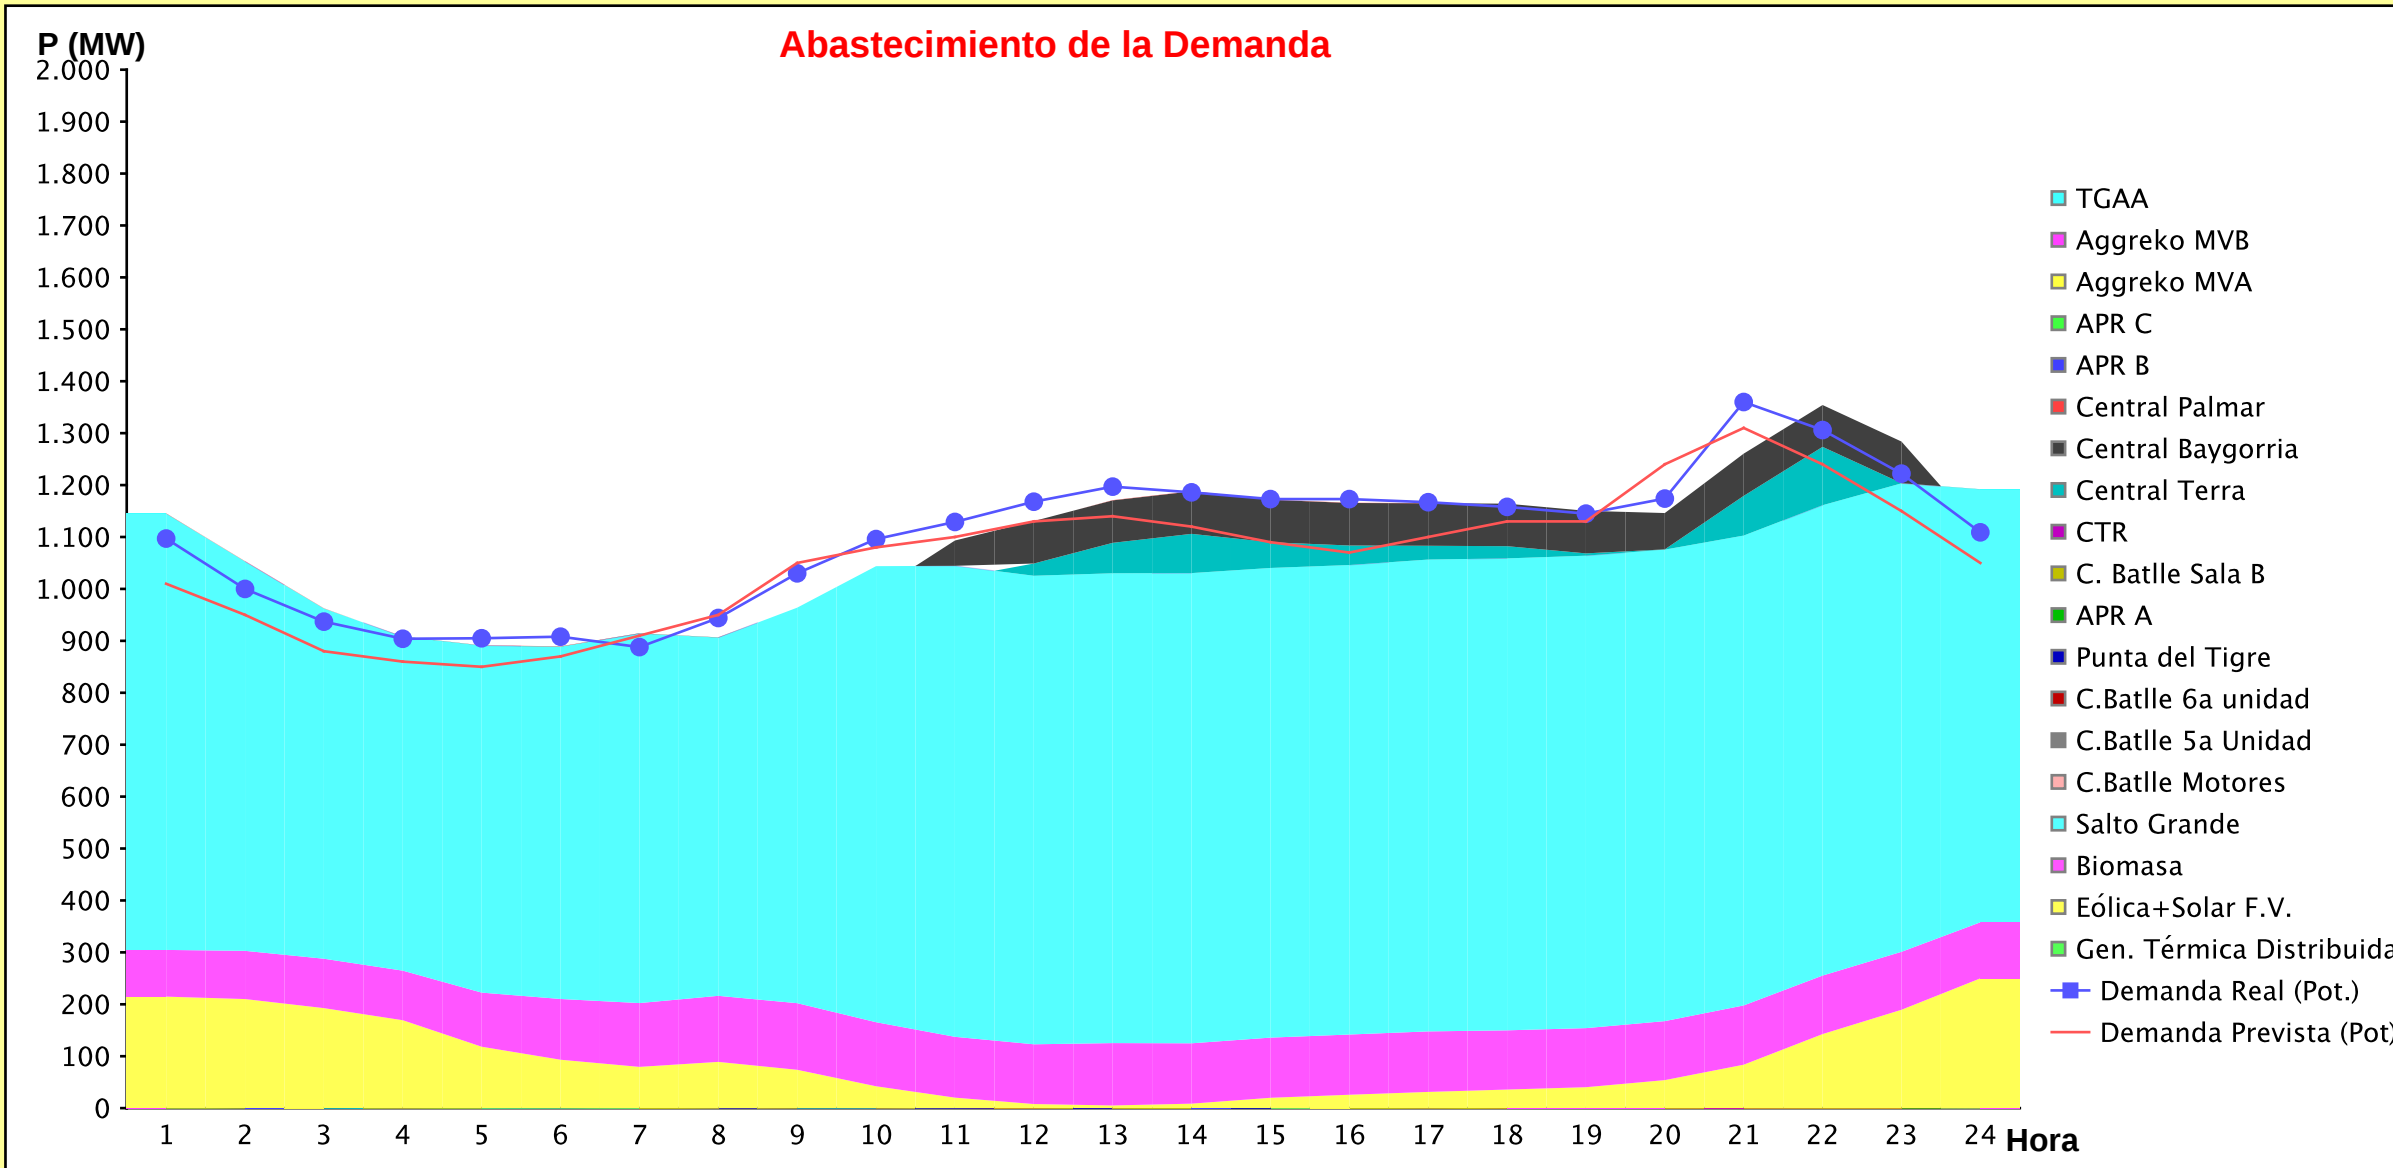


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.341
Hidráulica	13.341
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.341

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.301
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	25.410
Diferencia (MWh)	891
Ejecutada - Programada	3,51 %


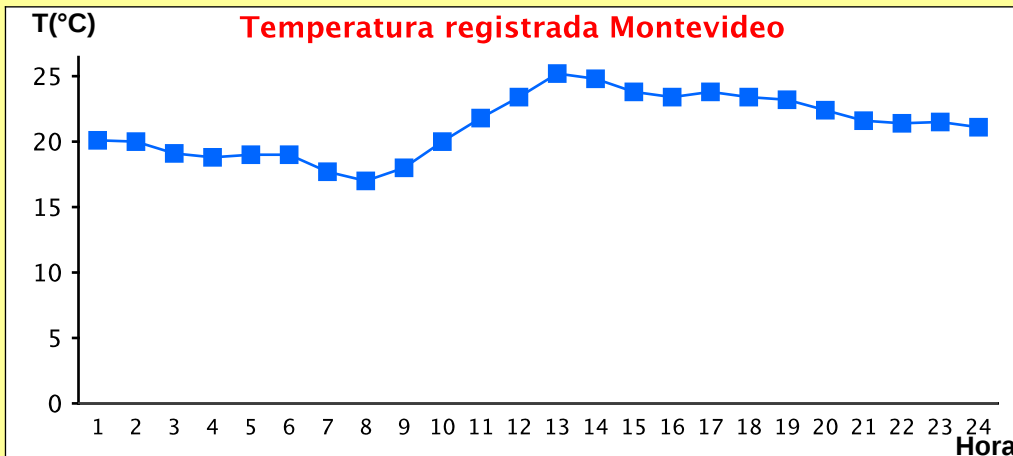


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1205,39 Hora 13:21
Potencia mínima:	880,81 Hora 04:42
Pico noche:	1365,58 Hora 20:56
Generación Media (MW)	
Eólica	91,9
Biomasa	112,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

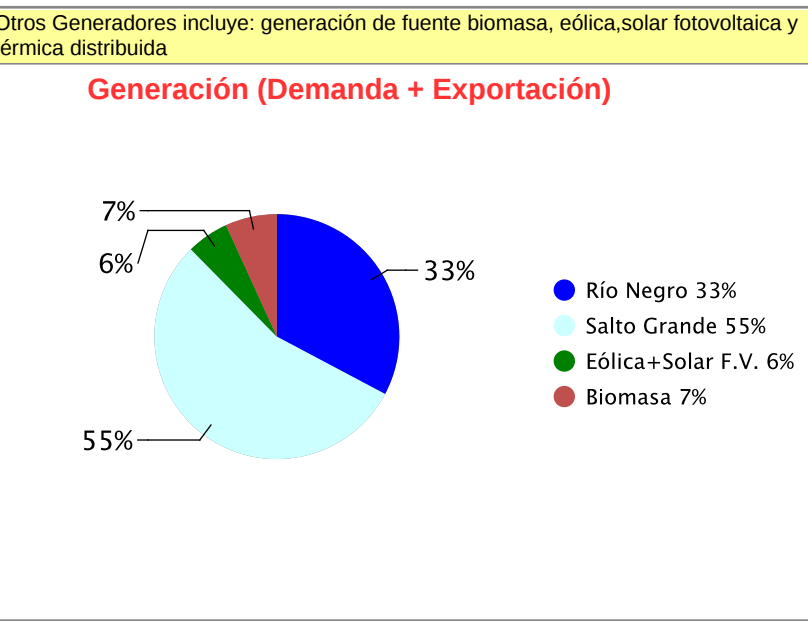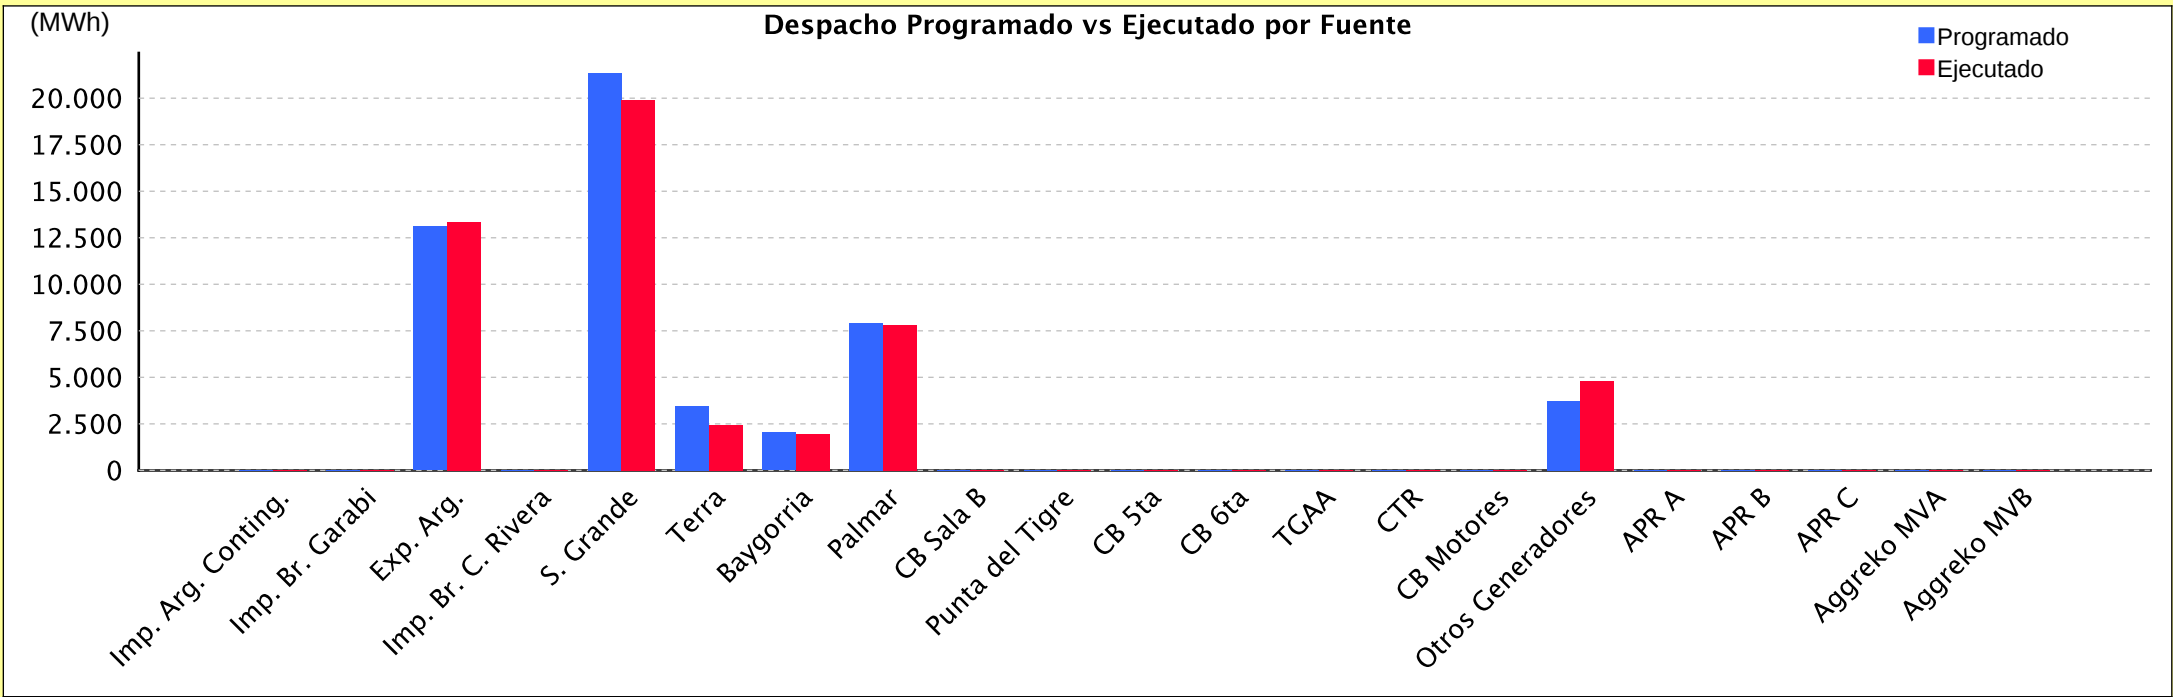
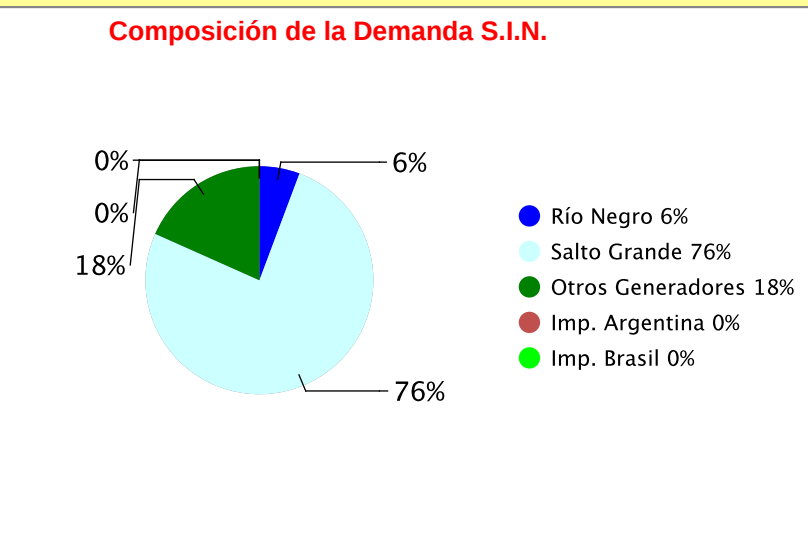


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

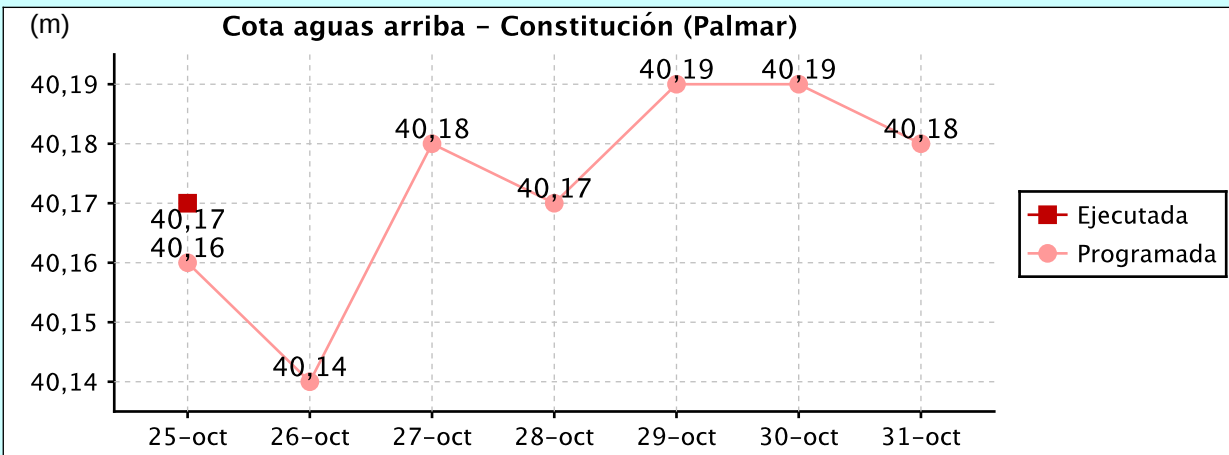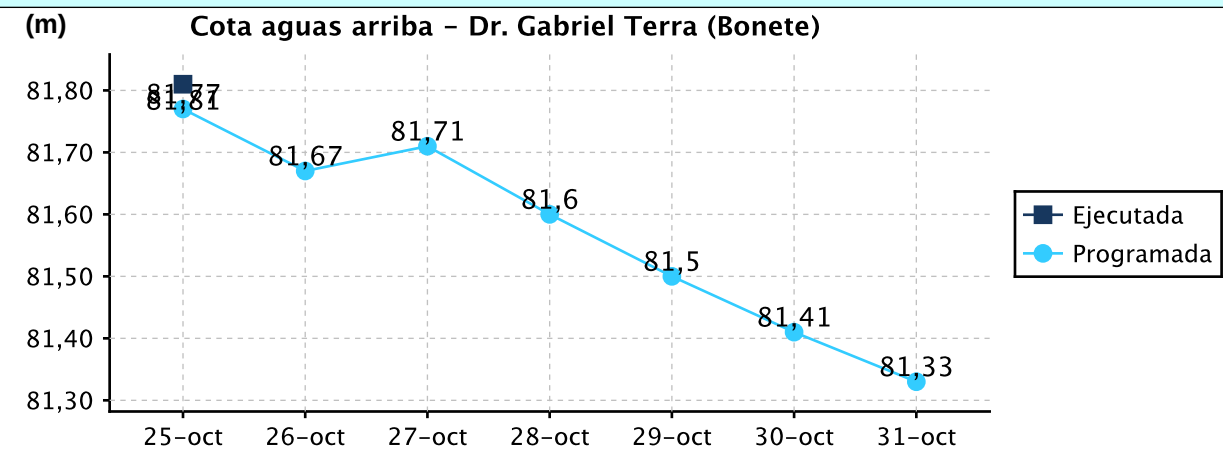

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,77	81,81
Baygorria	54,28	54,29
Palmar	40,16	40,17
SGU	35,52	35,56
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

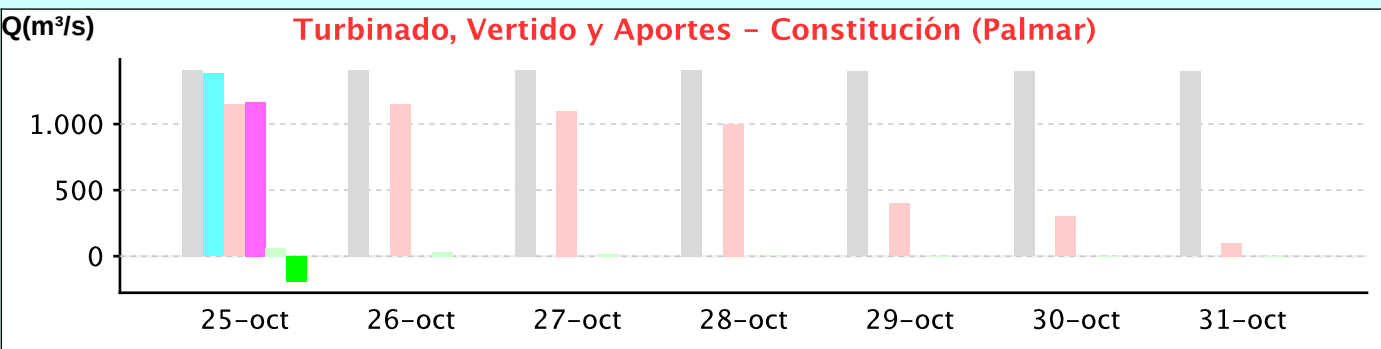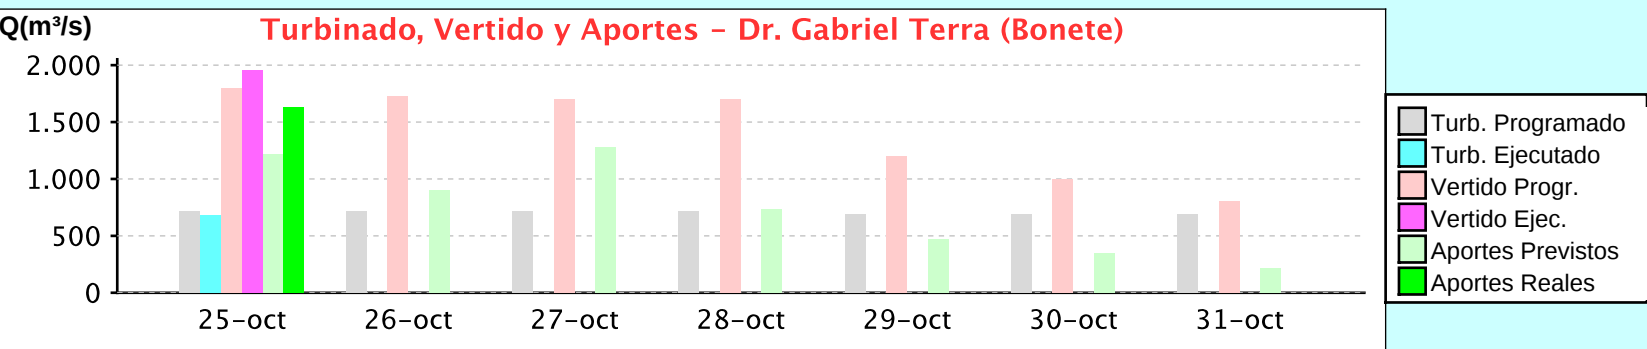

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

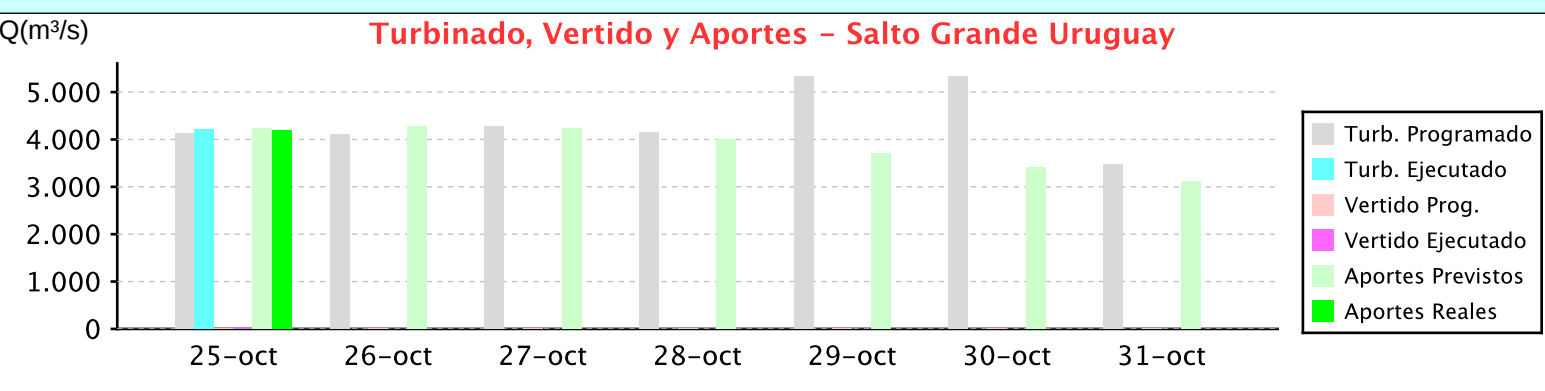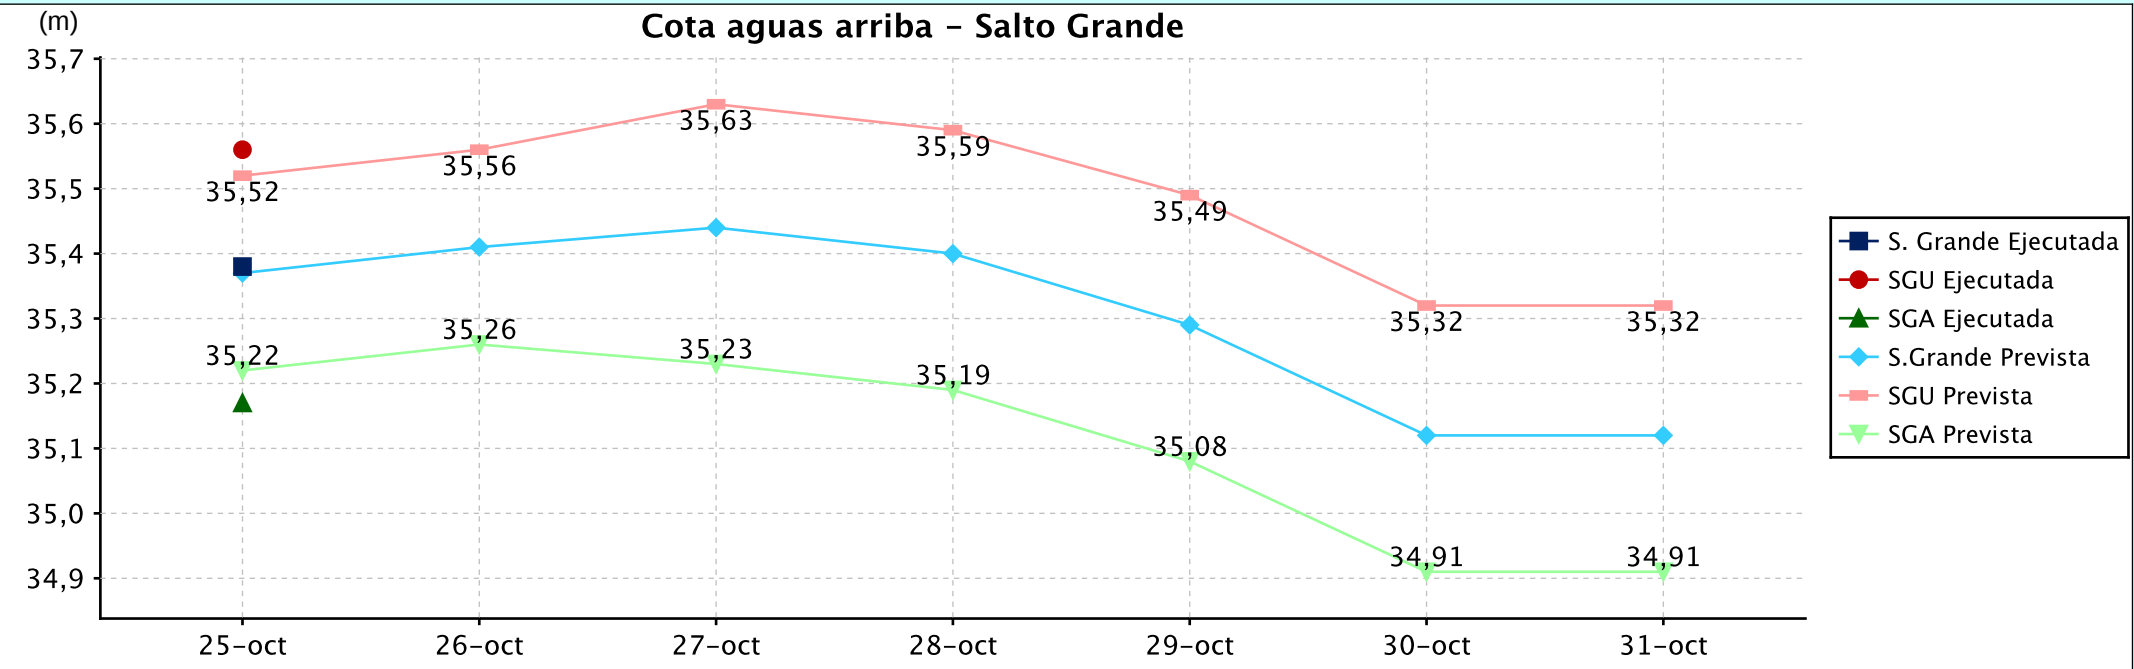

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,56
Cota Vista Arg	35,17
Cota real	35,38
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	9.645

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	715	684
Baygorria	828	827
Palmar	1.410	1.383
SGU	4.138	4.210

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.220	1.633
Baygorria	0	250
Palmar	61	-197
SGU	4.225	4.192

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.800	1.954
Baygorria	1.600	1.981
Palmar	1.150	1.168
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
