




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 27 de octubre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	325
Sala B	-5
5ta.	0
6ta.	0
Motores	330
Central La Tablada	-3
Central P. del Tigre	502
APR A	266
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.245
C. Baygorria	1.851
C. Palmar	7.779
C. Salto Grande	21.755
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.707
TOTAL Generación	44.424

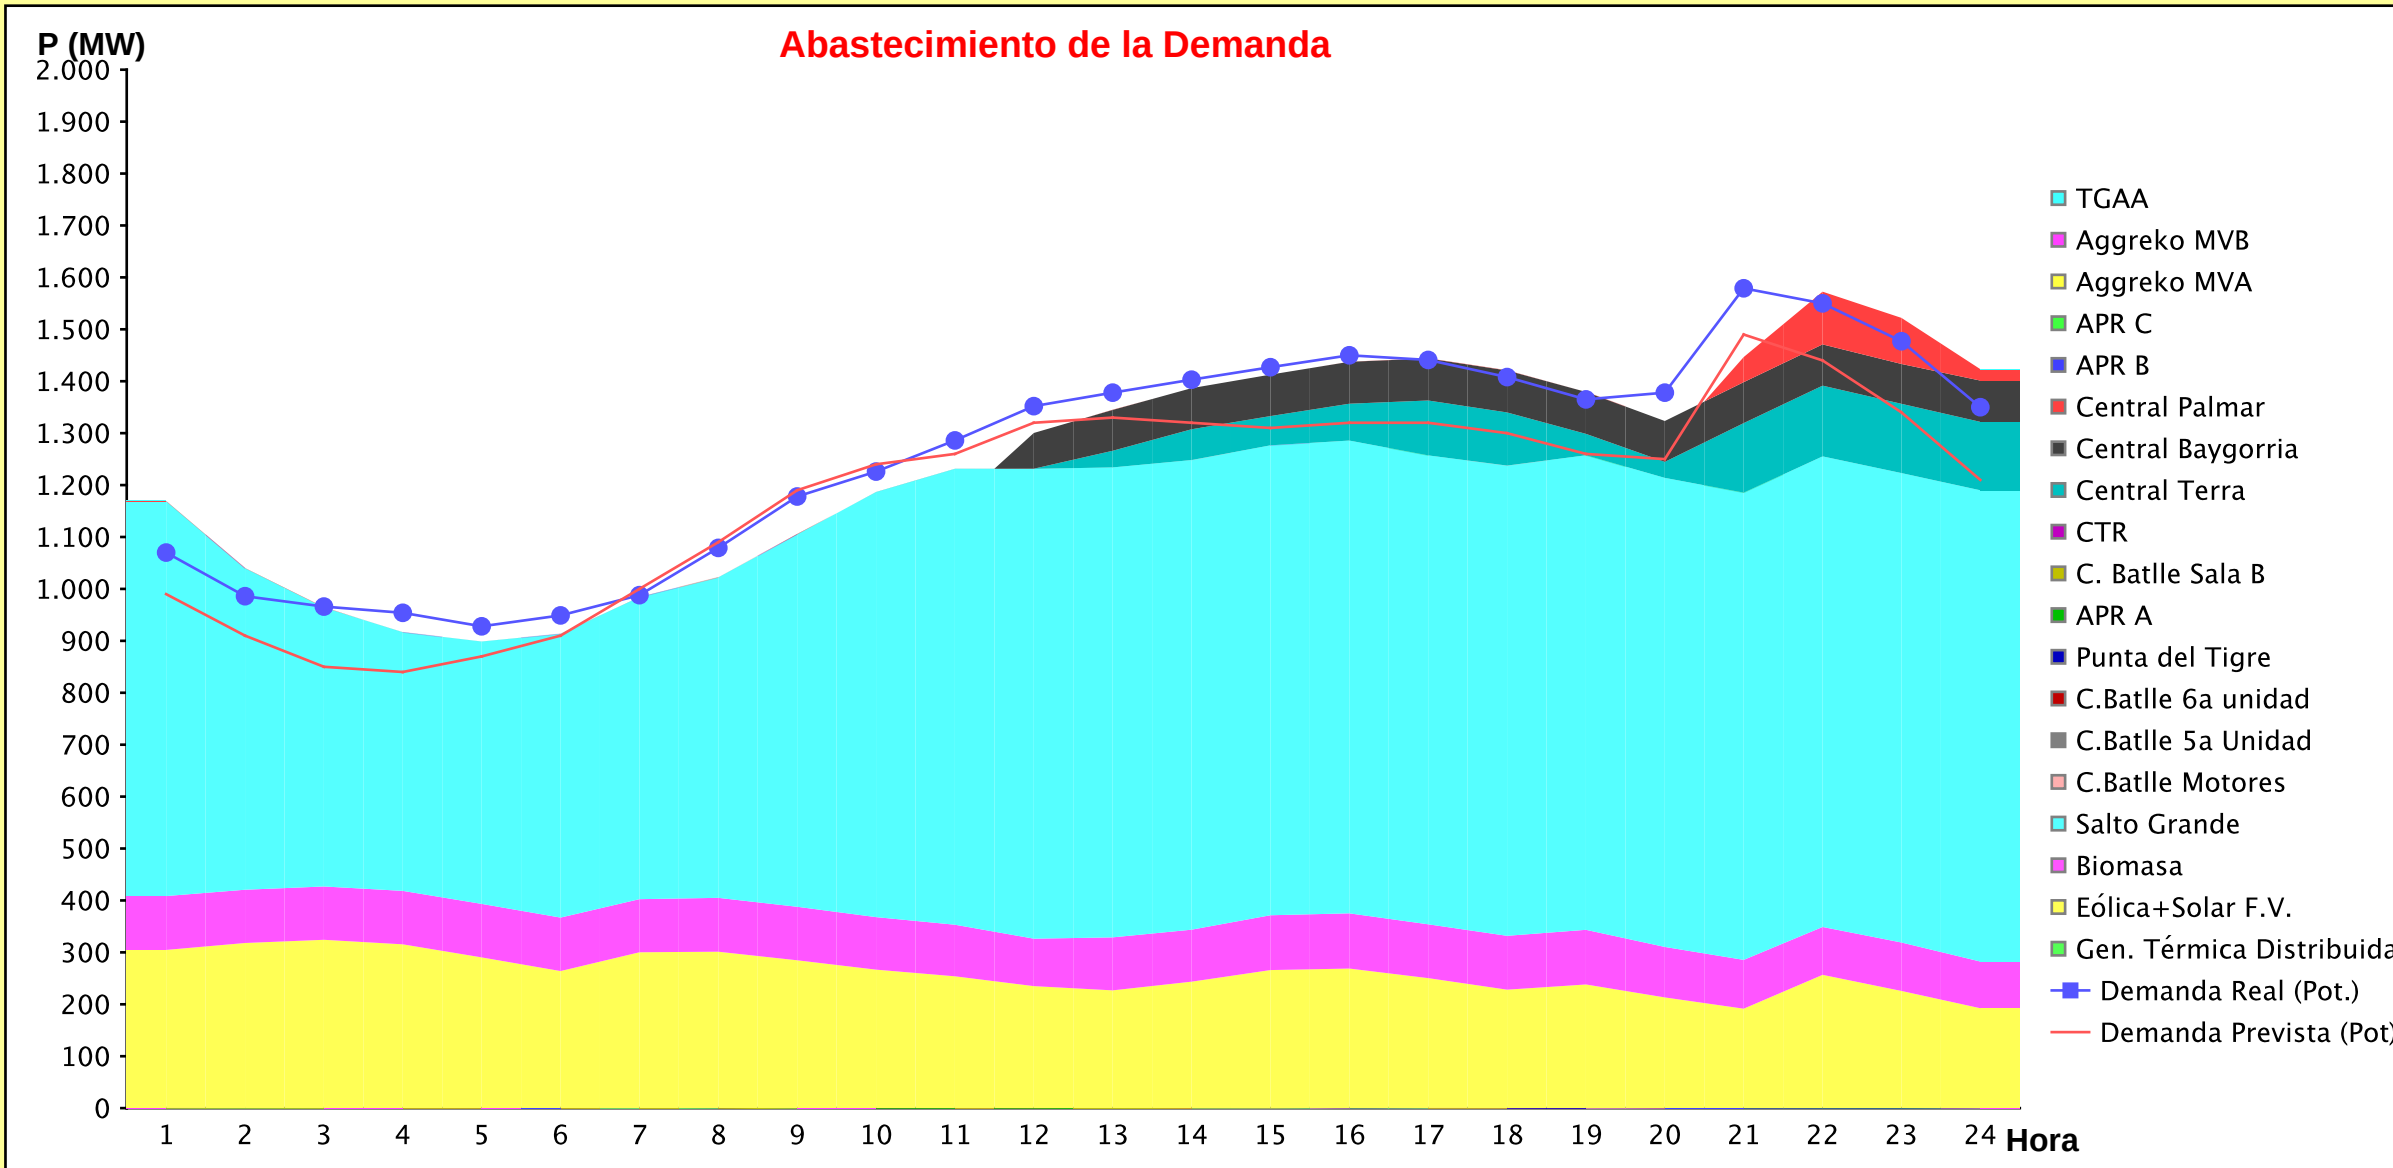




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	14.569
Hidráulica	13.459
Térmica	1.110
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	14.569

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.855
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	1.495
Ejecutada - Programada	5,27 %

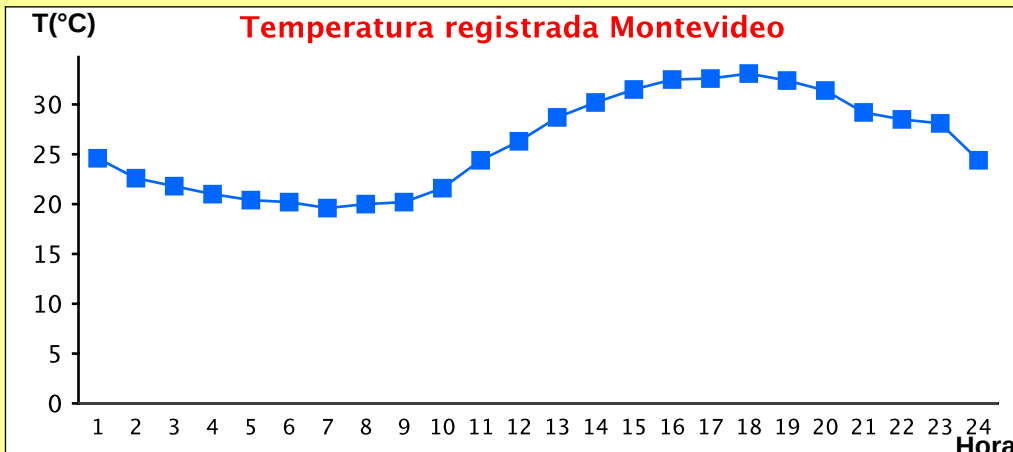



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1455,67 Hora 16:54
Potencia mínima:	893,15 Hora 04:09
Pico noche:	1596,48 Hora 21:04

Generación Media (MW)	
Eólica	260,9
Biomasa	100,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

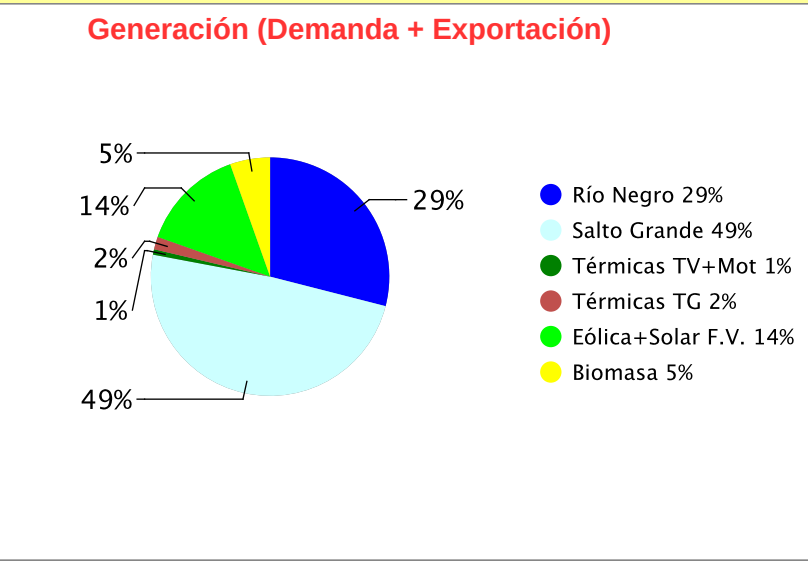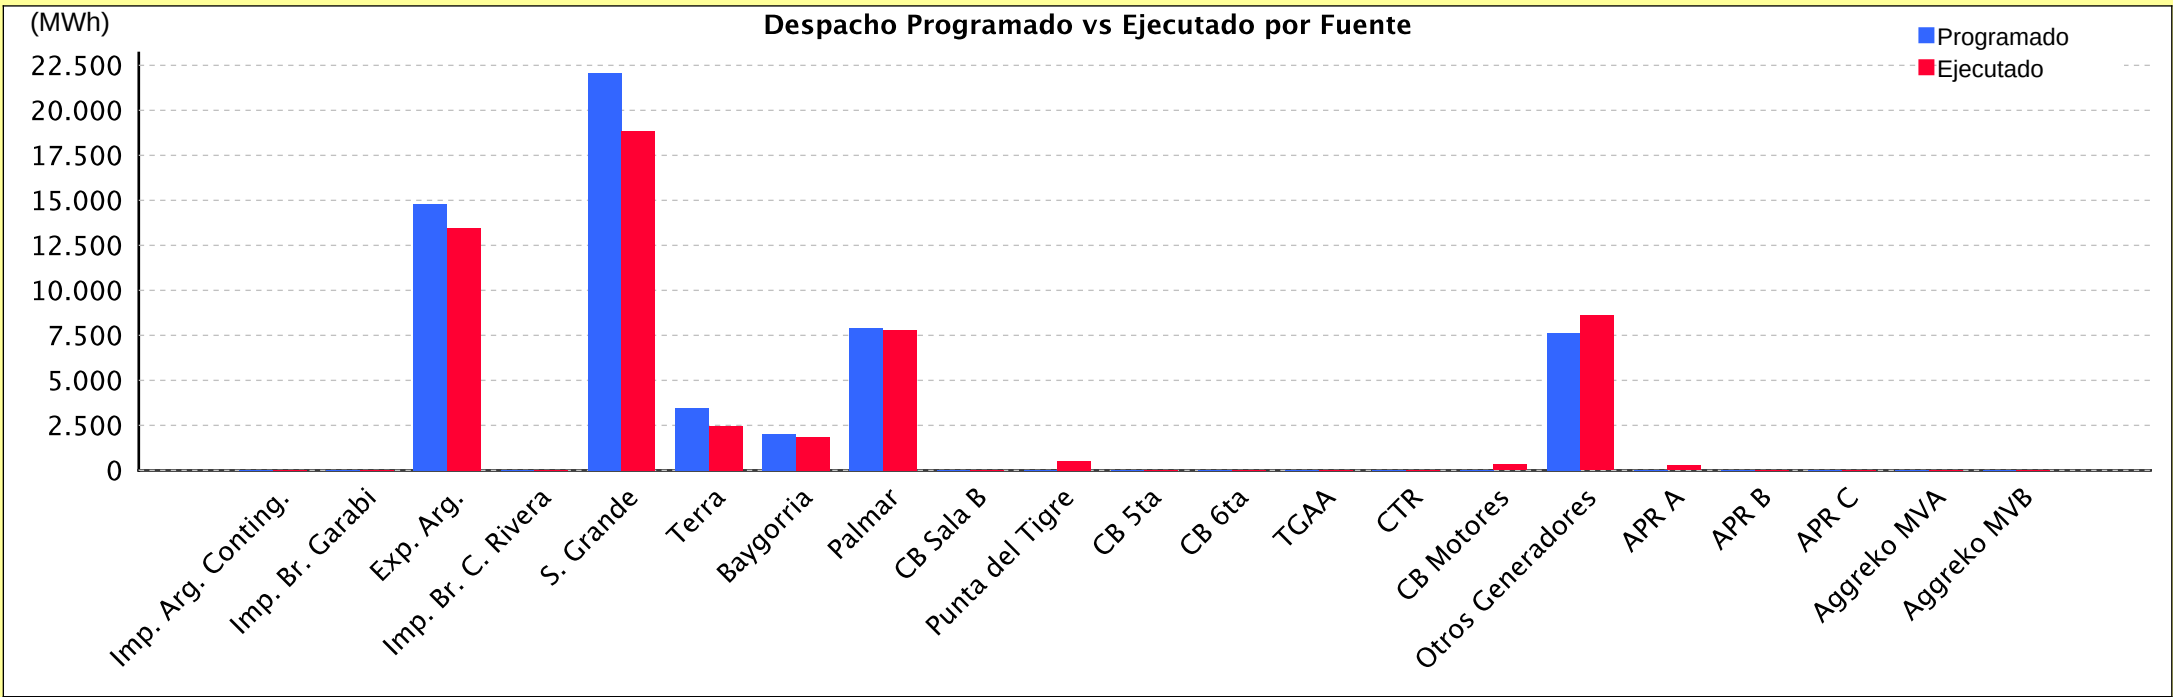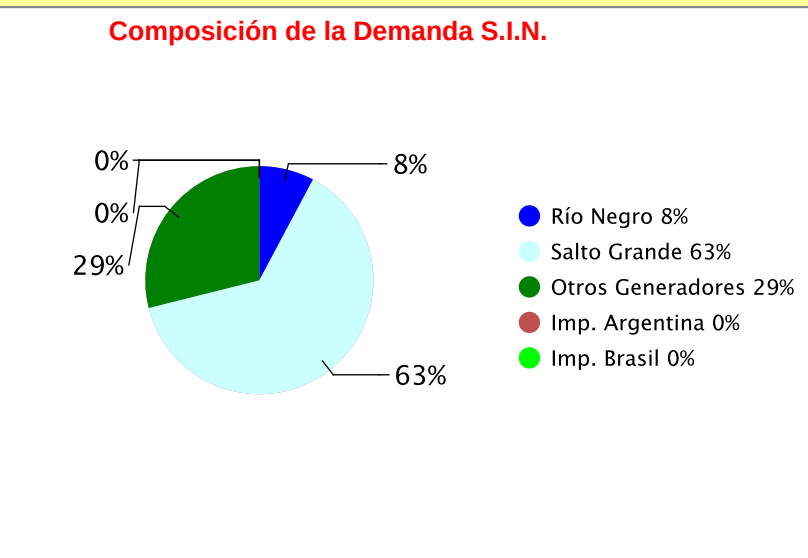



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

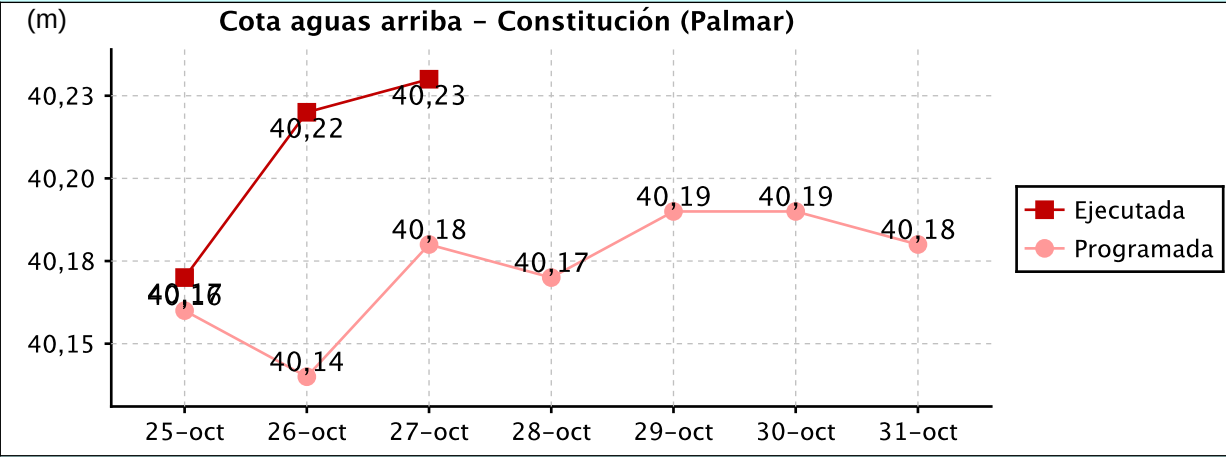
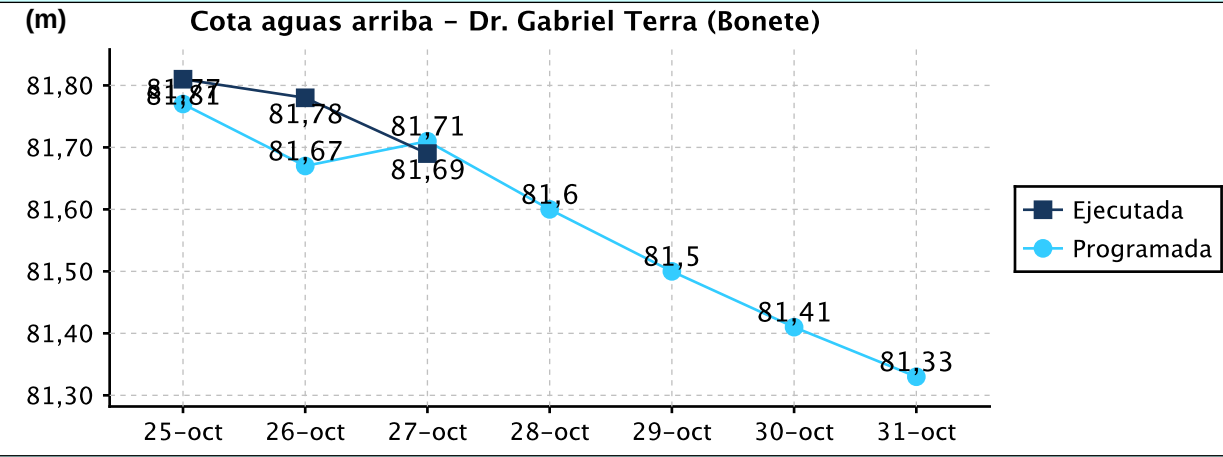


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,71	81,69
Baygorria	54,15	54,18
Palmar	40,18	40,23
SGU	35,63	35,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

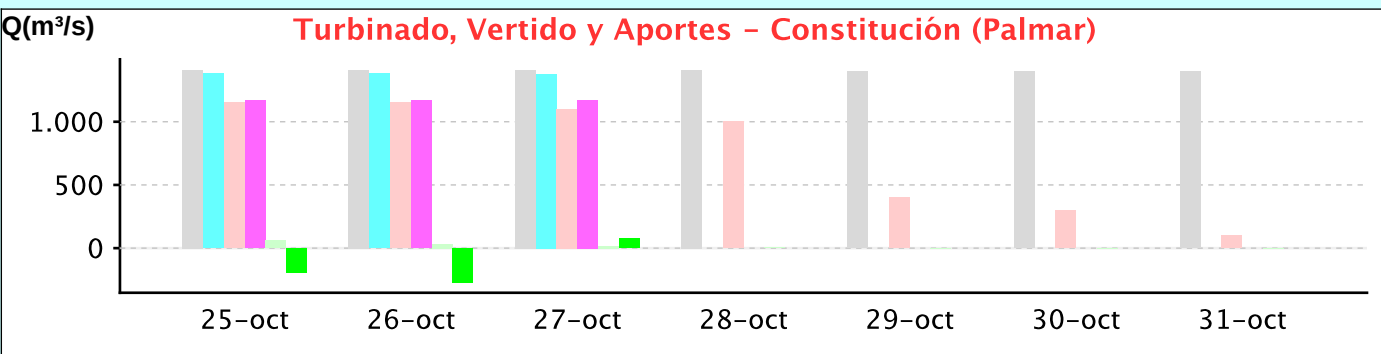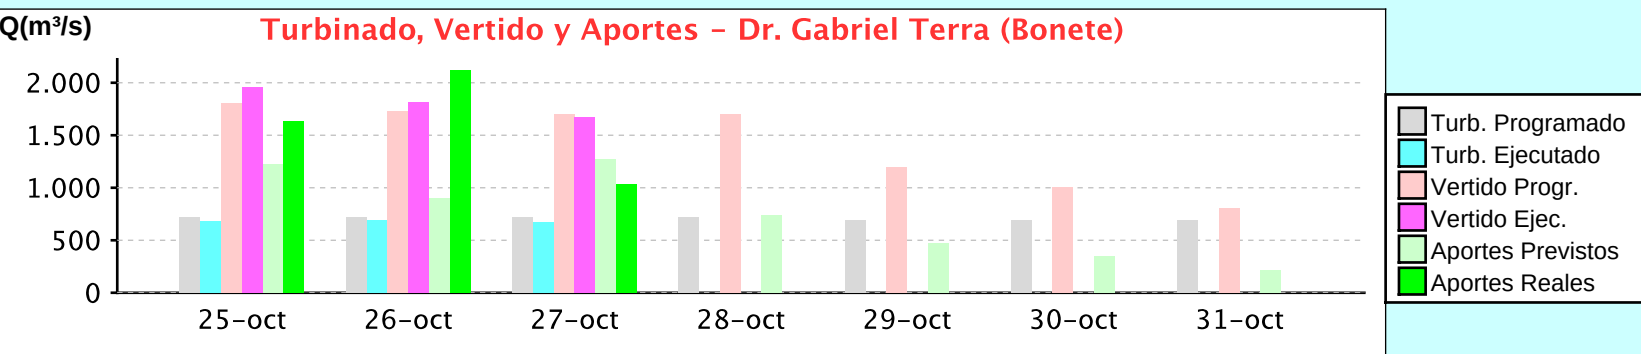

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

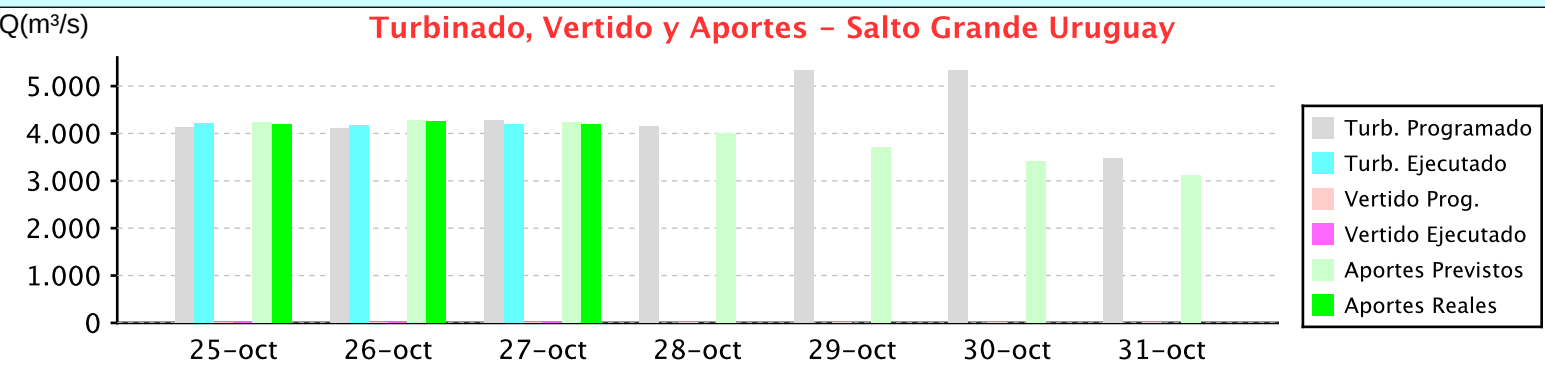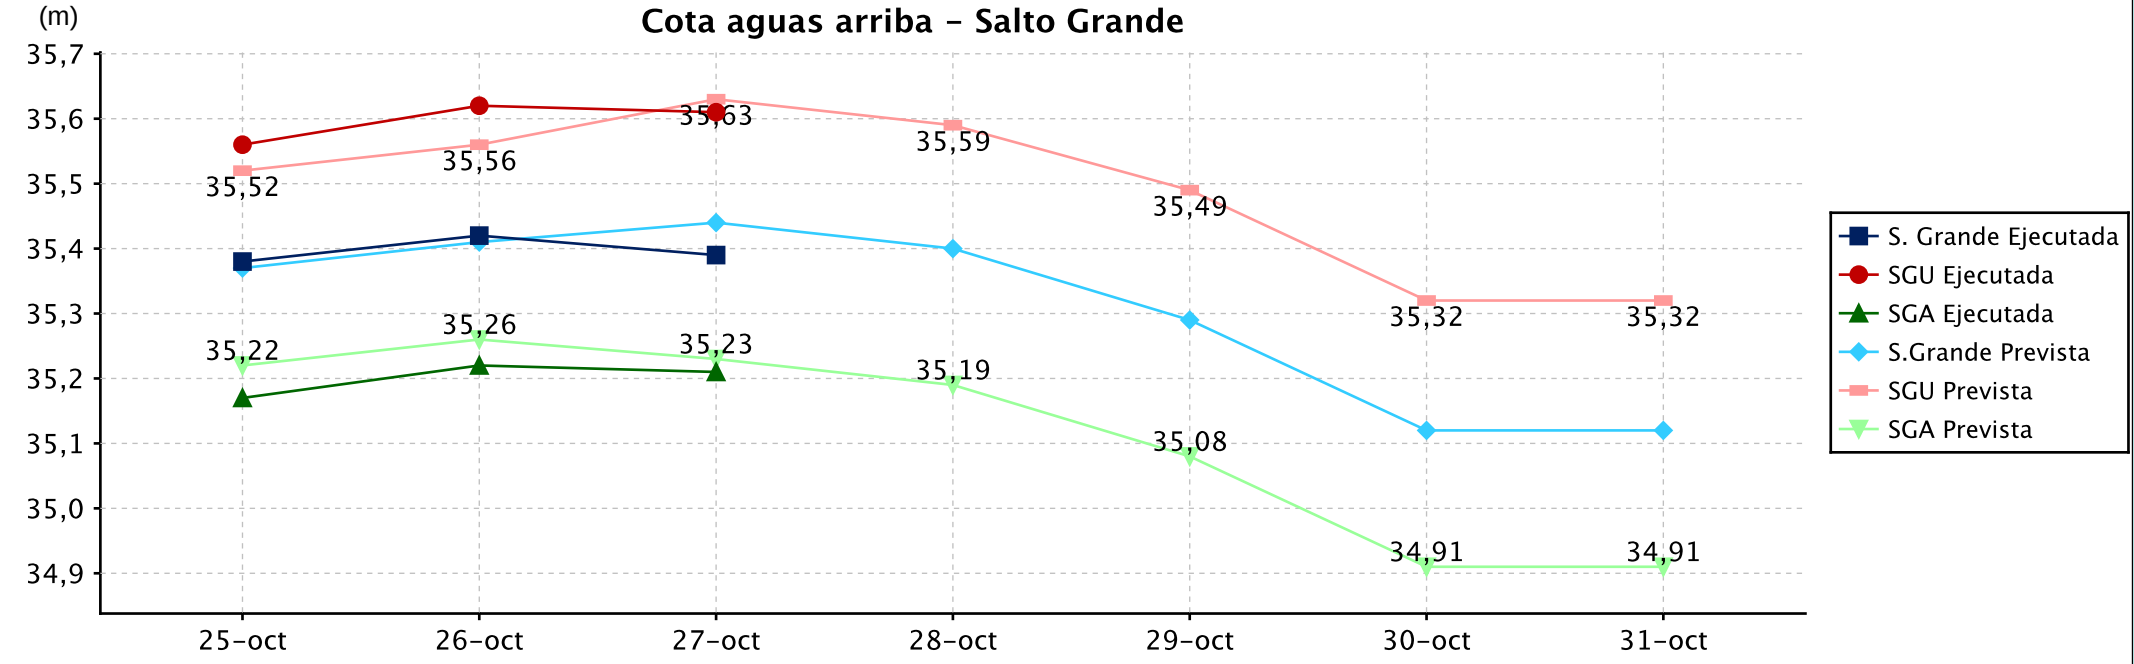

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,61
Cota Vista Arg	35,21
Cota real	35,39

Dif. Energ. (U-A)	9.789
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	715	673
Baygorria	828	765
Palmar	1.410	1.378
SGU	4.277	4.198

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.276	1.038
Baygorria	0	257
Palmar	16	76
SGU	4.225	4.196

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.700	1.671
Baygorria	1.500	1.758
Palmar	1.100	1.172
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
