




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 29 de octubre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	7
Central La Tablada	-22
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.209
C. Baygorria	1.718
C. Palmar	7.809
C. Salto Grande	20.037
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.800
TOTAL Generación	39.547

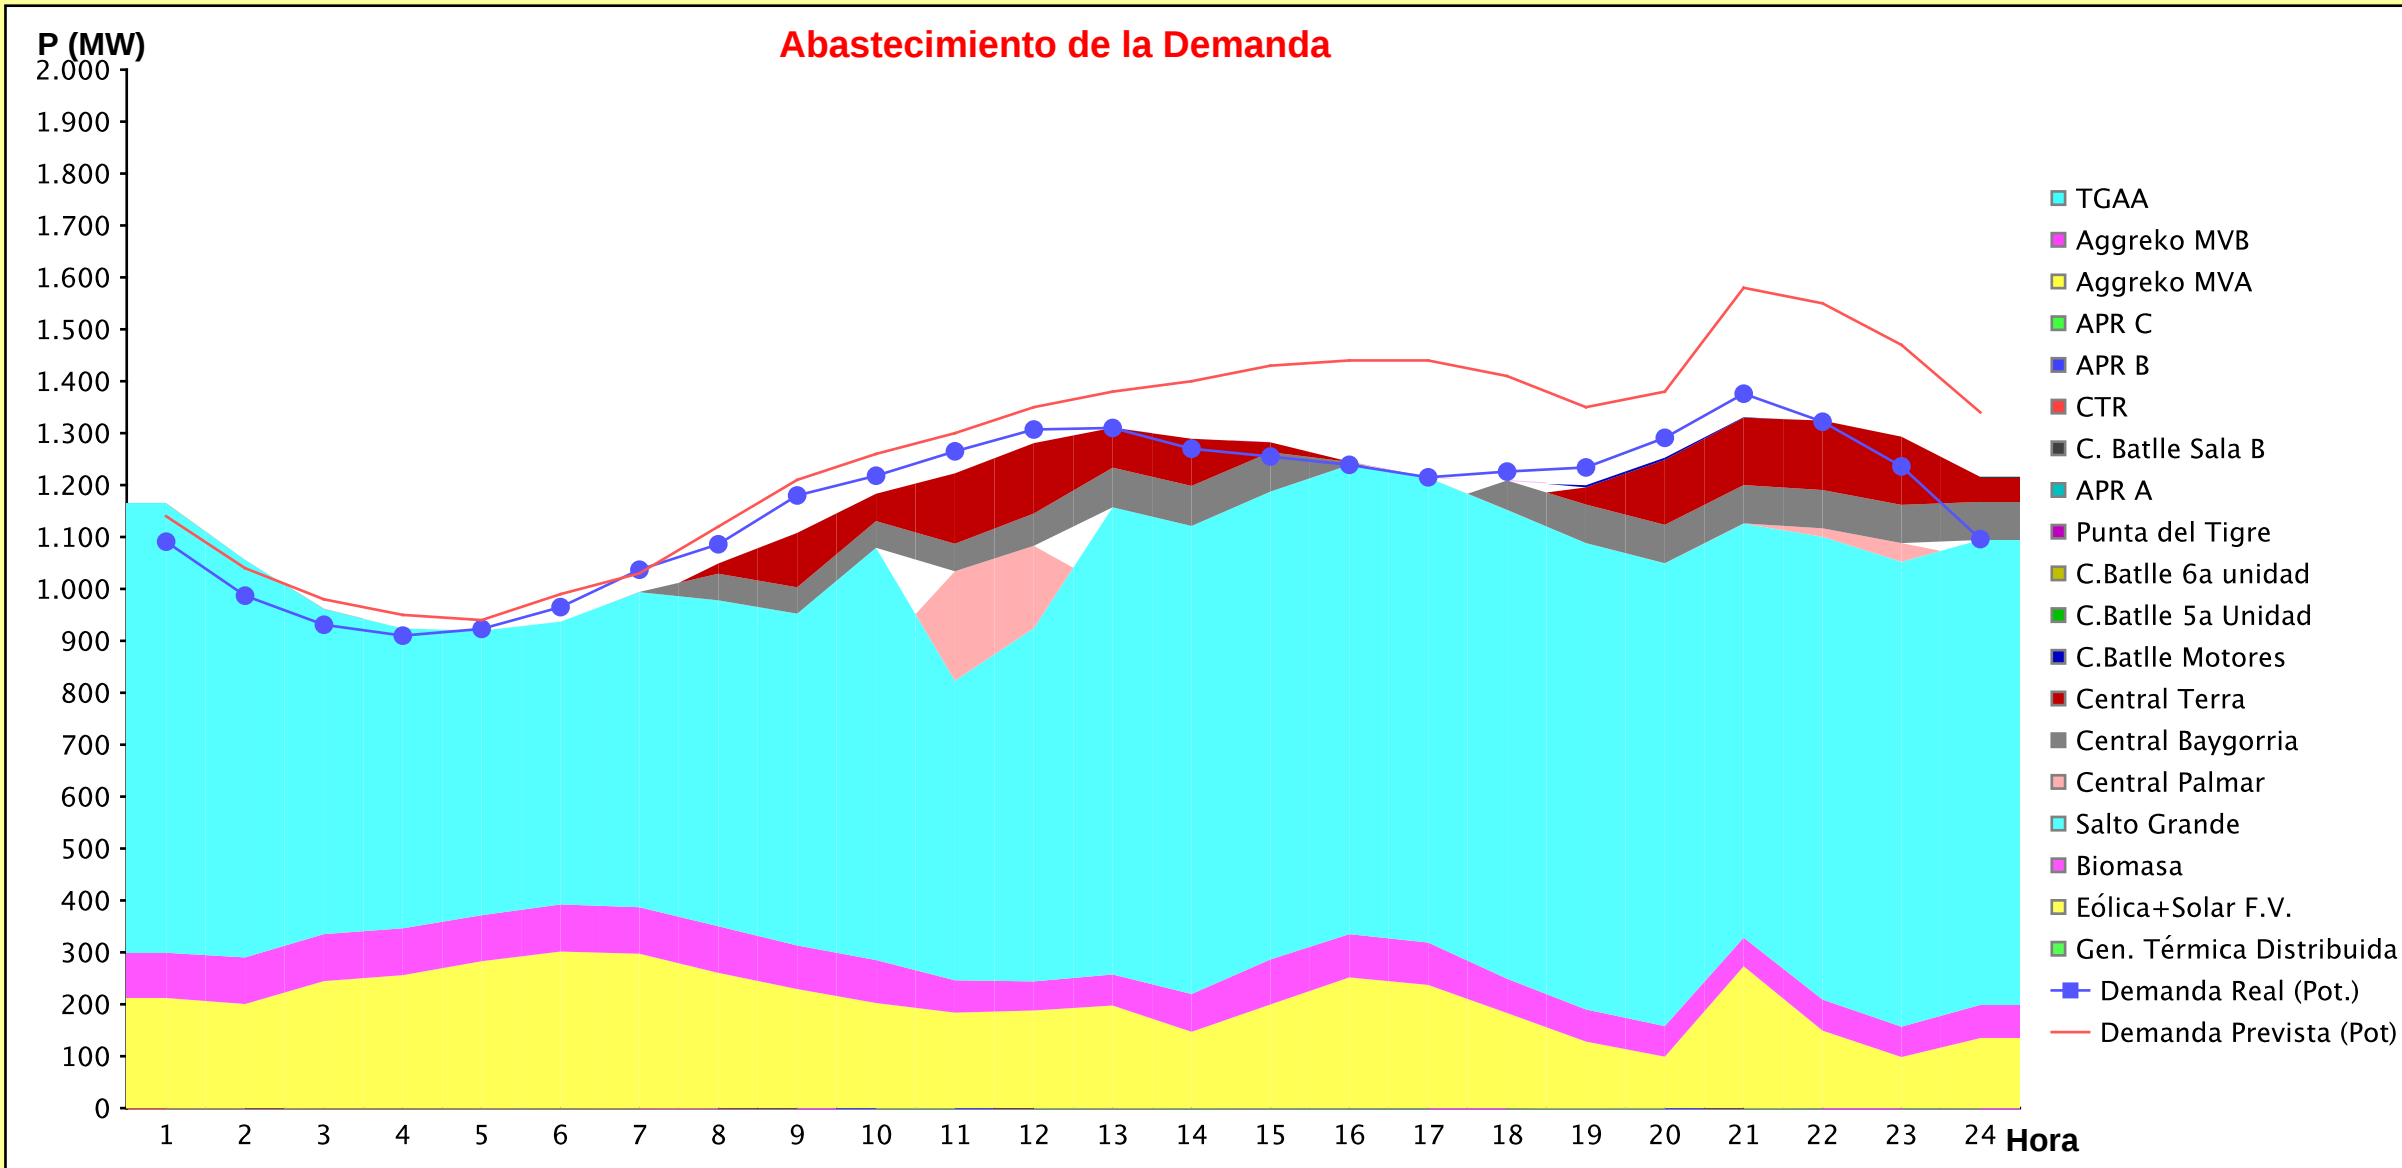

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.590
Hidráulica	11.590
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.590



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.957
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.480
Diferencia (MWh)	-2.523
Ejecutada - Programada	-8,28 %

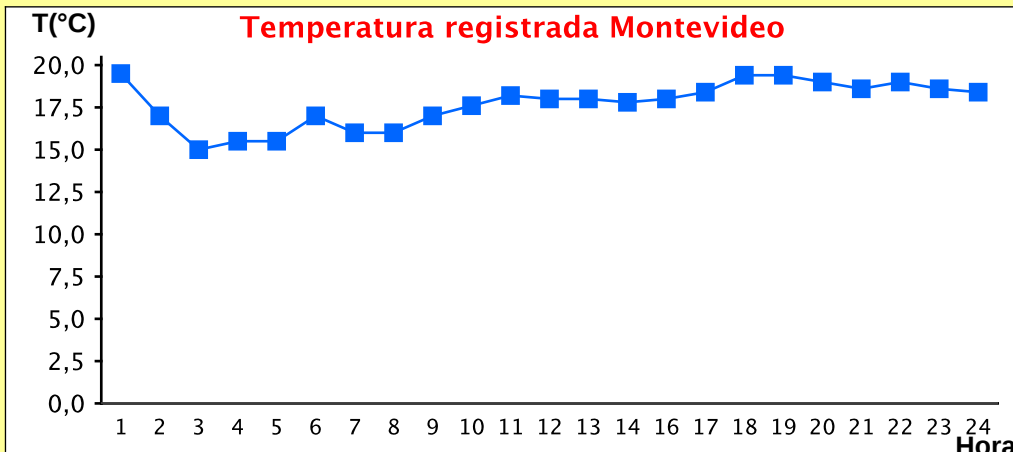


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1329,58 Hora 12:32
Potencia mínima:	892,03 Hora 03:36
Pico noche:	1378,85 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	207,1
Biomasa	75,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

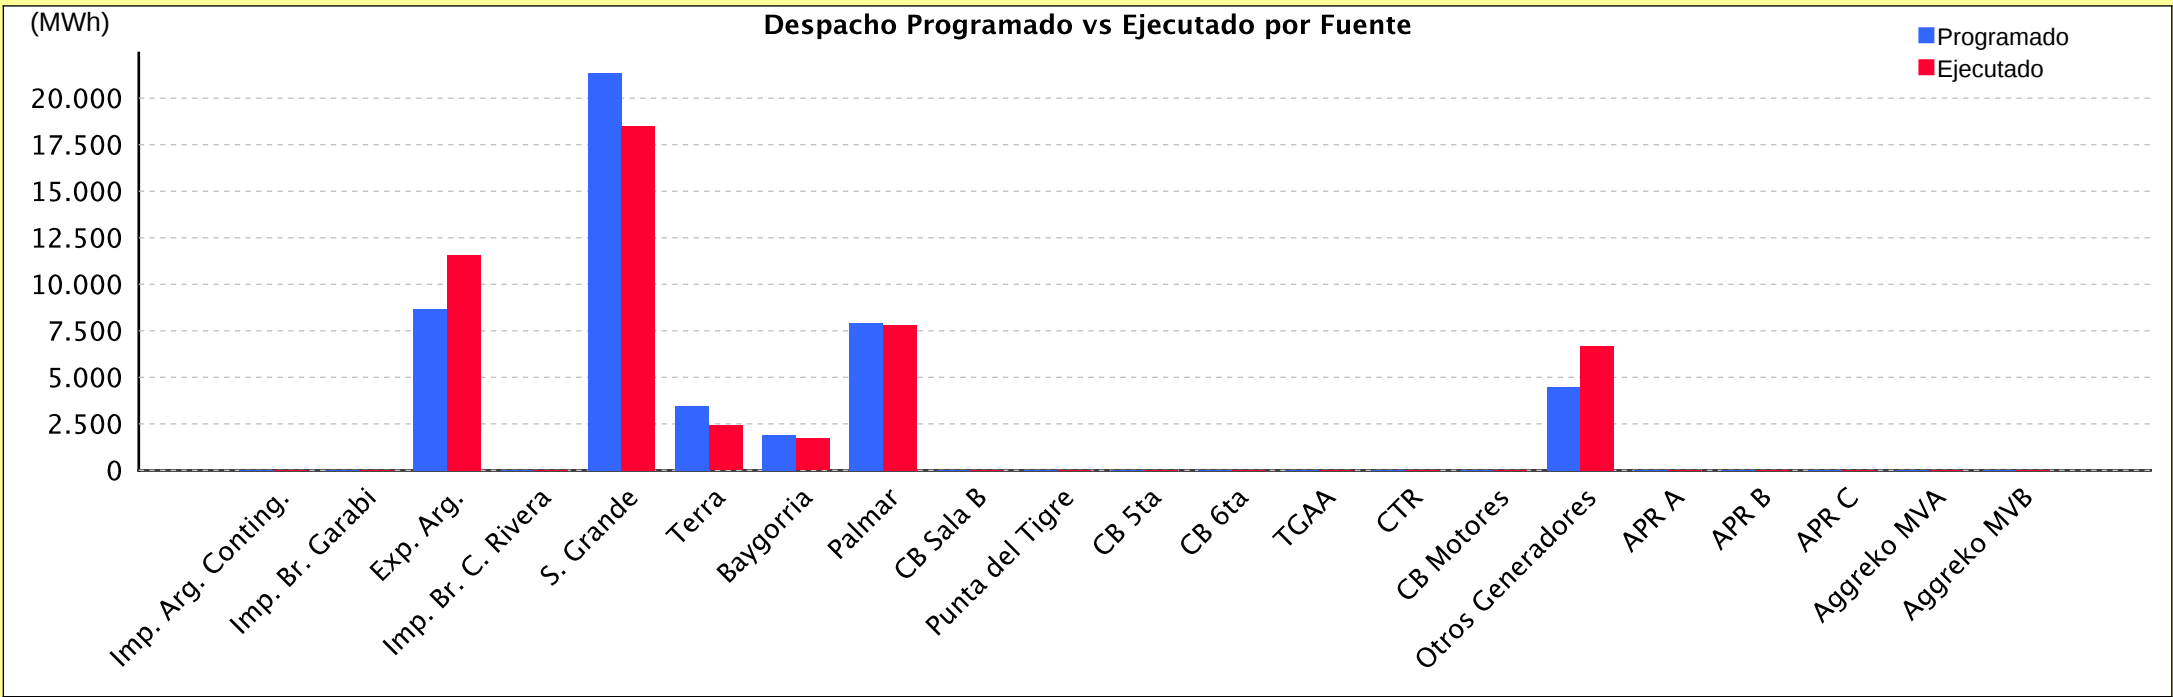
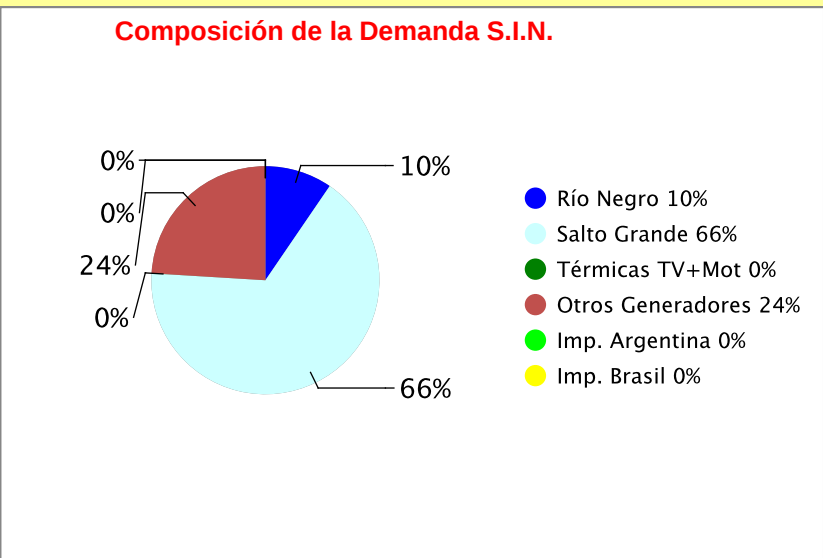


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

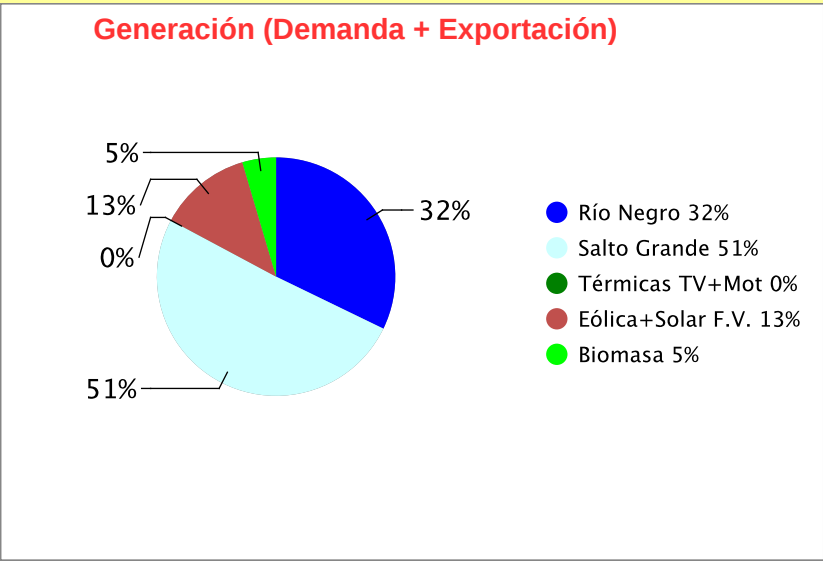



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

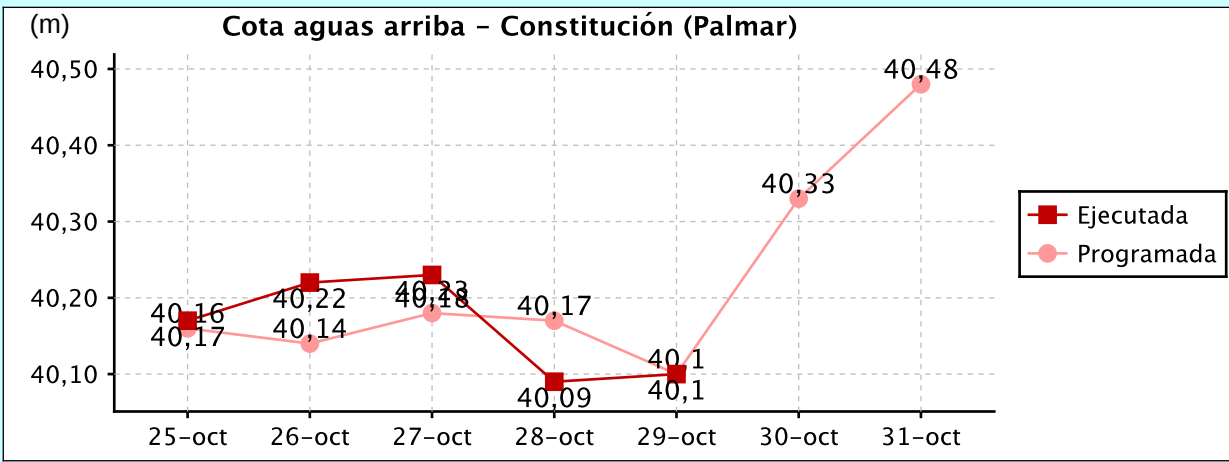
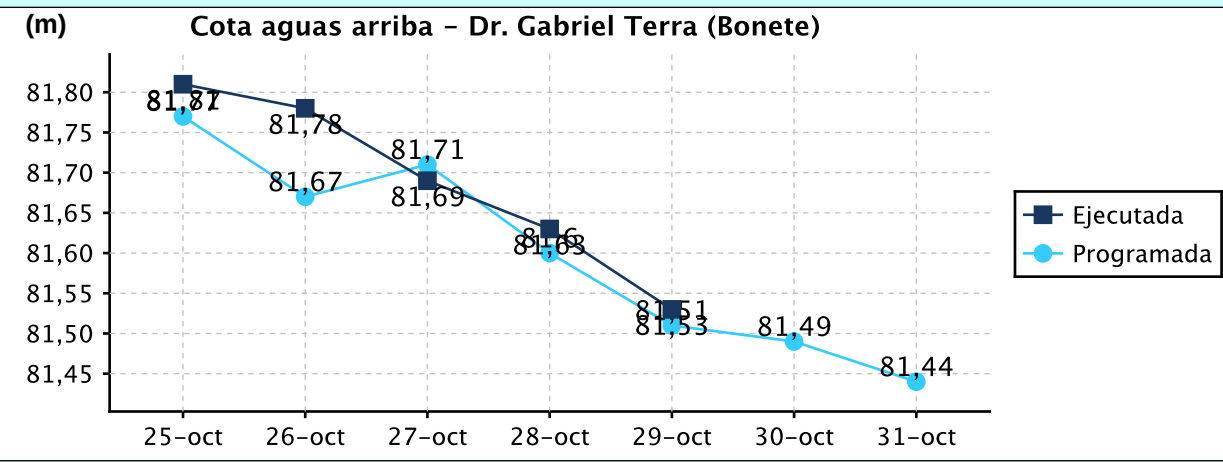


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,51	81,53
Baygorria	54,26	54,07
Palmar	40,10	40,1
SGU	35,44	35,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

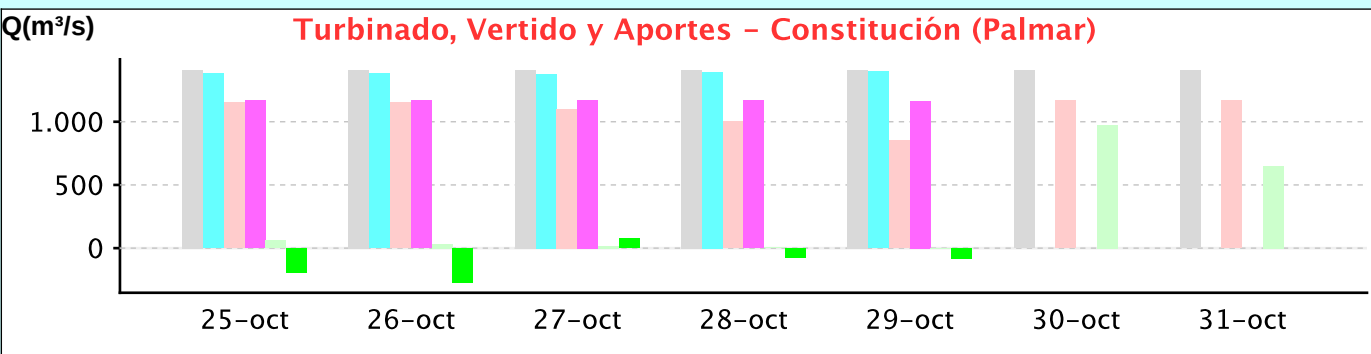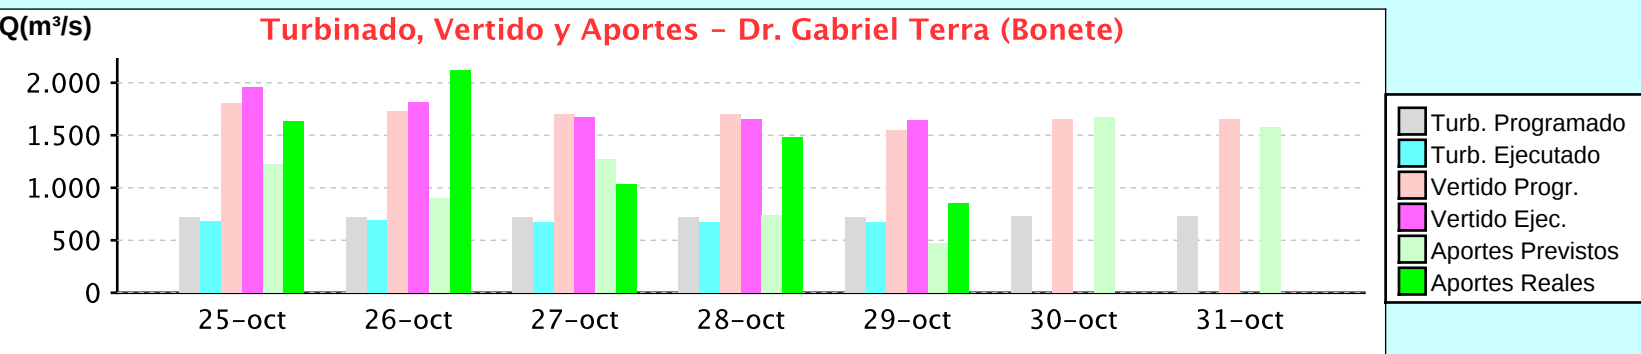

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

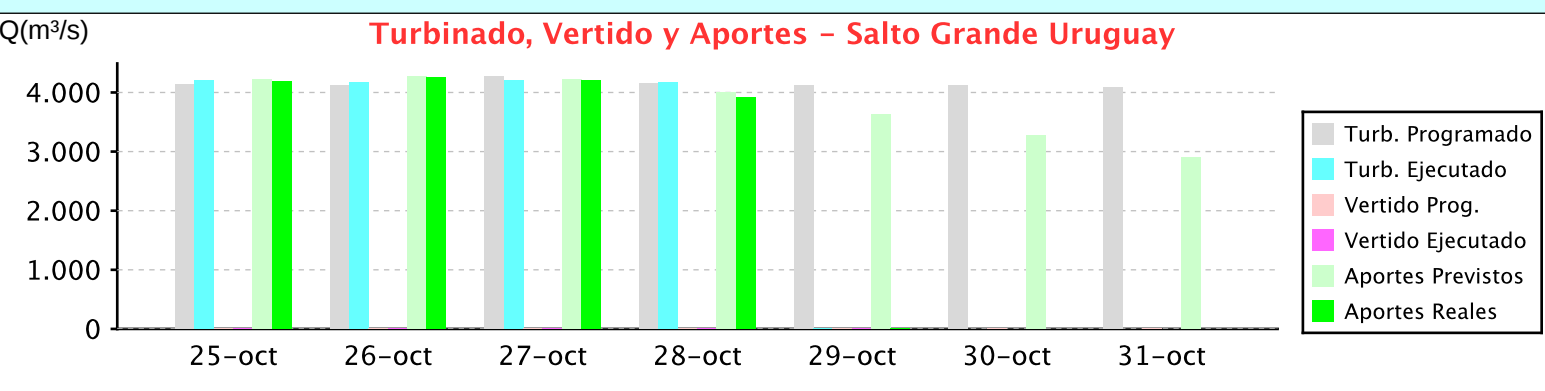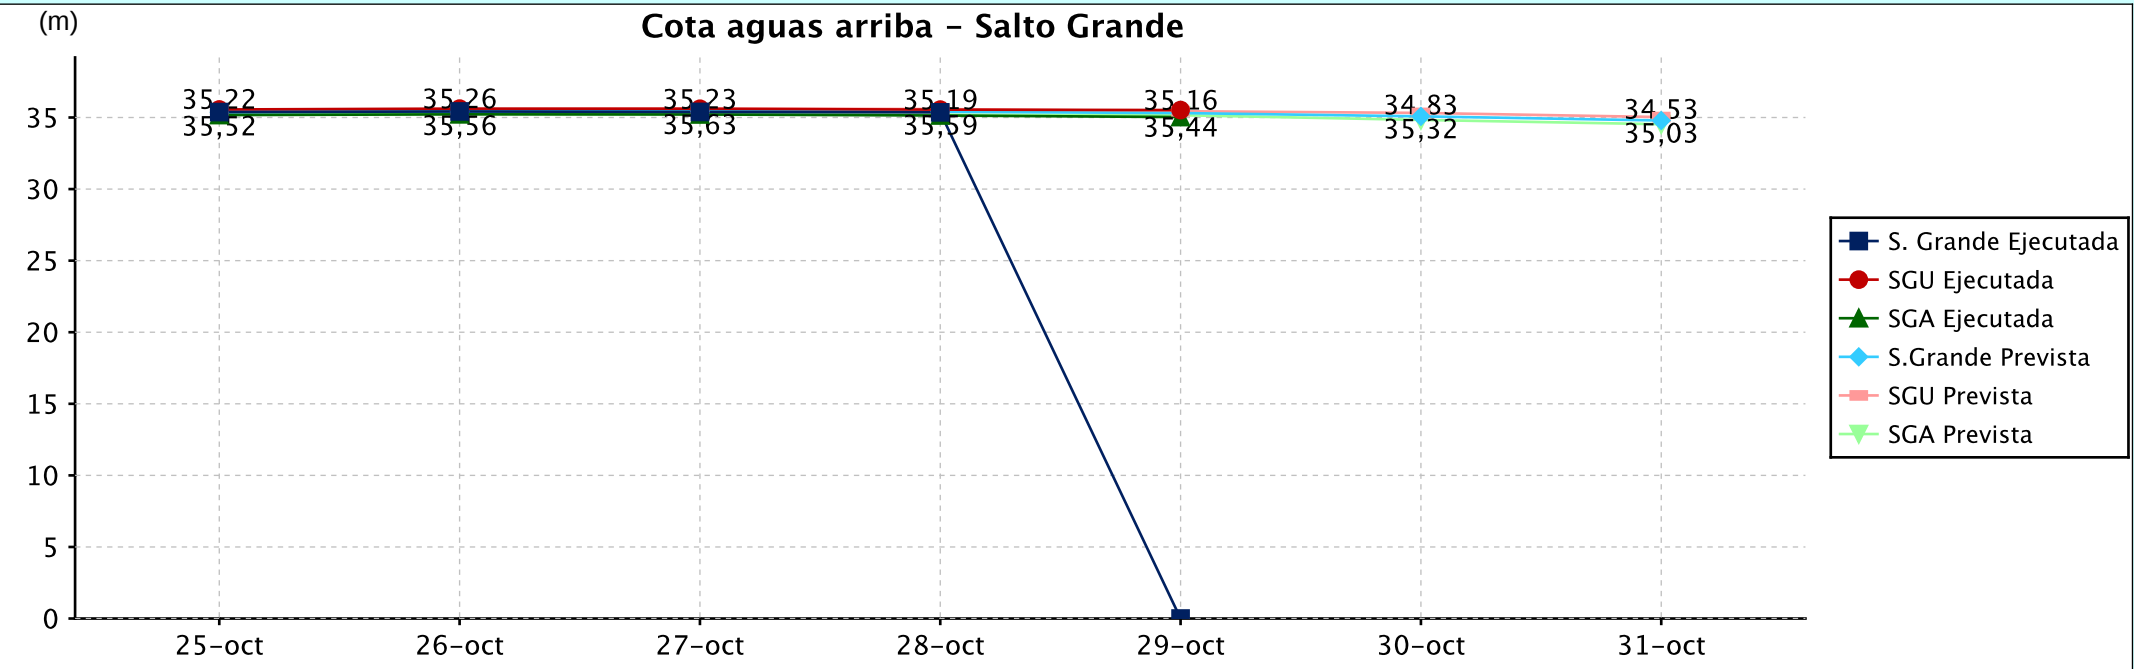

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,52
Cota Vista Arg	35,03
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	11.630

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	715	672
Baygorria	767	683
Palmar	1.410	1.396
SGU	4.113	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	473	855
Baygorria	0	147
Palmar	1	-84
SGU	3.625	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.550	1.641
Baygorria	1.400	2.020
Palmar	850	1.164
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 483 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

30/10/2014 17:07
