




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 01 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-6
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.242
C. Baygorria	1.914
C. Palmar	7.892
C. Salto Grande	20.391
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.040
TOTAL Generación	42.460

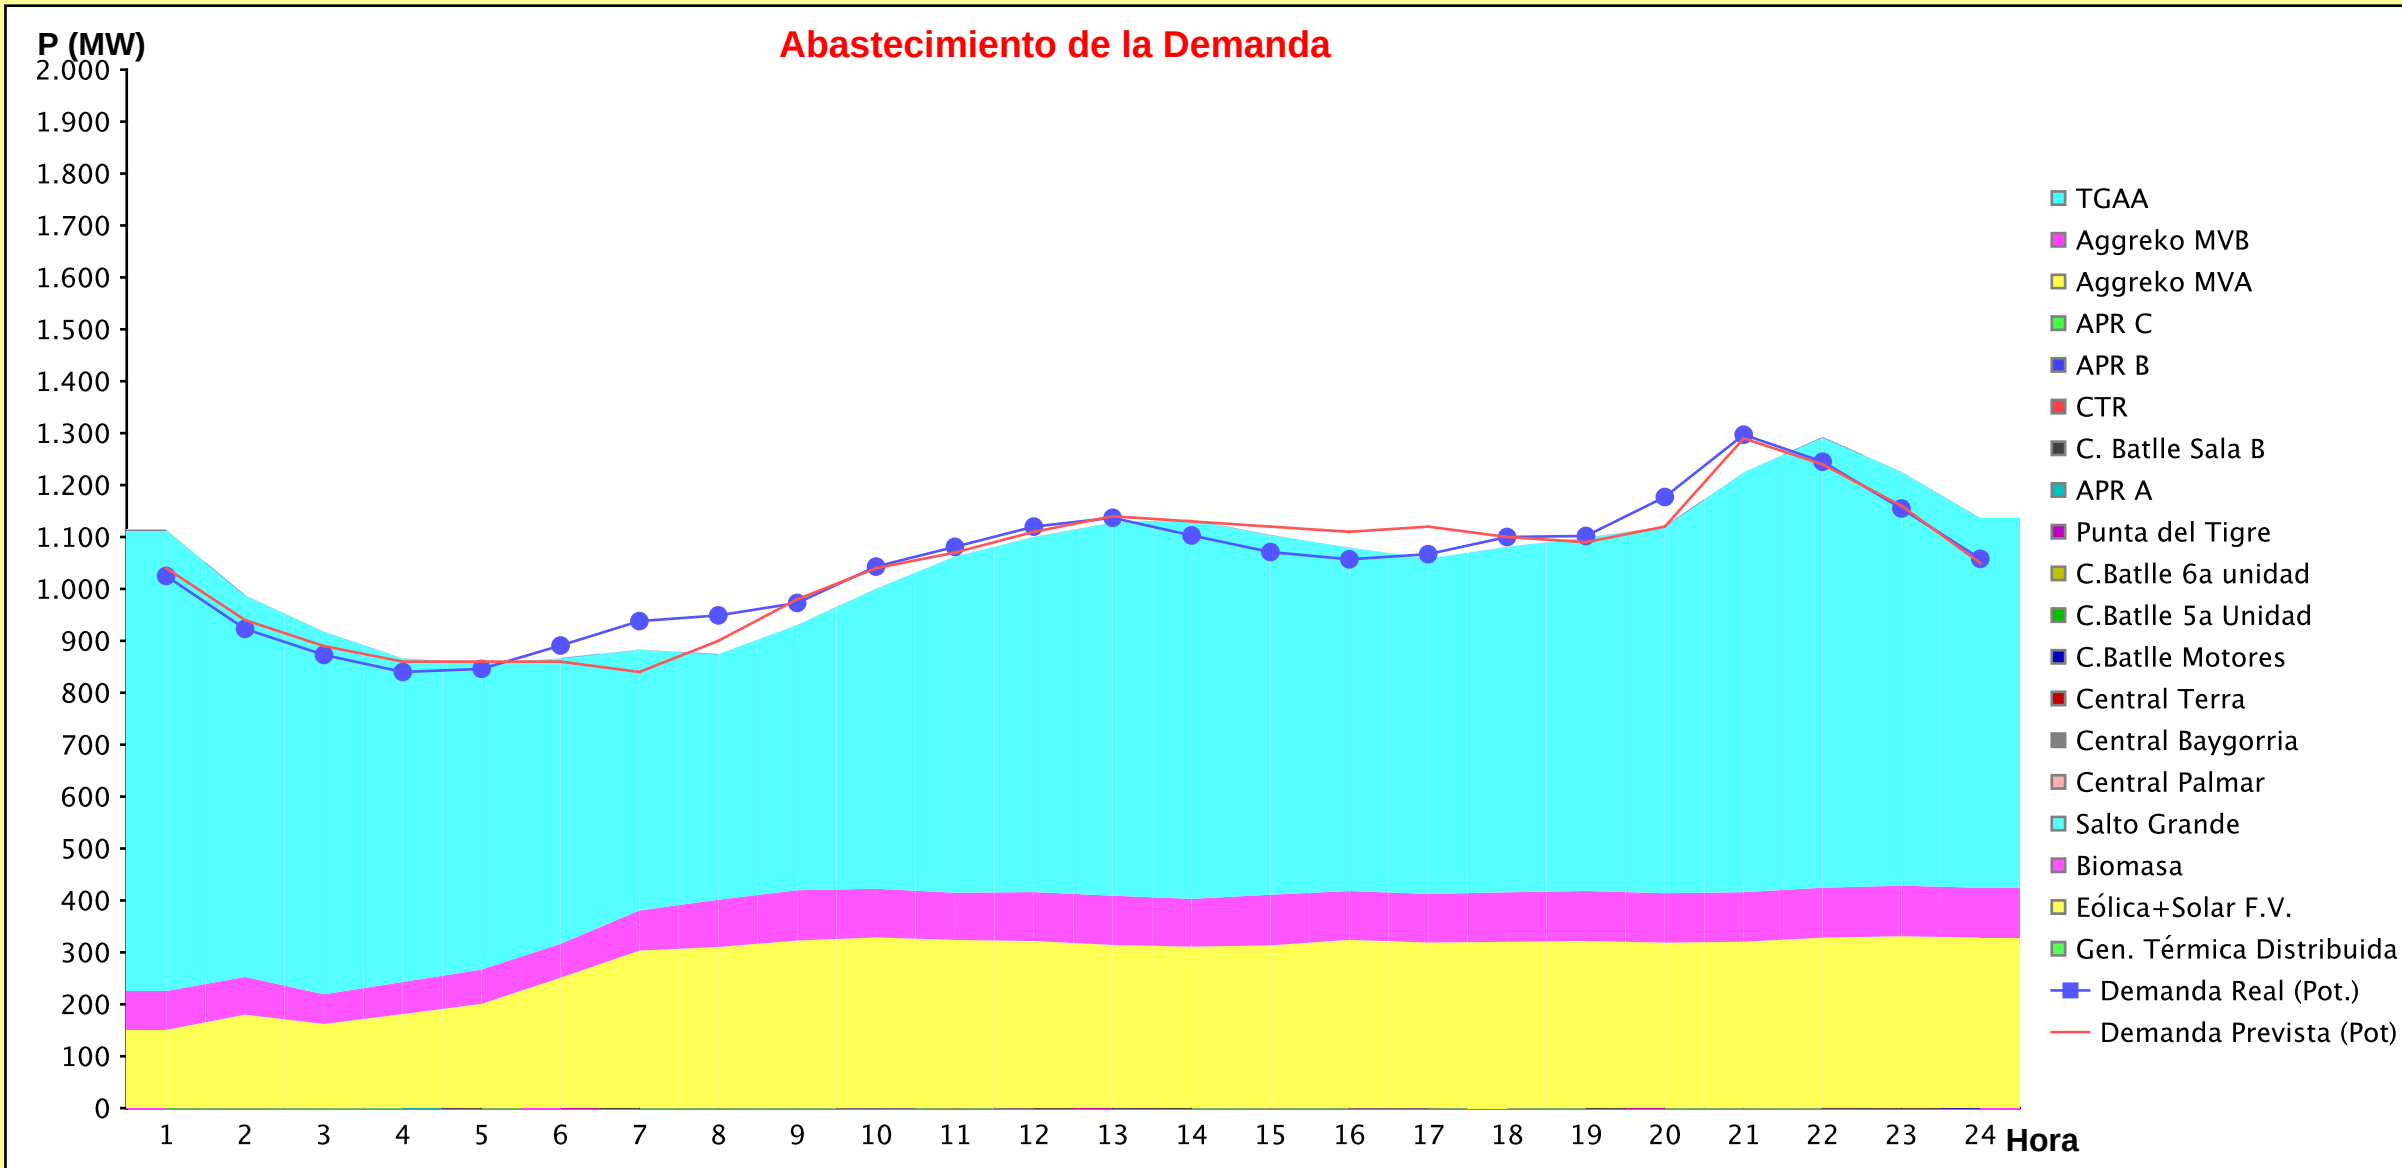

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	17.282
Hidráulica	17.282
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	17.282



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.178
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.060
Diferencia (MWh)	118
Ejecutada - Programada	0,47 %

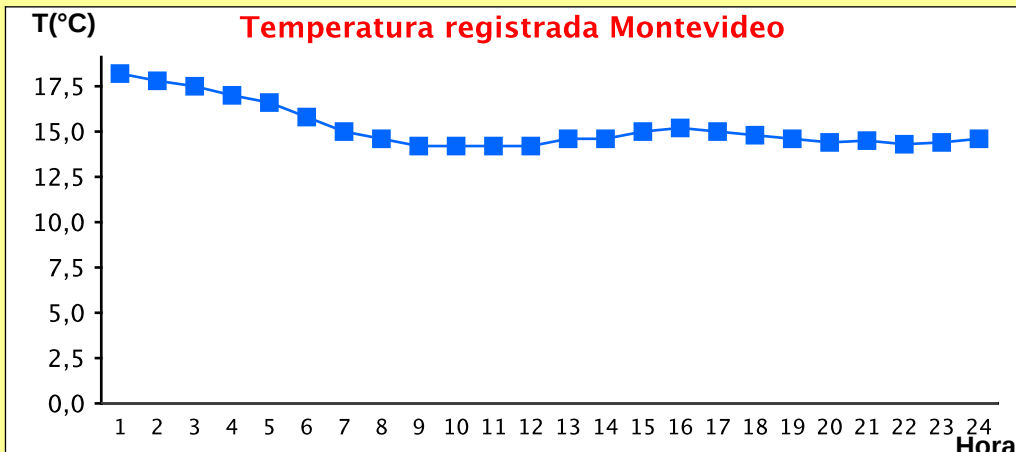


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1143,15 Hora 12:57
Potencia mínima:	821,16 Hora 04:18
Pico noche:	1300,43 Hora 20:48

Generación Media (MW)	
Eólica	287,1
Biomasa	87,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

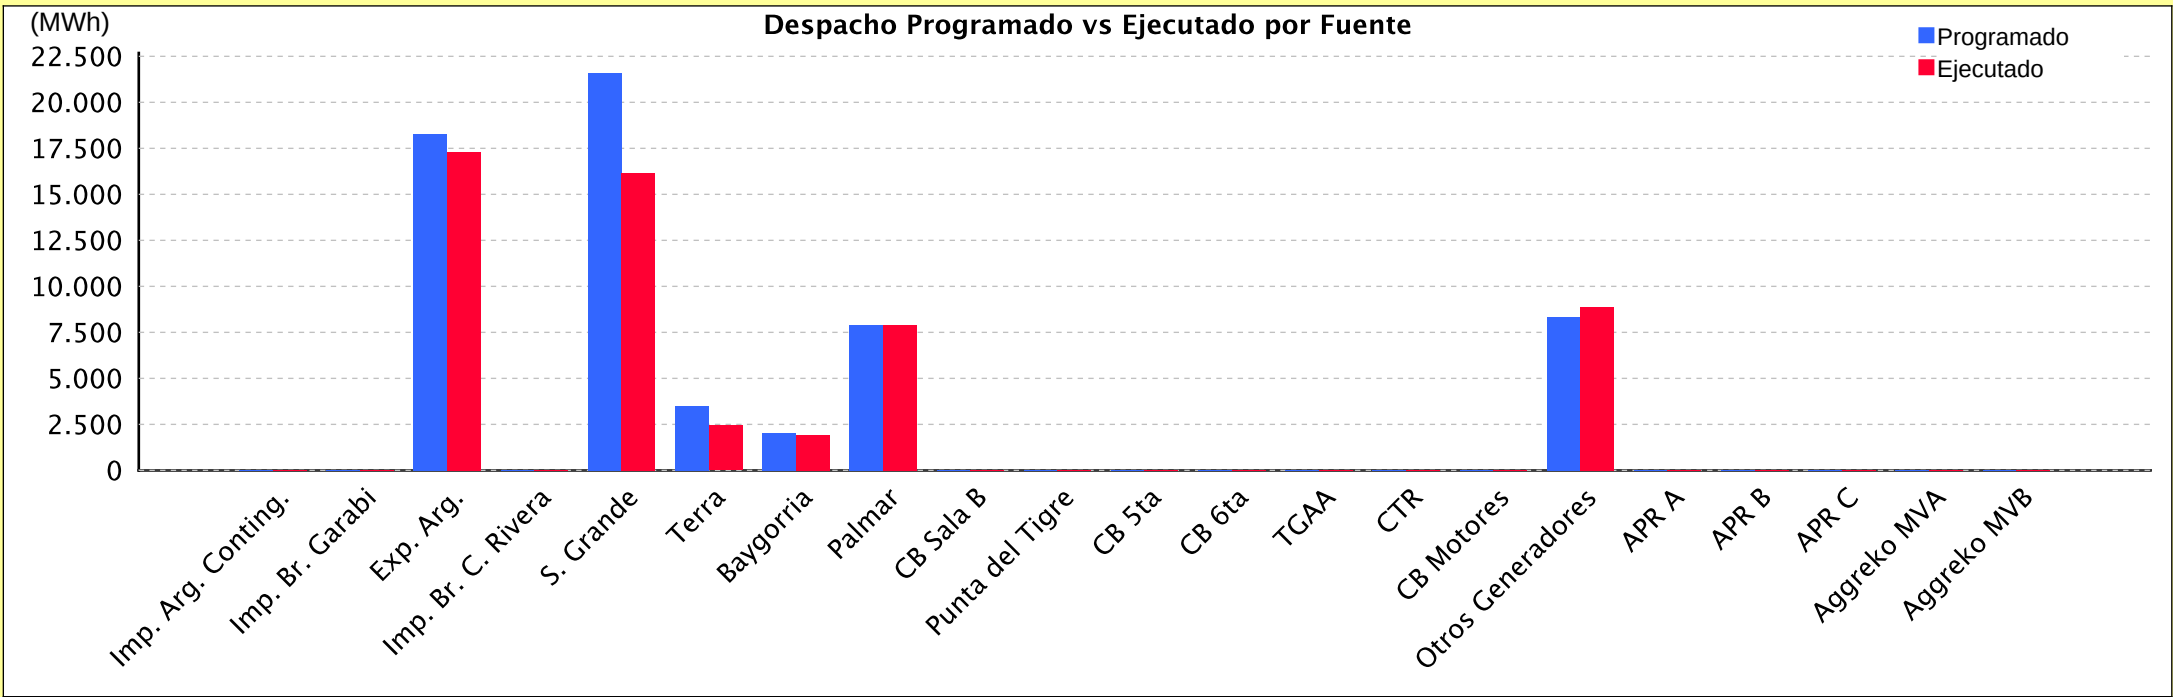
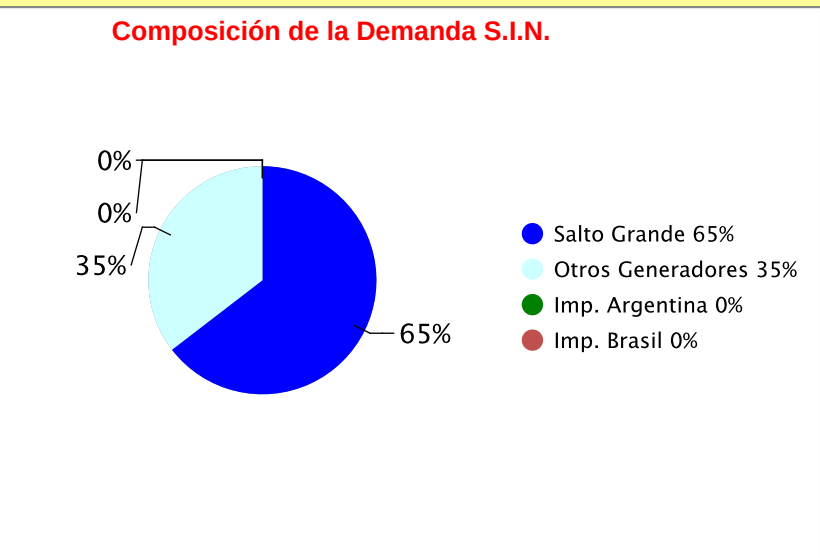


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

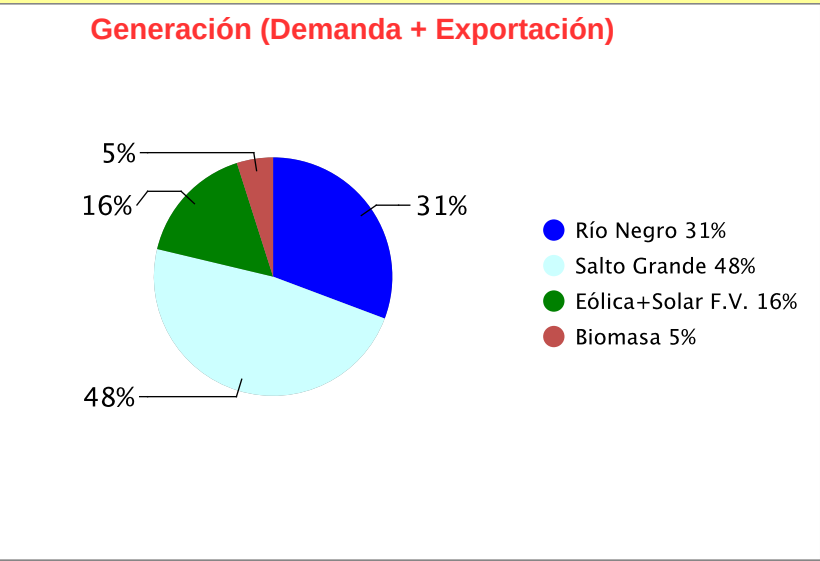



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

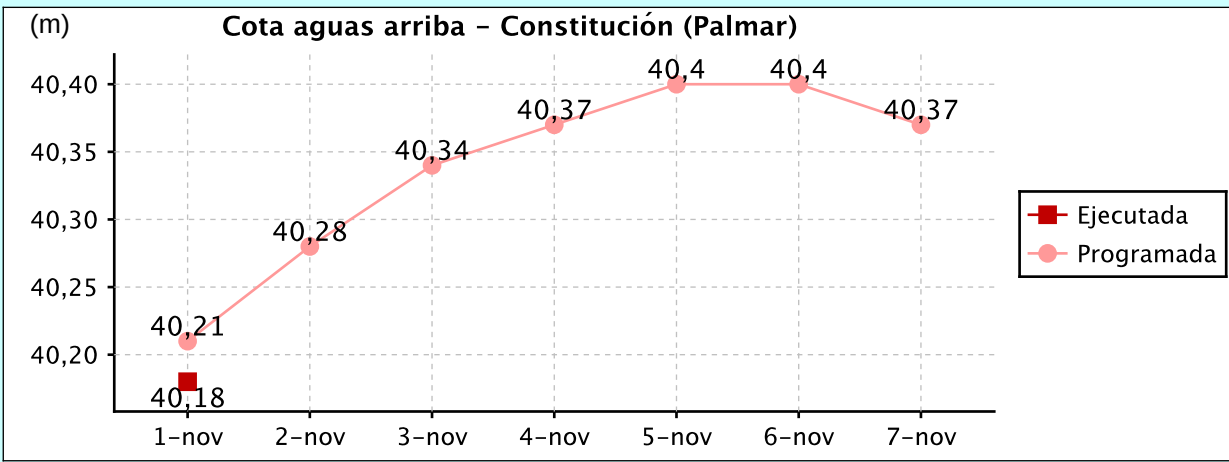
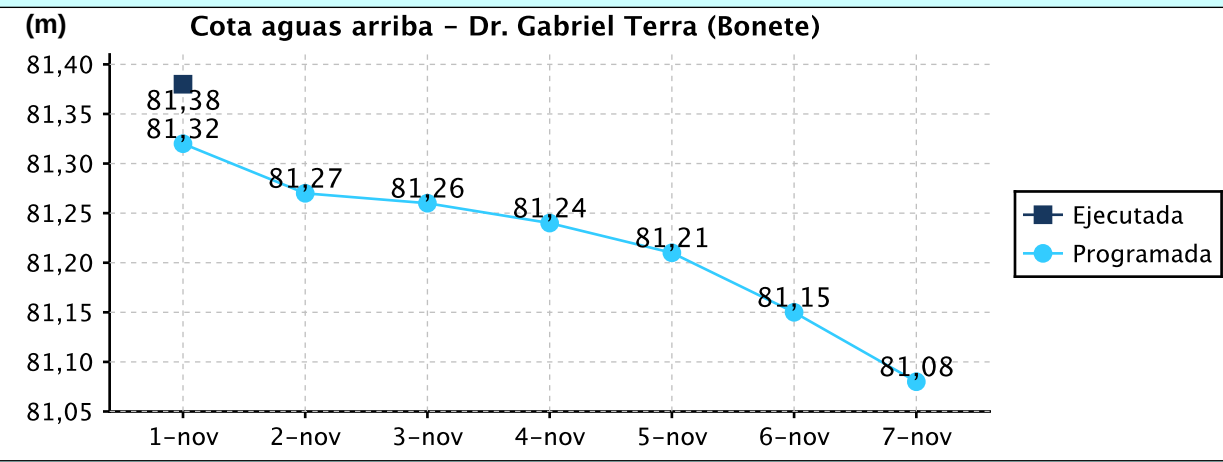


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,32	81,38
Baygorria	54,28	54,26
Palmar	40,21	40,18
SGU	35,39	35,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

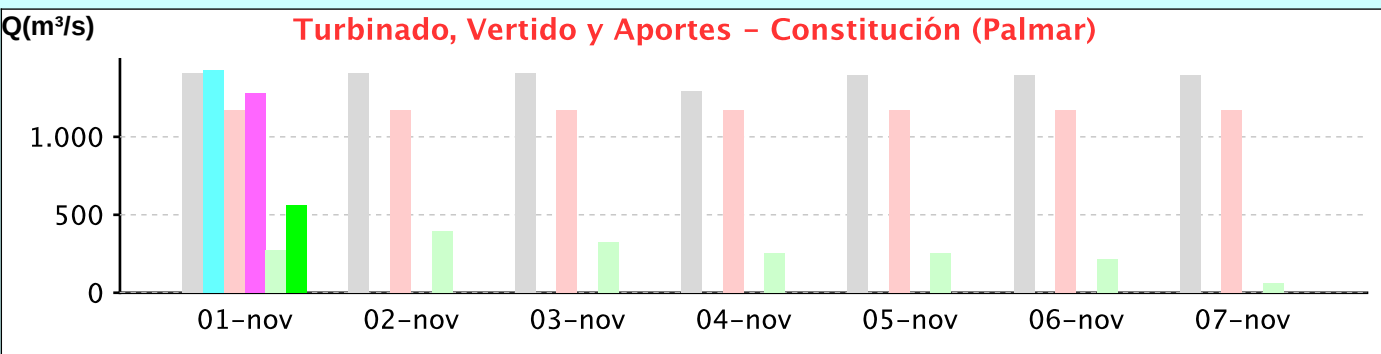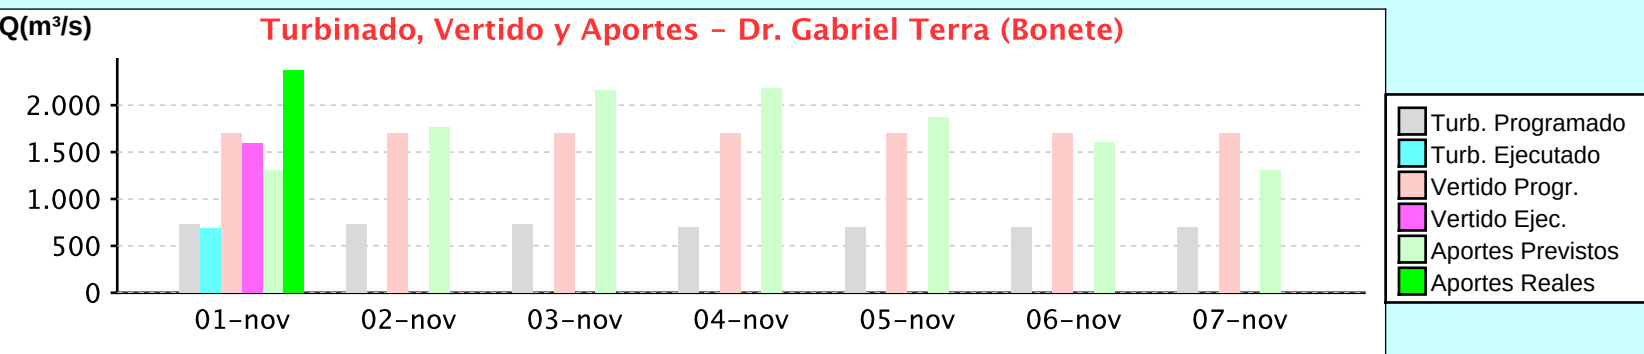

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

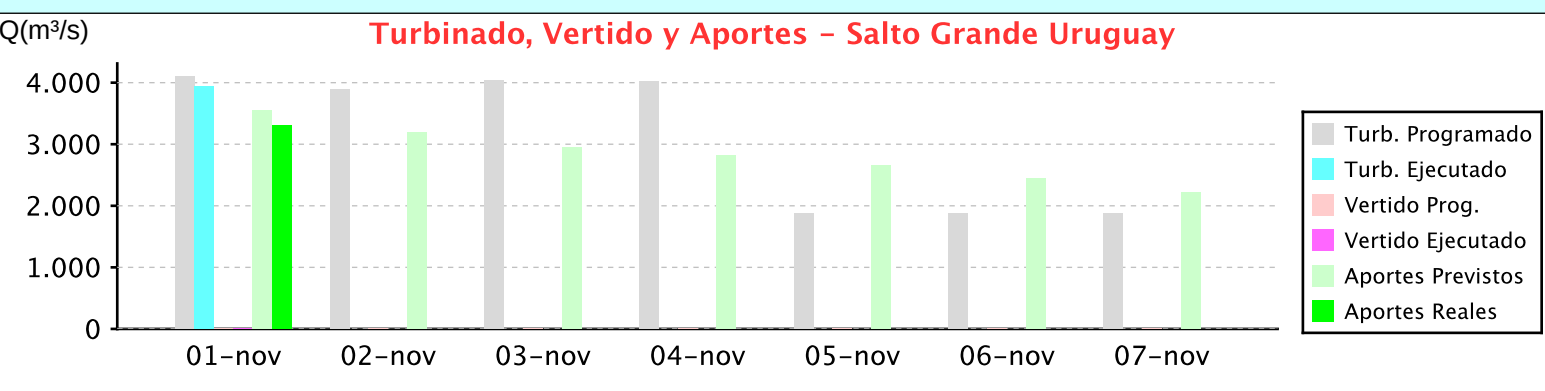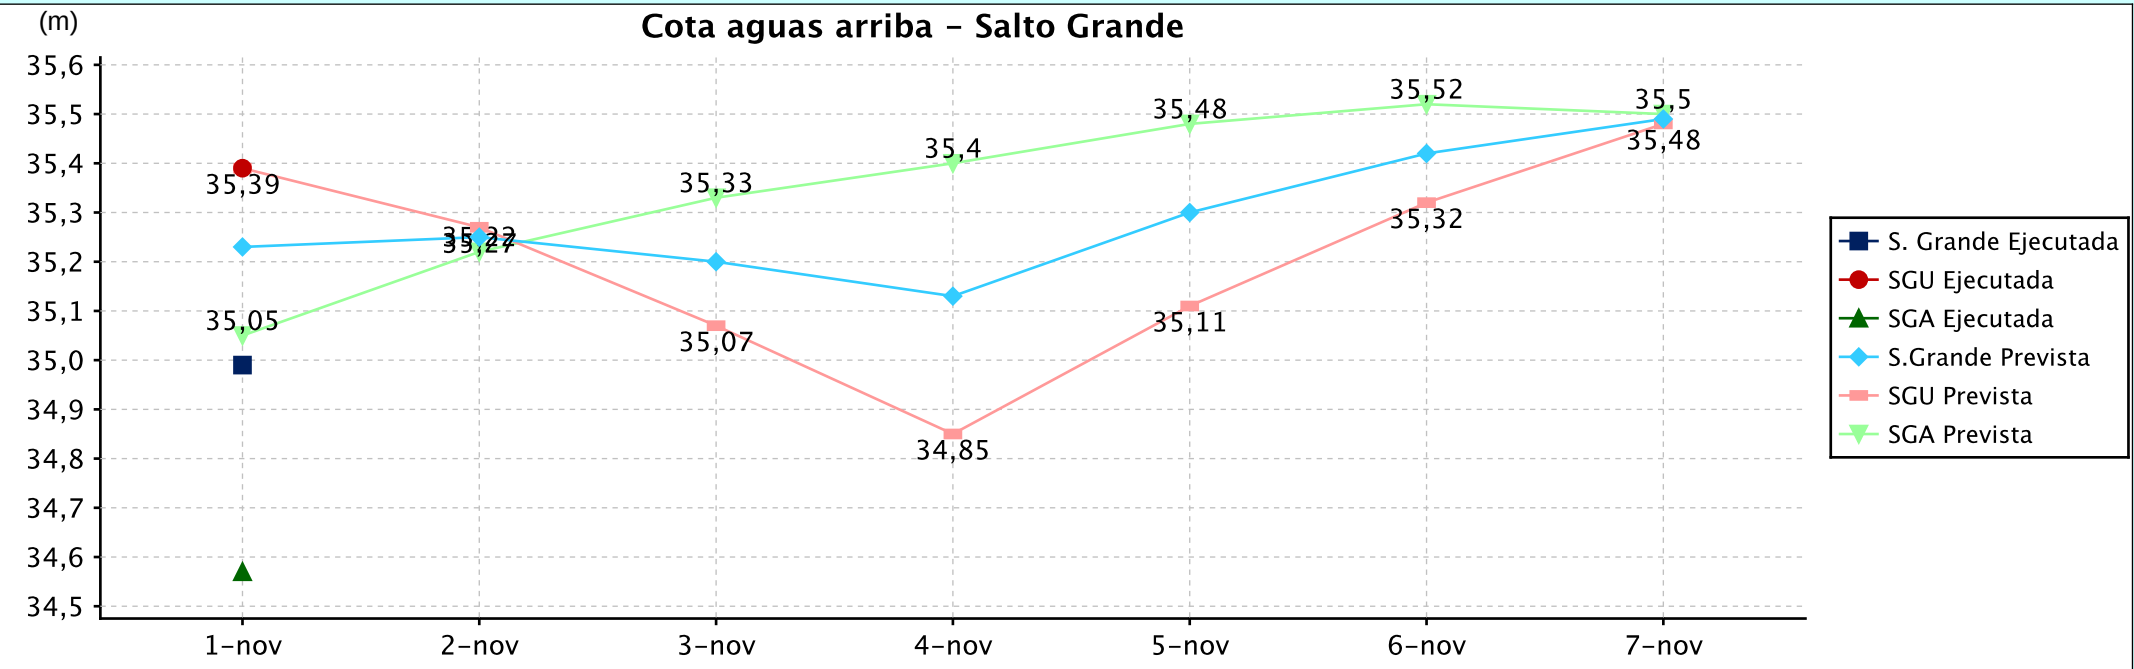

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,39
Cota Vista Arg	34,57
Cota real	34,99
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
19.423	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	730	684
Baygorria	842	769
Palmar	1.410	1.426
SGU	4.107	3.945

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.307	2.371
Baygorria	81	118
Palmar	273	558
SGU	3.550	3.300

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.700	1.599
Baygorria	1.570	1.666
Palmar	1.170	1.282
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 720 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

03/11/2014 16:10
