




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 03 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-7
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.237
C. Baygorria	1.888
C. Palmar	7.894
C. Salto Grande	18.971
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.133
TOTAL Generación	39.104

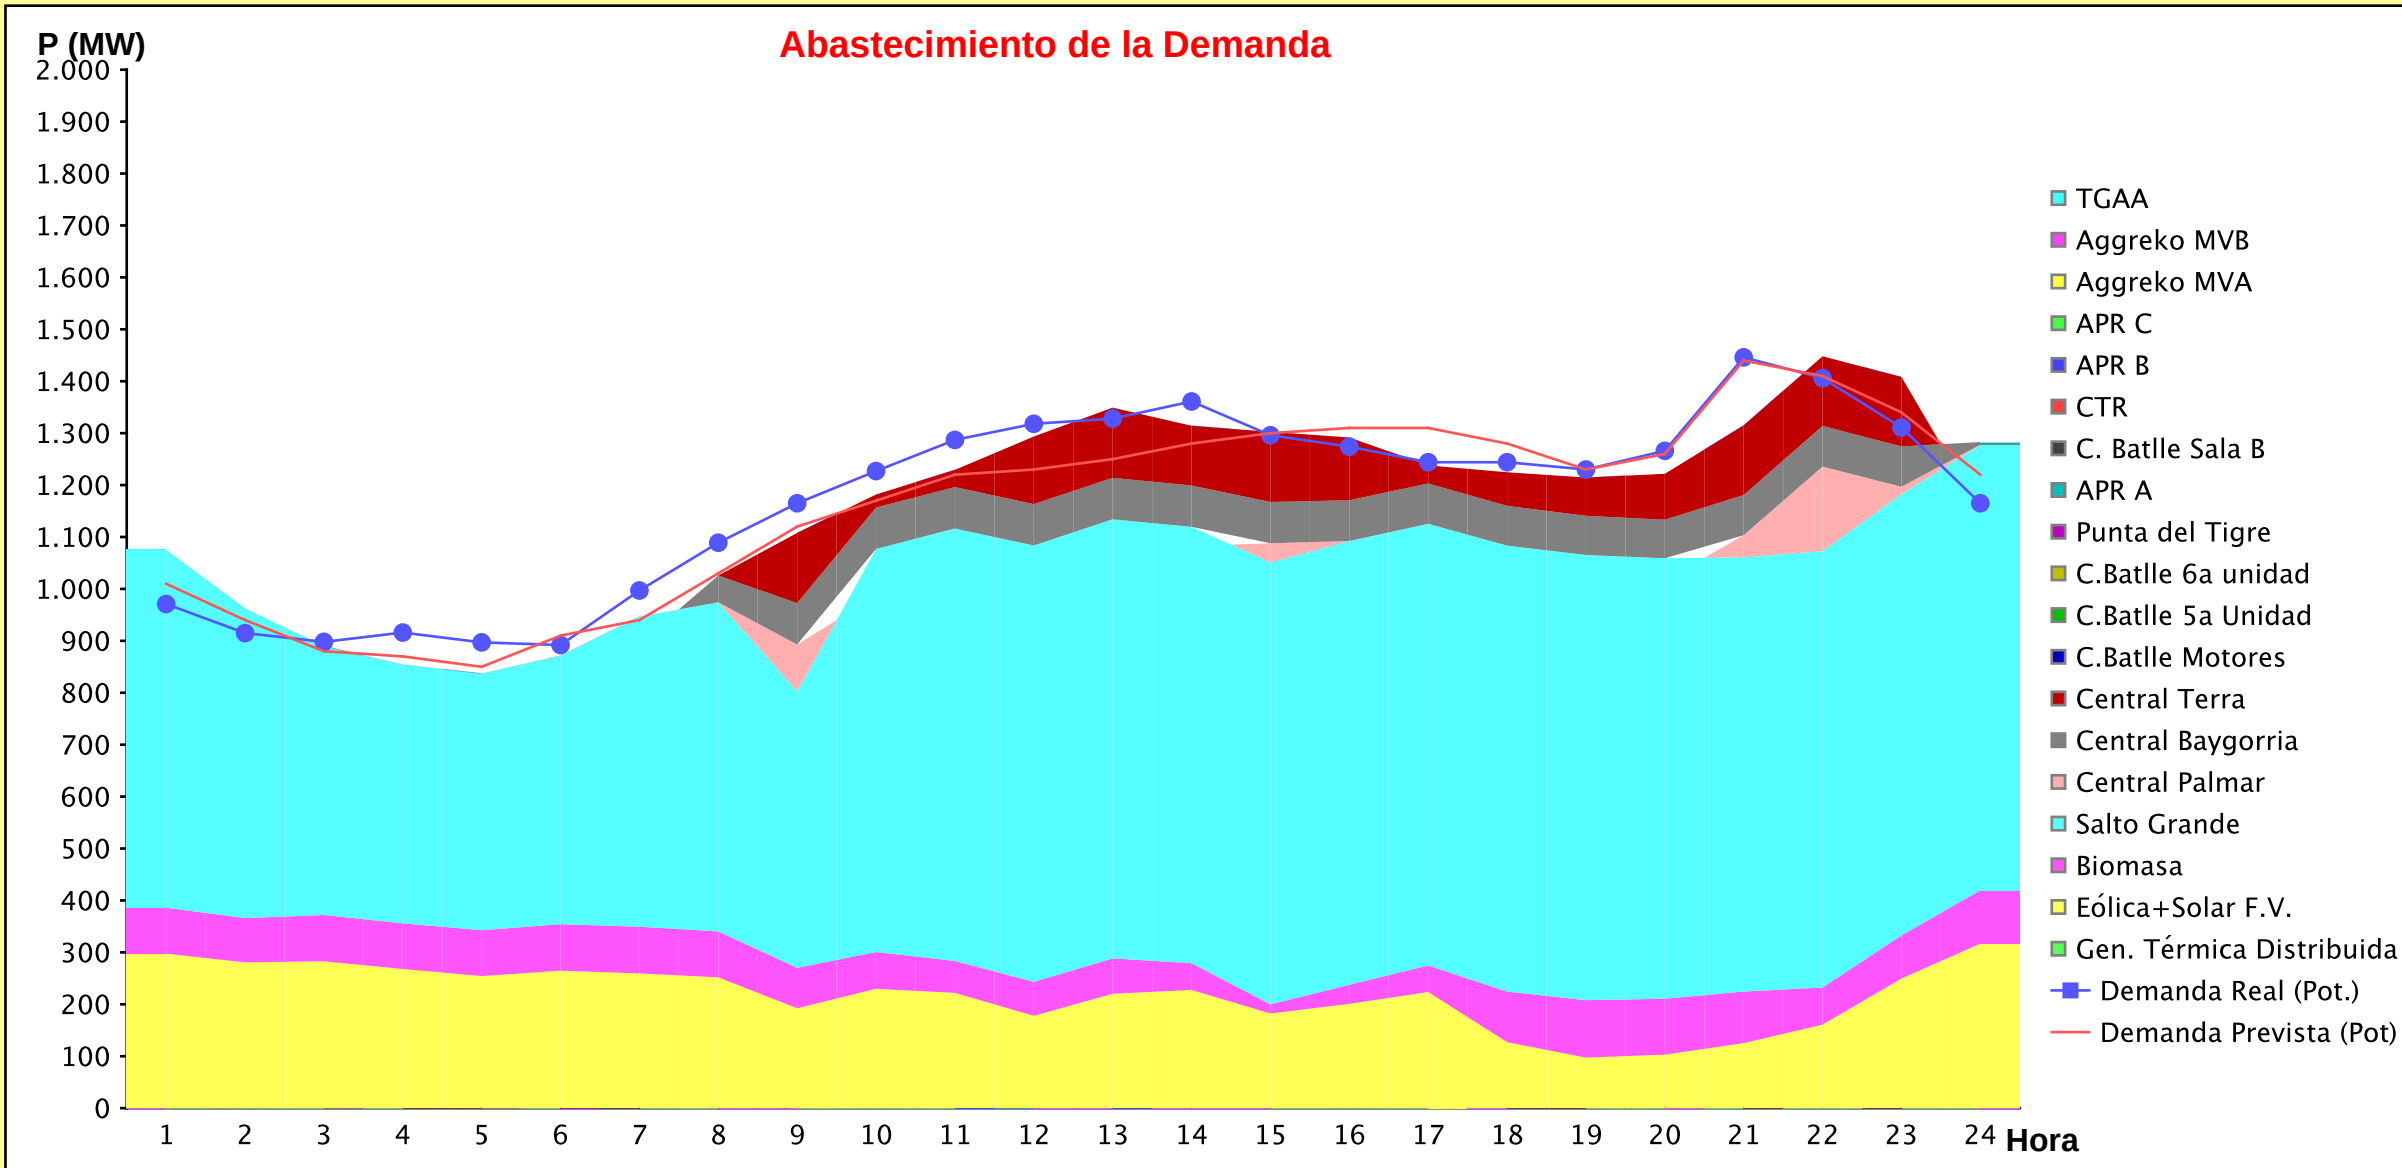

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.202
Hidráulica	11.202
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.202




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.902
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.800
Diferencia (MWh)	102
Ejecutada - Programada	0,37 %

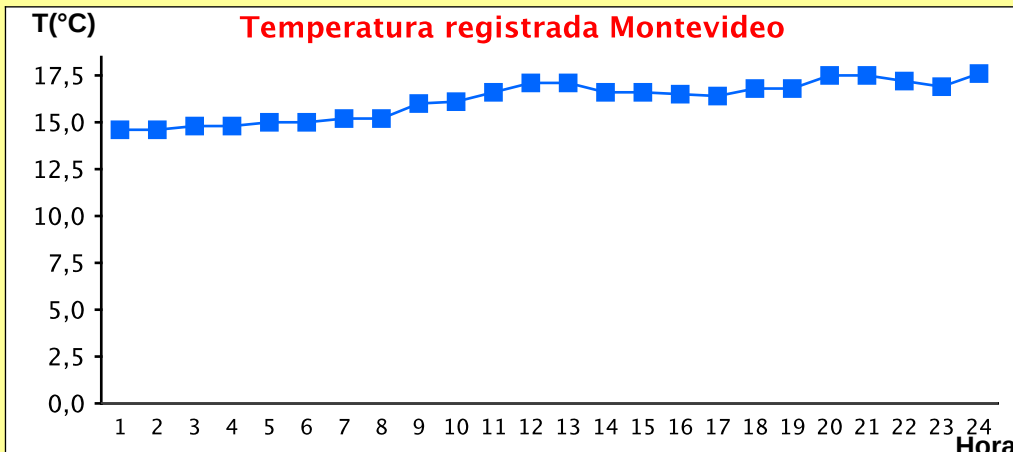



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1380,79 Hora 13:49
Potencia mínima:	825,21 Hora 04:14
Pico noche:	1454,6 Hora 21:26

Generación Media (MW)	
Eólica	217,7
Biomasa	81,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

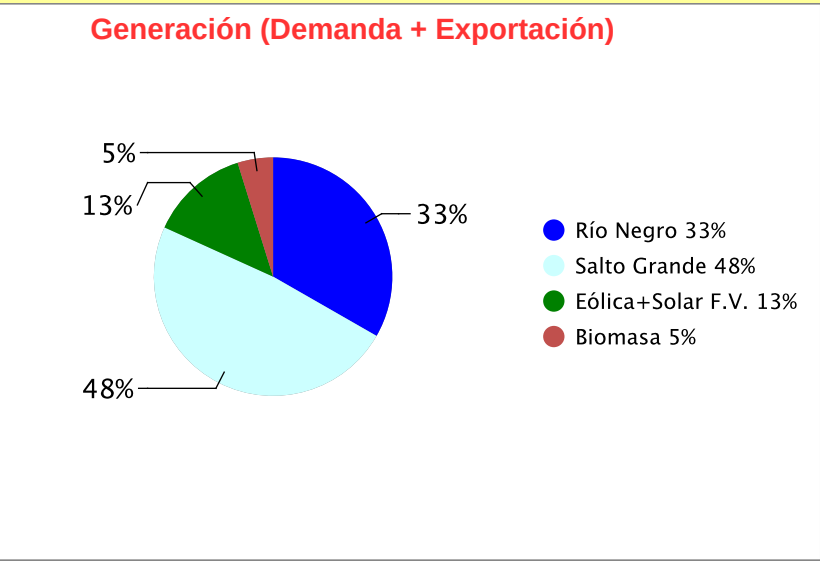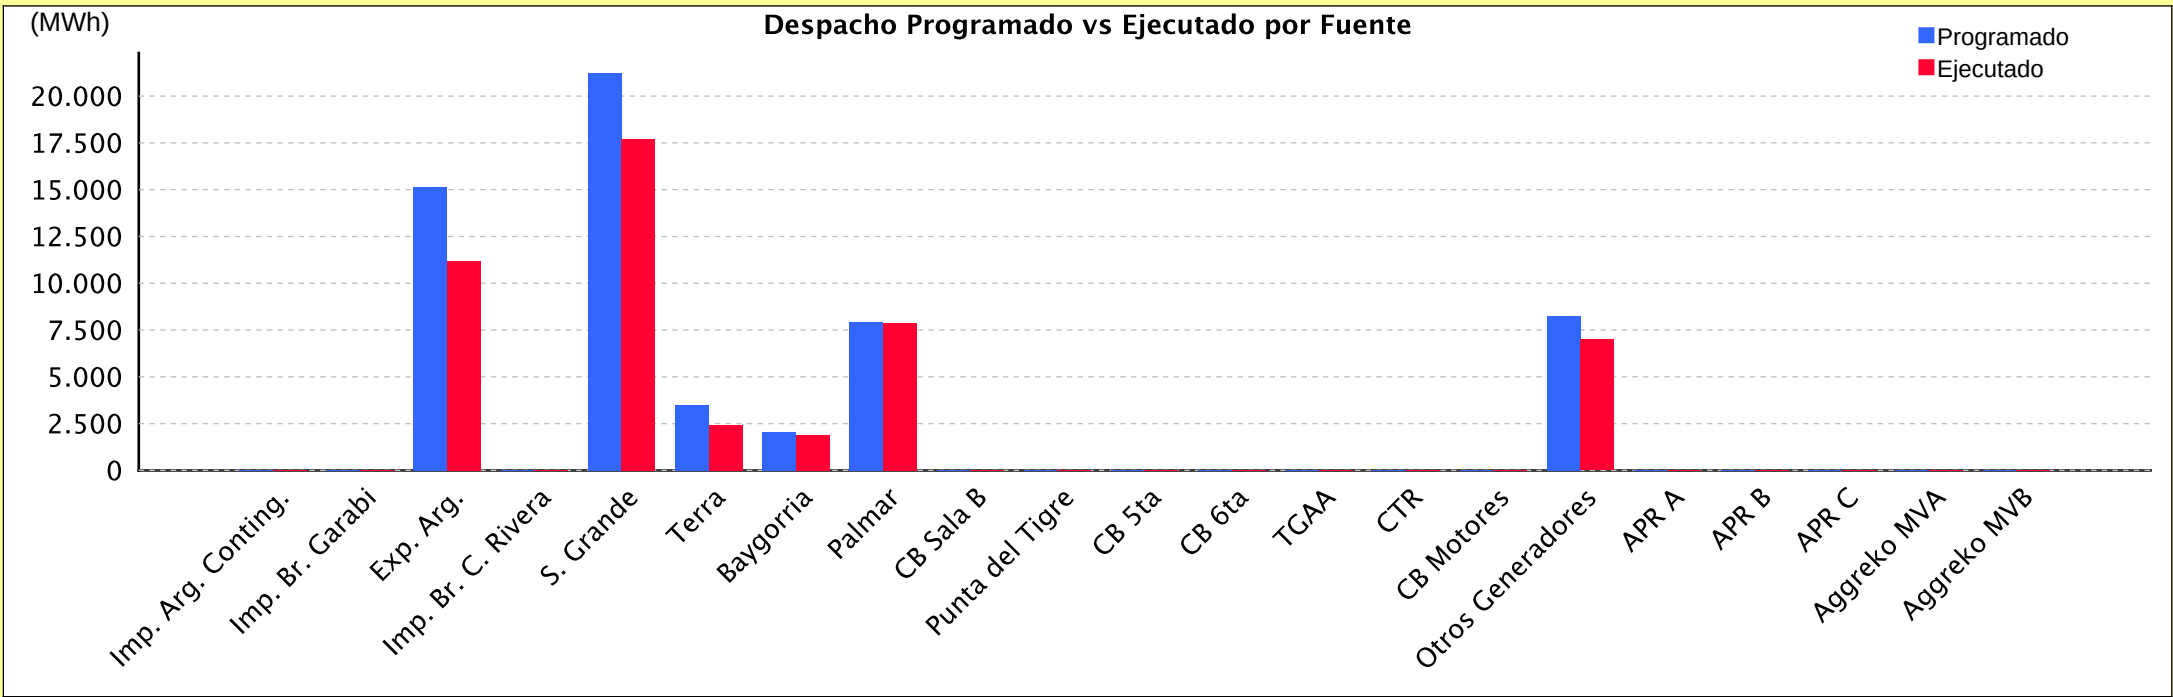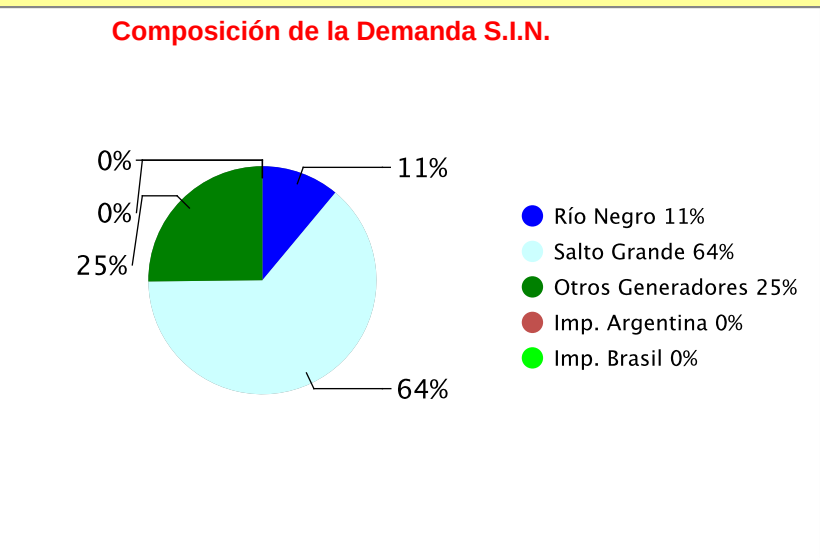



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

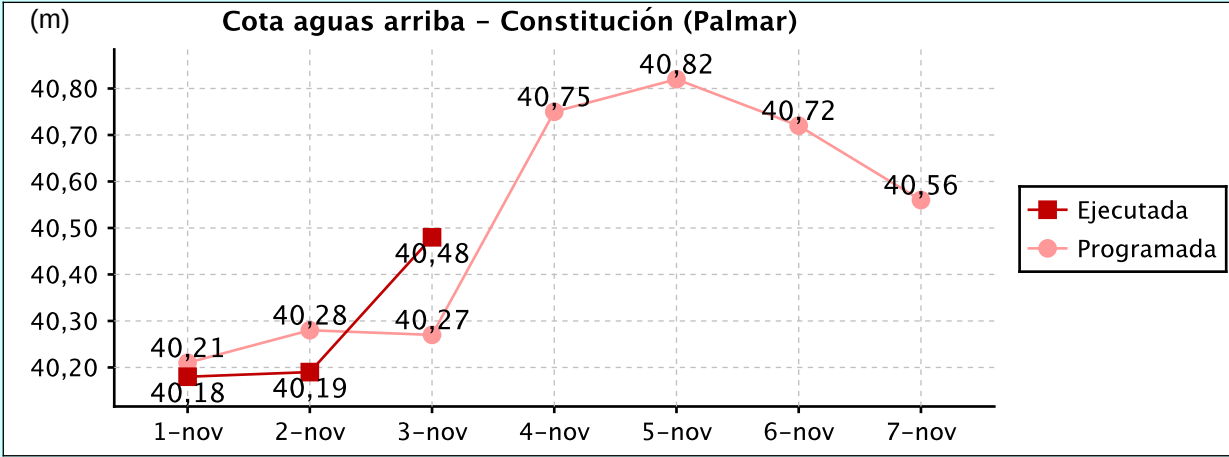
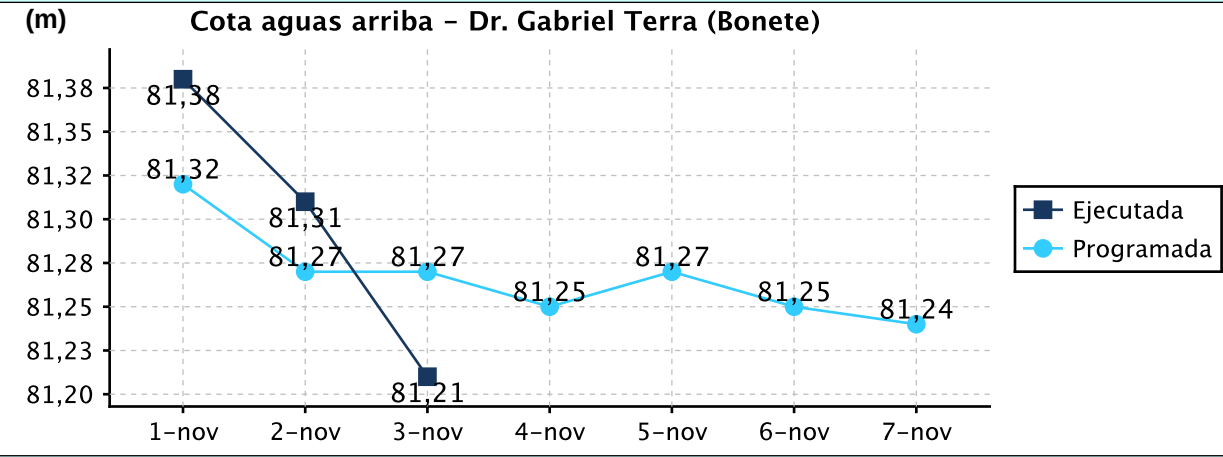


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,27	81,21
Baygorria	54,24	54,12
Palmar	40,27	40,48
SGU	35,33	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

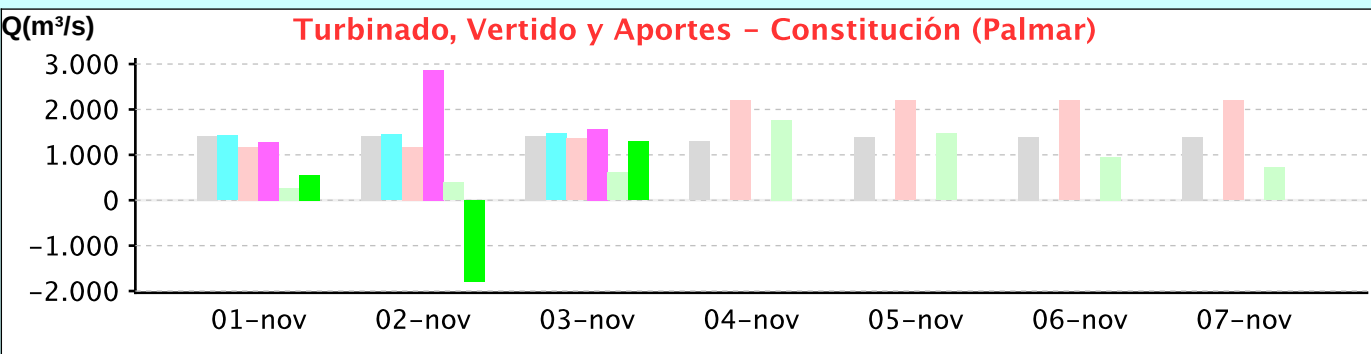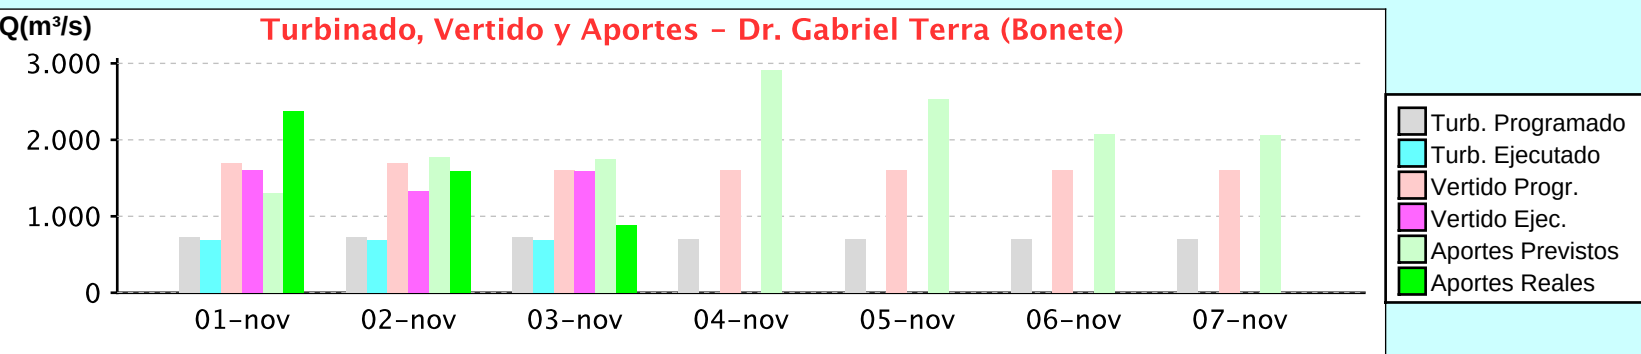

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

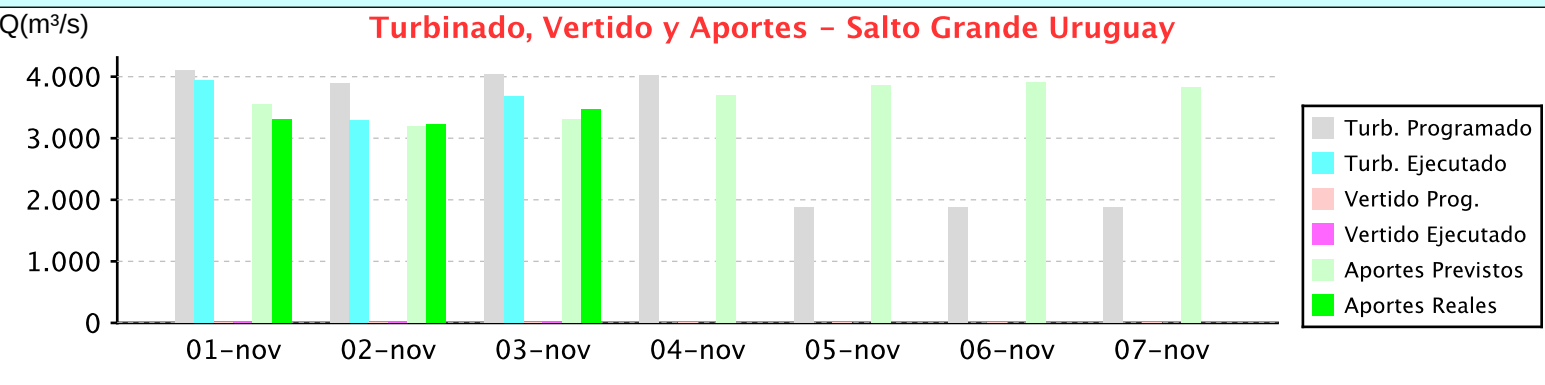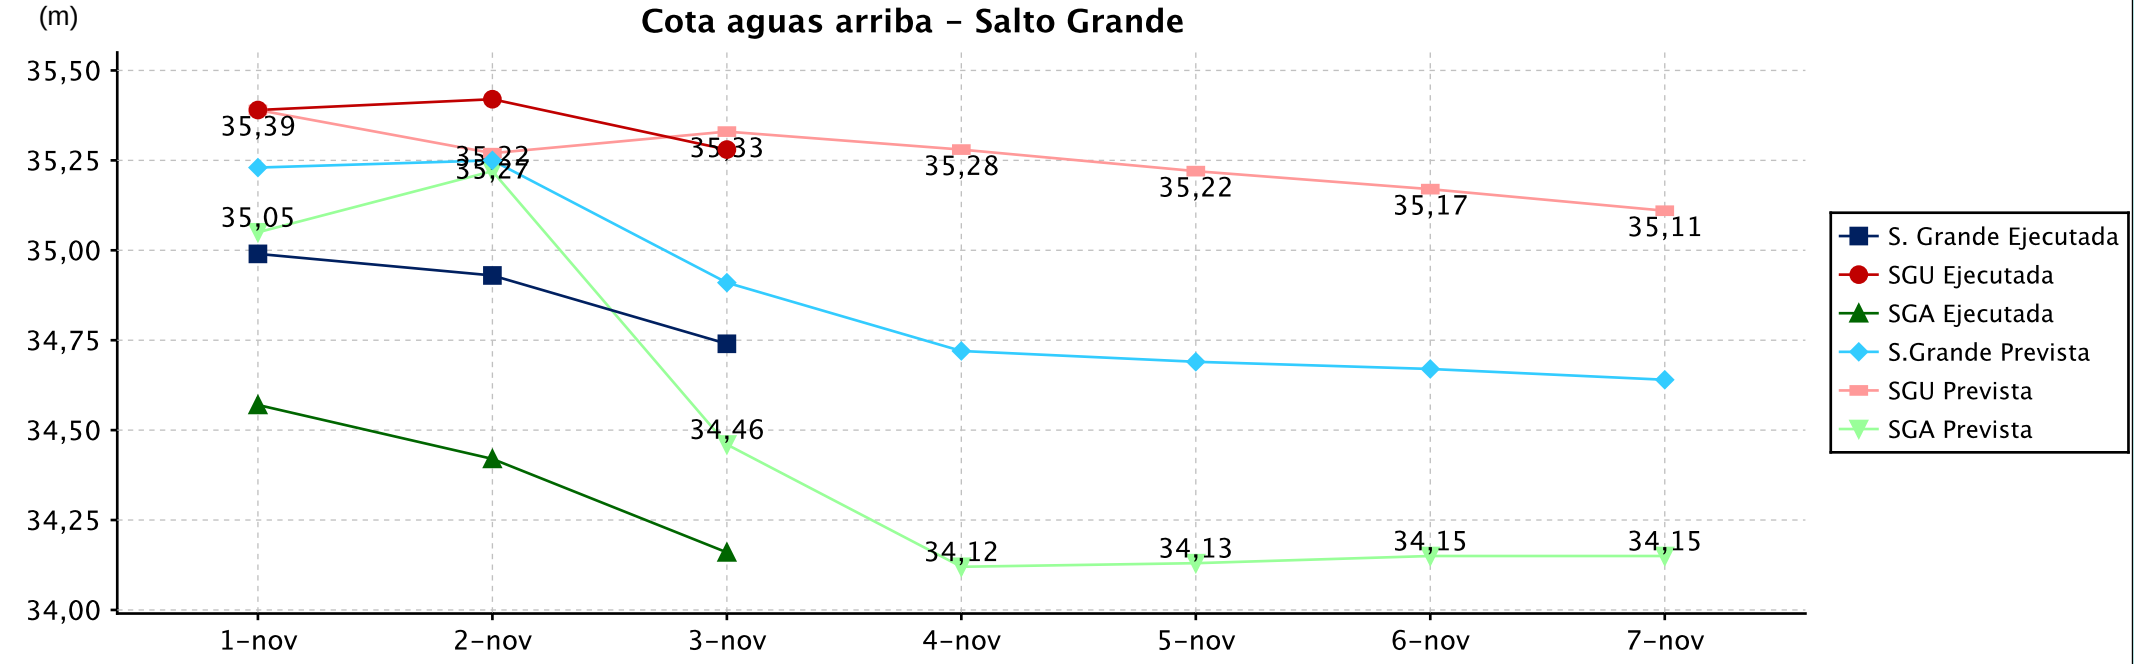

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	34,16
Cota real	34,74
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
25.585	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	730	686
Baygorria	842	796
Palmar	1.410	1.465
SGU	4.038	3.682

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.742	889
Baygorria	166	310
Palmar	607	1.298
SGU	3.300	3.467

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.600	1.585
Baygorria	1.650	1.912
Palmar	1.360	1.573
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 467 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

04/11/2014 13:49
