



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 05 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-6
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.011
C. Baygorria	1.867
C. Palmar	7.323
C. Salto Grande	18.135
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.709
TOTAL Generación	35.026

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.030
Hidráulica	8.030
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.030




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.996
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.720
Diferencia (MWh)	-724
Ejecutada - Programada	-2,61 %

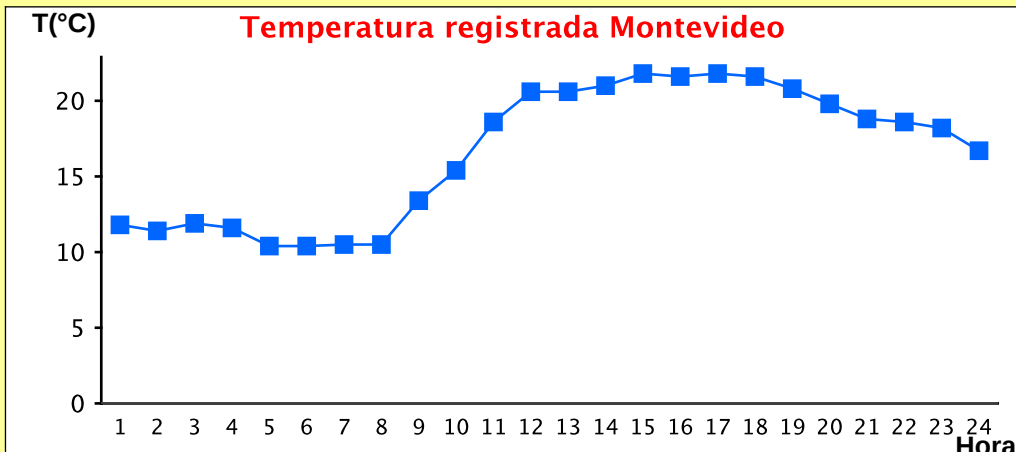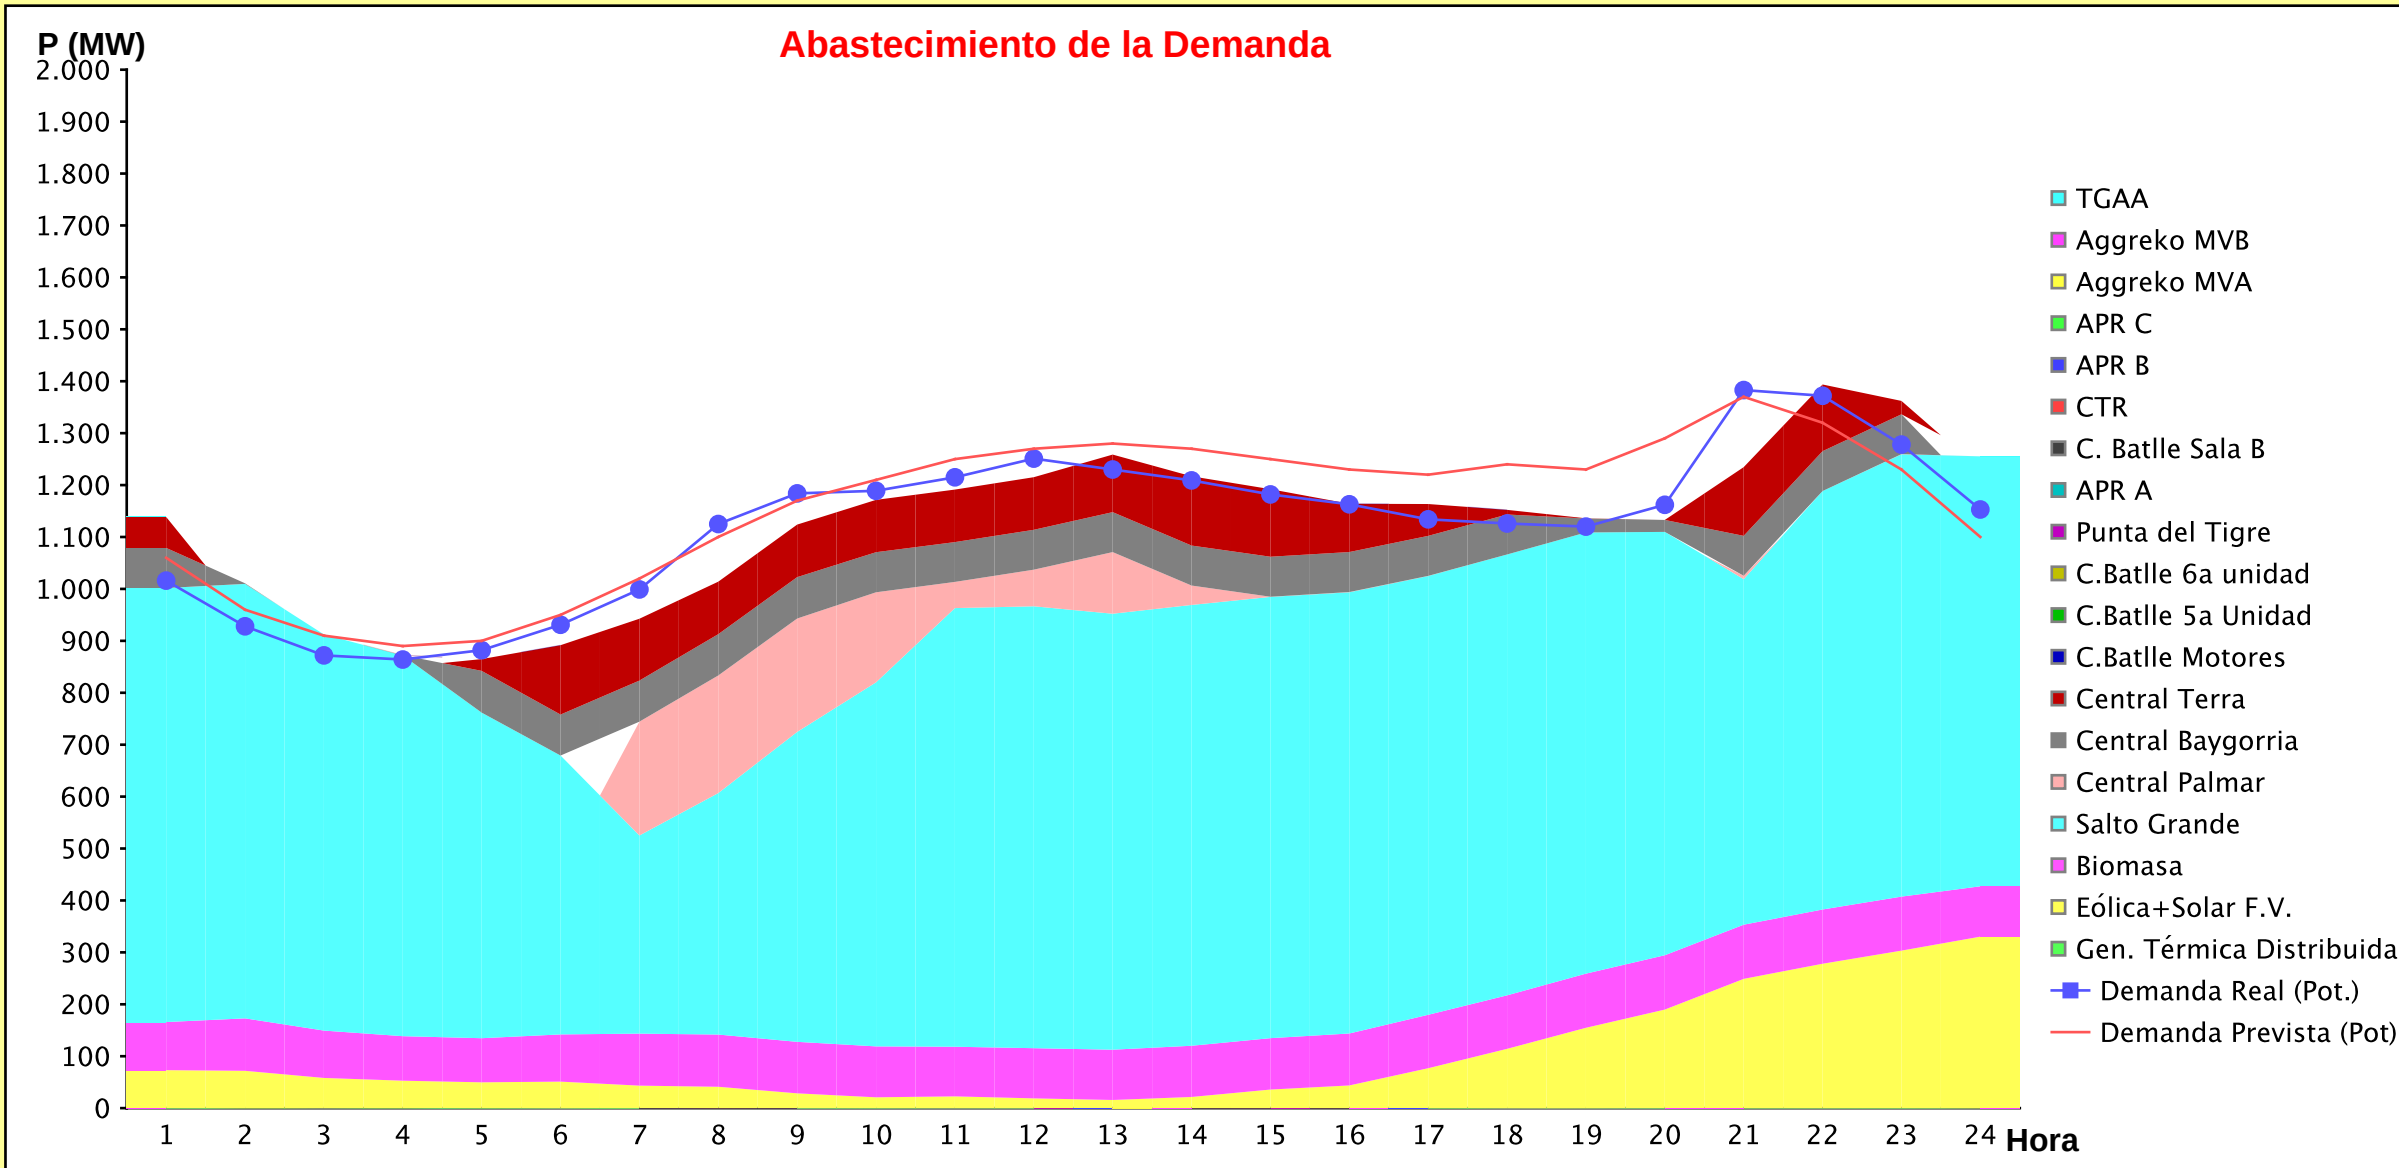



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1265,08 Hora 11:49
Potencia mínima:	857,19 Hora 03:57
Pico noche:	1400,81 Hora 21:31

Generación Media (MW)	
Eólica	98,5
Biomasa	98,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

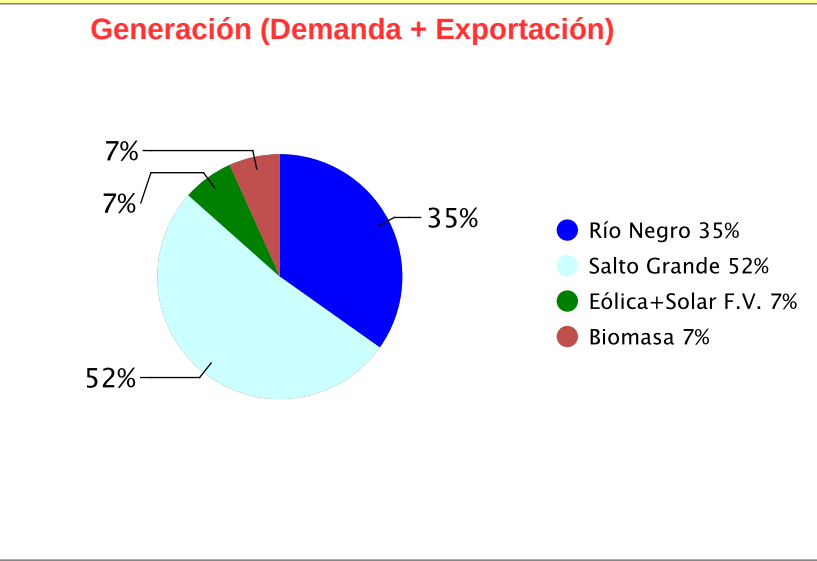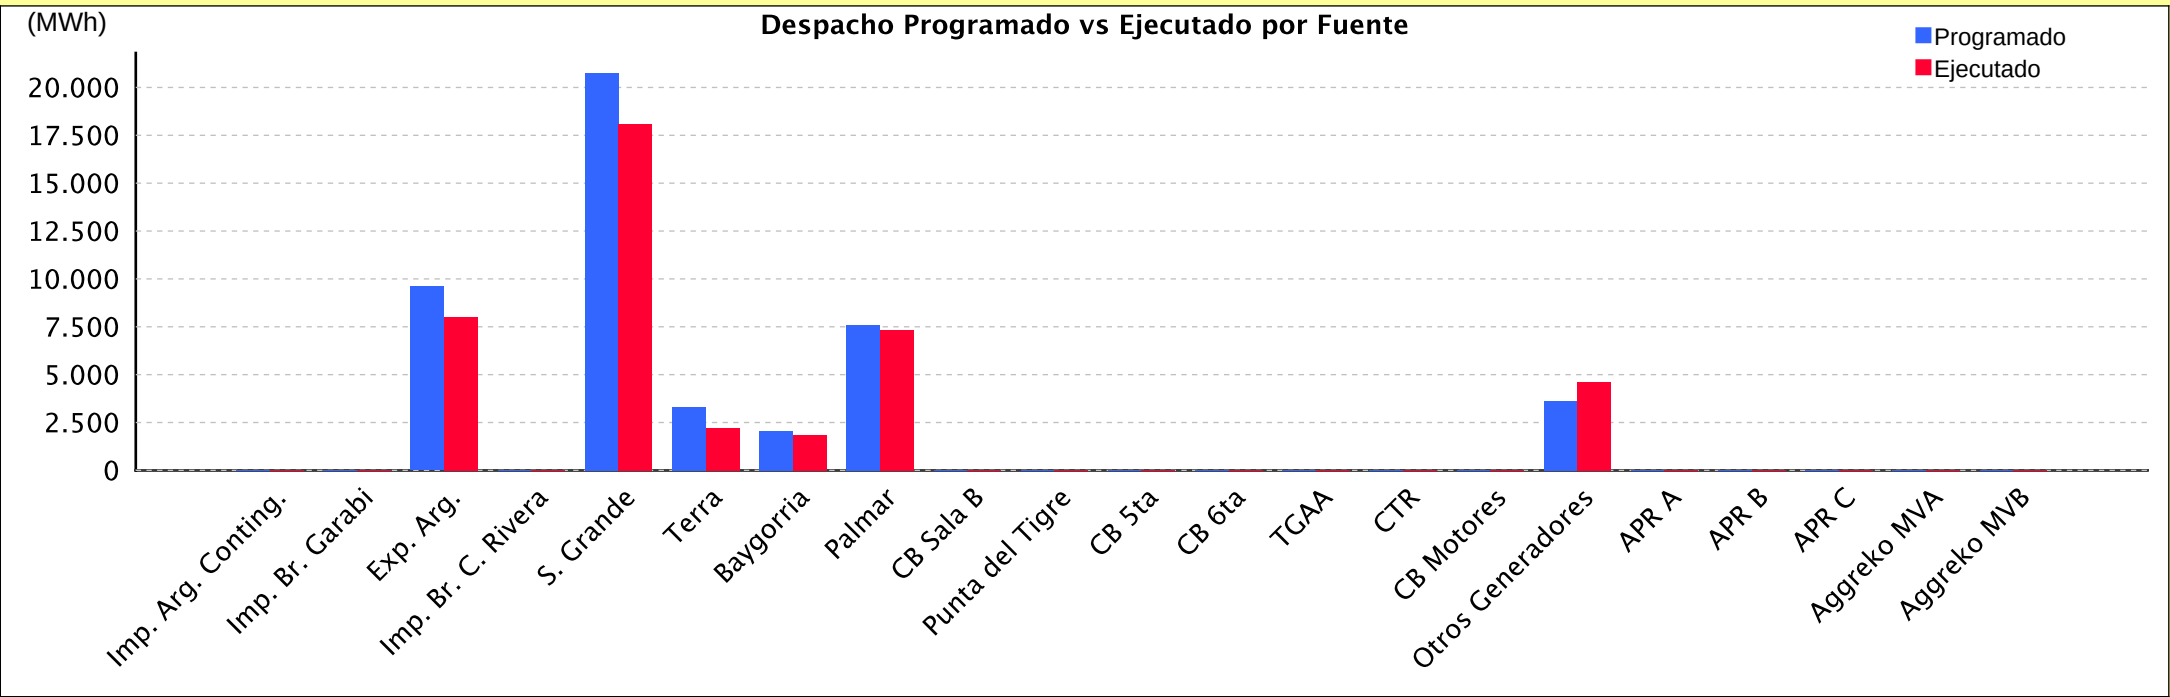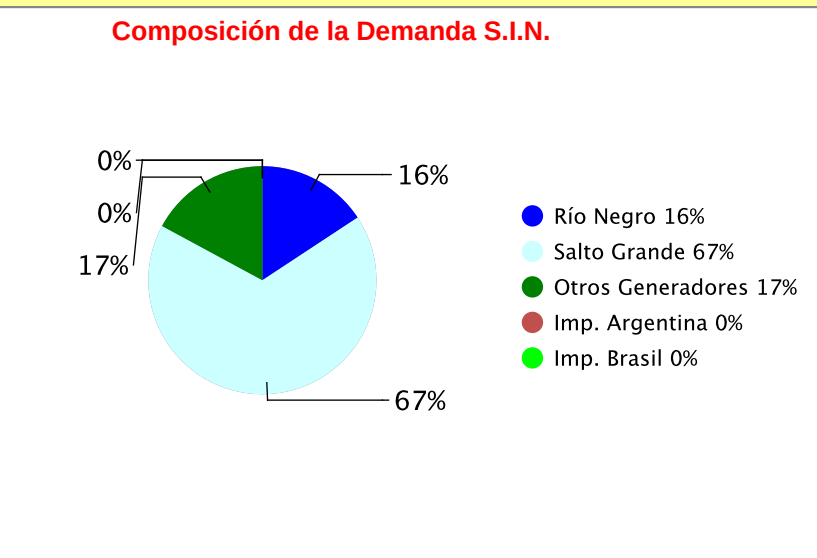



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

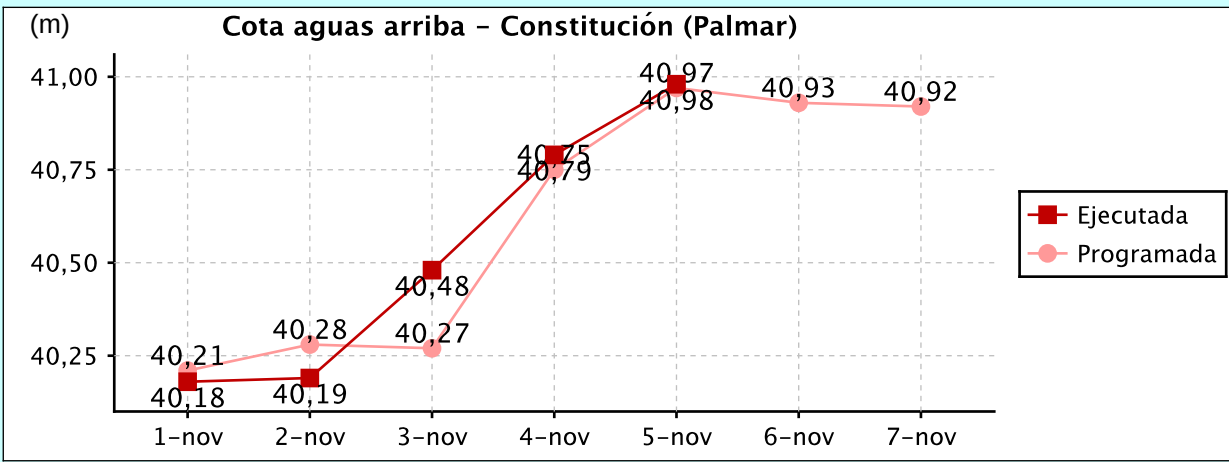
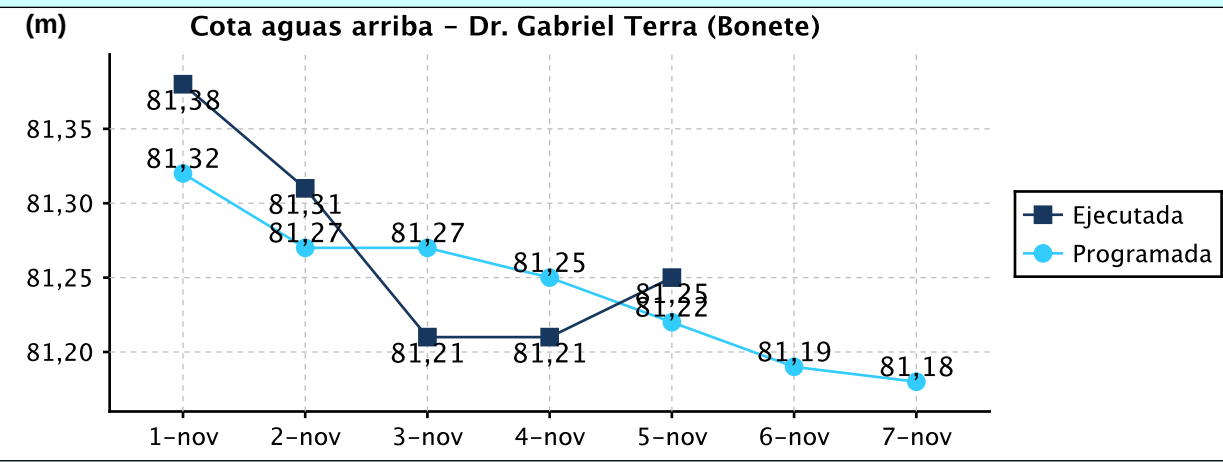


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,22	81,25
Baygorria	54,13	54,11
Palmar	40,97	40,98
SGU	35,51	35,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

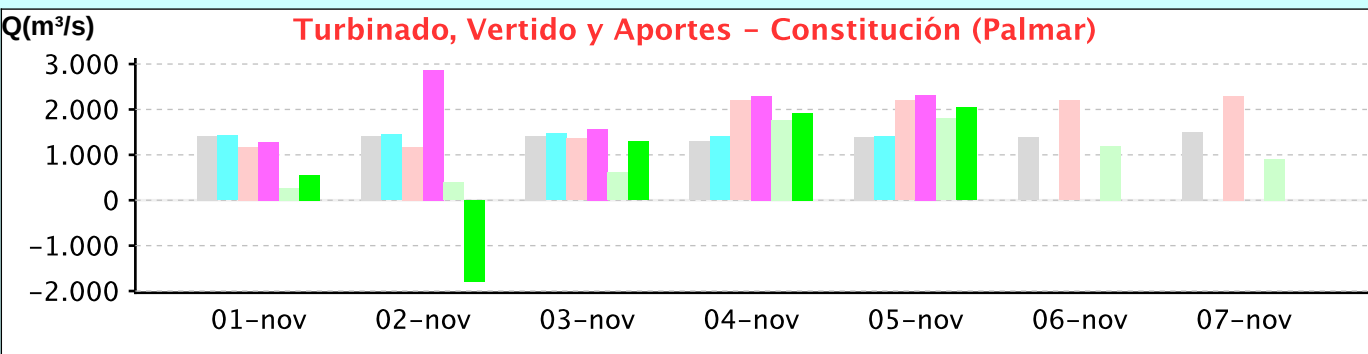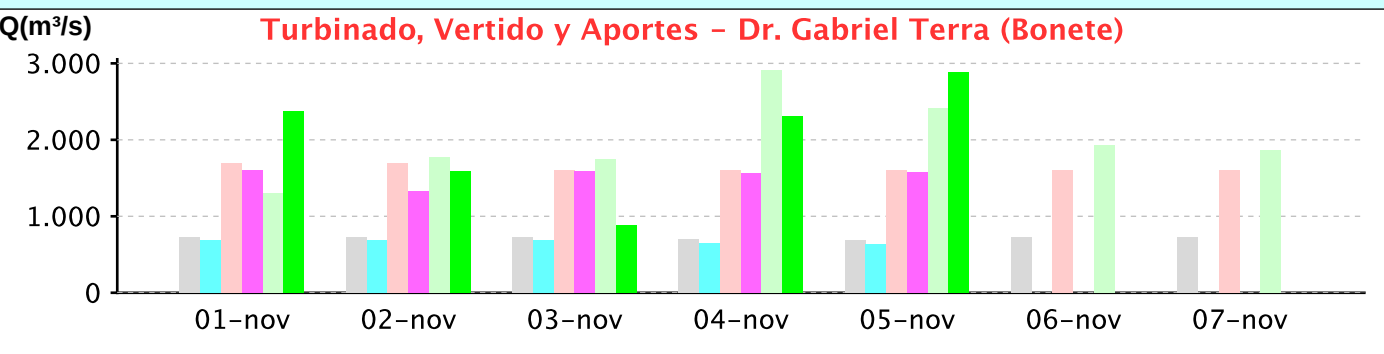

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

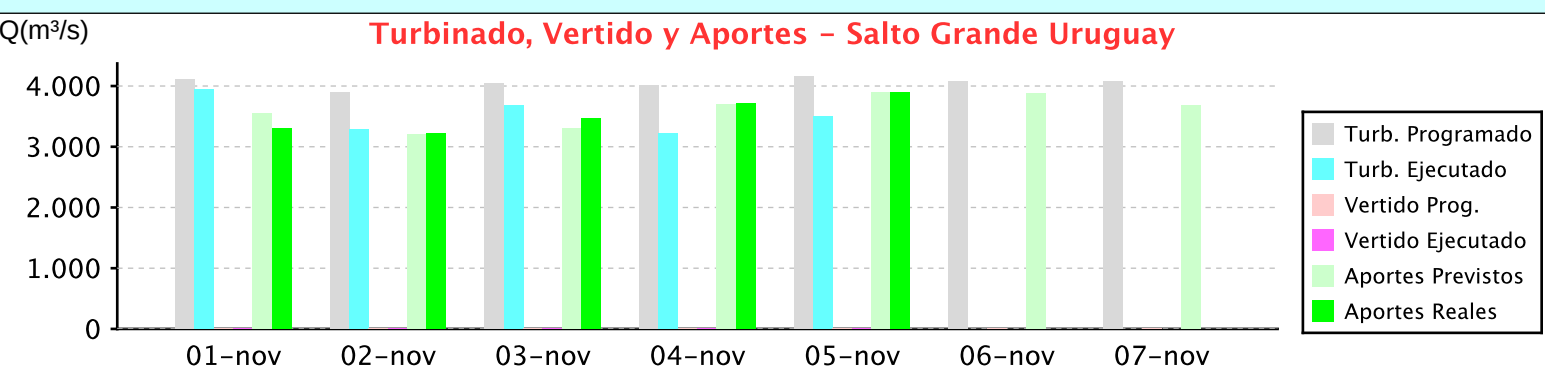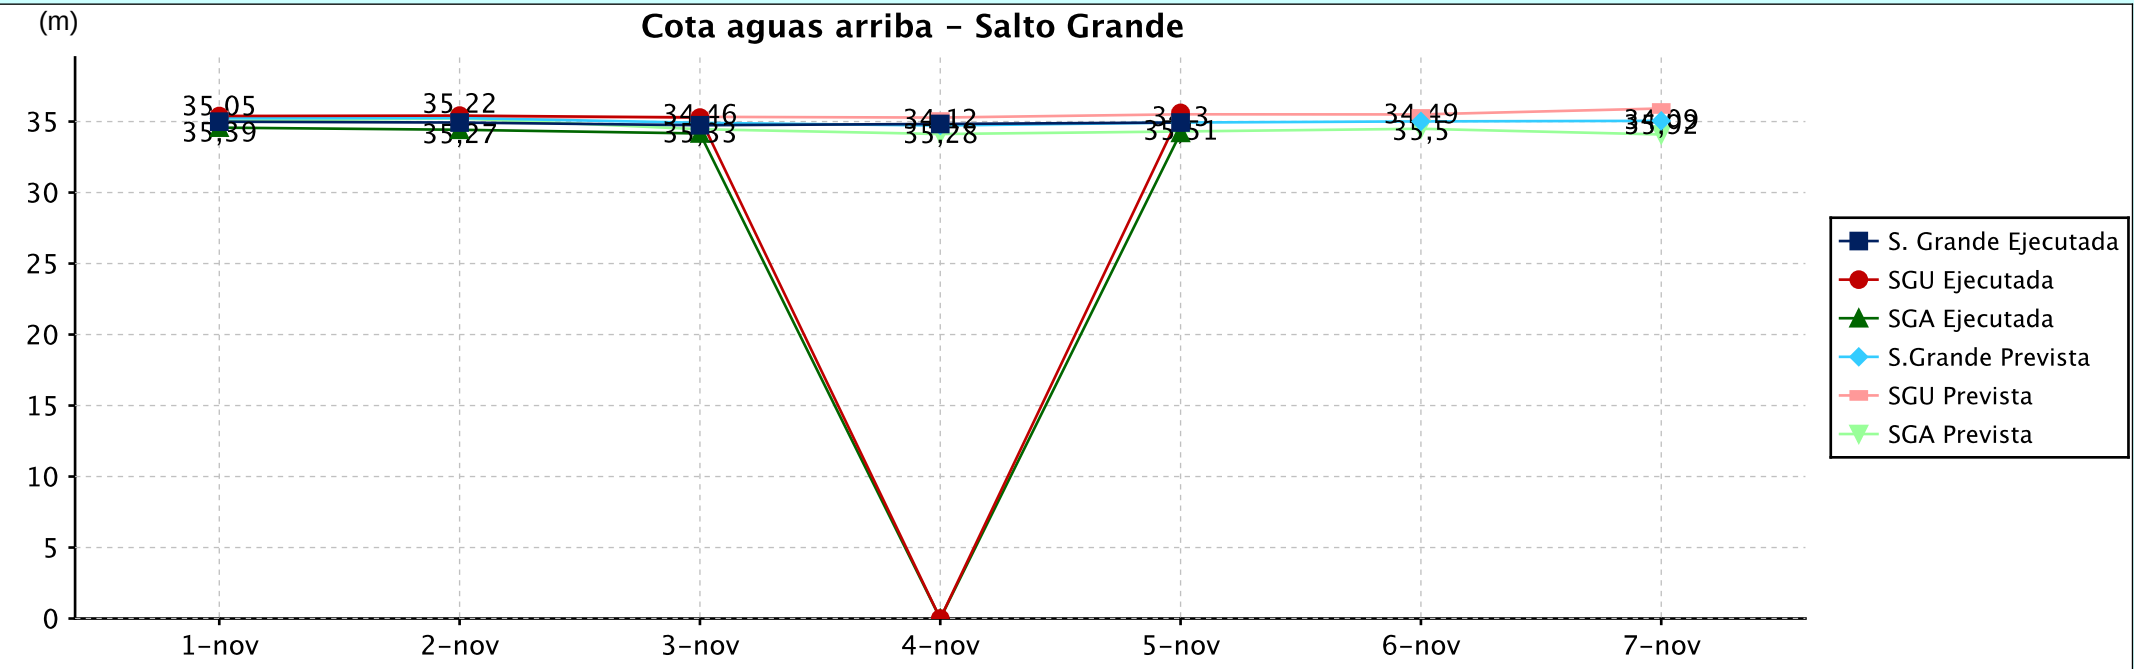

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,61
Cota Vista Arg	34,20
Cota real	34,93

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	32.743
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	692	631
Baygorria	822	823
Palmar	1.392	1.406
SGU	4.163	3.494

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.410	2.881
Baygorria	273	308
Palmar	1.800	2.043
SGU	3.900	3.893

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.600	1.573
Baygorria	1.750	1.689
Palmar	2.200	2.316
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 335 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
