



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 06 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	42
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	46
Central La Tablada	194
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.217
C. Baygorria	1.830
C. Palmar	6.341
C. Salto Grande	13.704
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.602
TOTAL Generación	31.921

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.982
Hidráulica	4.982
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.982




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.939
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.970
Diferencia (MWh)	-31
Ejecutada - Programada	-0,12 %

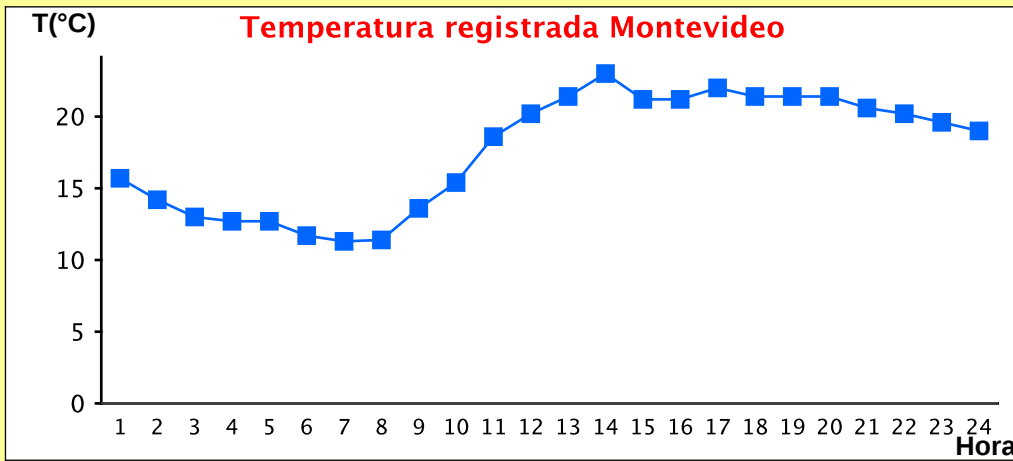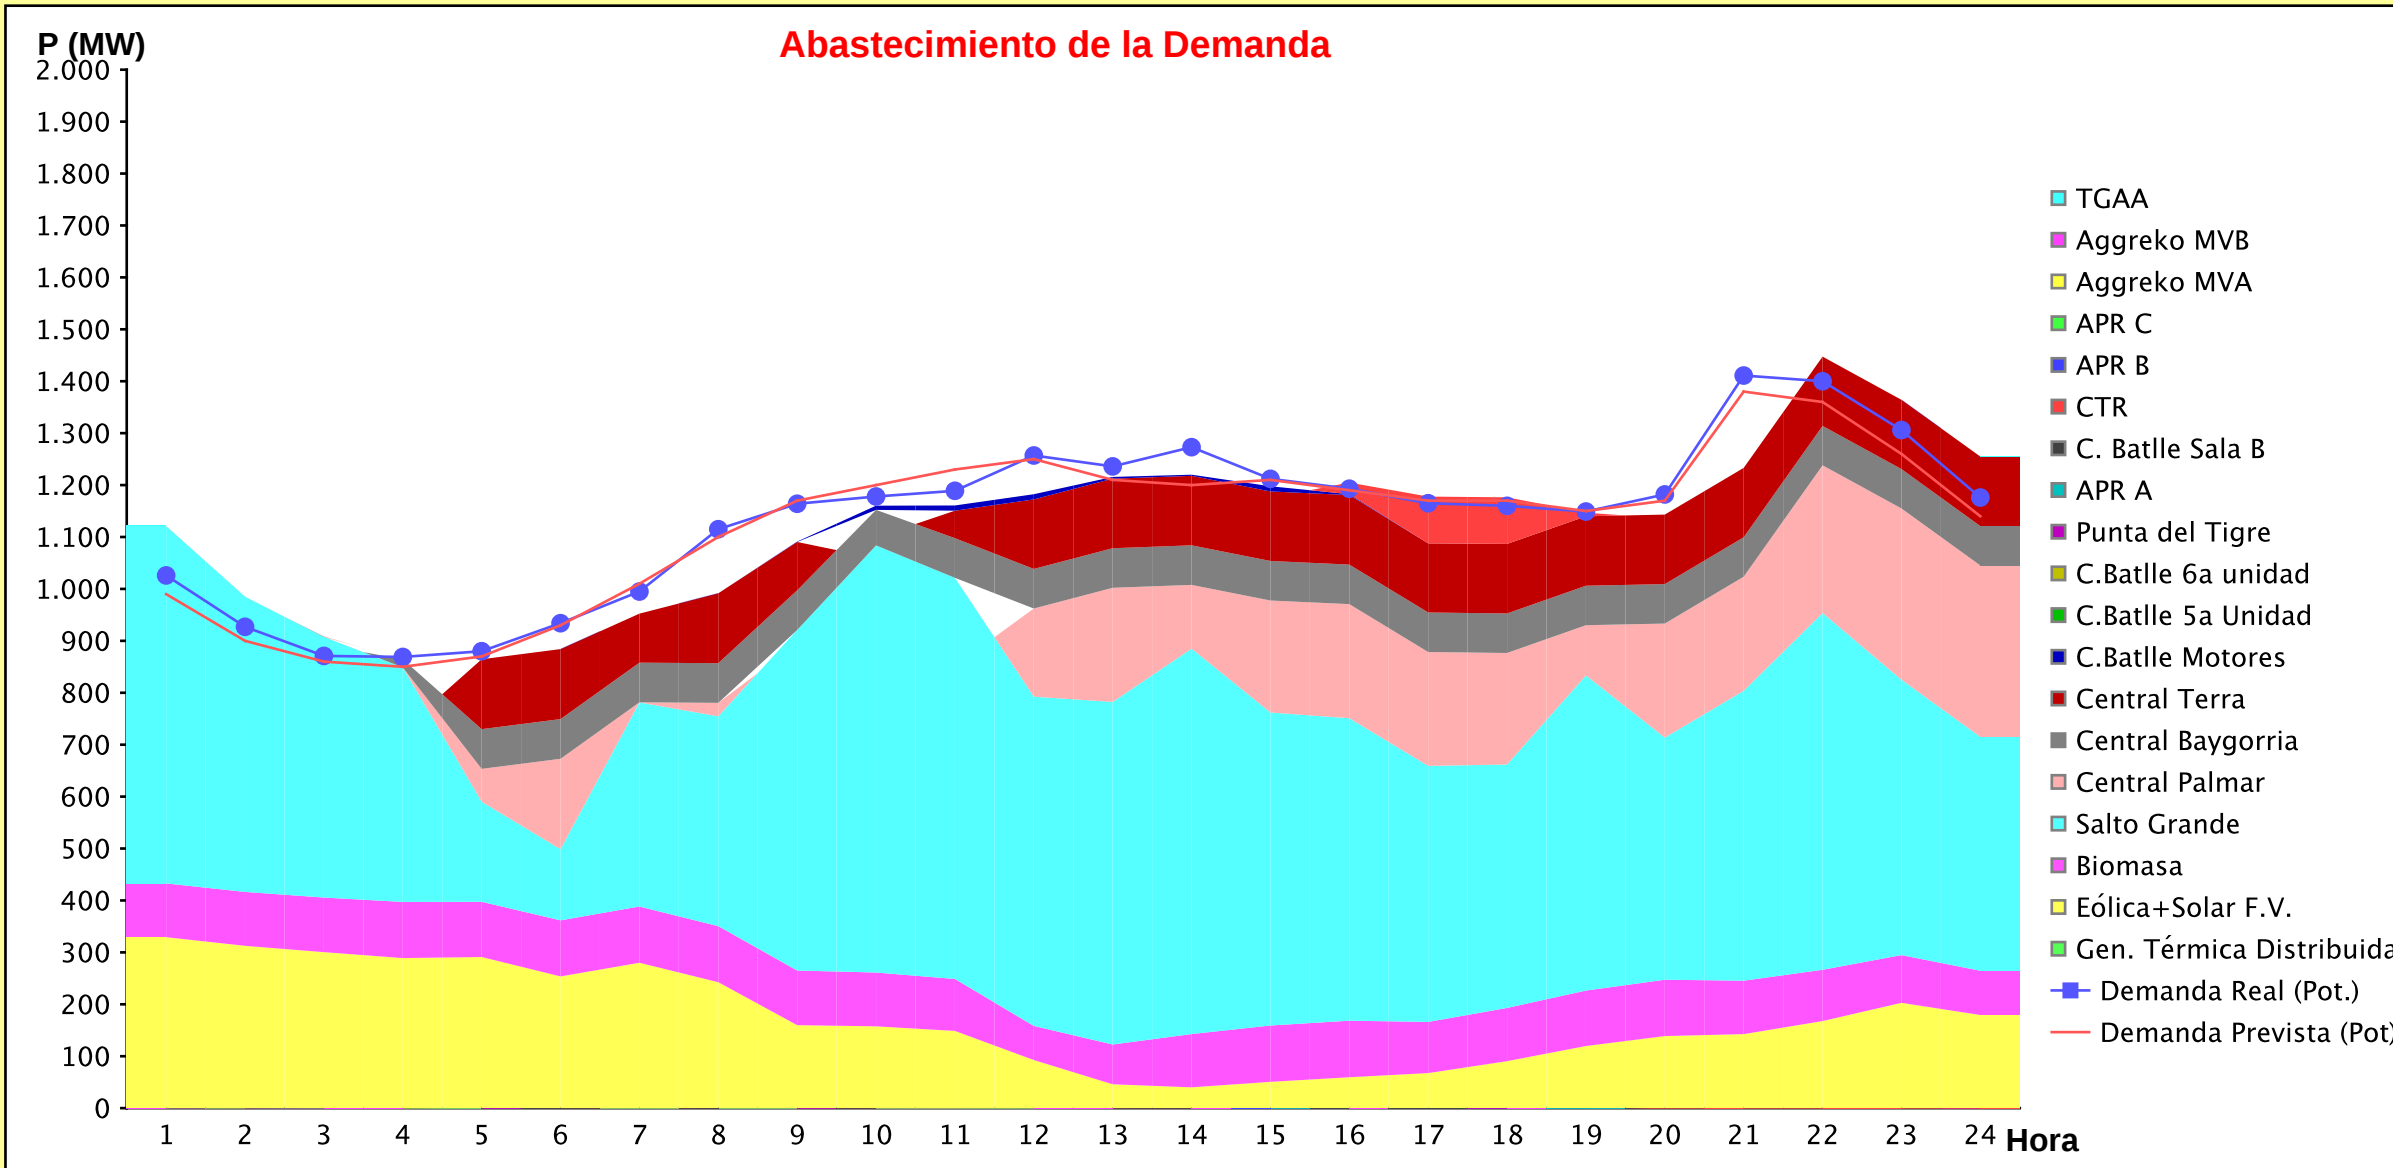



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1278,8 Hora 11:20
Potencia mínima:	845,24 Hora 03:43
Pico noche:	1438,34 Hora 21:15

Generación Media (MW)	
Eólica	173,8
Biomasa	101,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

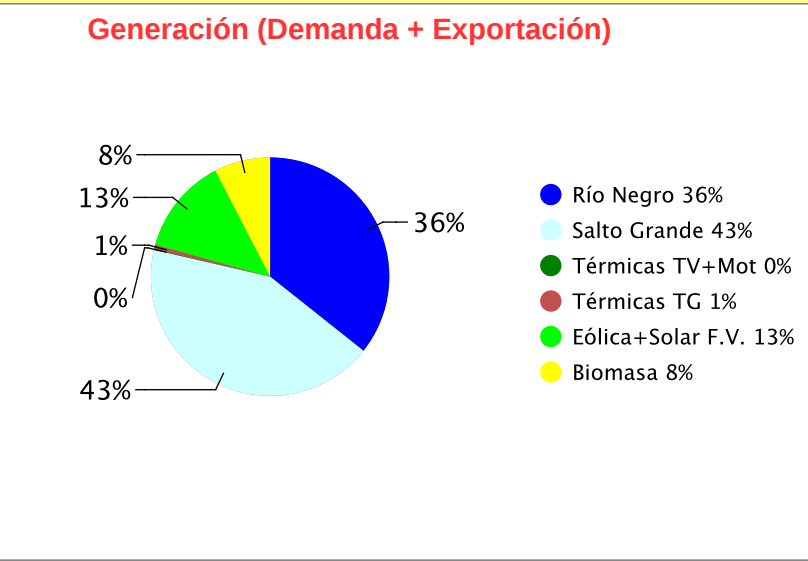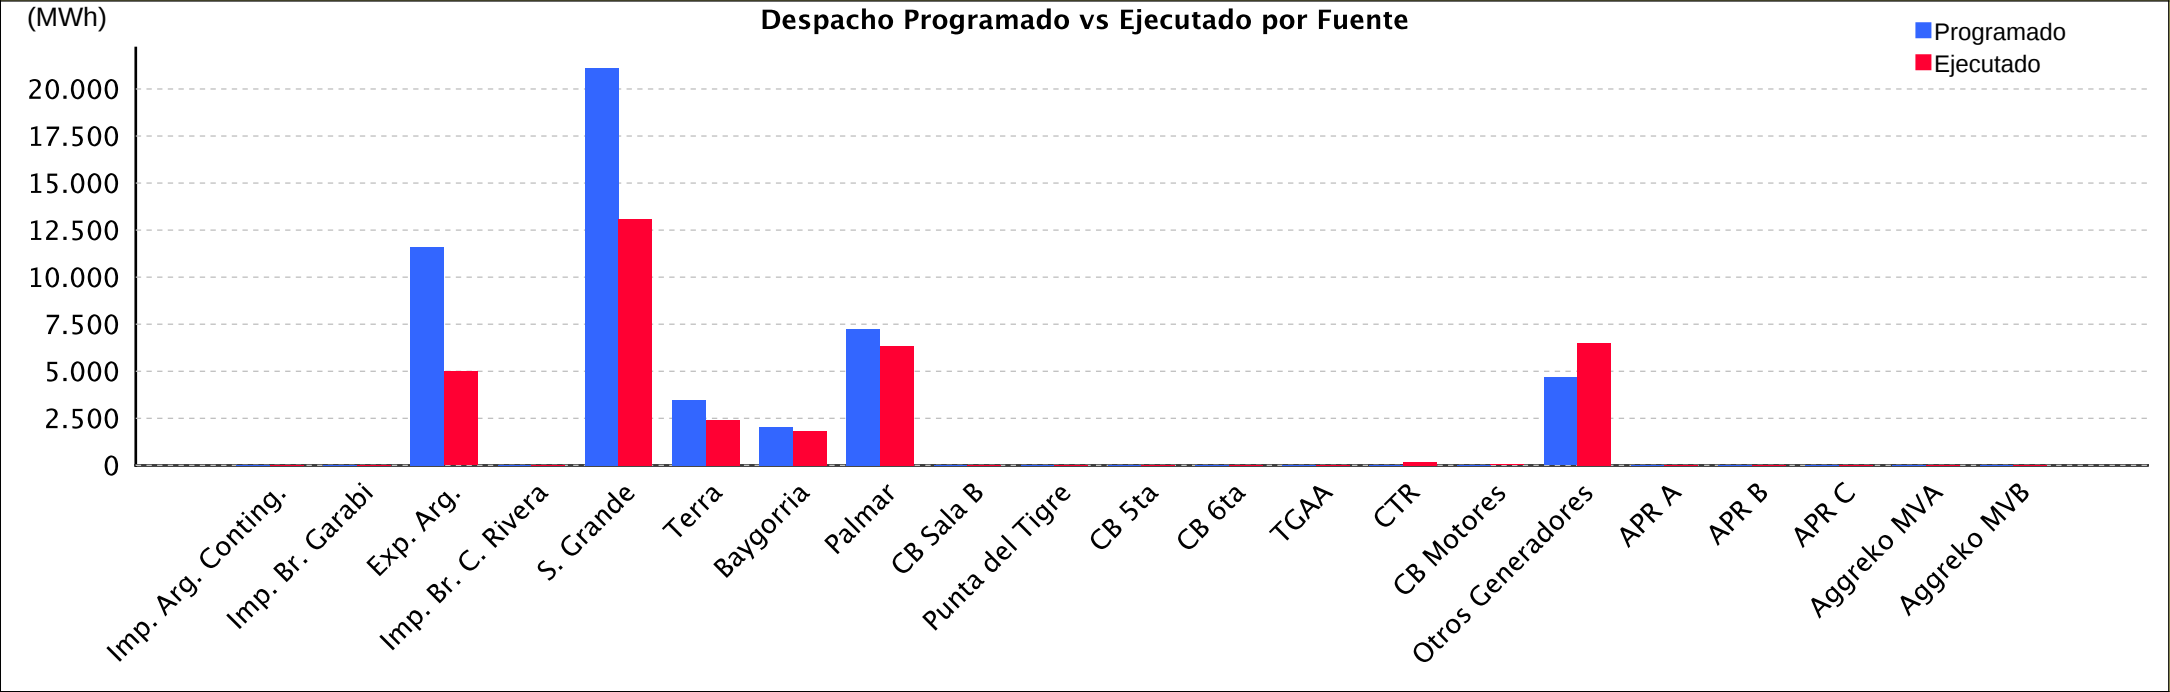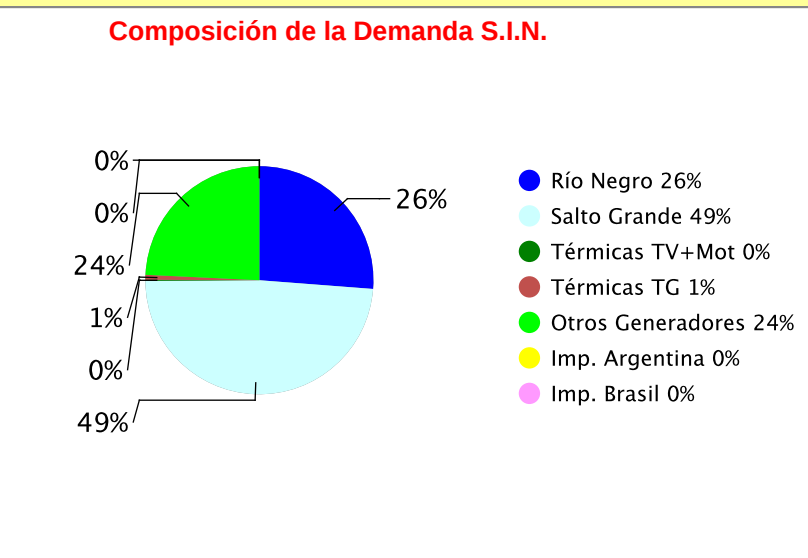



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

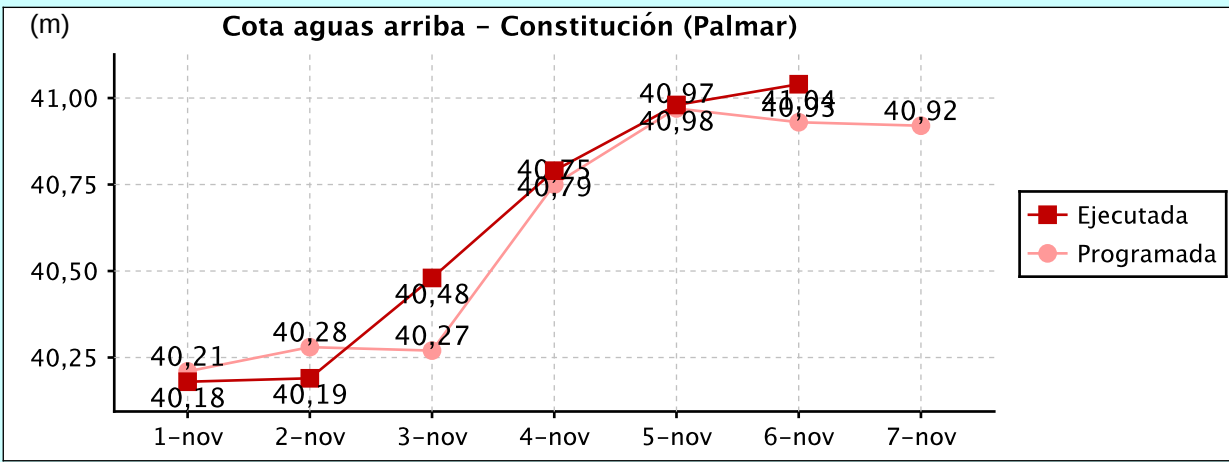
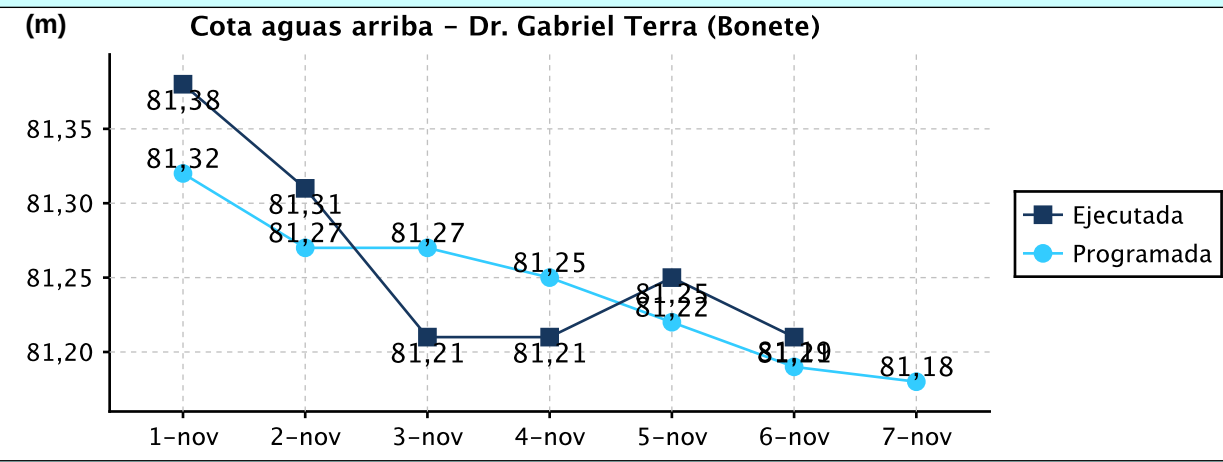


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,19	81,21
Baygorria	54,19	54,07
Palmar	40,93	41,04
SGU	35,50	35,87

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

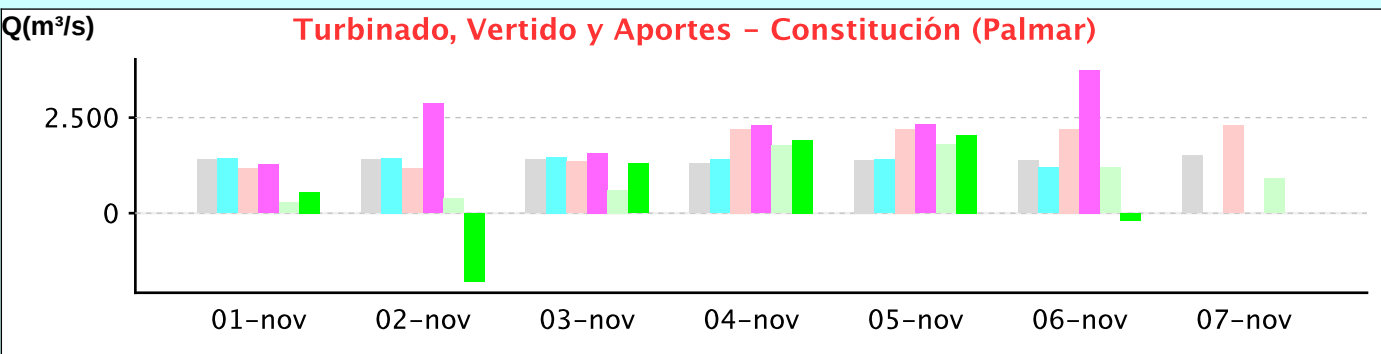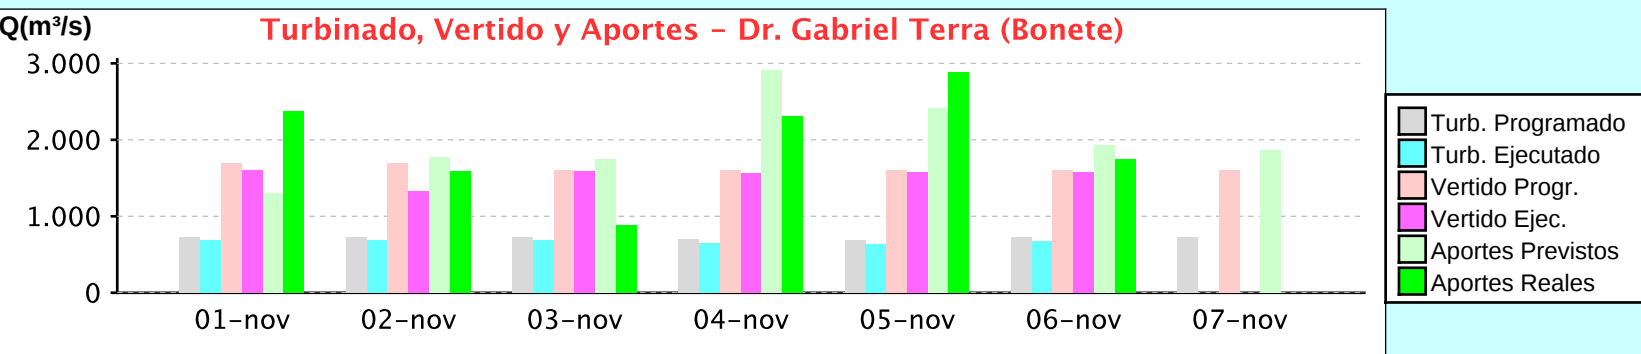

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

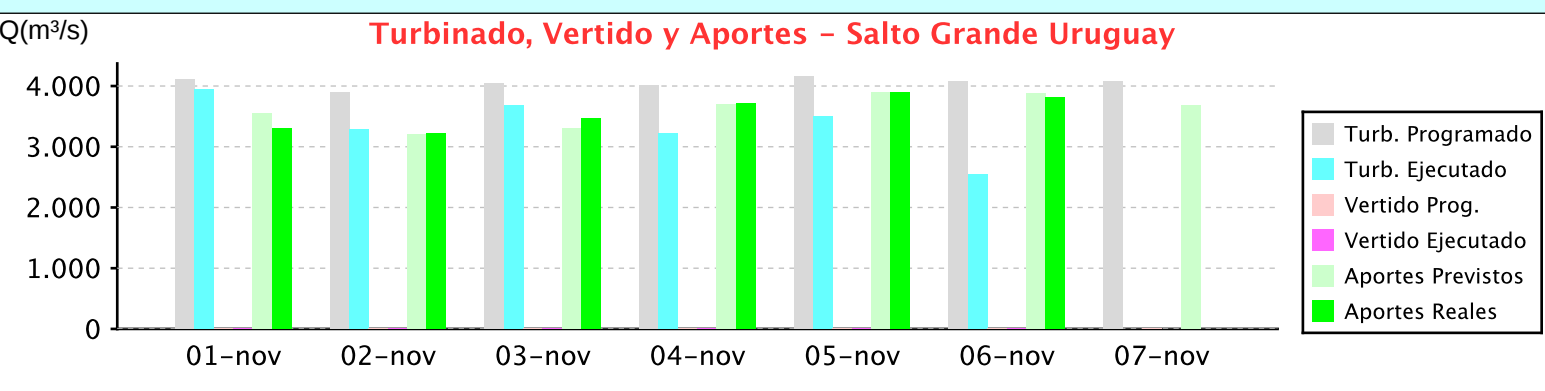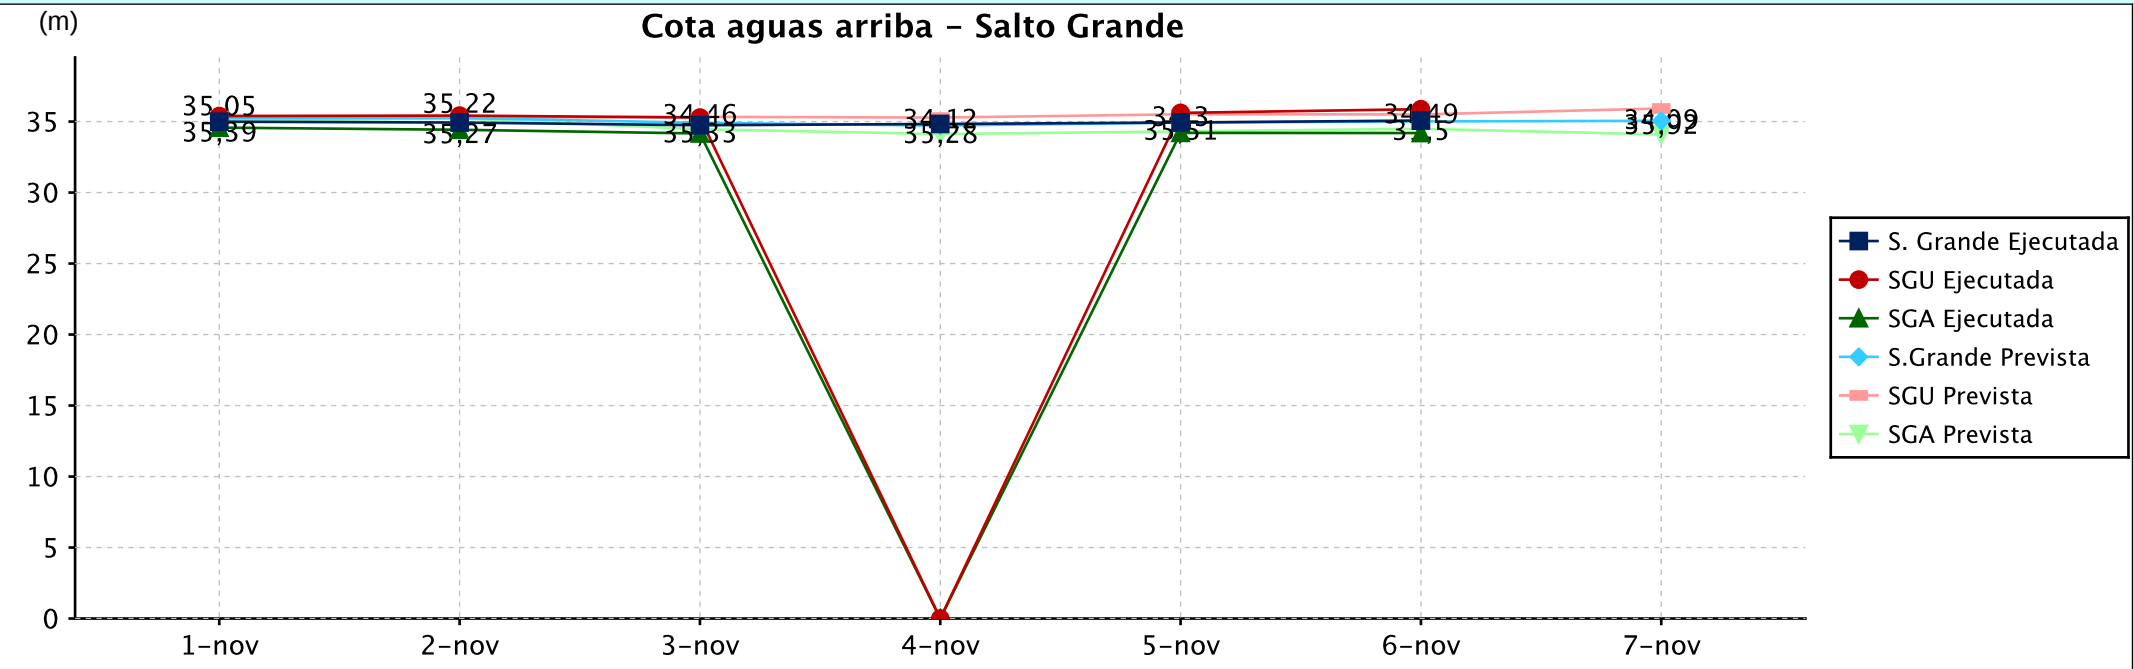

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,87
Cota Vista Arg	34,19
Cota real	35,07

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	39.533
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	730	679
Baygorria	856	798
Palmar	1.378	1.197
SGU	4.076	2.551

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.935	1.748
Baygorria	147	165
Palmar	1.200	-187
SGU	3.875	3.808

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.600	1.572
Baygorria	1.550	1.651
Palmar	2.200	3.748
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 208 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Se despacharon Motores CB y CTR por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

07/11/2014 15:12
