




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 10 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	8
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.213
C. Baygorria	1.891
C. Palmar	7.881
C. Salto Grande	20.998
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.703
TOTAL Generación	37.634

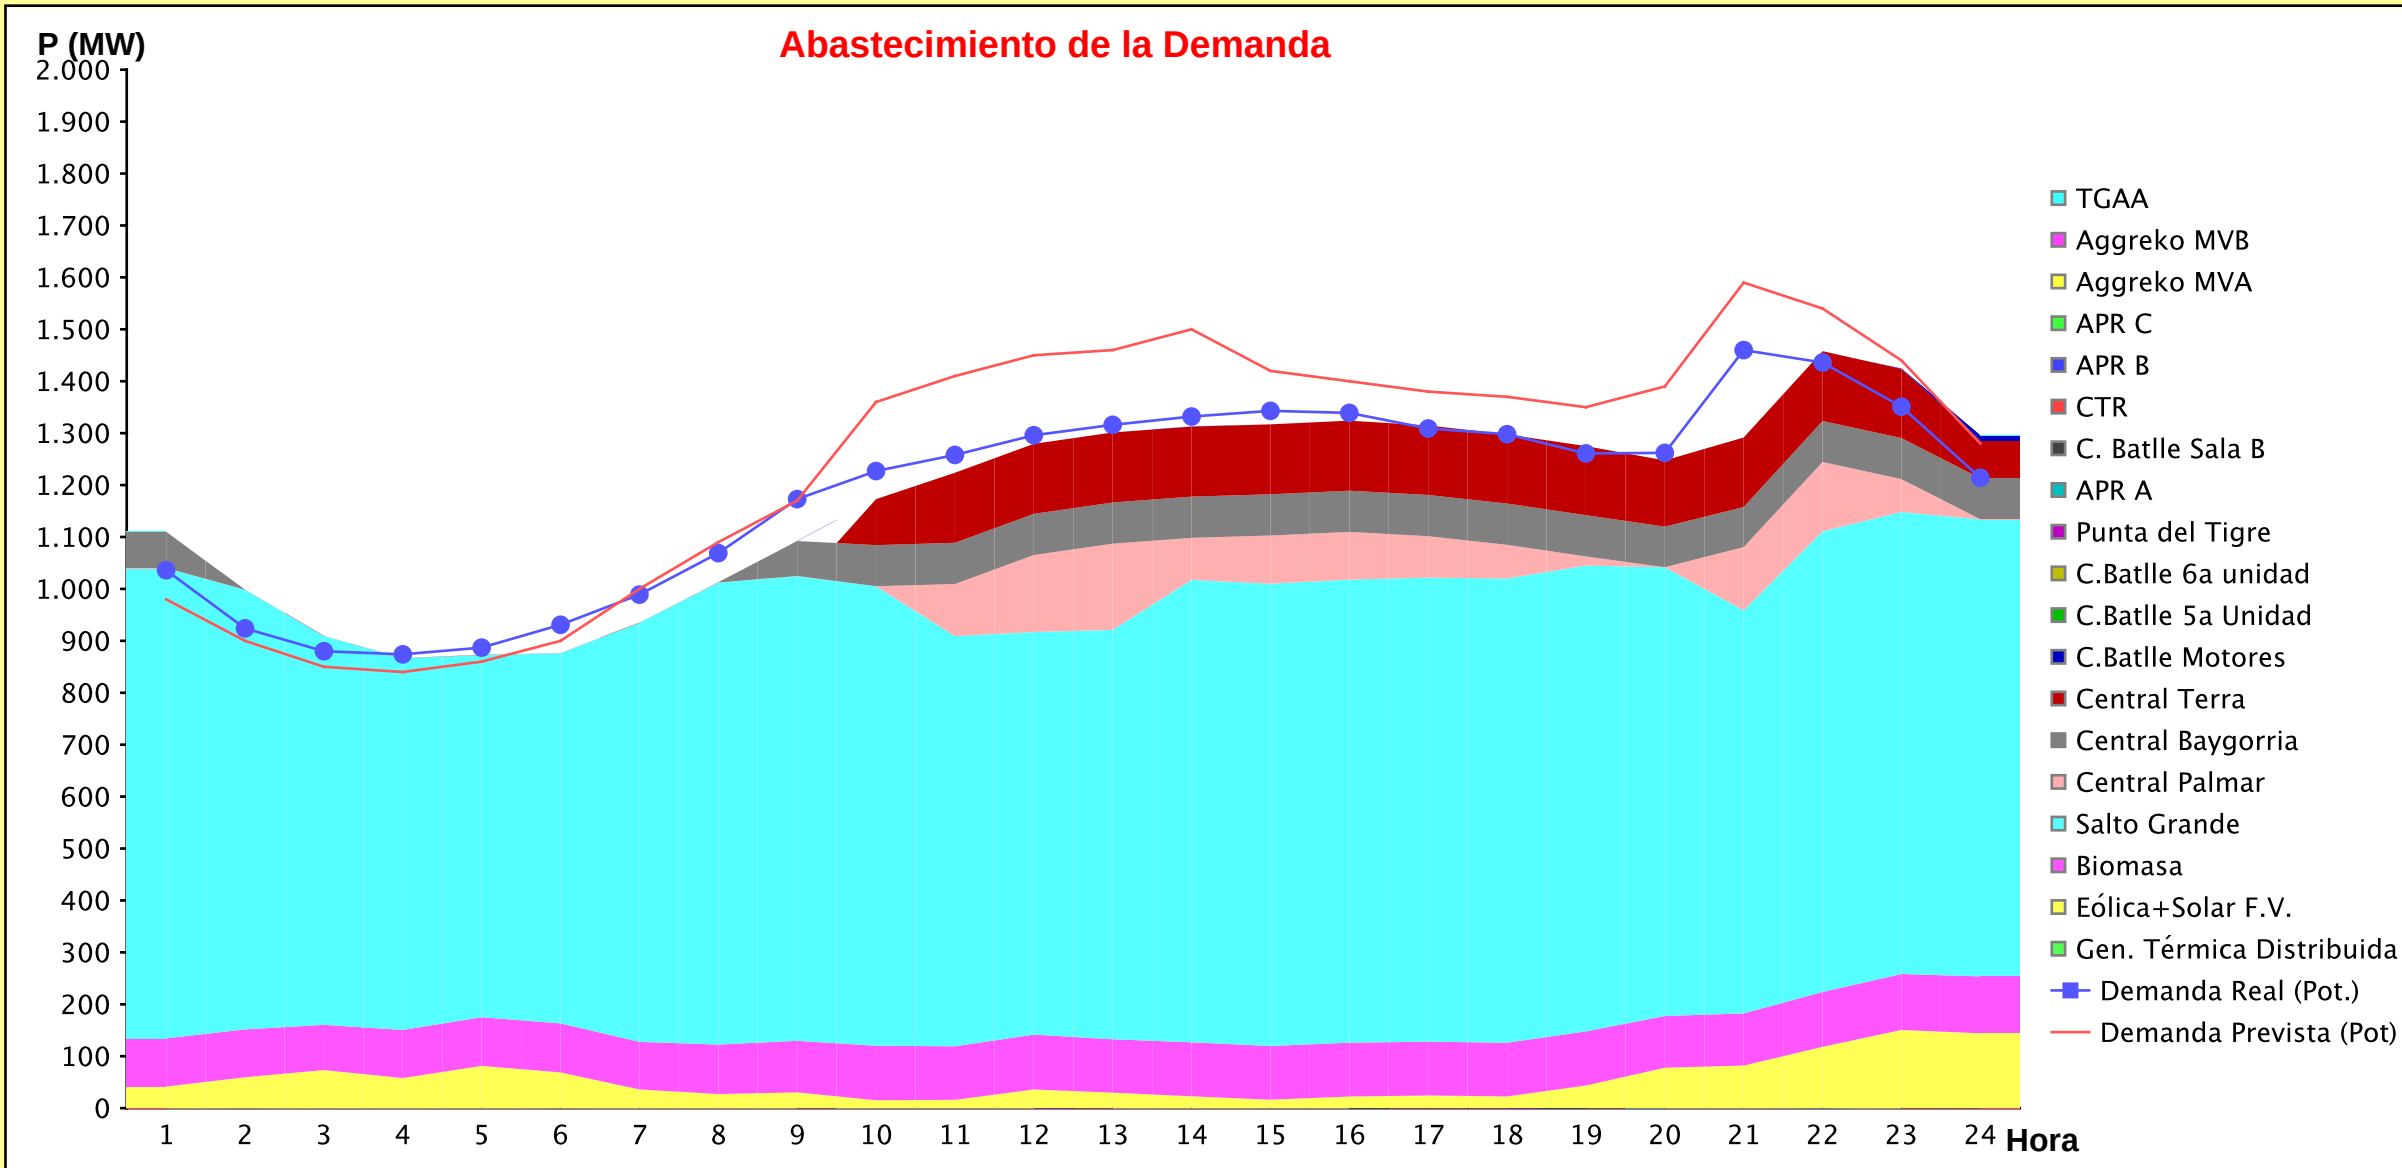

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.483
Hidráulica	9.483
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.483



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.151
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.930
Diferencia (MWh)	-1.779
Ejecutada - Programada	-5.94 %

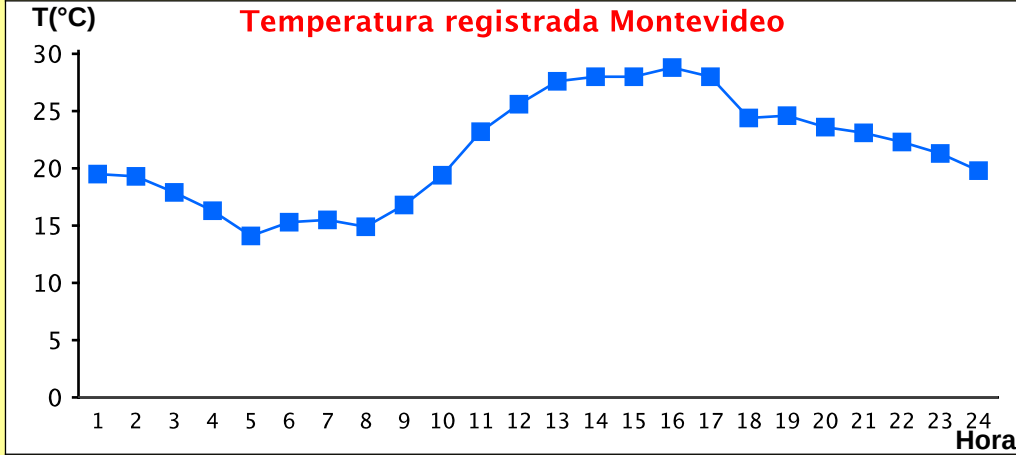


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1347,08 Hora 15:01
Potencia mínima:	855,47 Hora 03:50
Pico noche:	1480,9 Hora 21:42

Generación Media (MW)	
Eólica	55,0
Biomasa	100,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

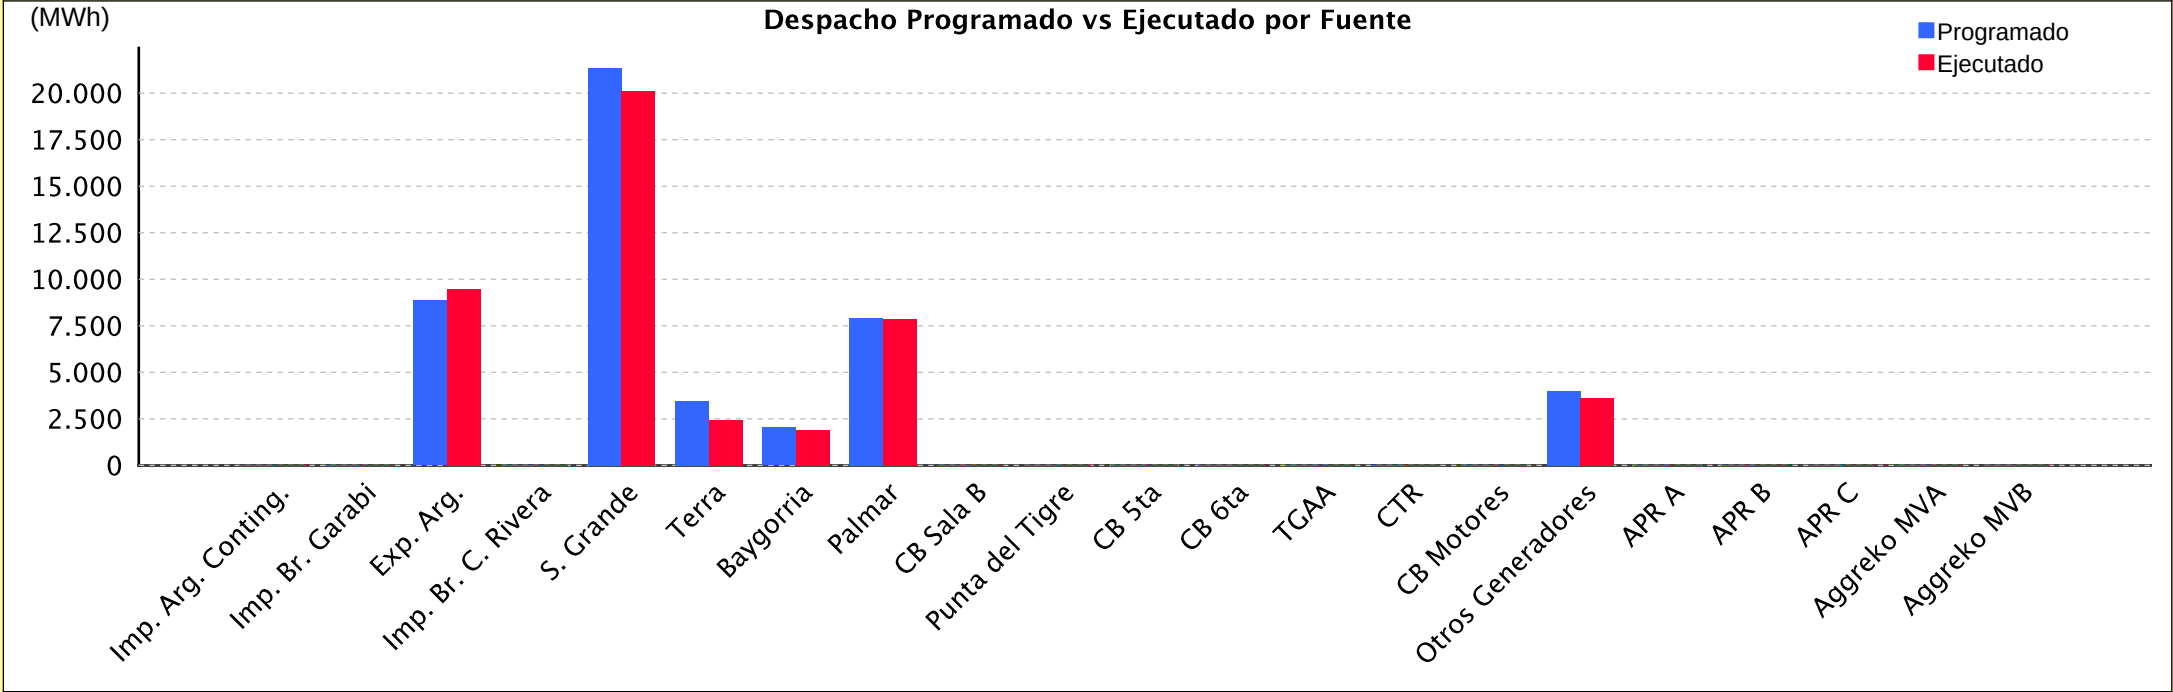
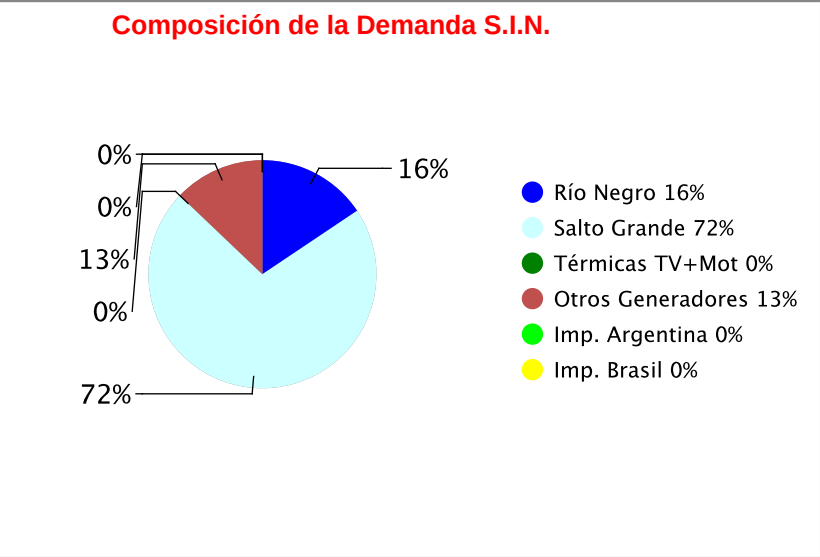


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

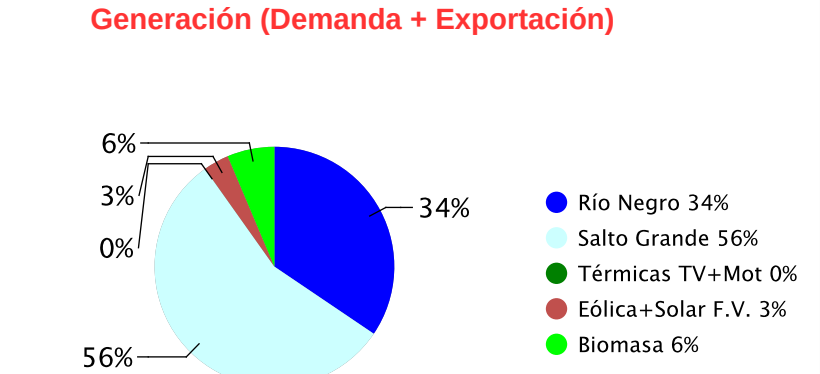



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

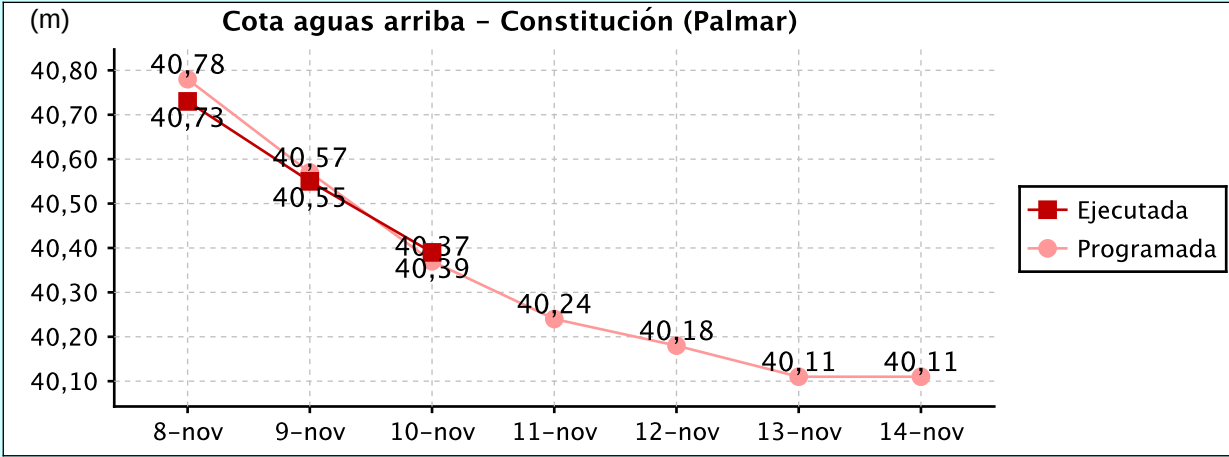
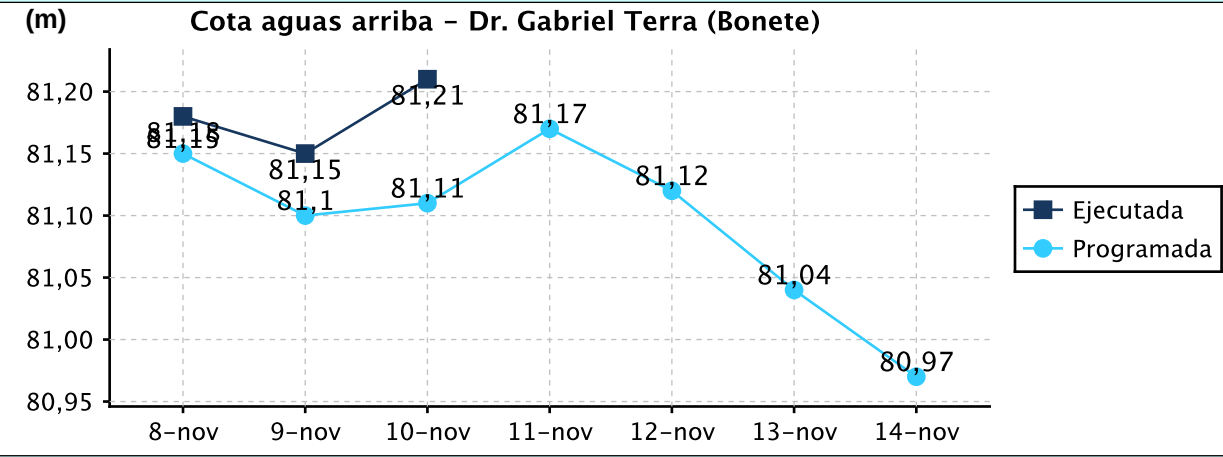


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,11	81,21
Baygorria	54,20	54,14
Palmar	40,37	40,39
SGU	36,04	35,96

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

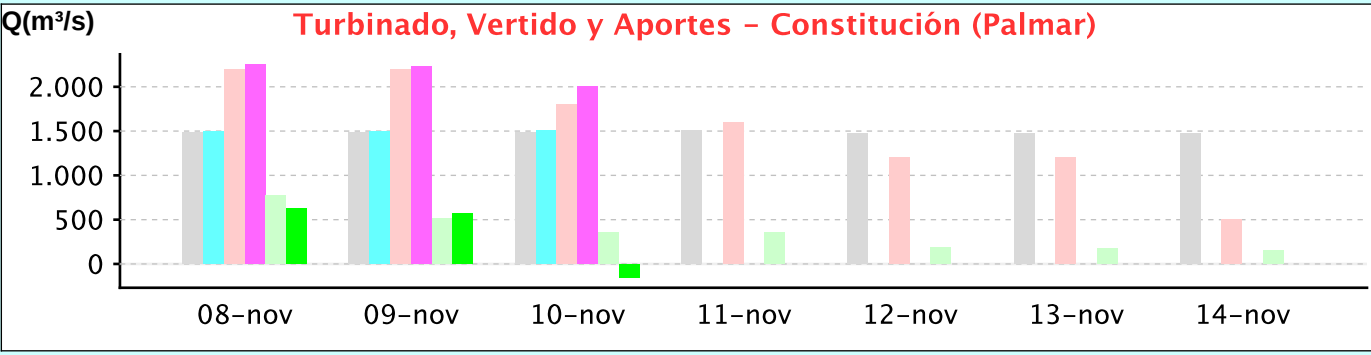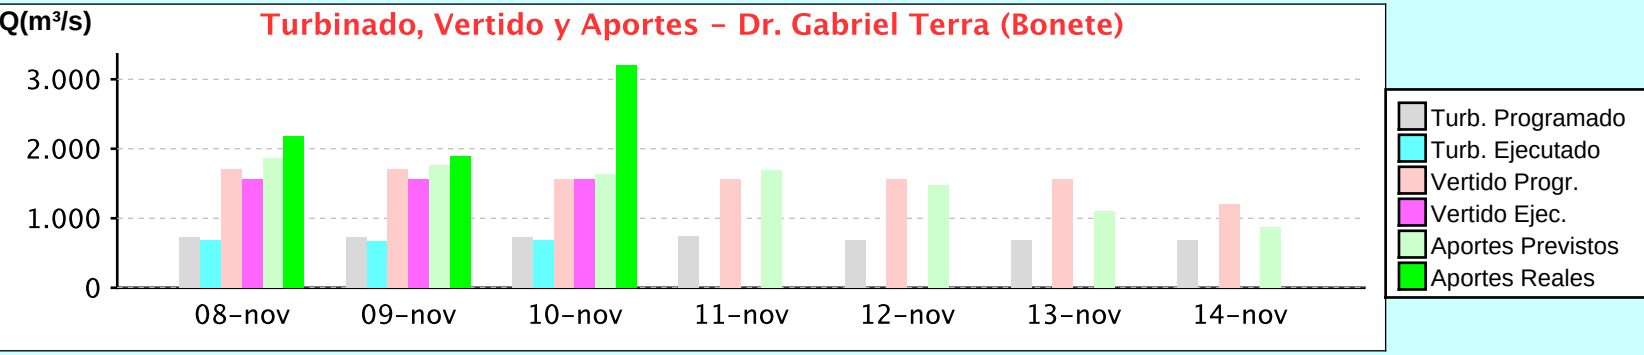

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

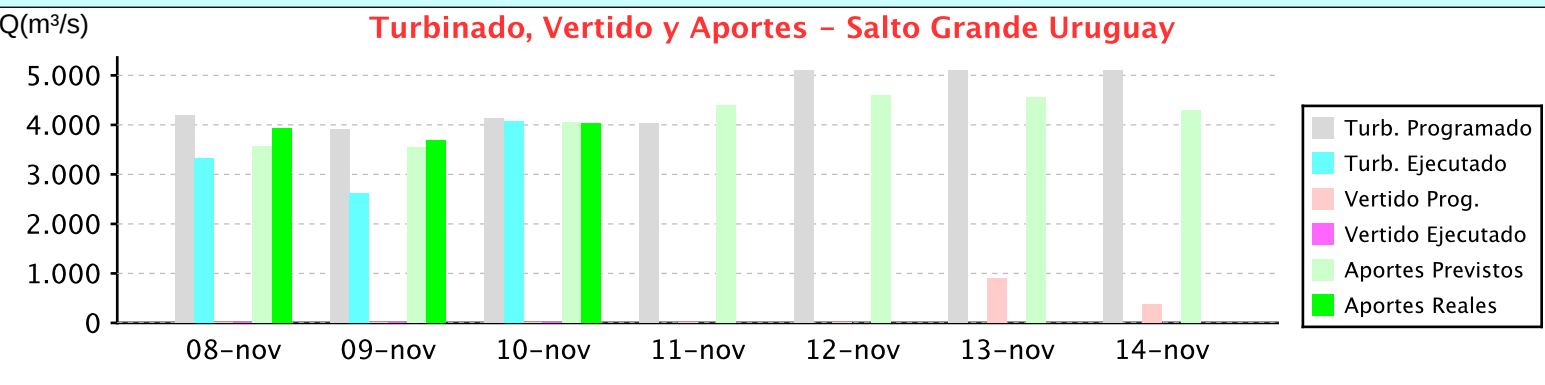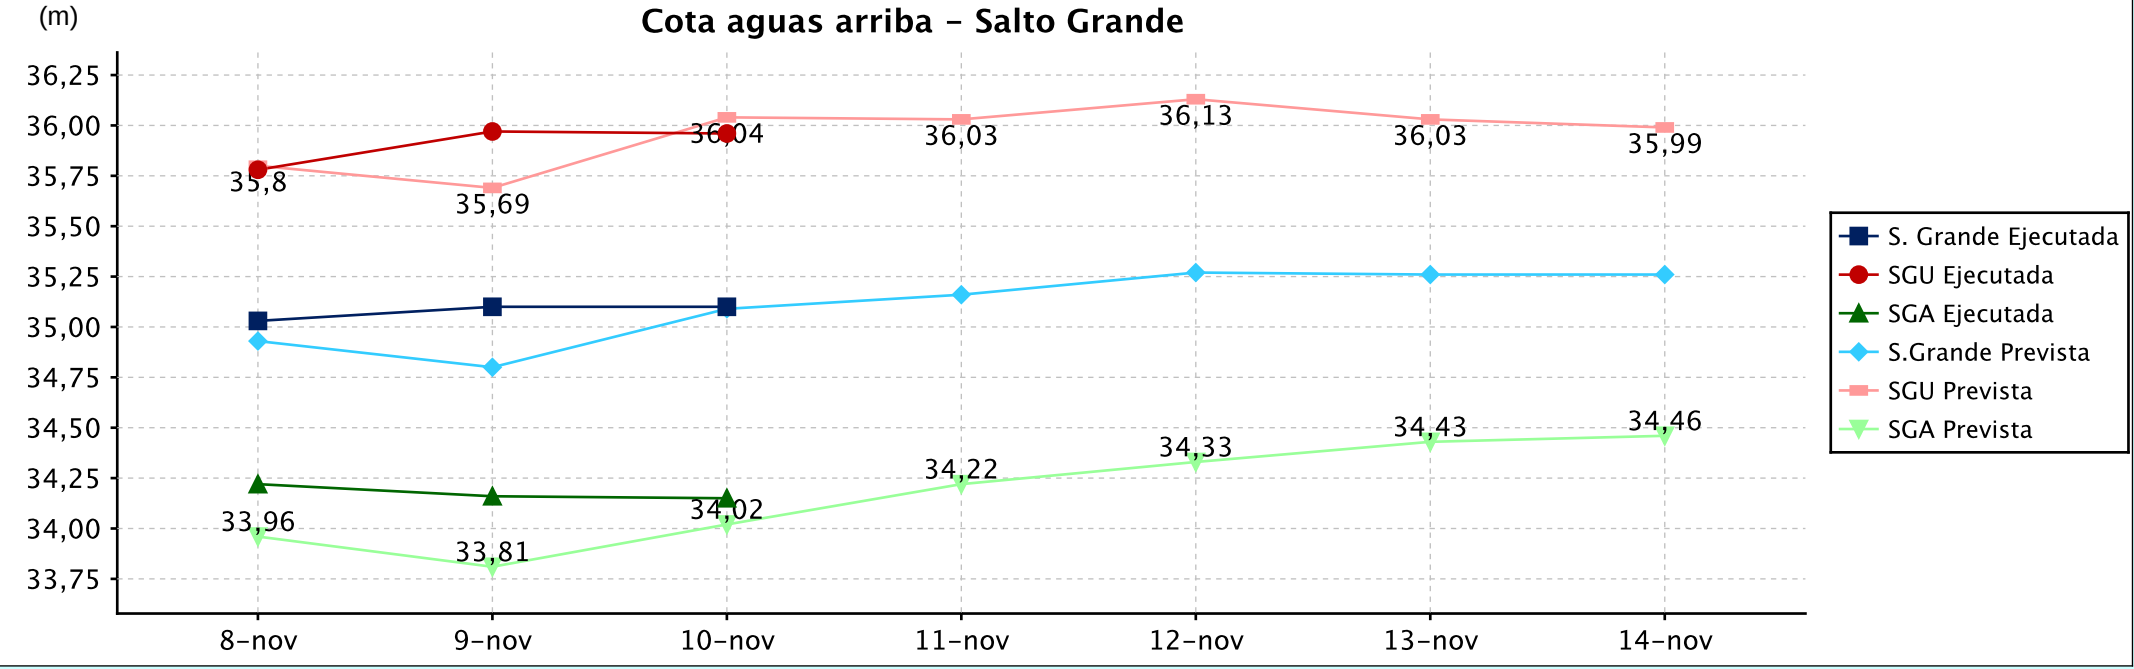

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,96
Cota Vista Arg	34,15
Cota real	35,10
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	42.748

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	730	677
Baygorria	868	780
Palmar	1.484	1.507
SGU	4.138	4.071

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.639	3.199
Baygorria	0	-575
Palmar	352	-149
SGU	4.044	4.038

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.565	1.556
Baygorria	1.500	2.346
Palmar	1.800	2.004
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 395 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

11/11/2014 16:00
