




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 13 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	106
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	110
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.235
C. Baygorria	1.903
C. Palmar	7.899
C. Salto Grande	18.493
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.245
TOTAL Generación	35.822

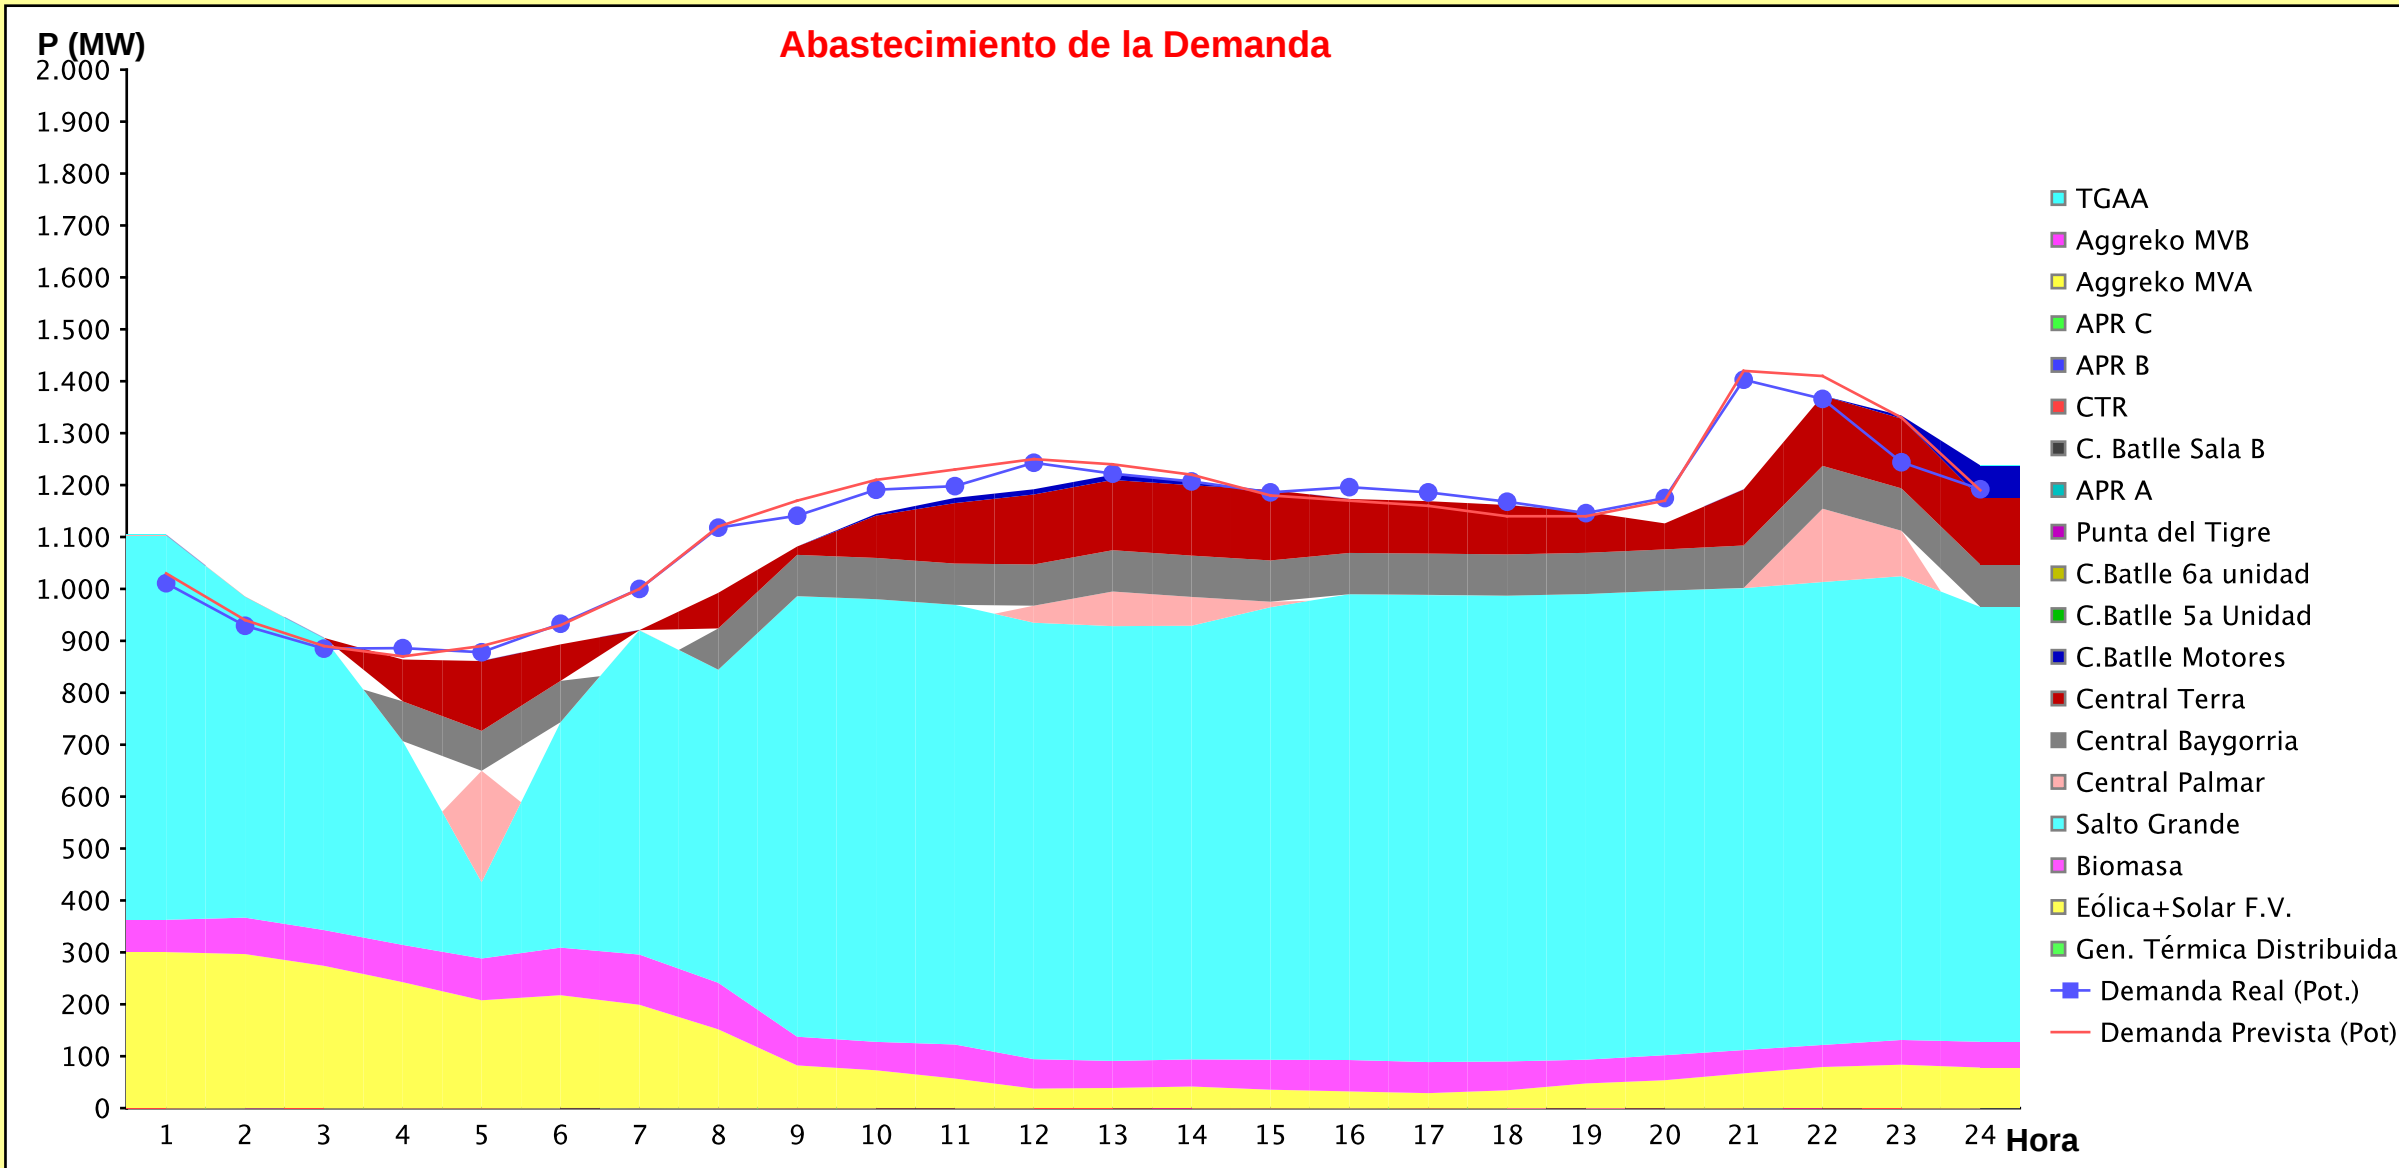

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.234
Hidráulica	9.234
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.234




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.588
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.300
Diferencia (MWh)	-712
Ejecutada - Programada	-2,61 %

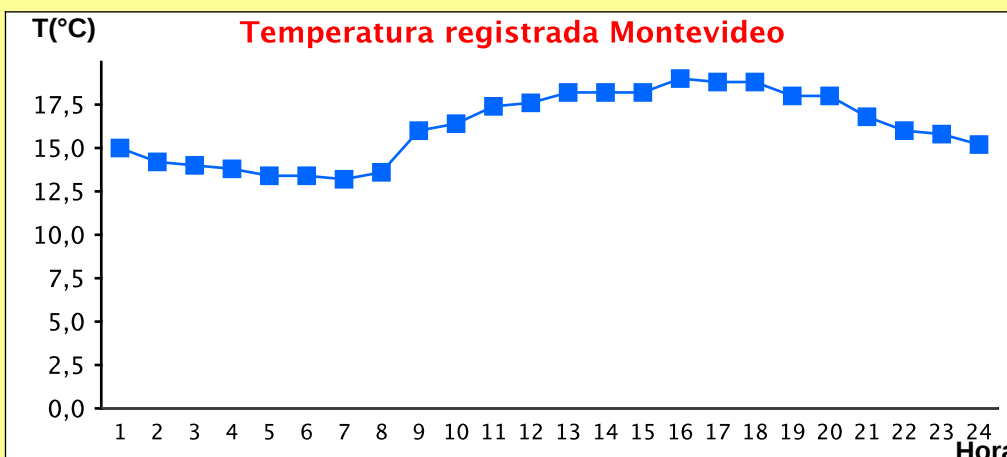



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1269,73 Hora 11:52
Potencia mínima:	862,08 Hora 04:49
Pico noche:	1423,47 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	115,6
Biomasa	70,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

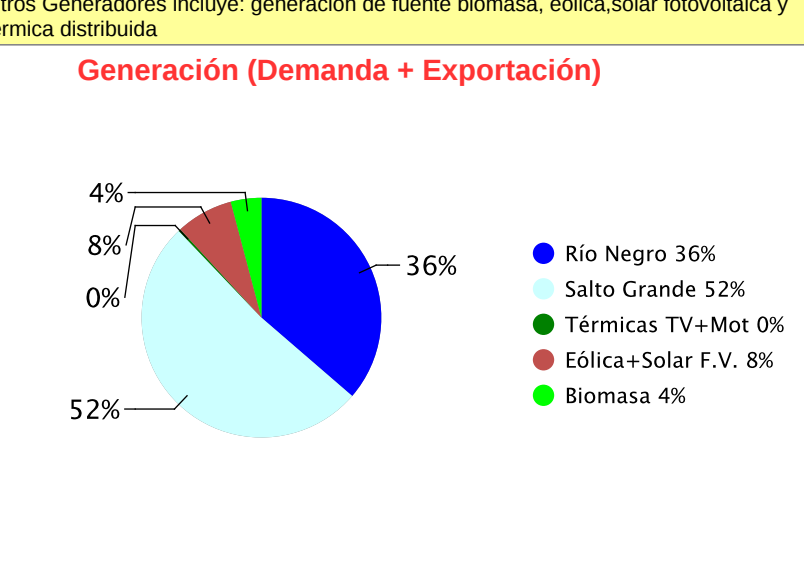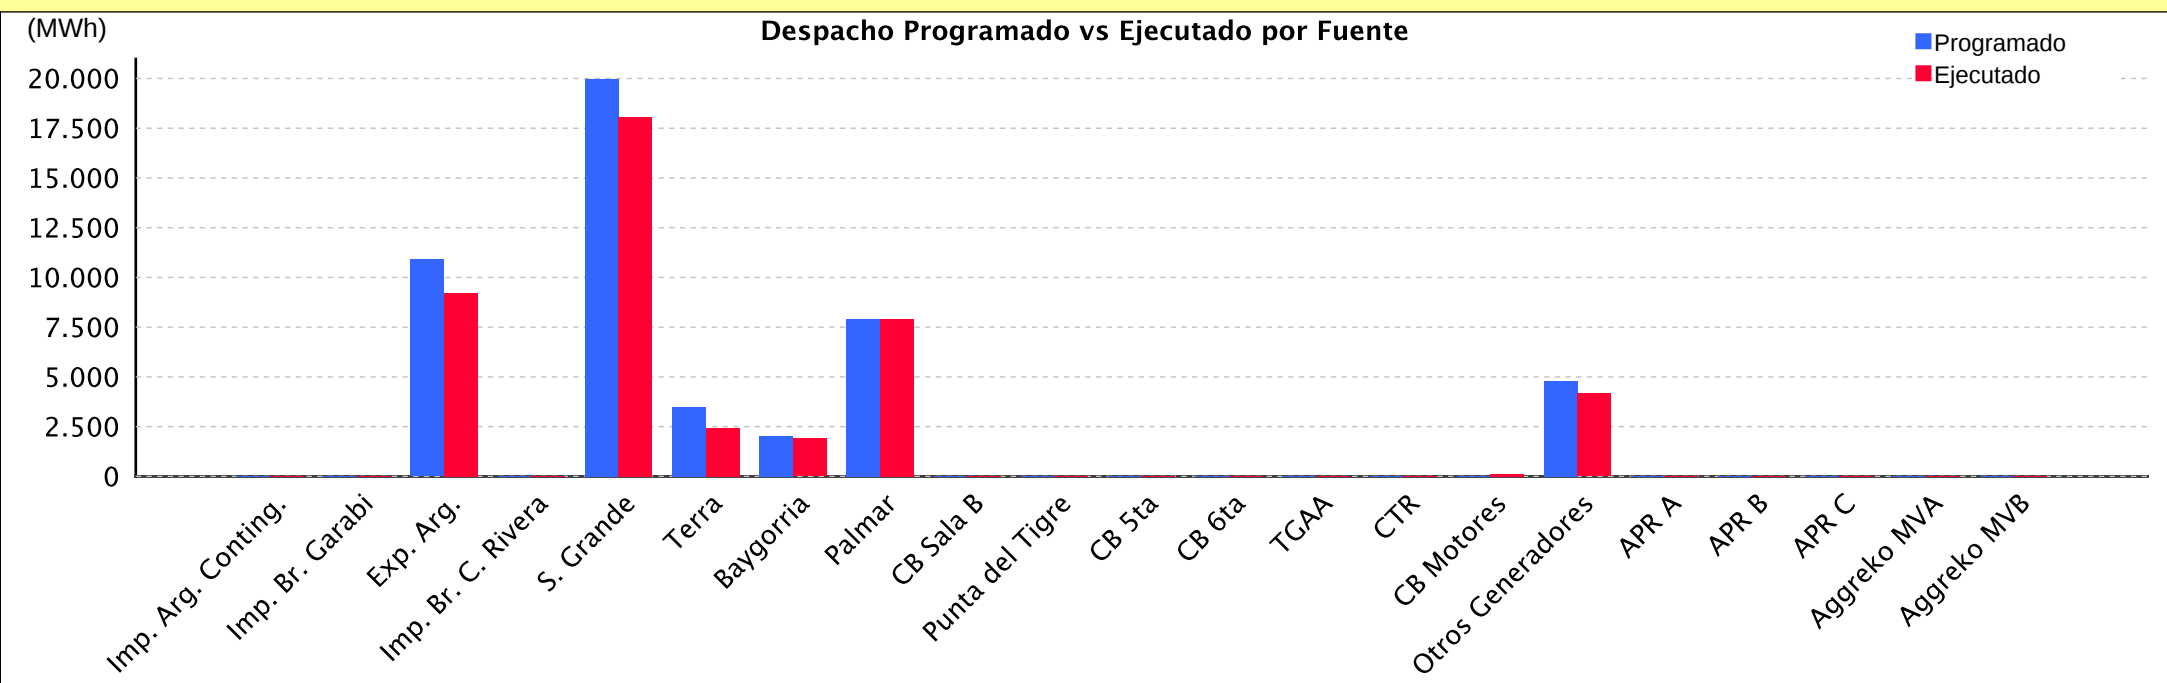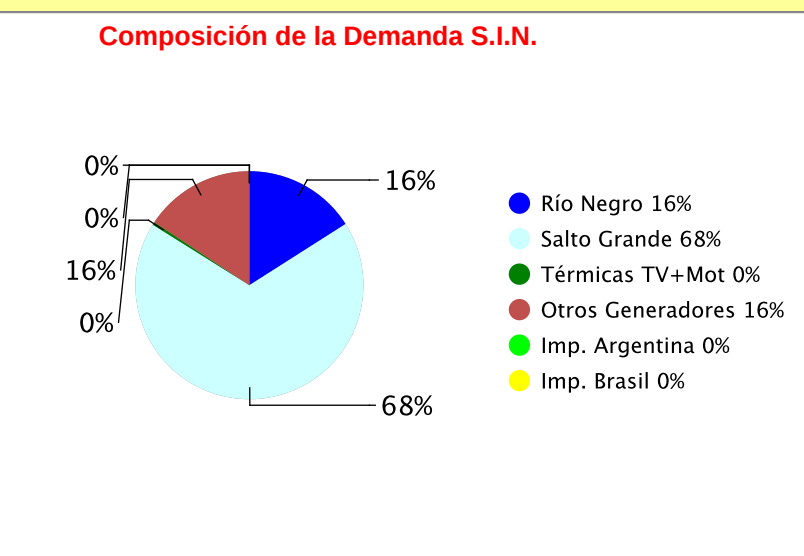



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

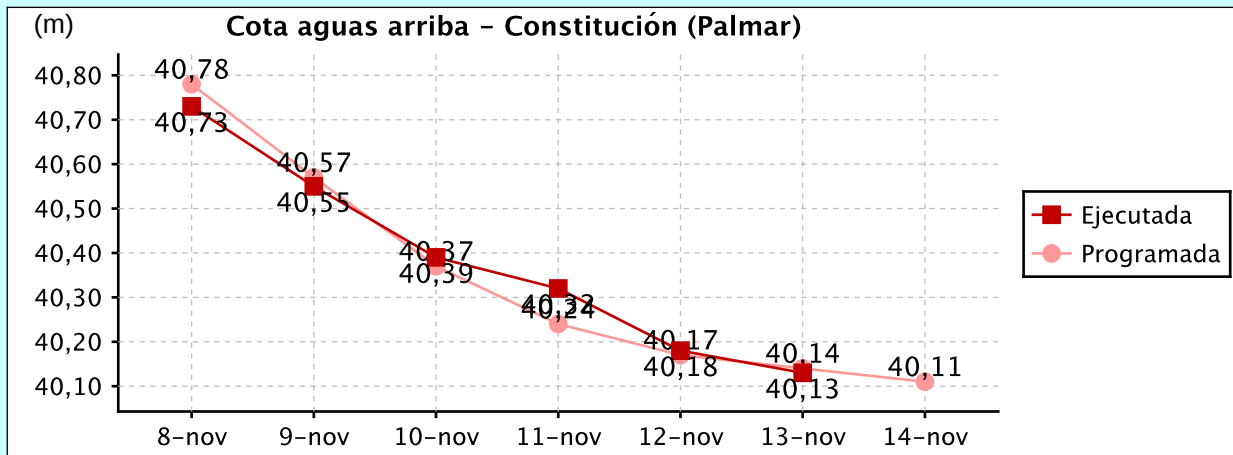
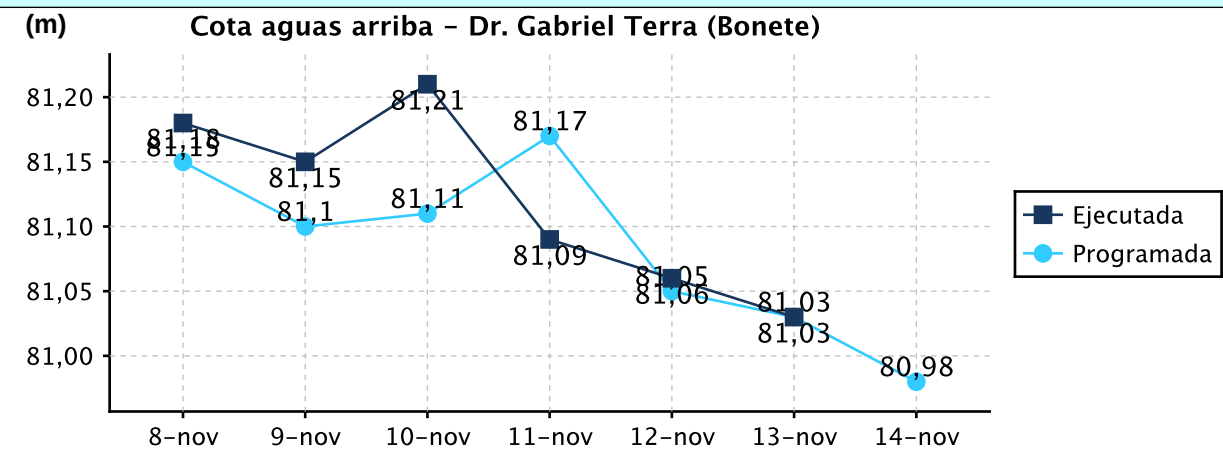


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,03	81,03
Baygorria	54,20	54,11
Palmar	40,14	40,13
SGU	36,17	36,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

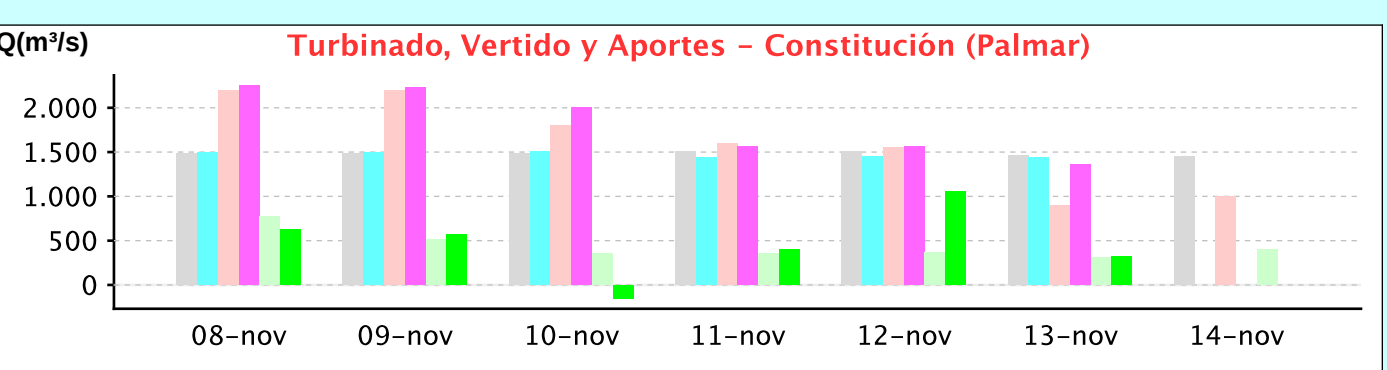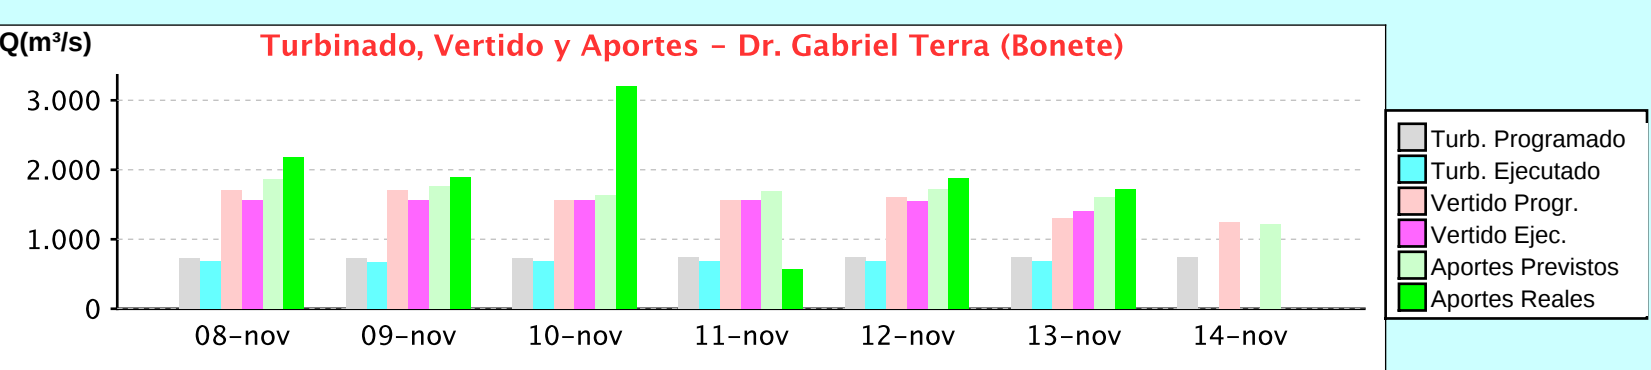

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

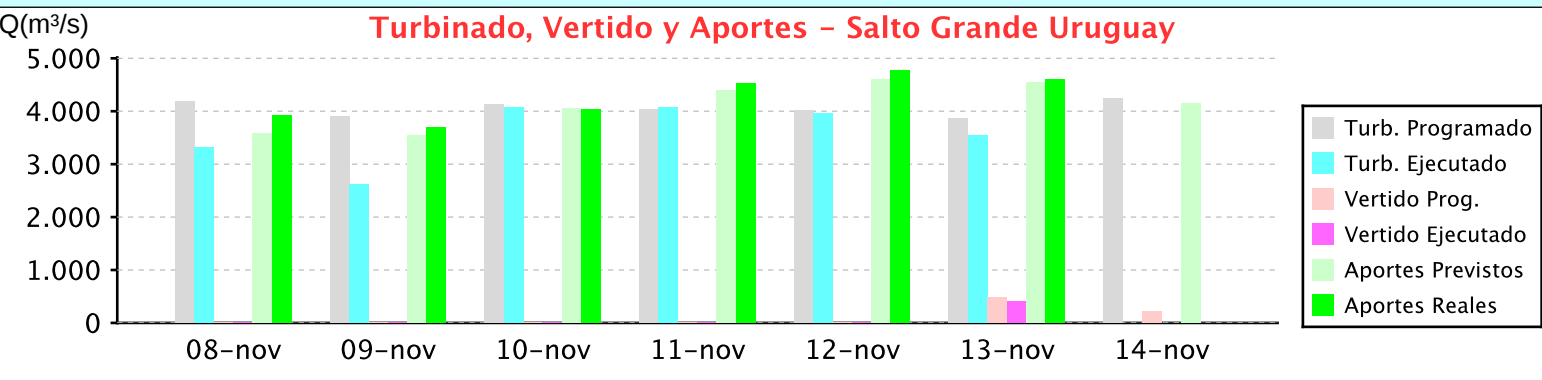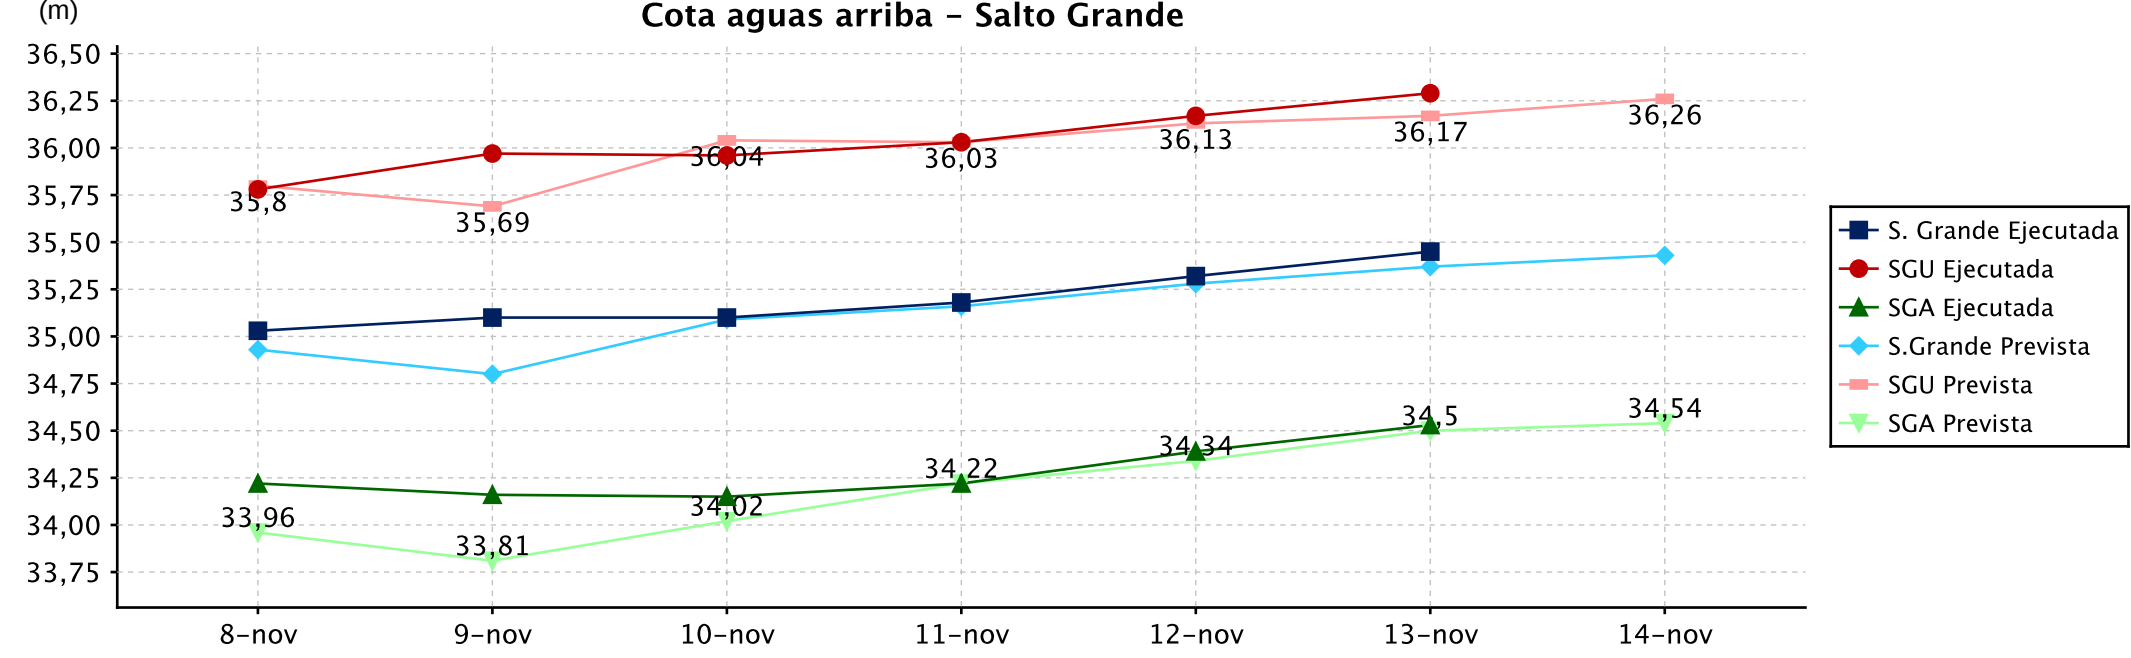

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,29
Cota Vista Arg	34,53
Cota real	35,45

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	42.827
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	735	678
Baygorria	840	784
Palmar	1.467	1.440
SGU	3.857	3.536

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.601	1.722
Baygorria	0	280
Palmar	314	327
SGU	4.550	4.596

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.398
Baygorria	1.100	1.559
Palmar	900	1.361
SGU	484	404

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 385 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
Se despacharon Motores CB forzados por pruebas.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

14/11/2014 15:44
