



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 19 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	27
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	31
Central La Tablada	-39
Central P. del Tigre	-11
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	75
Aggreko MVA	46
Aggreko MVB	29
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.316
C. Baygorria	1.928
C. Palmar	7.793
C. Salto Grande	9.724
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.722
TOTAL Generación	29.533

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.533
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.510
Diferencia (MWh)	23
Ejecutada - Programada	0,08 %

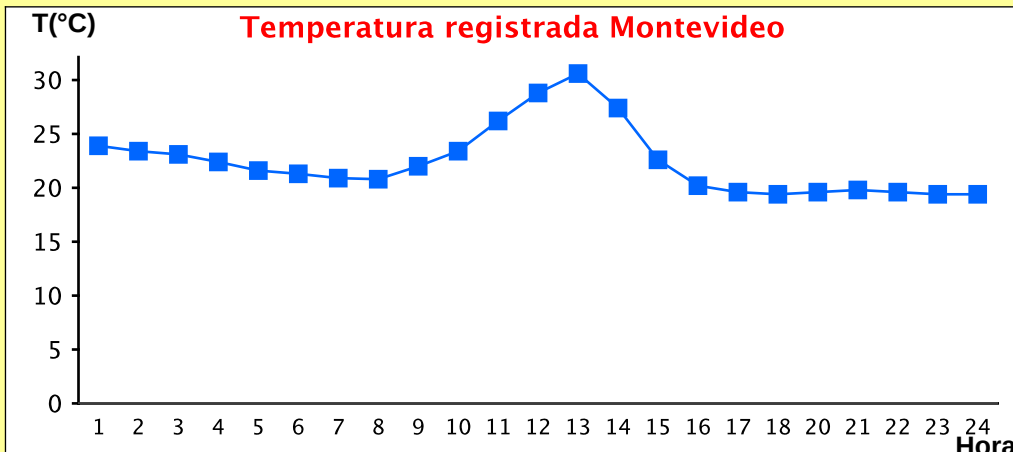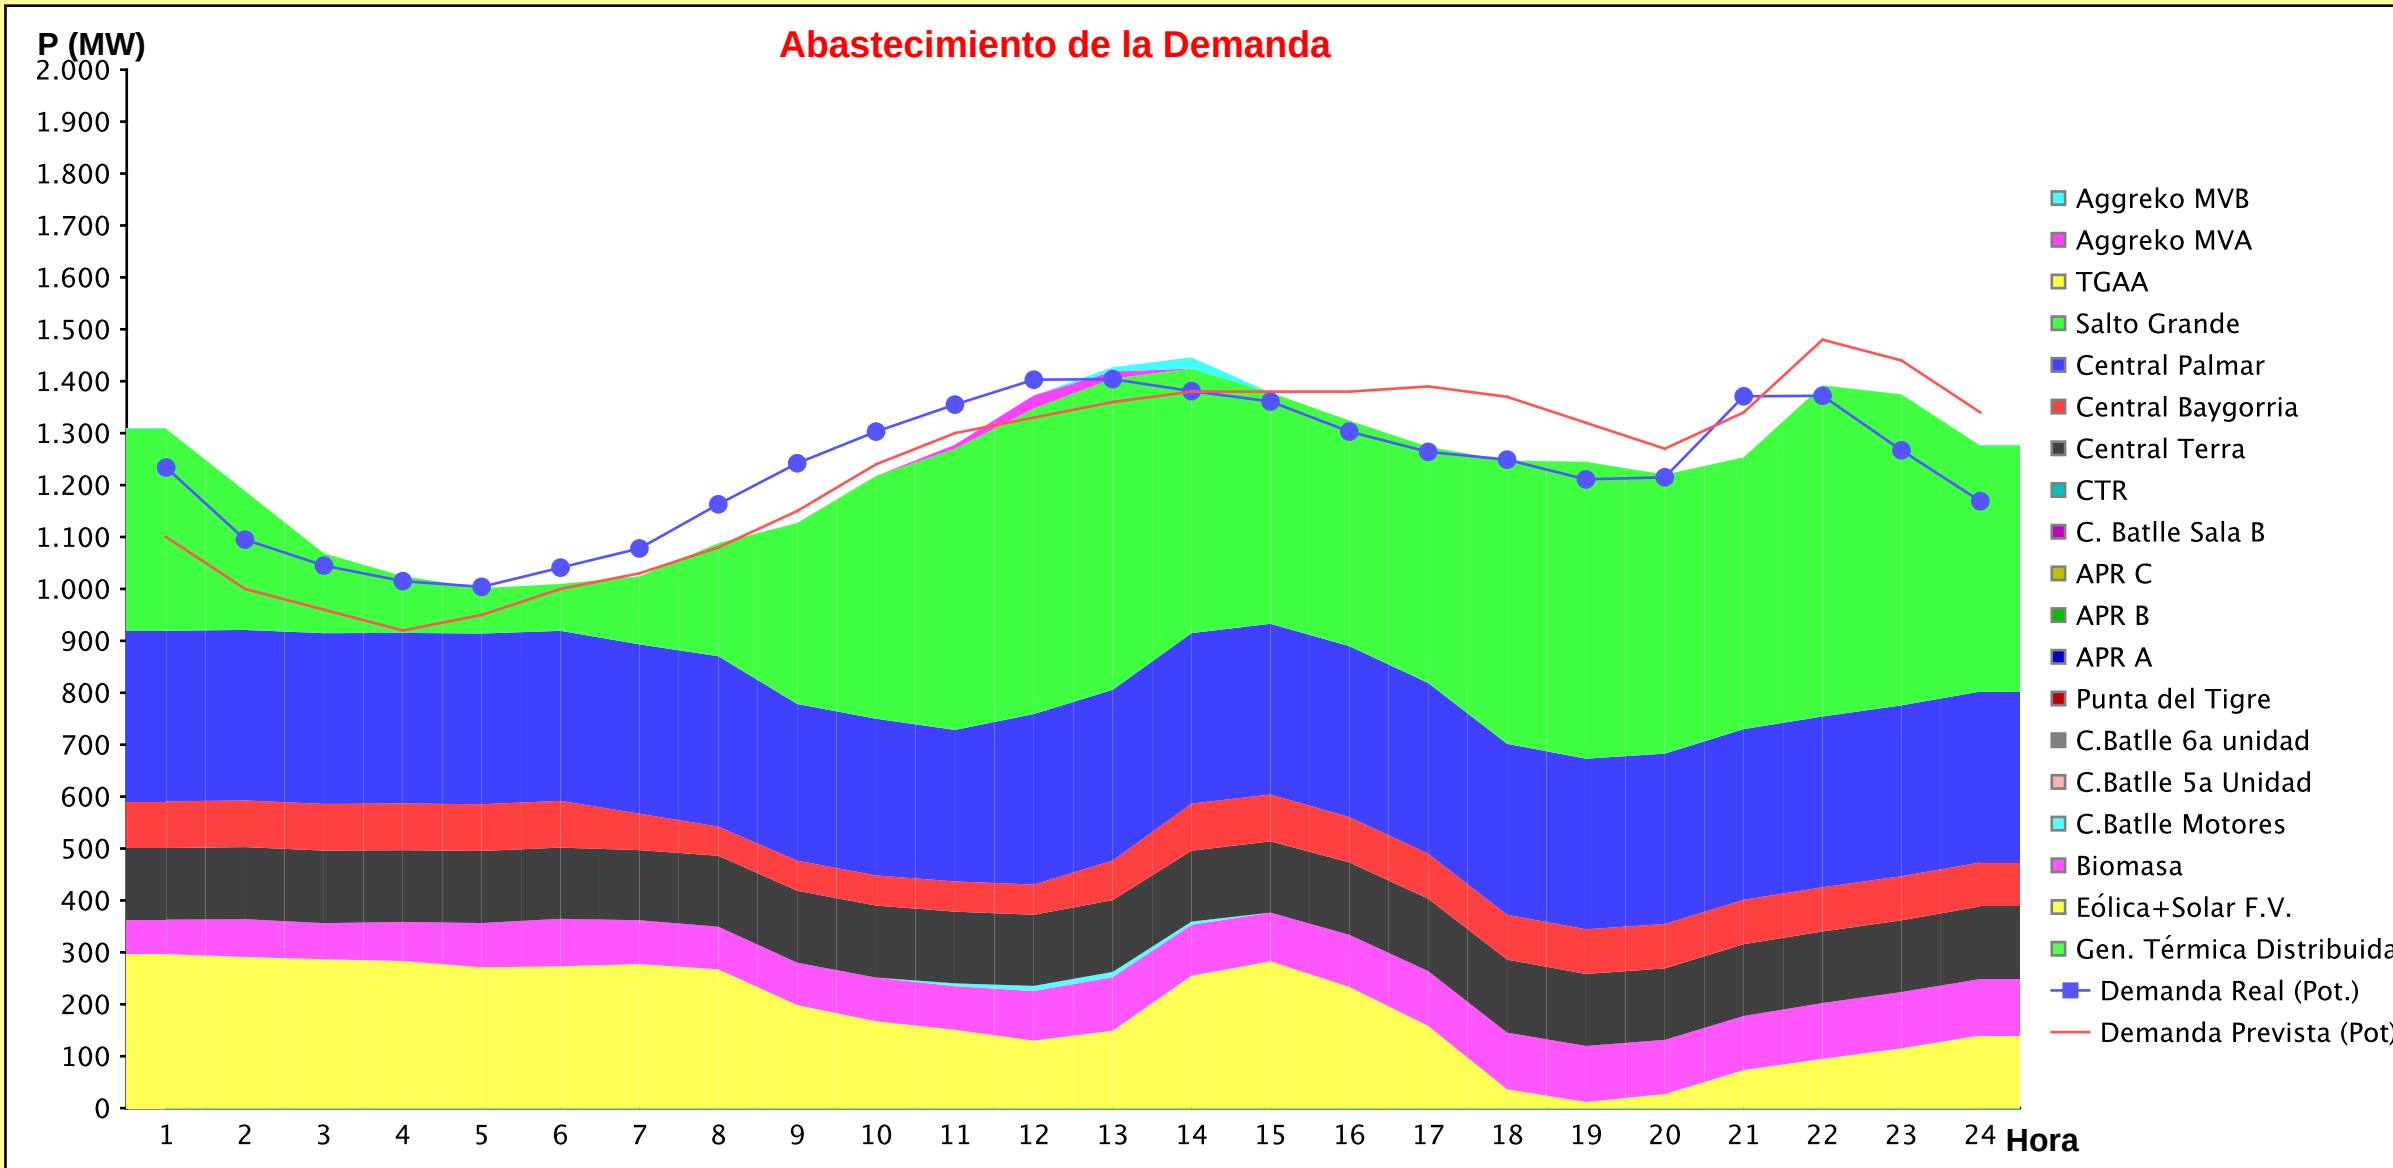



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1417,27 Hora 13:25
Potencia mínima:	982,08 Hora 04:50
Pico noche:	1410,25 Hora 21:28

Generación Media (MW)	
Eólica	186,8
Biomasa	92,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

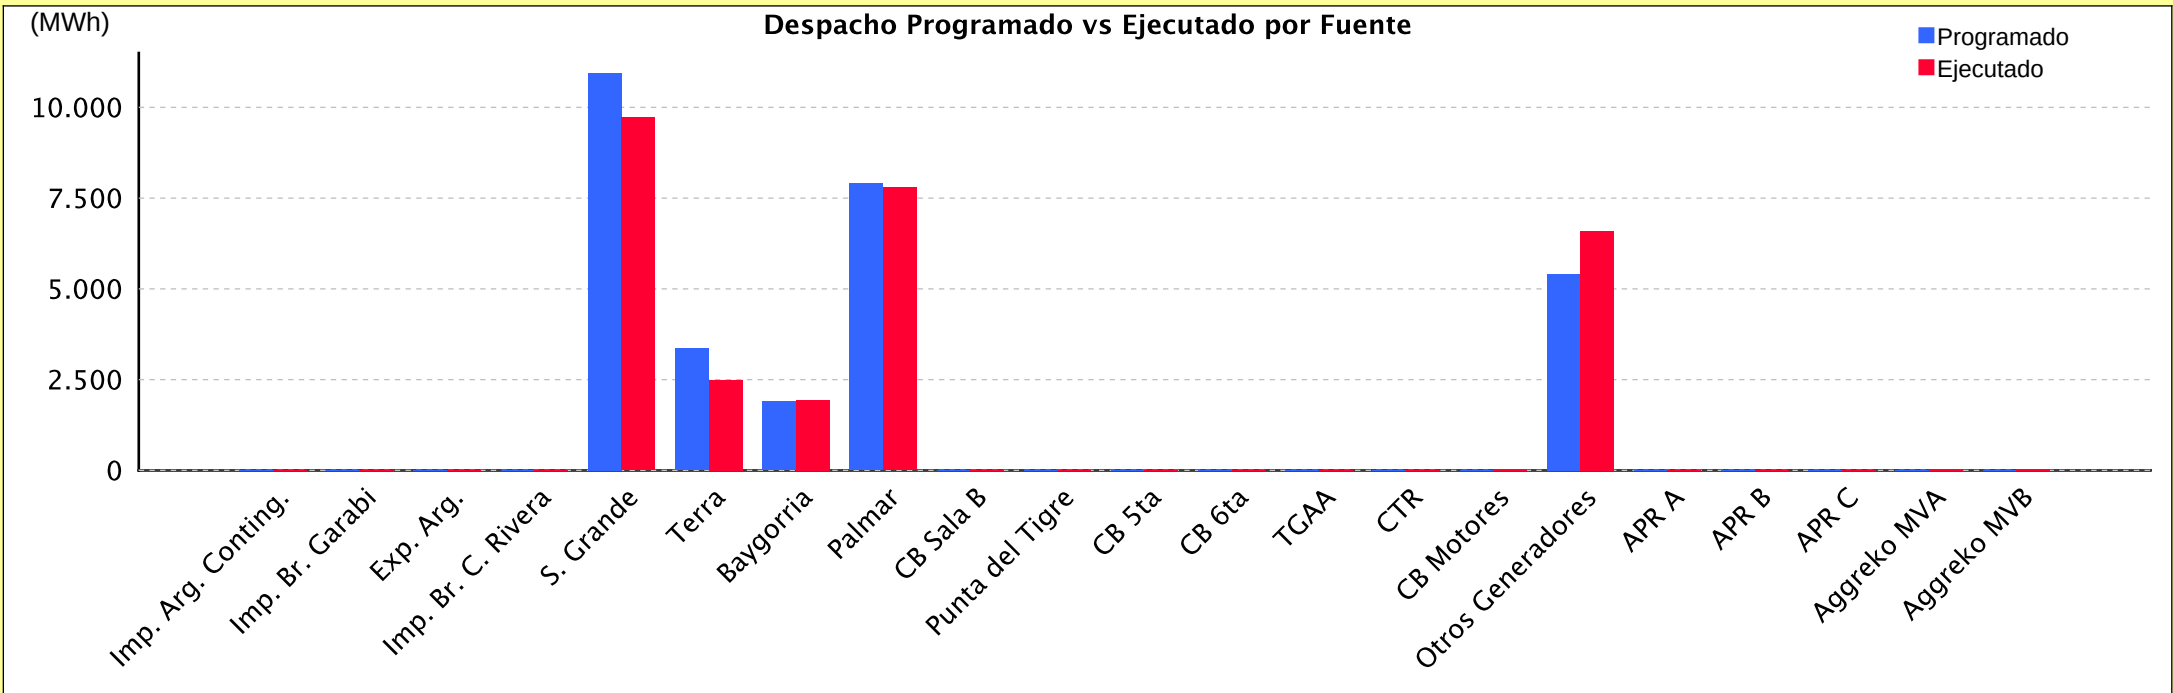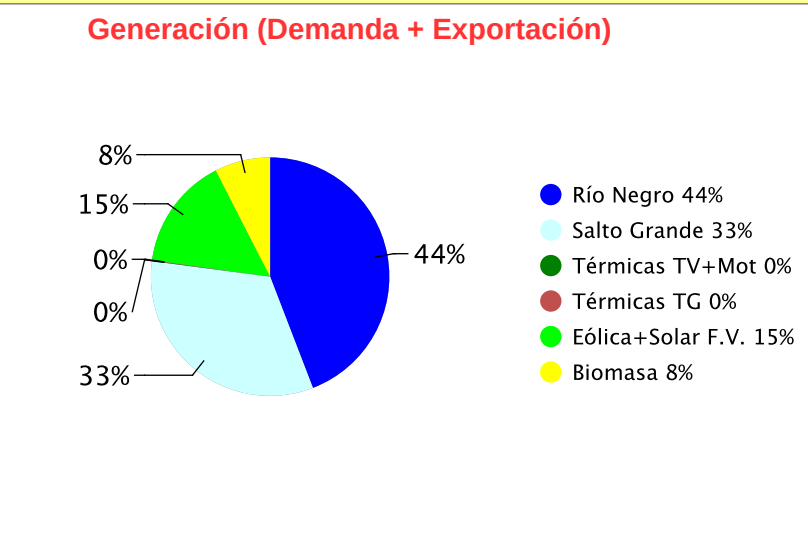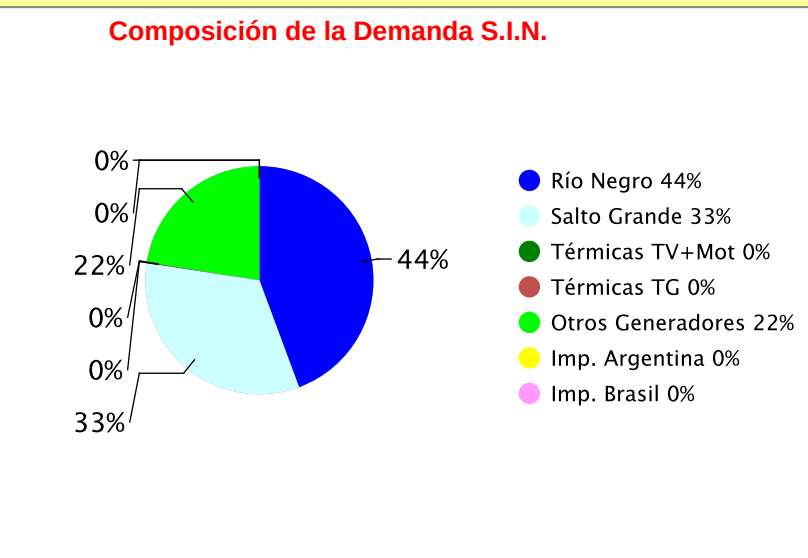



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

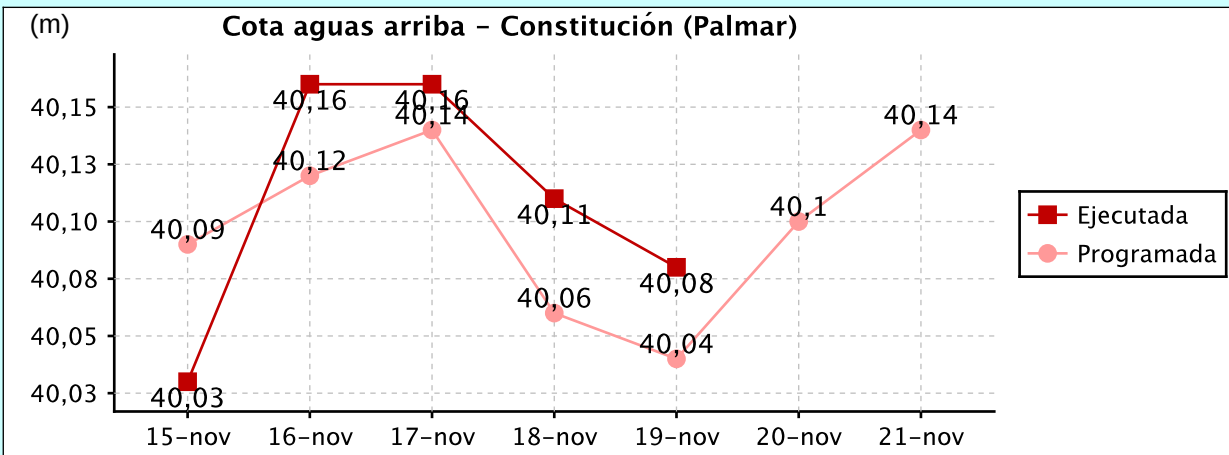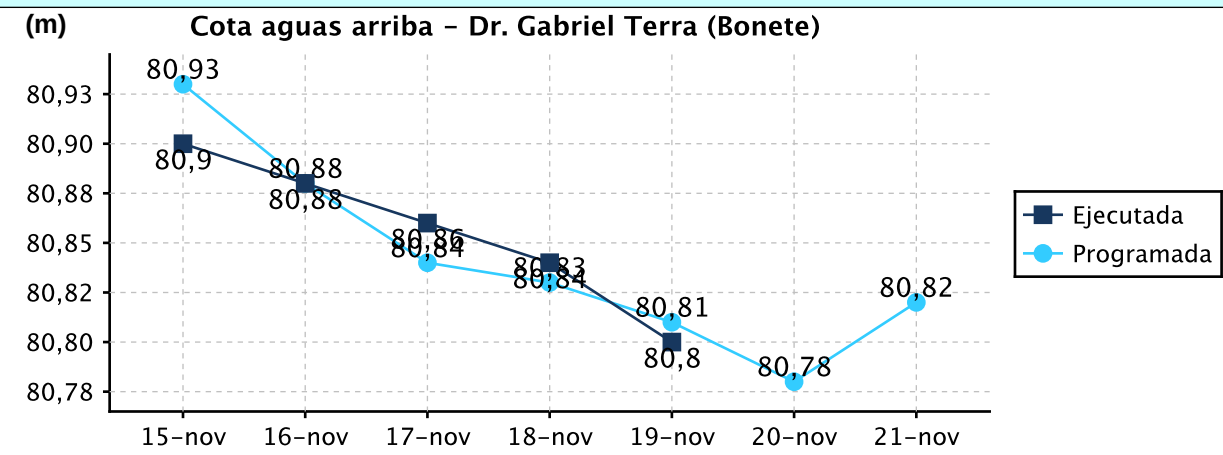


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,81	80,8
Baygorria	54,20	54,1
Palmar	40,04	40,08
SGU	36,00	35,98

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

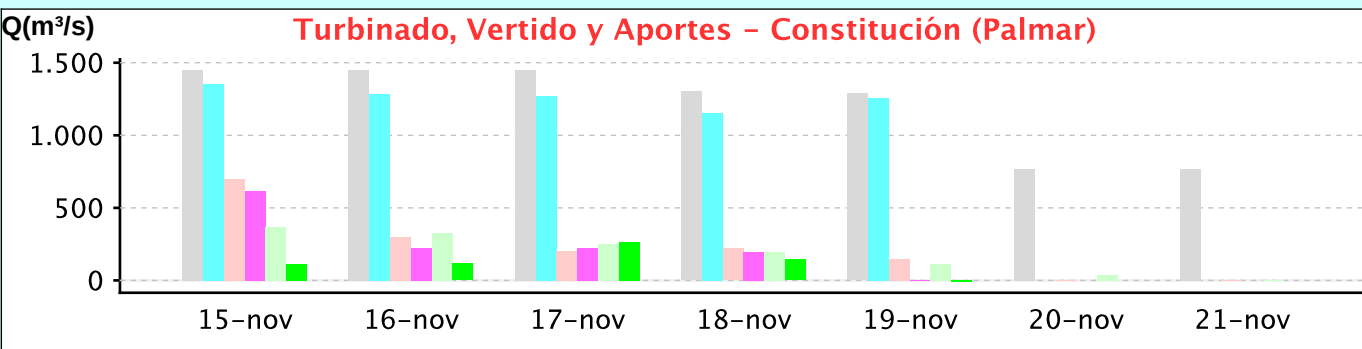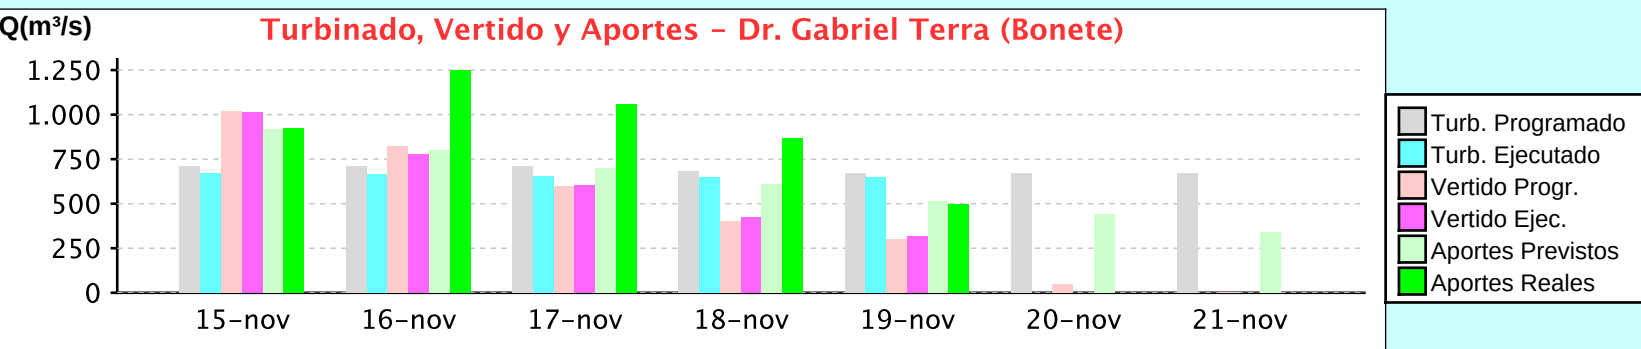

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

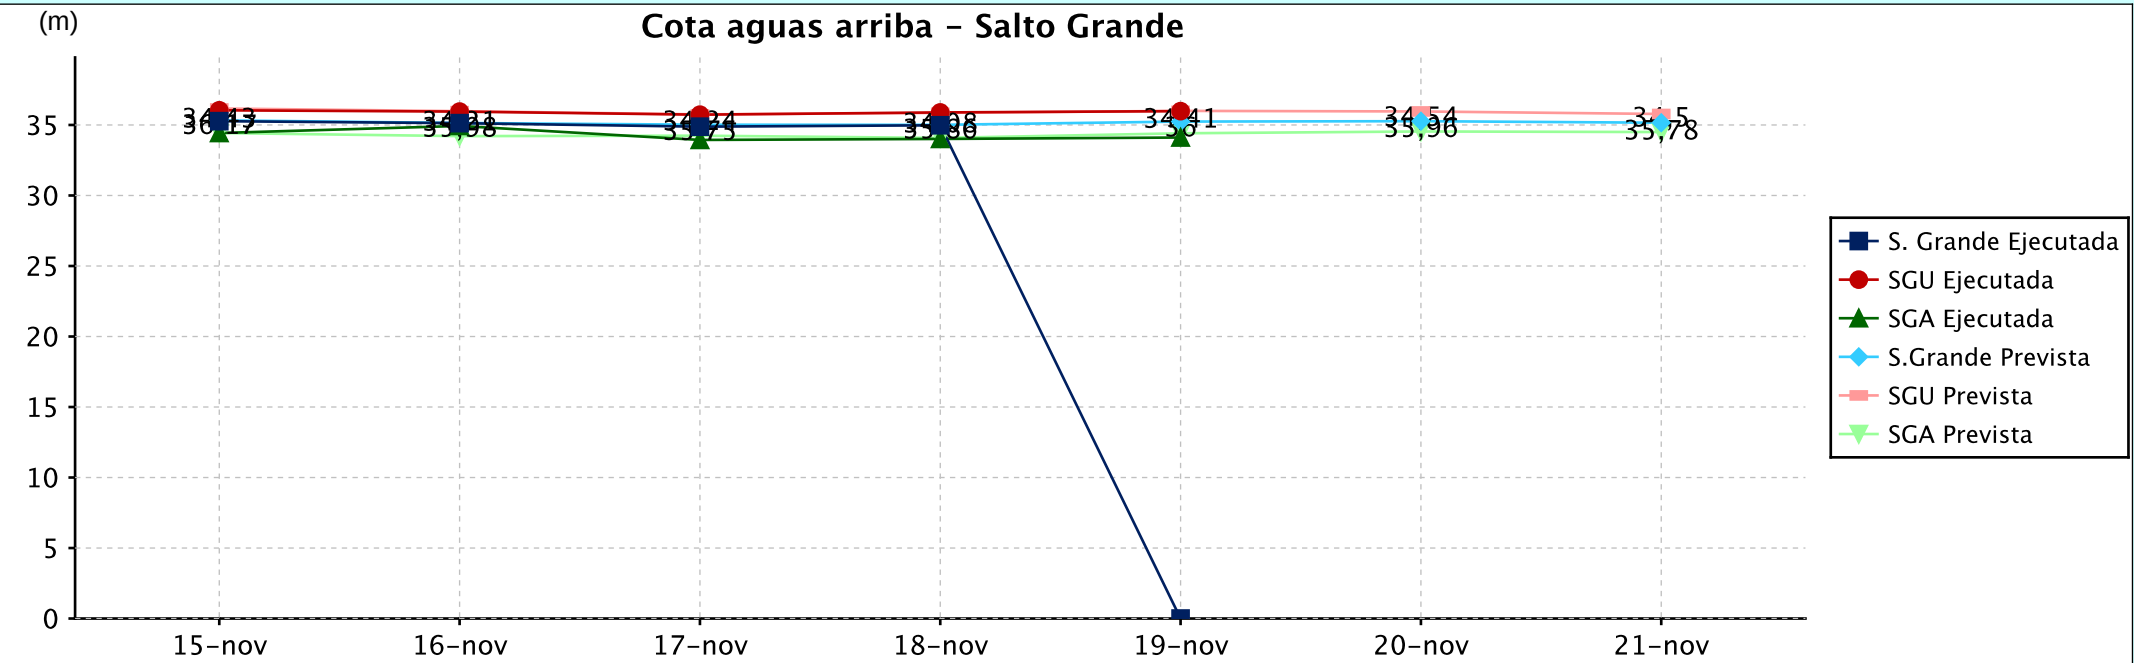


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	649
Baygorria	727	714
Palmar	1.288	1.258
SGU	2.033	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	513	498
Baygorria	0	111
Palmar	113	-12
SGU	2.250	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	300	319
Baygorria	150	482
Palmar	150	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

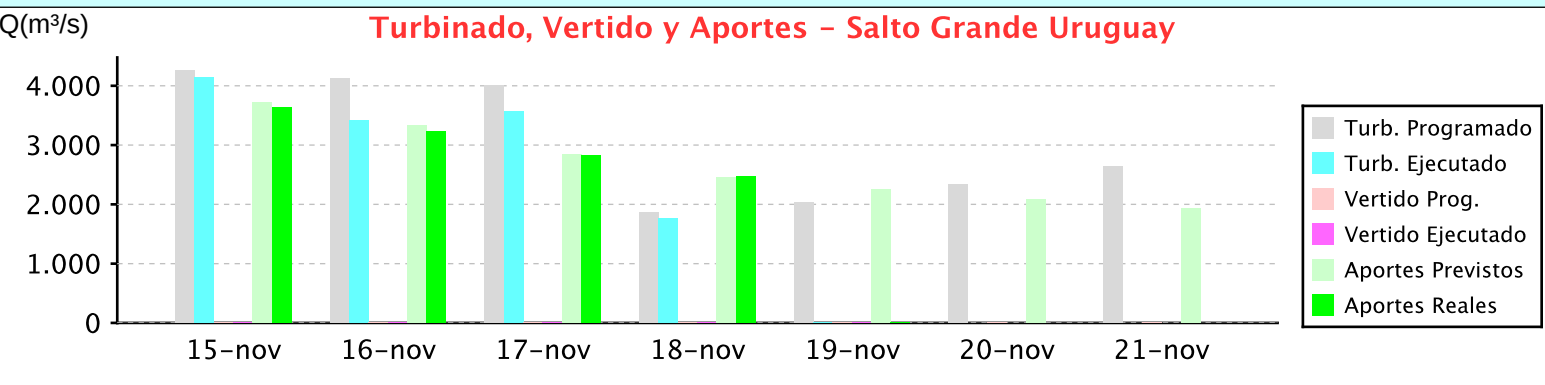

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,98
Cota Vista Arg	34,11
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	43.928

OBSERVACIONES
