



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 20 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.102
C. Baygorria	1.825
C. Palmar	5.397
C. Salto Grande	12.639
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.079
TOTAL Generación	27.976

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.976
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.730
Diferencia (MWh)	246
Ejecutada - Programada	0,89 %

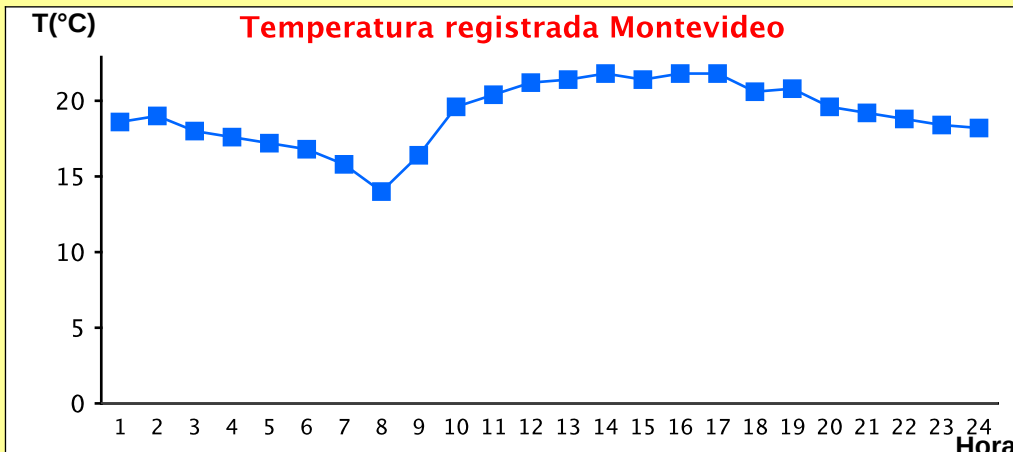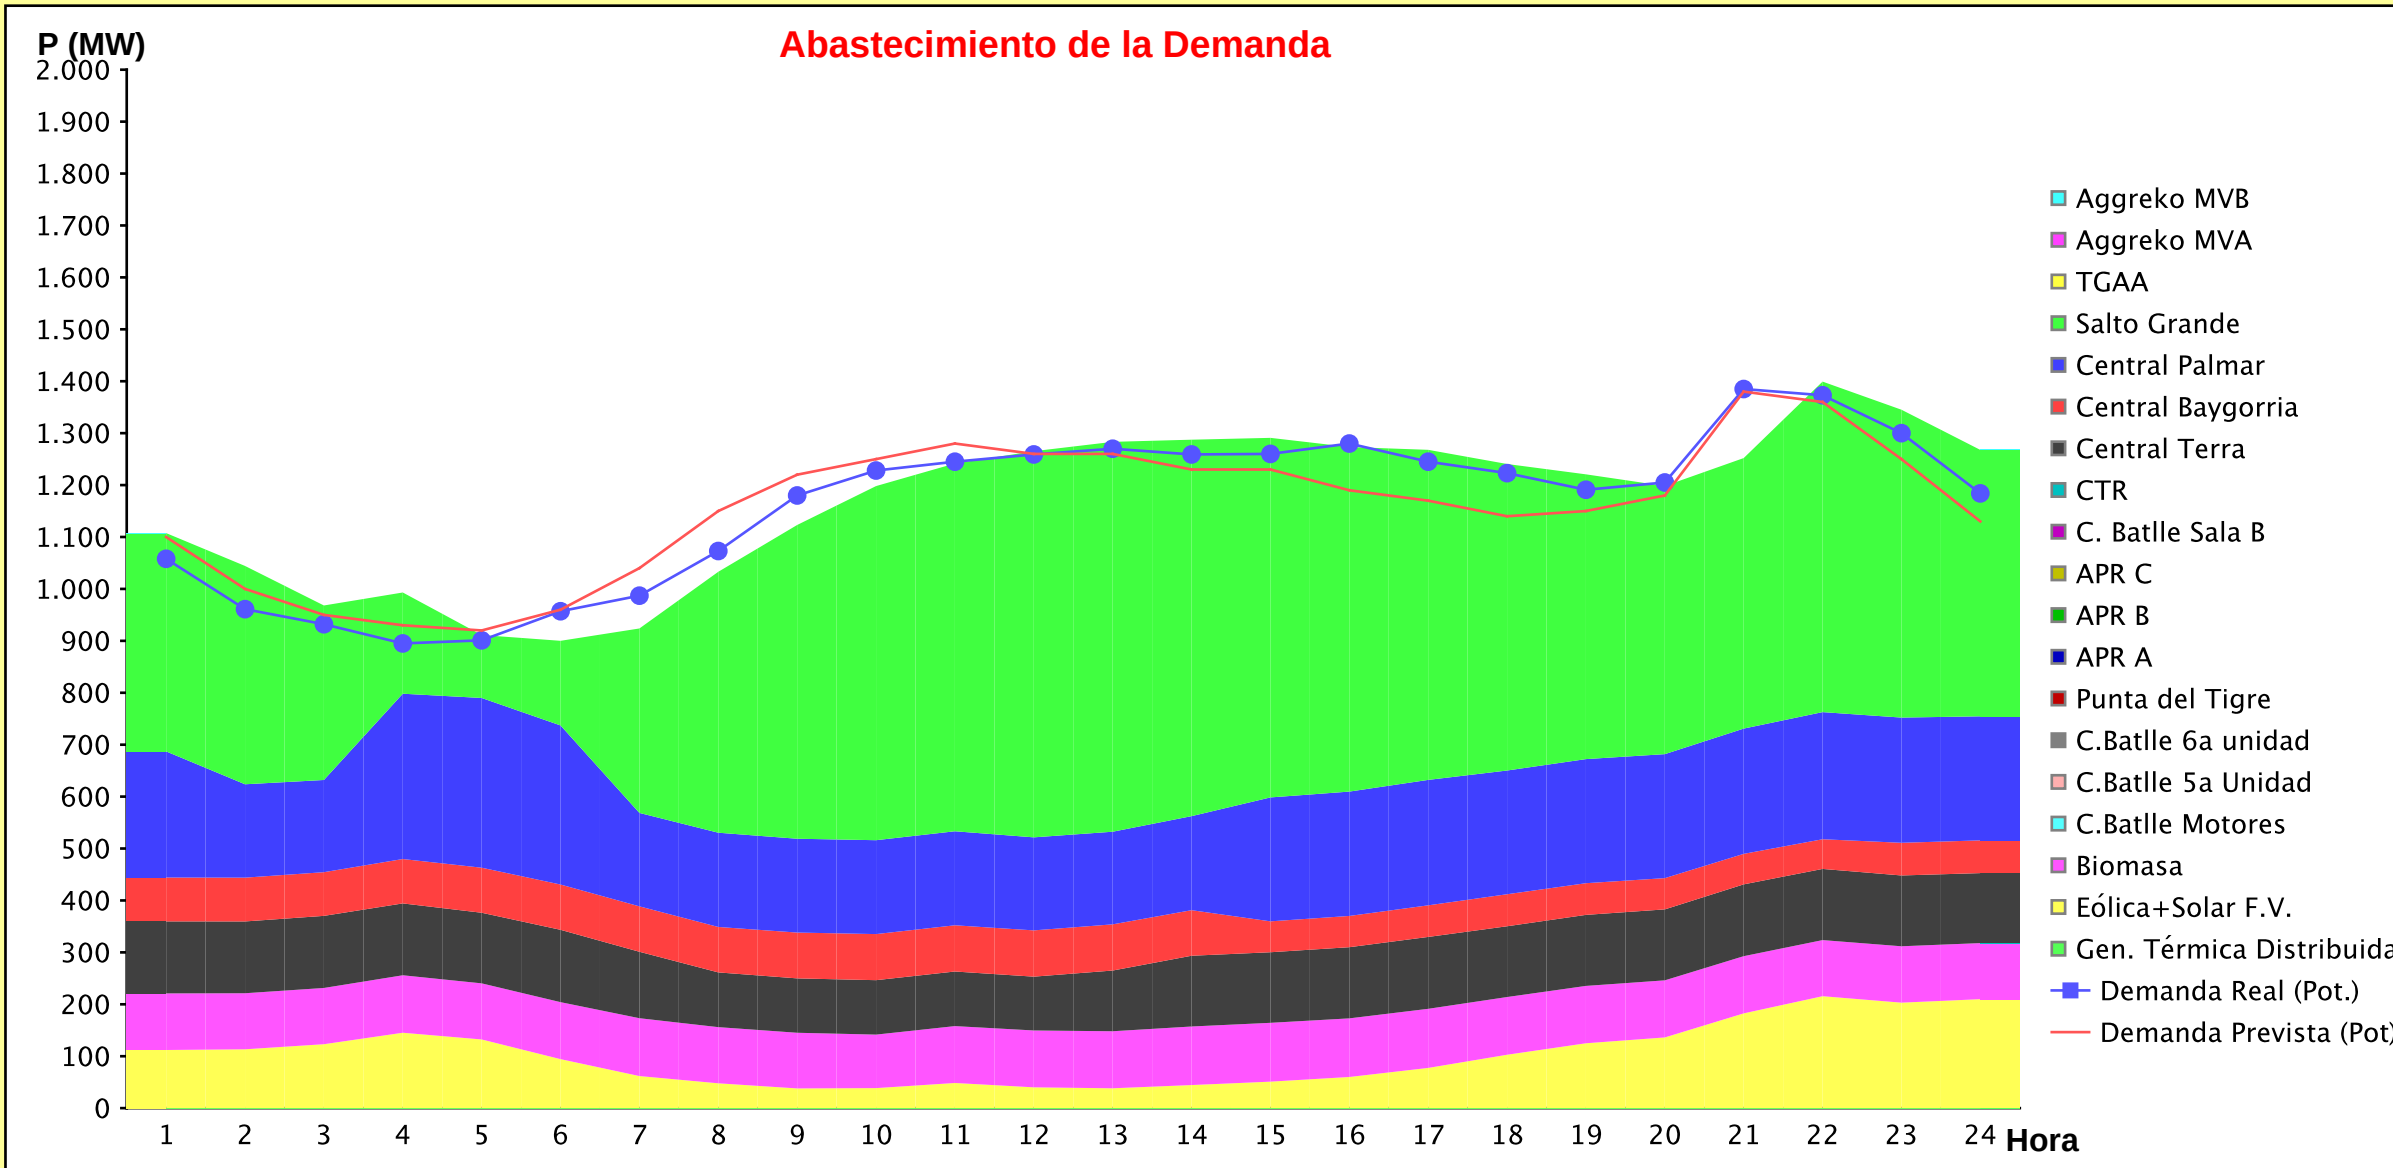


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1294,74 Hora 13:31
Potencia mínima:	888,21 Hora 03:58
Pico noche:	1421,98 Hora 21:34

Generación Media (MW)	
Eólica	102,7
Biomasa	109,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

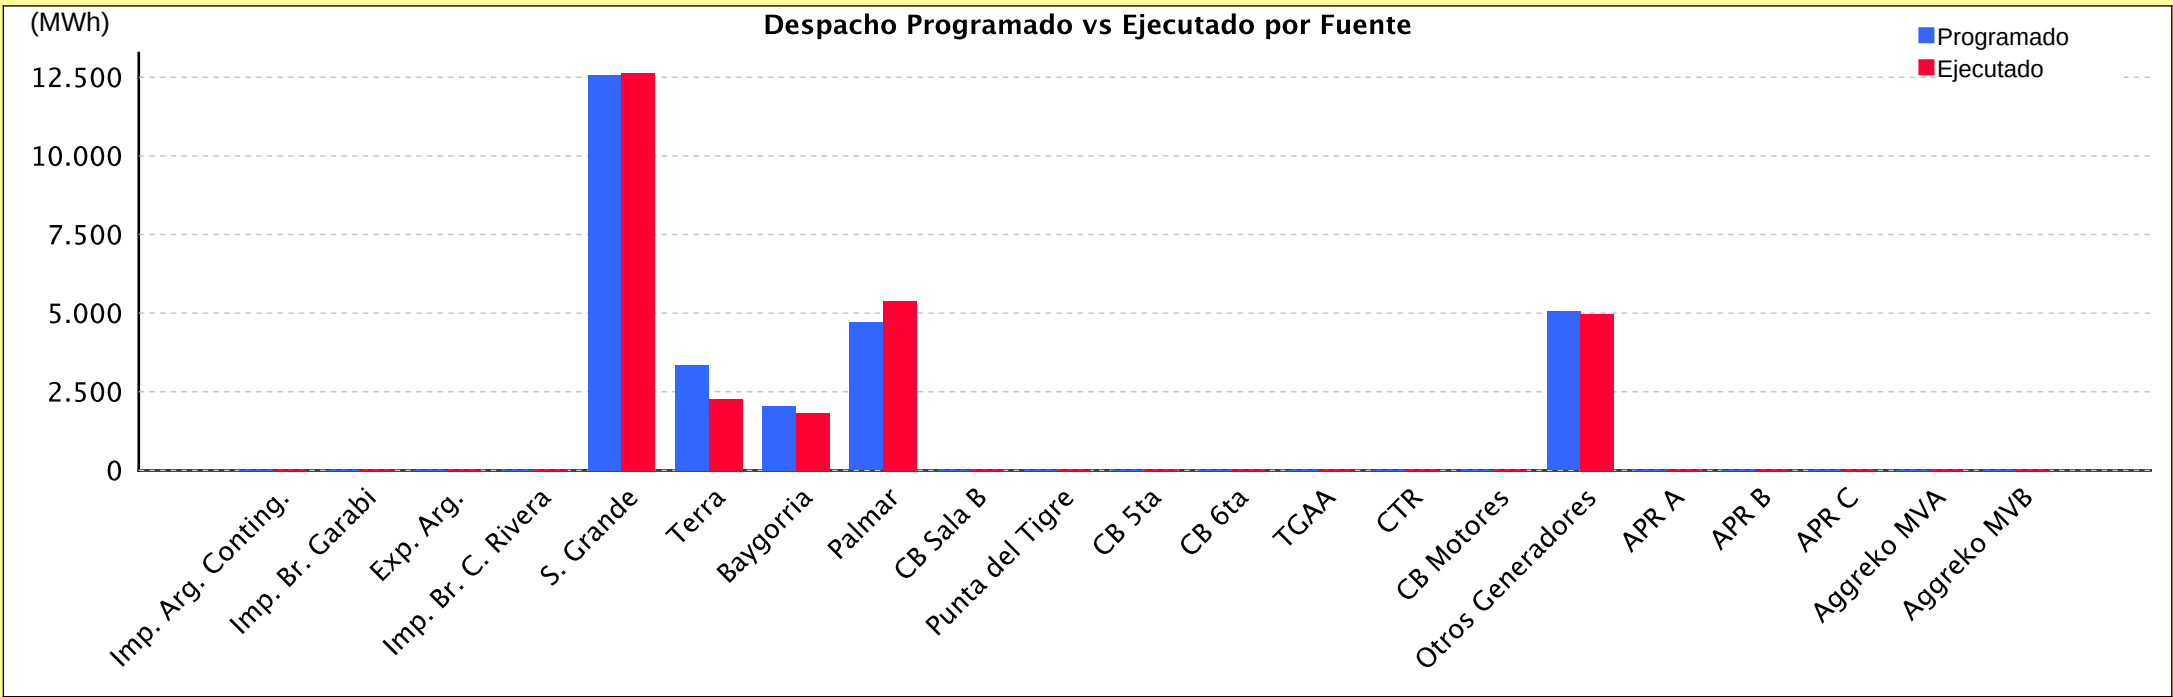
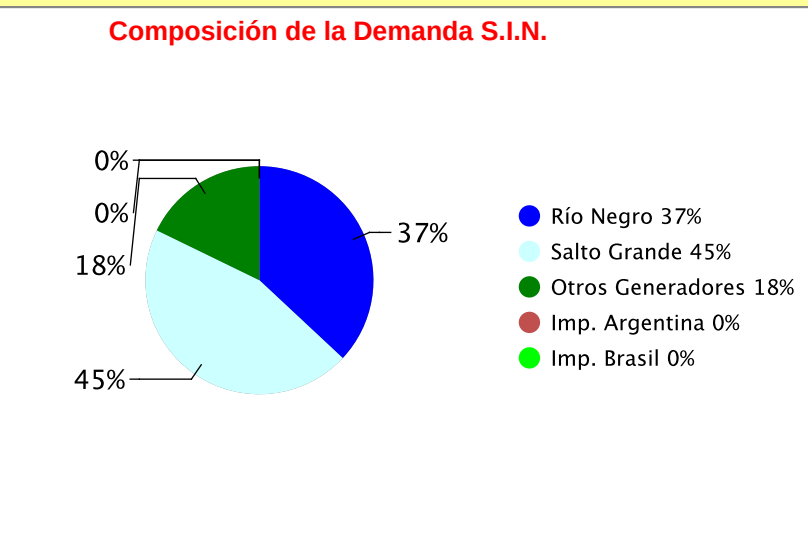


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

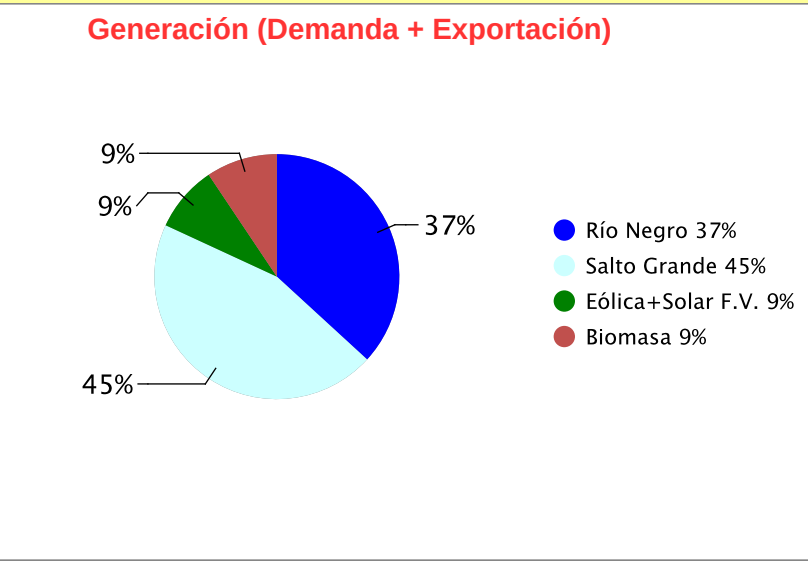



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

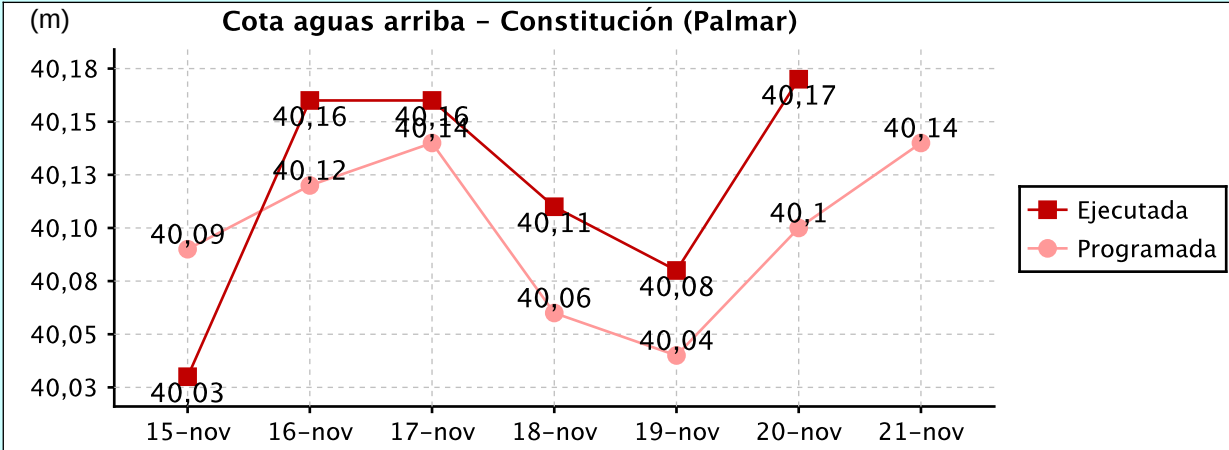
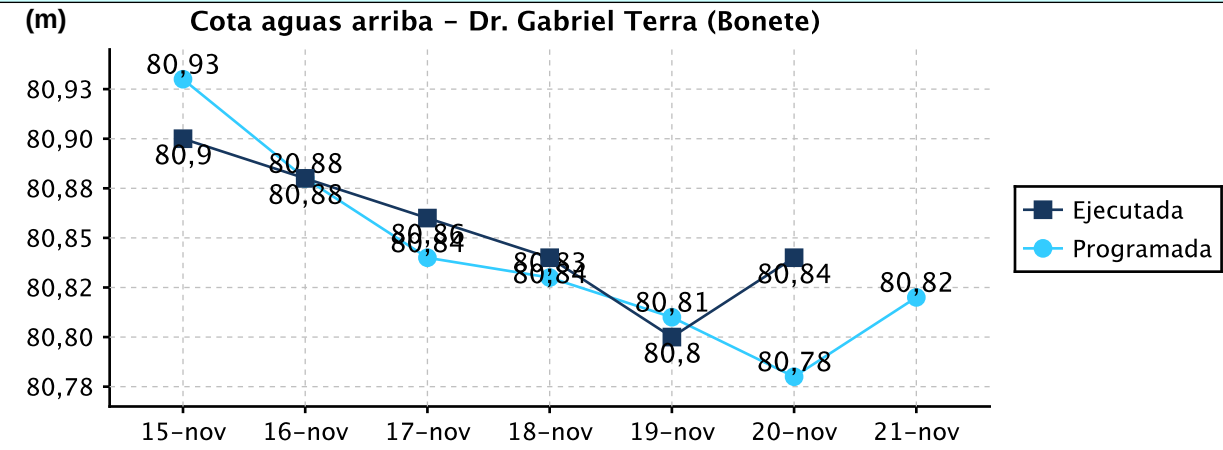


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,78	80,84
Baygorria	54,02	53,99
Palmar	40,10	40,17
SGU	35,96	35,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

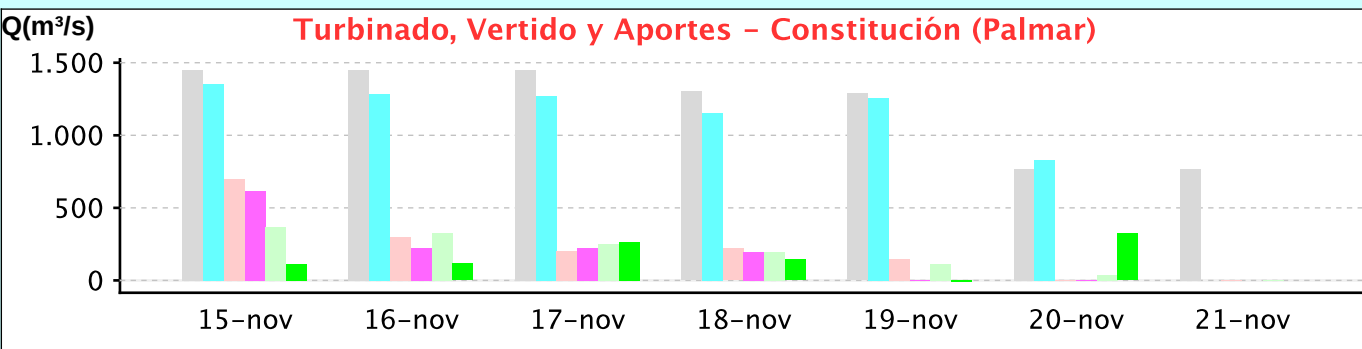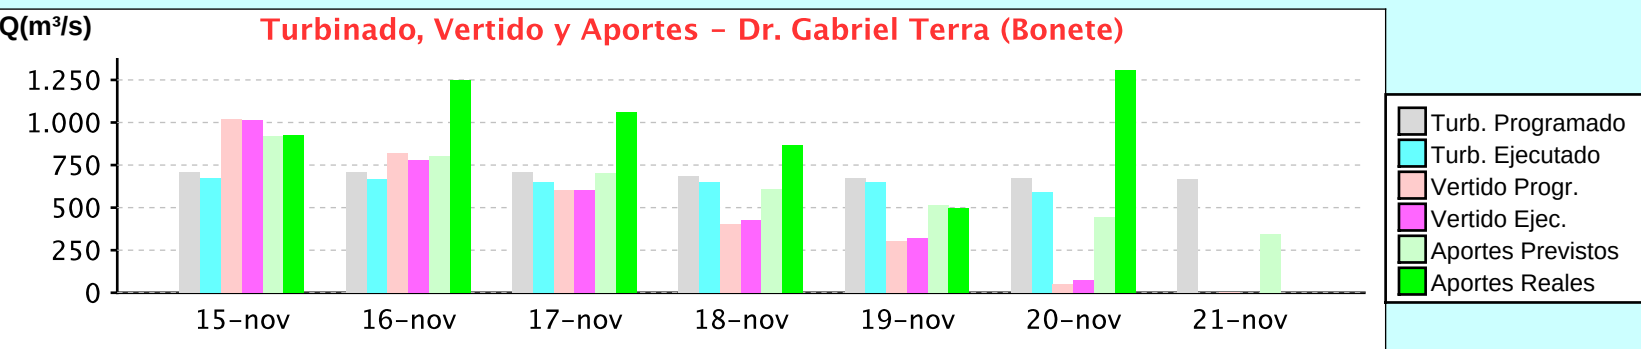

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

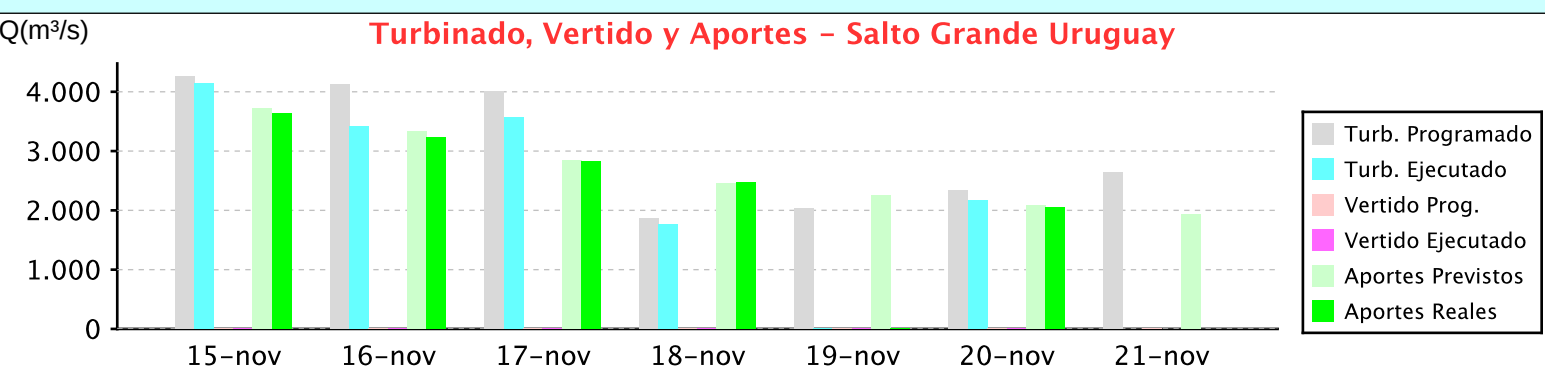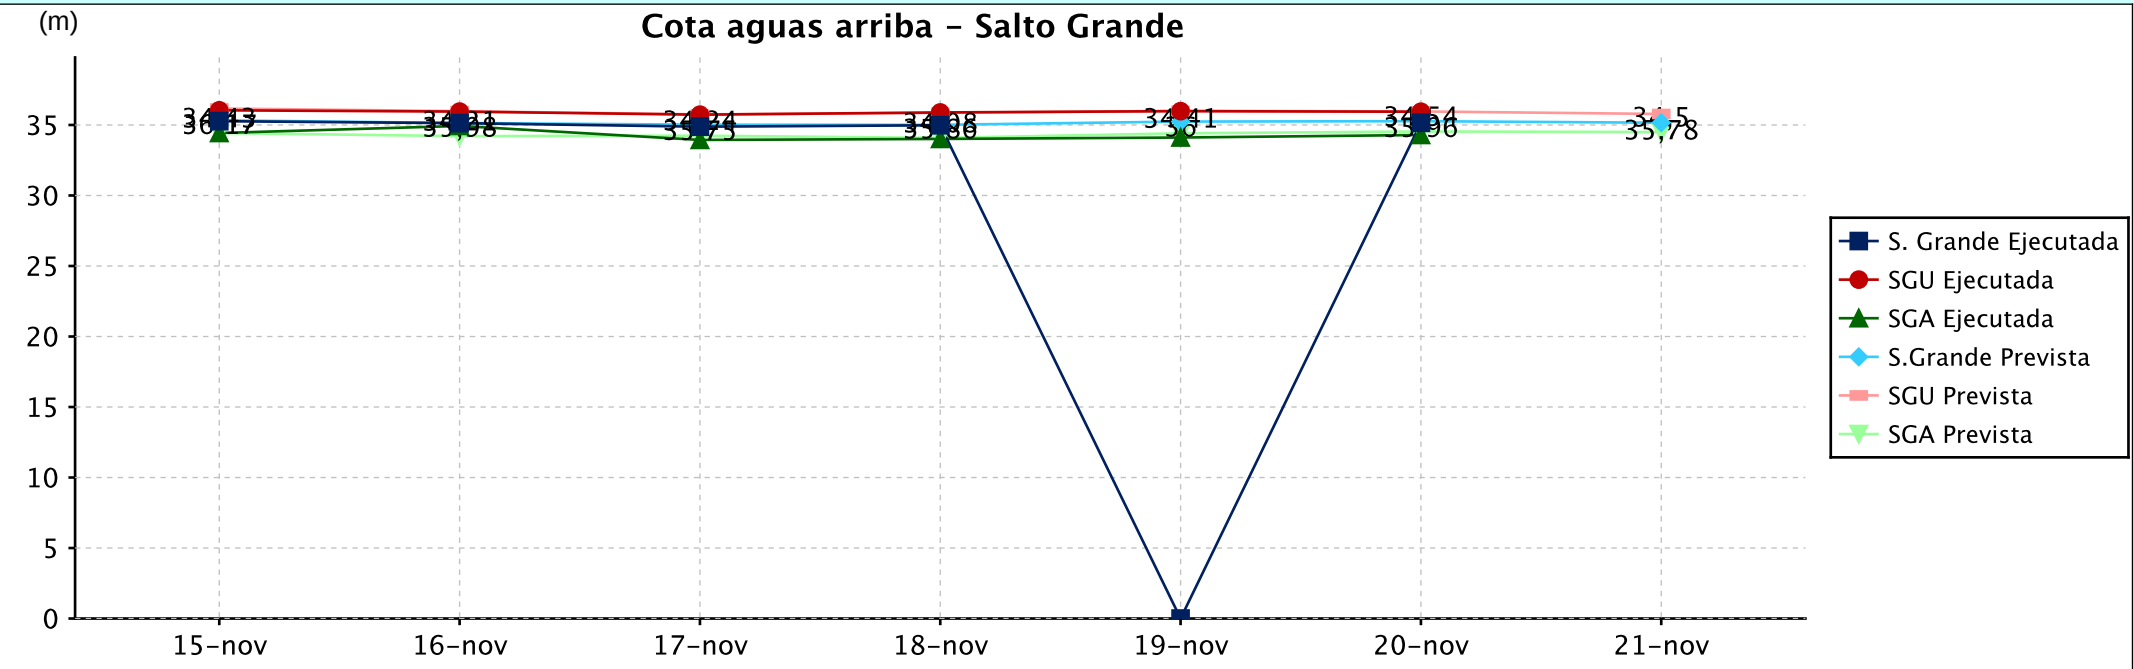

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,94
Cota Vista Arg	34,29
Cota real	35,15

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	39.102
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	590
Baygorria	781	669
Palmar	766	833
SGU	2.335	2.164

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	443	1.306
Baygorria	0	48
Palmar	37	323
SGU	2.075	2.052

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	50	76
Baygorria	0	172
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
