




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


domingo 23 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	358
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	362
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	164
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.394
C. Baygorria	2.114
C. Palmar	7.234
C. Salto Grande	12.675
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.436
TOTAL Generación	32.321


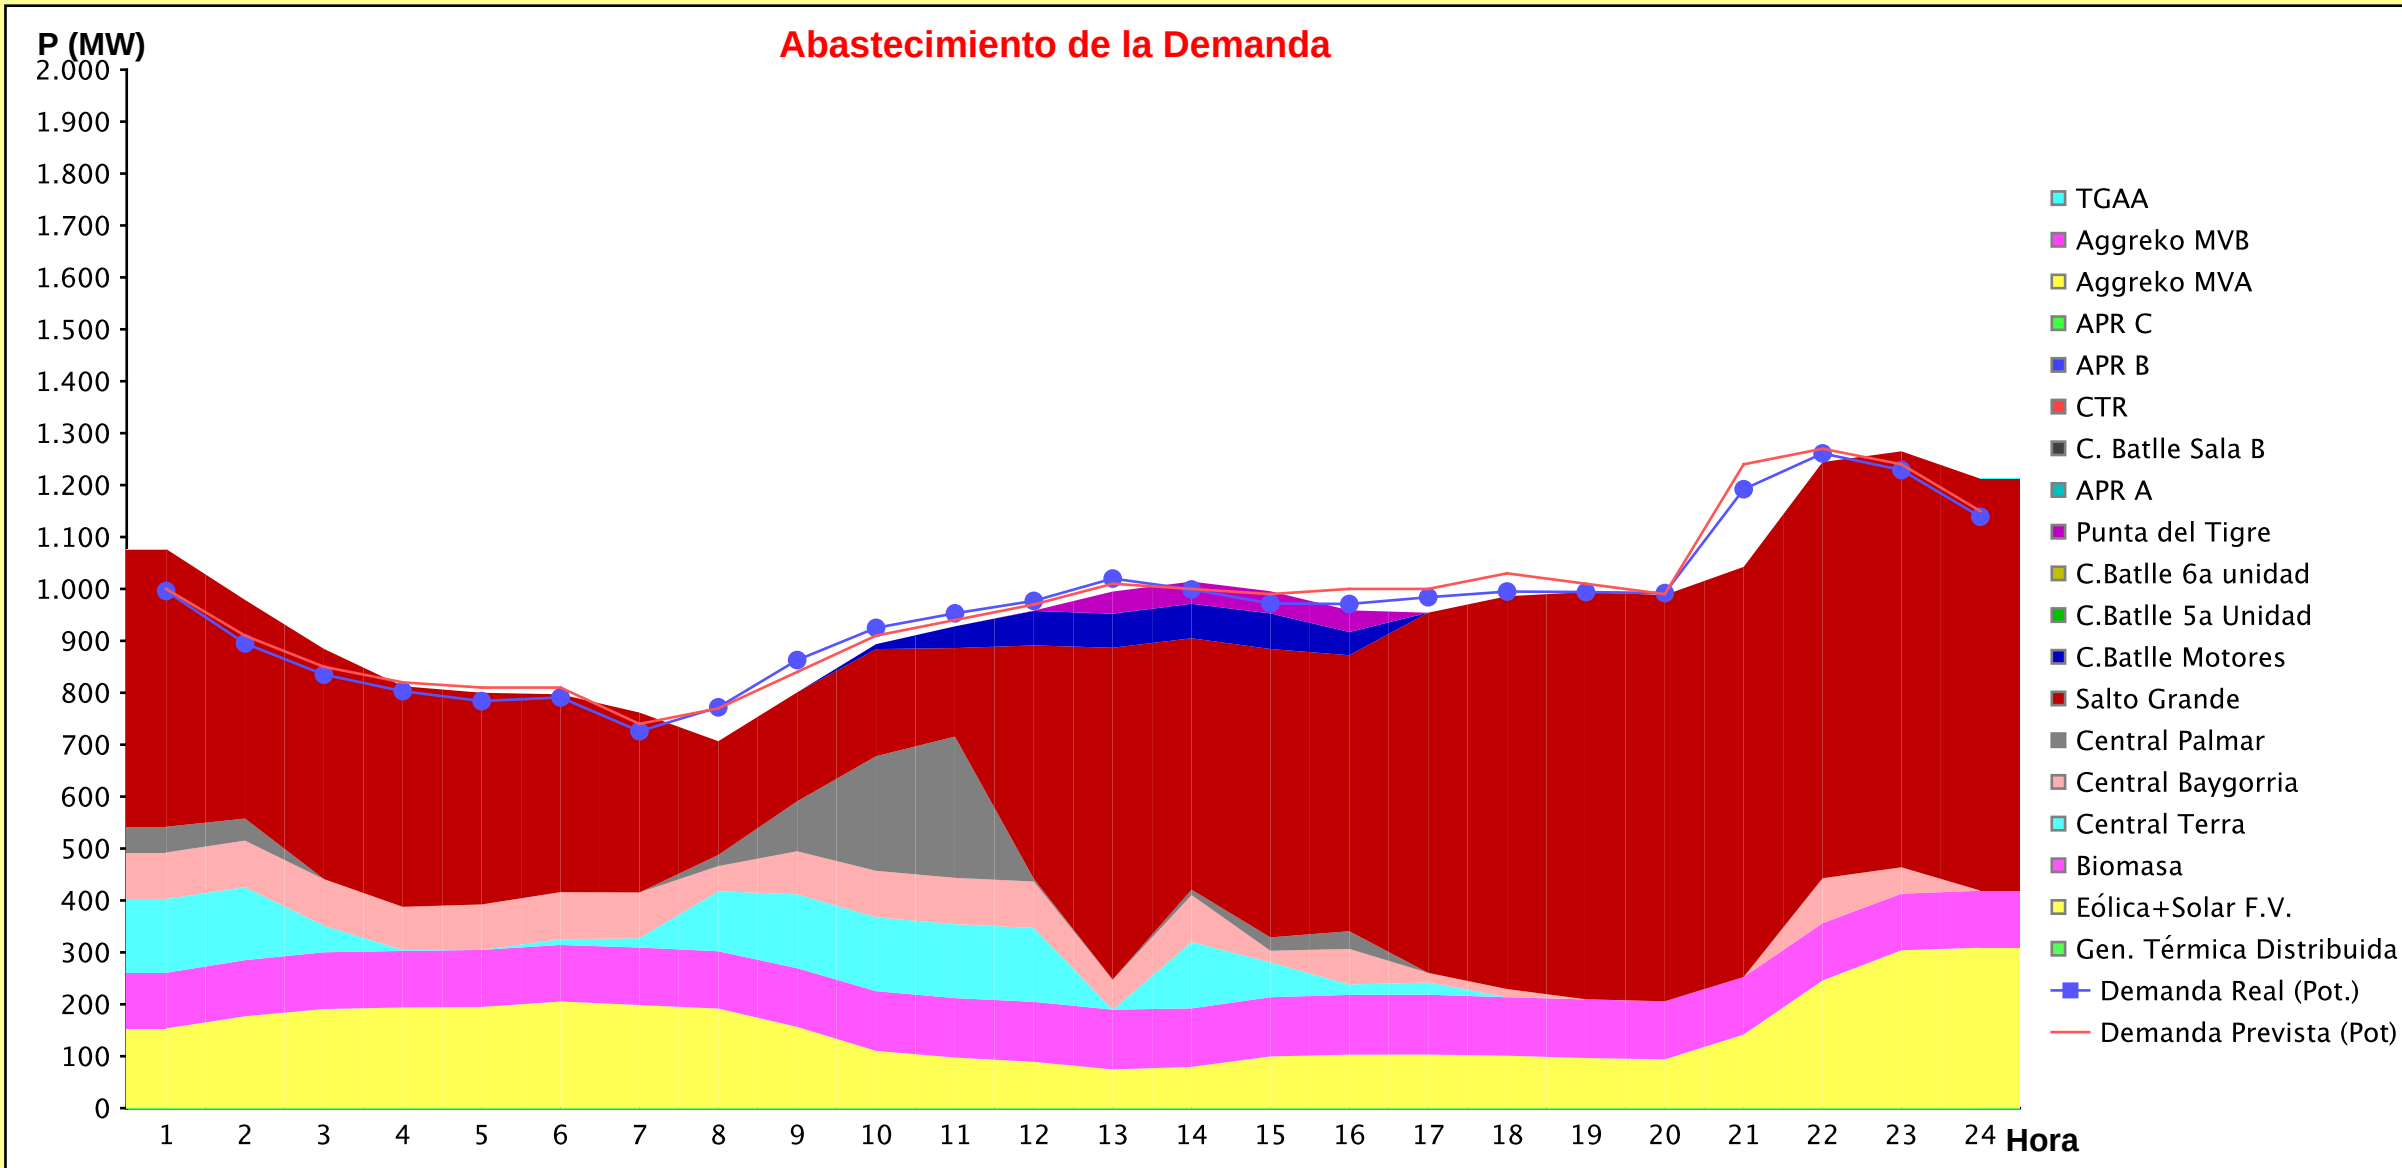


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.300
Hidráulica	9.300
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.300

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.021
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	23.300
Diferencia (MWh)	-279
Ejecutada - Programada	-1,20 %


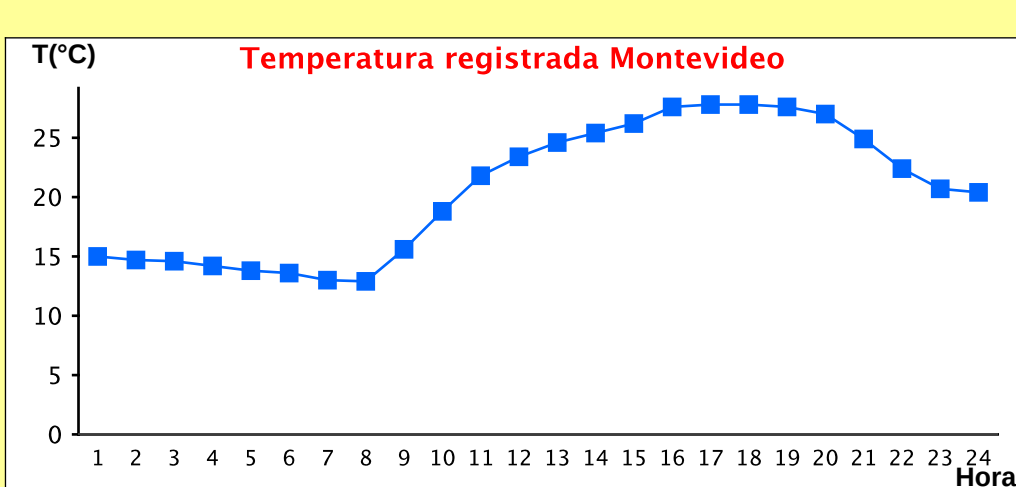


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1016,42 Hora 13:23
Potencia mínima:	721,95 Hora 06:54
Pico noche:	1268,59 Hora 21:50
Generación Media (MW)	
Eólica	154,7
Biomasa	111,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

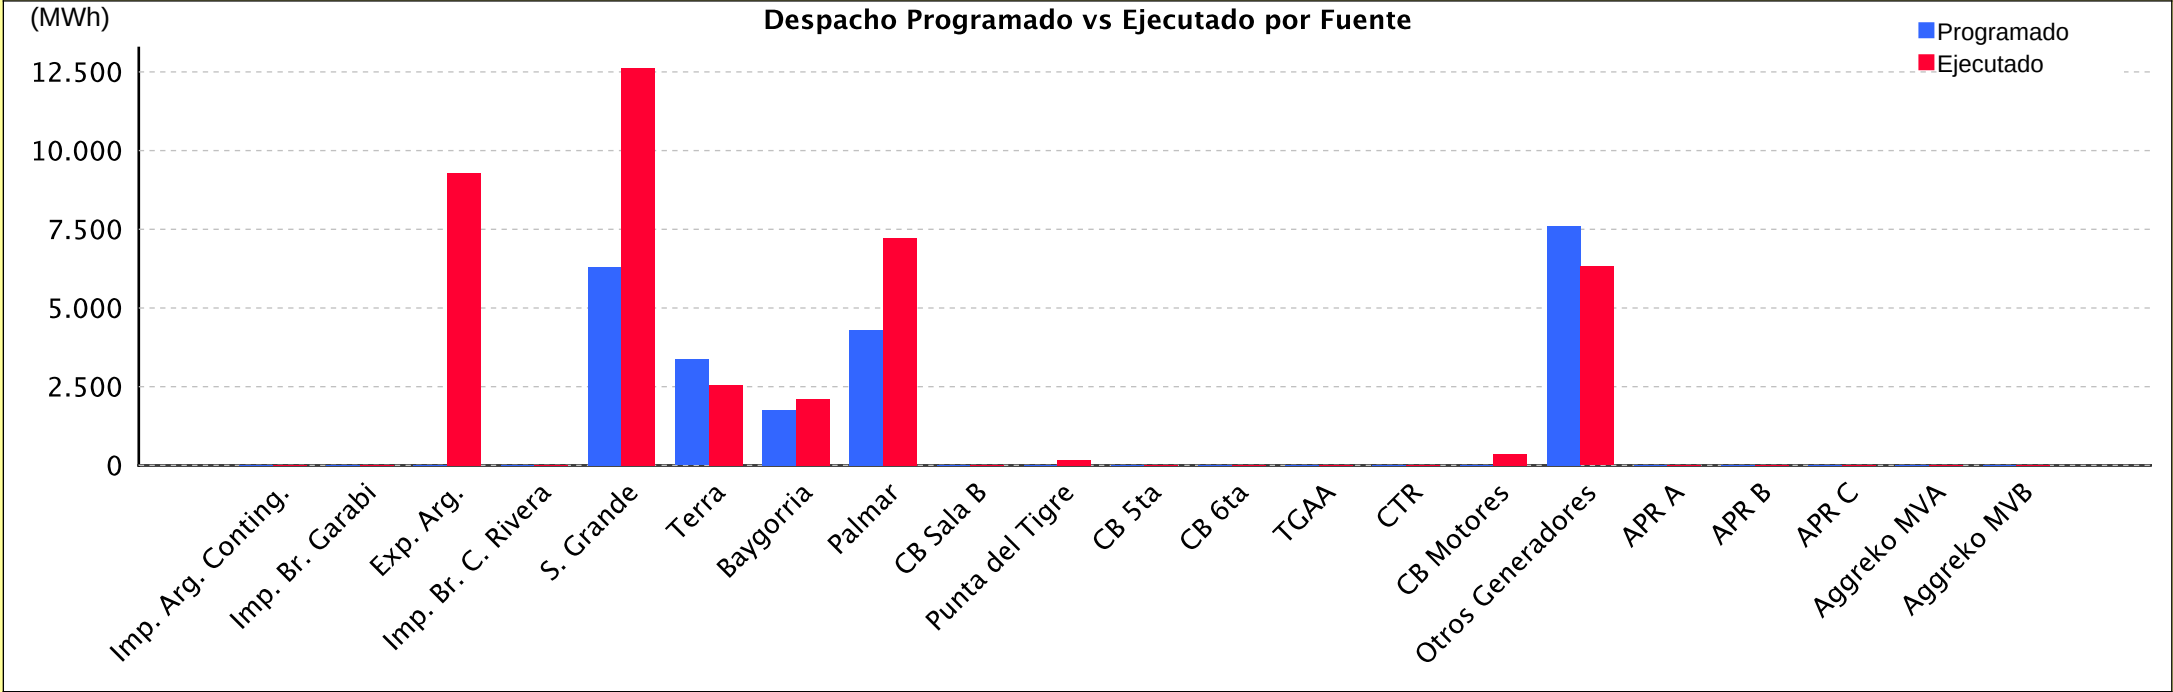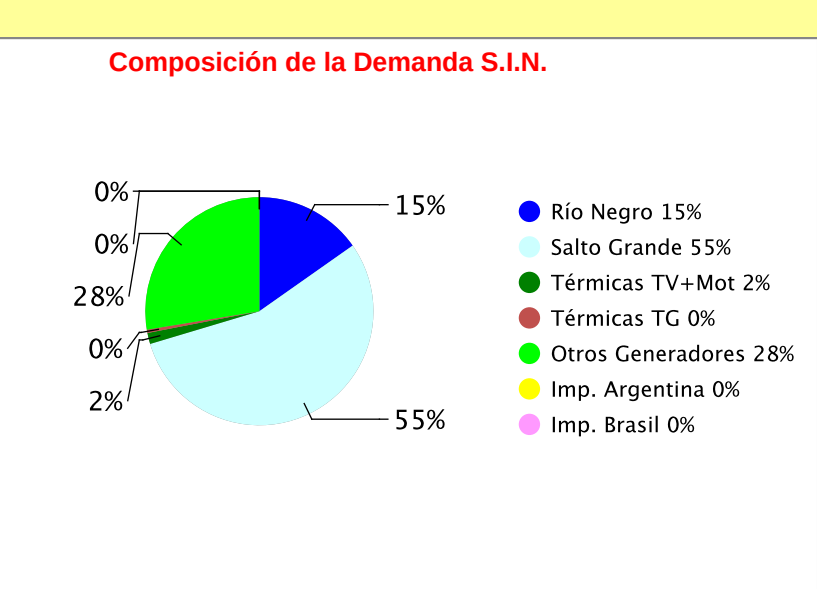



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

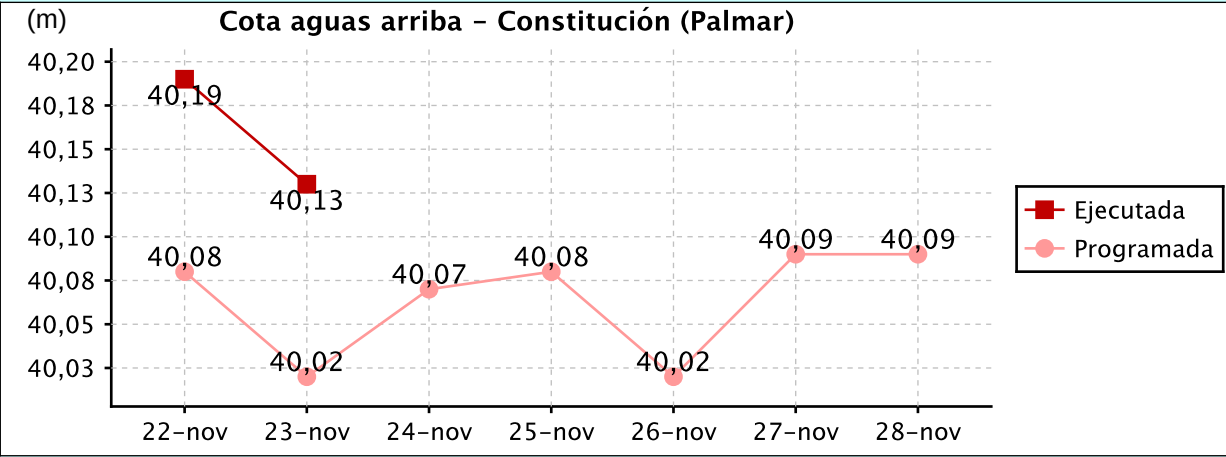
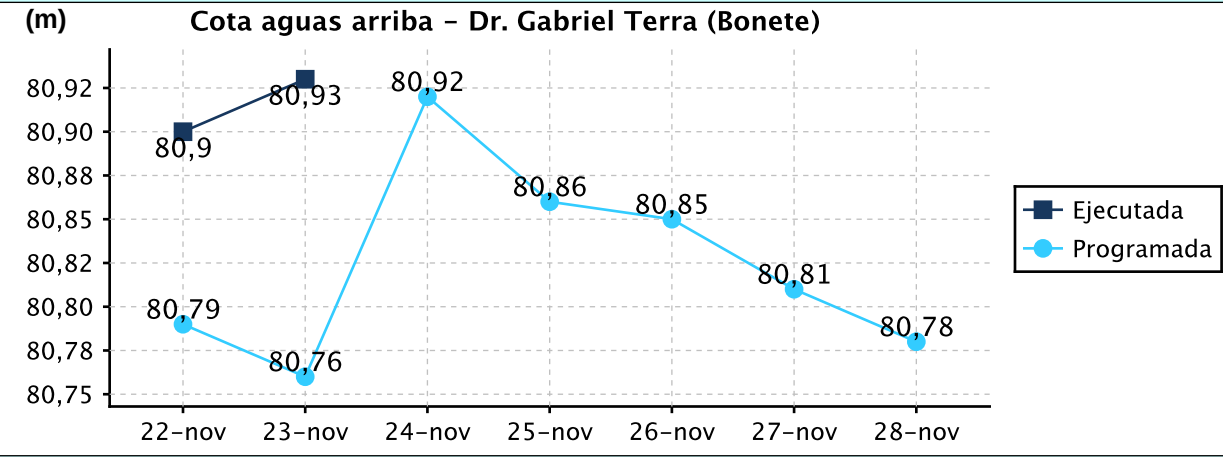


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,76	80,93
Baygorria	54,16	54,1
Palmar	40,02	40,13
SGU	35,67	35,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

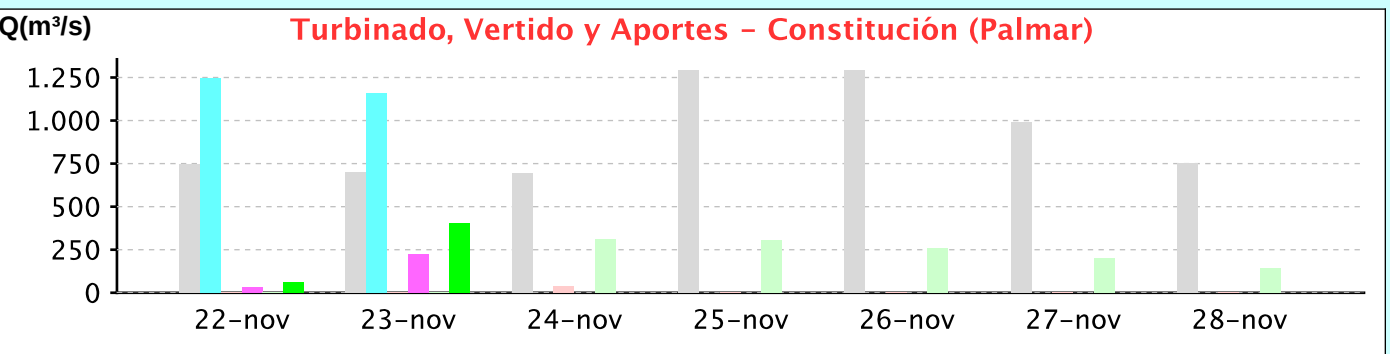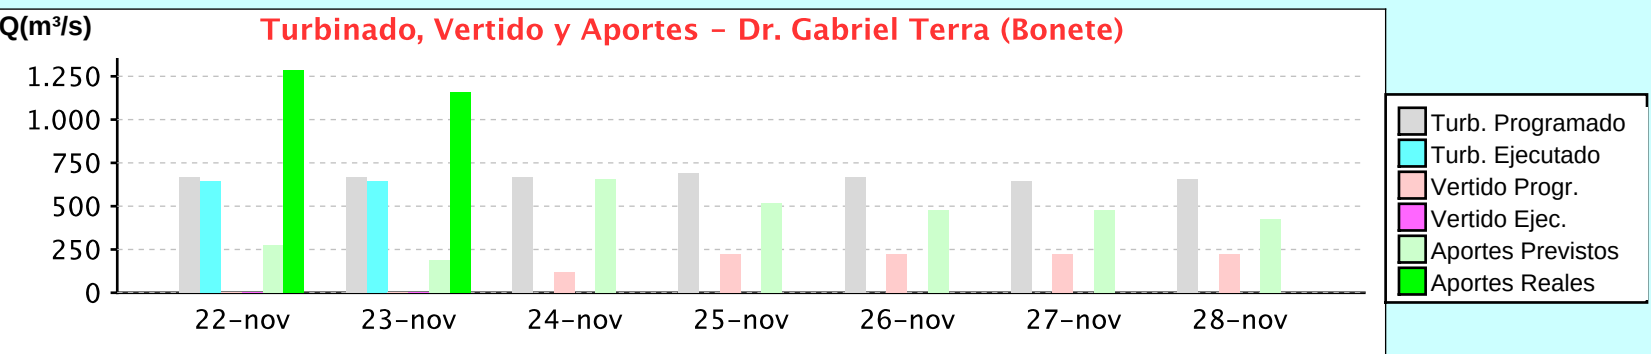

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

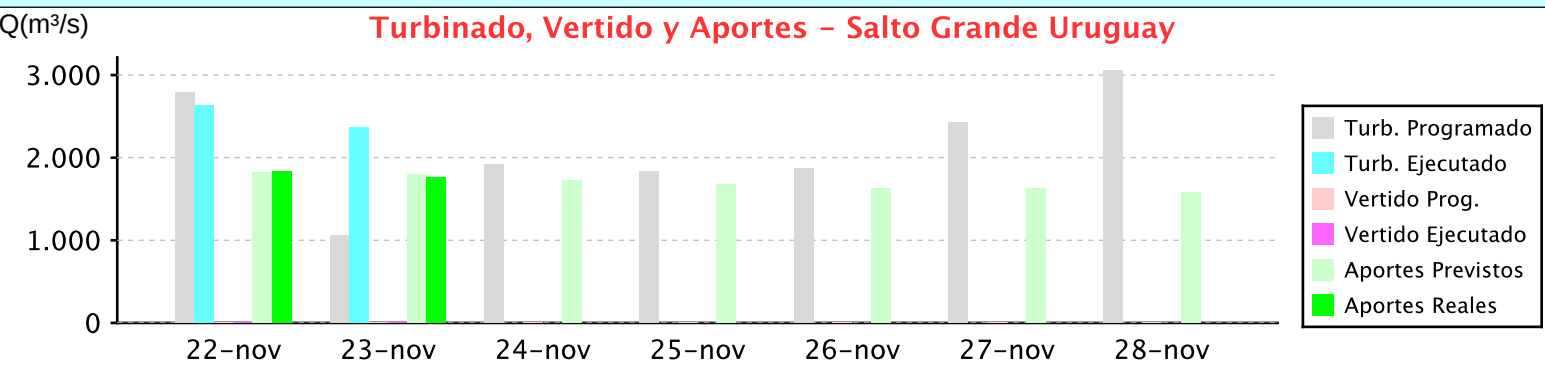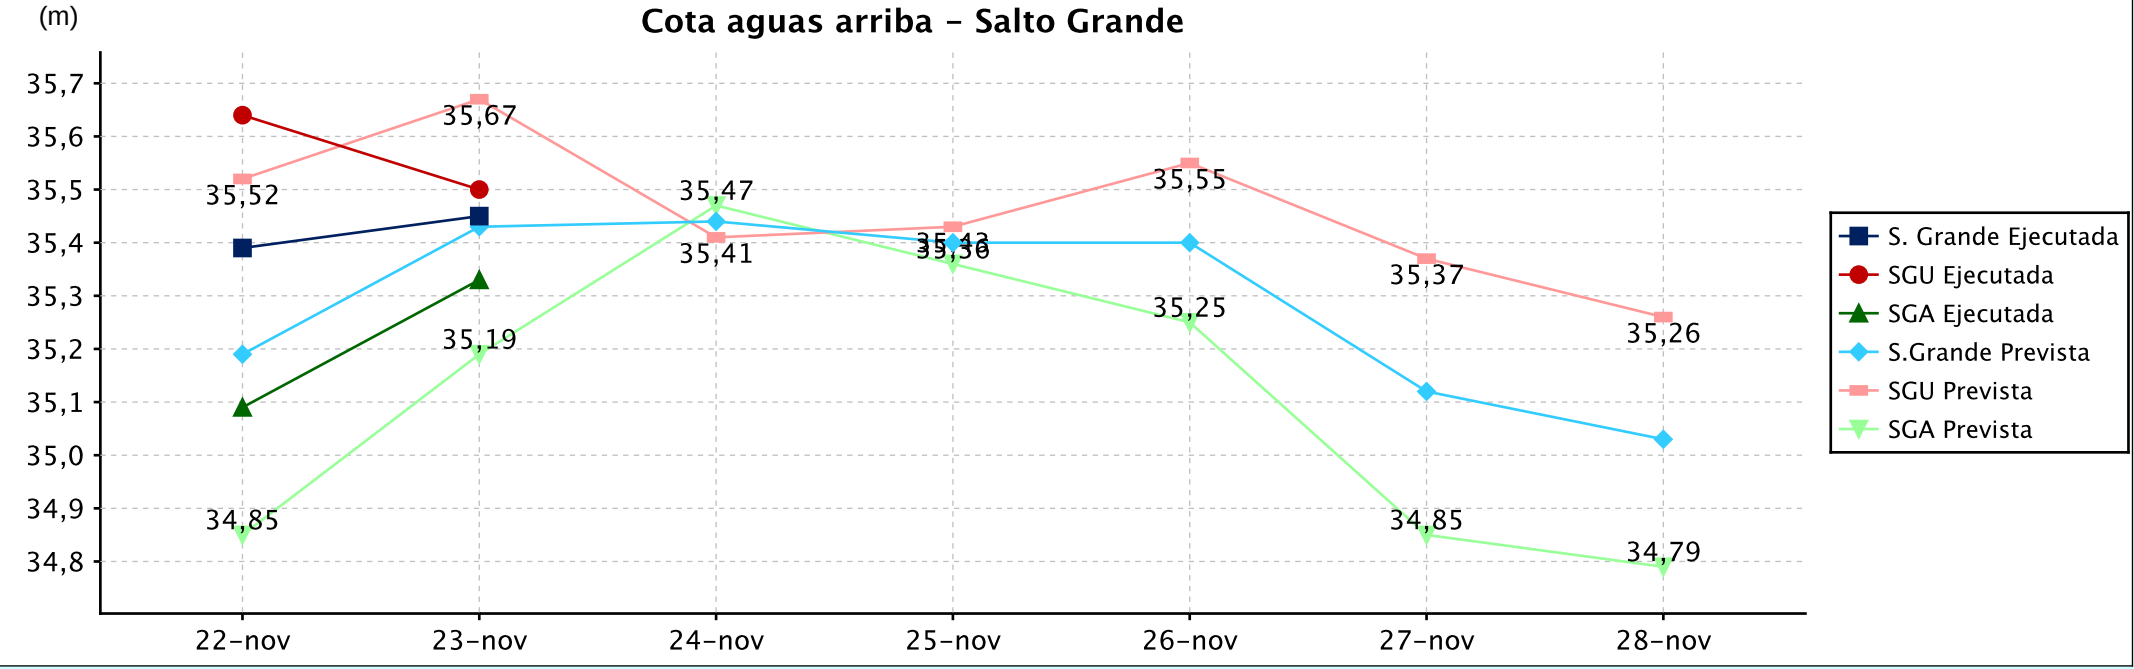

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,50
Cota Vista Arg	35,33
Cota real	35,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.069

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	647
Baygorria	664	783
Palmar	699	1.159
SGU	1.060	2.369

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	190	1.160
Baygorria	0	124
Palmar	0	402
SGU	1.800	1.760

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	34
Palmar	0	226
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se actualiza informe parcial publicado el 24/11.
Durante el mediodía se generó forzado con Motores CB y Punta del Tigre por restricciones en la red de transmisión.
Se exportaron 388 MW medios hacia Argentina.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

27/11/2014 14:15
