



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 24 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.379
C. Baygorria	2.165
C. Palmar	7.409
C. Salto Grande	8.182
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.130
TOTAL Generación	27.205

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.205
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.390
Diferencia (MWh)	-1.185
Ejecutada - Programada	-4,17 %

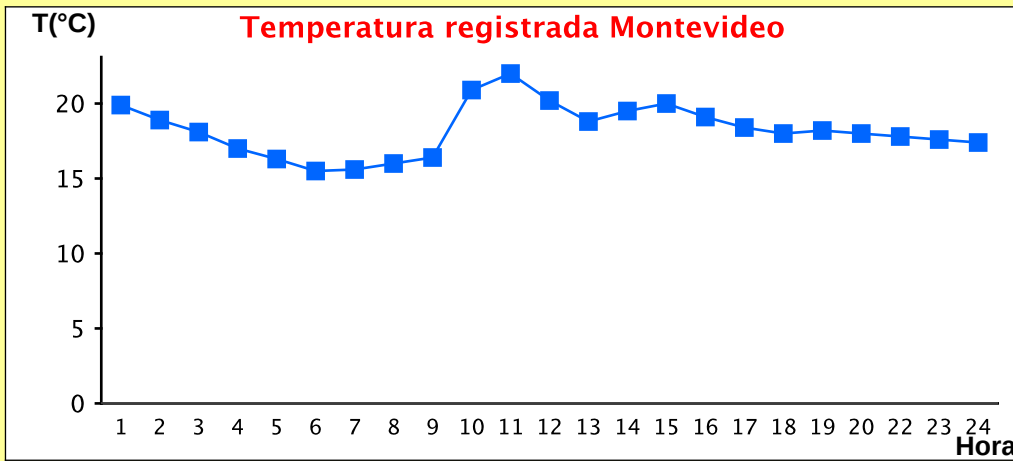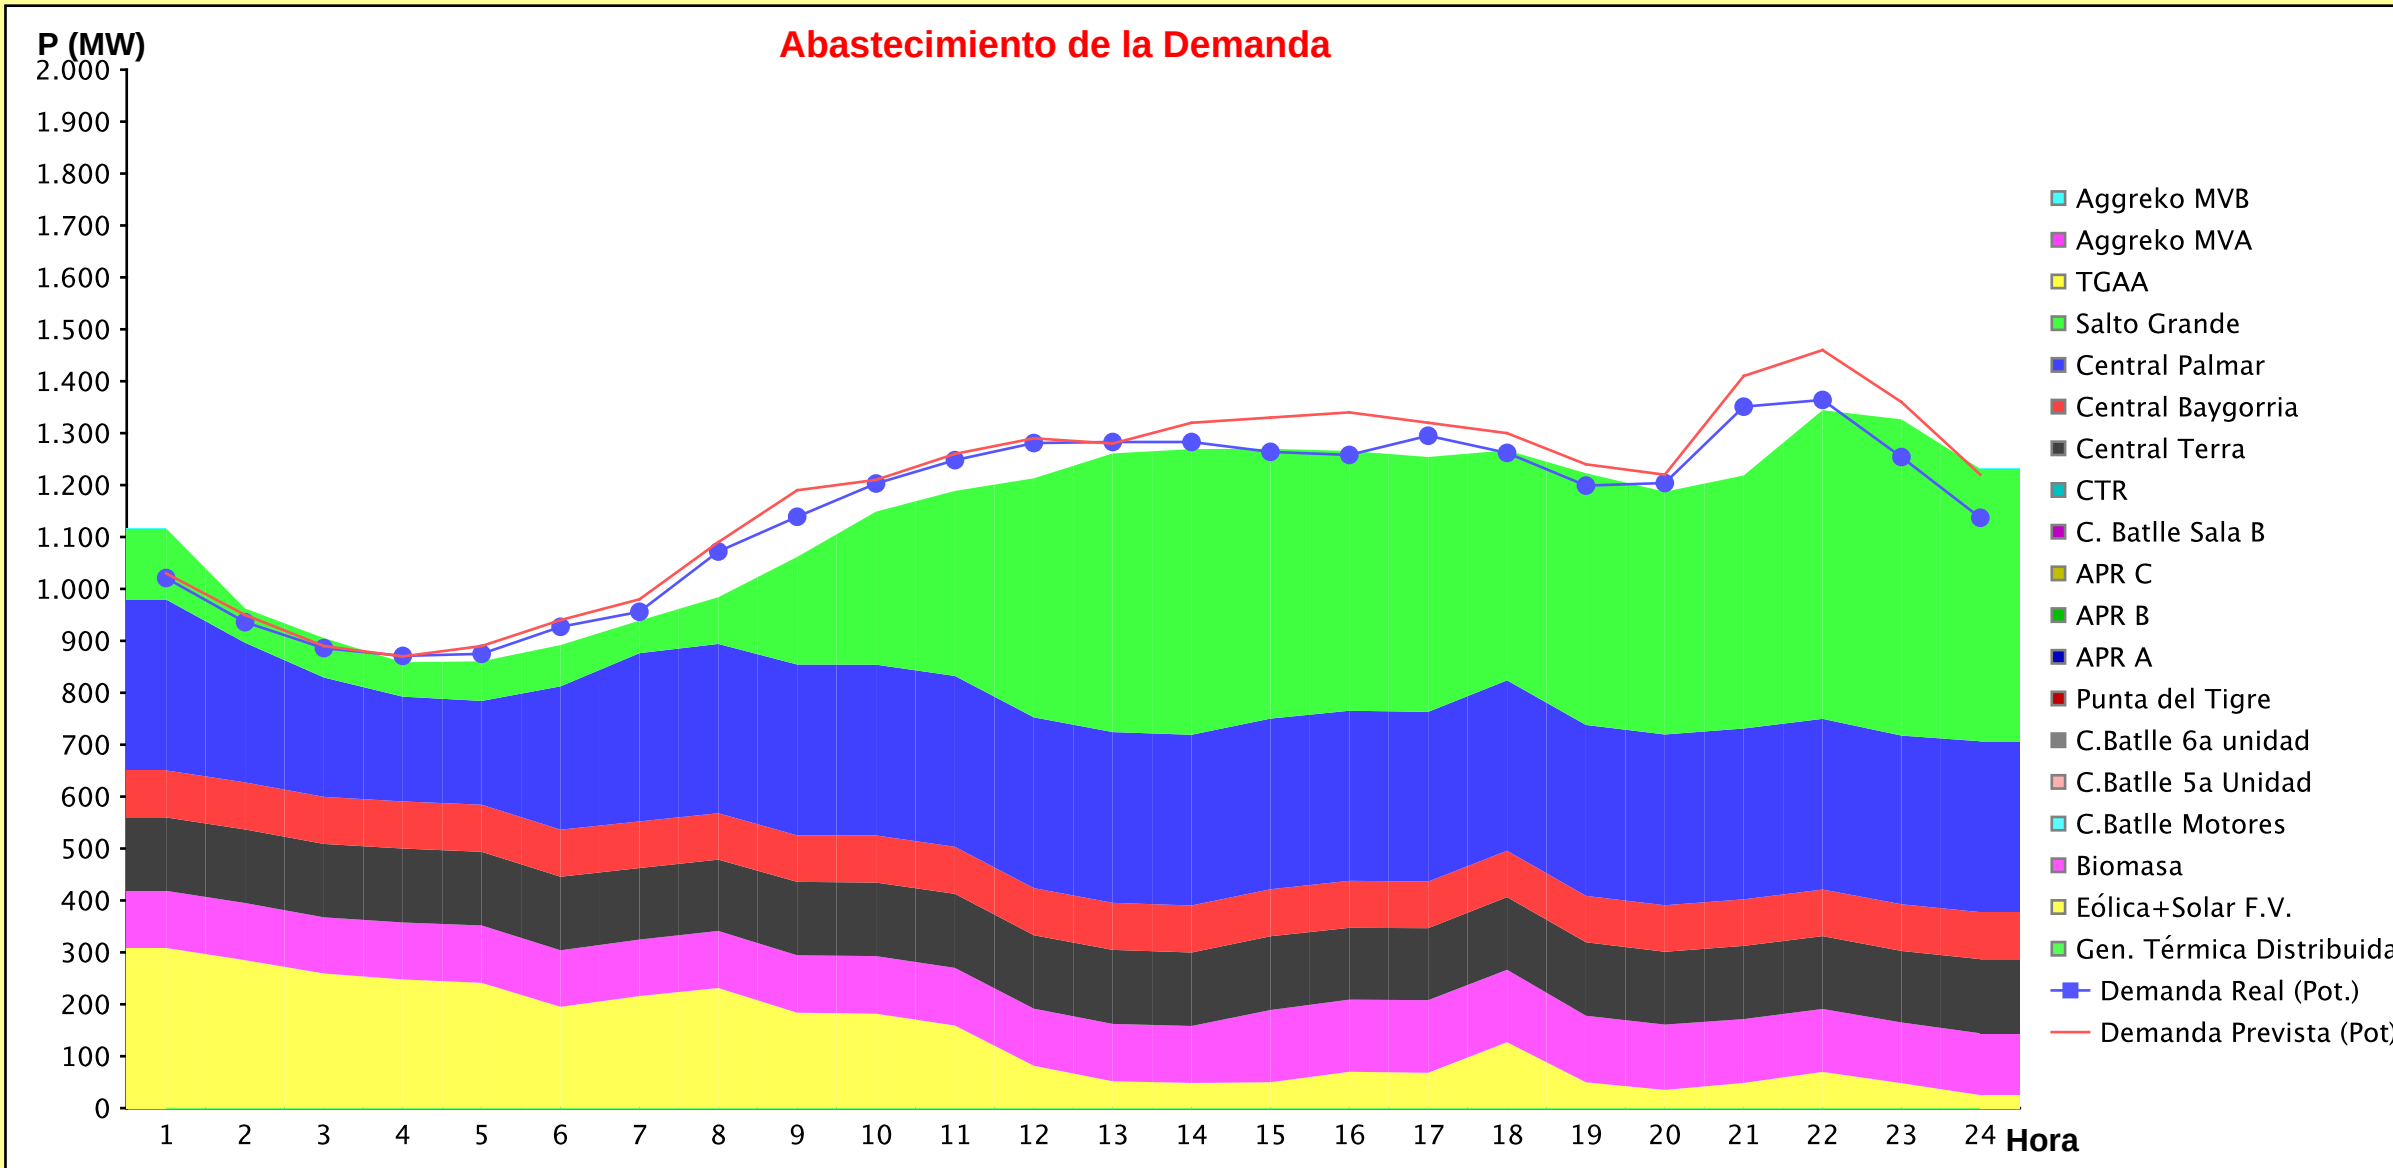



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1292,52 Hora 13:39
Potencia mínima:	848,34 Hora 04:22
Pico noche:	1392,73 Hora 21:34

Generación Media (MW)	
Eólica	137,6
Biomasa	118,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

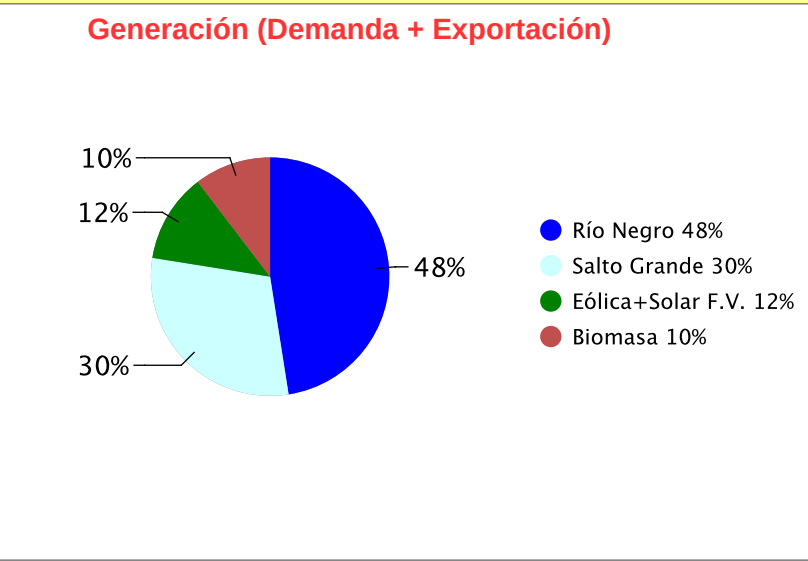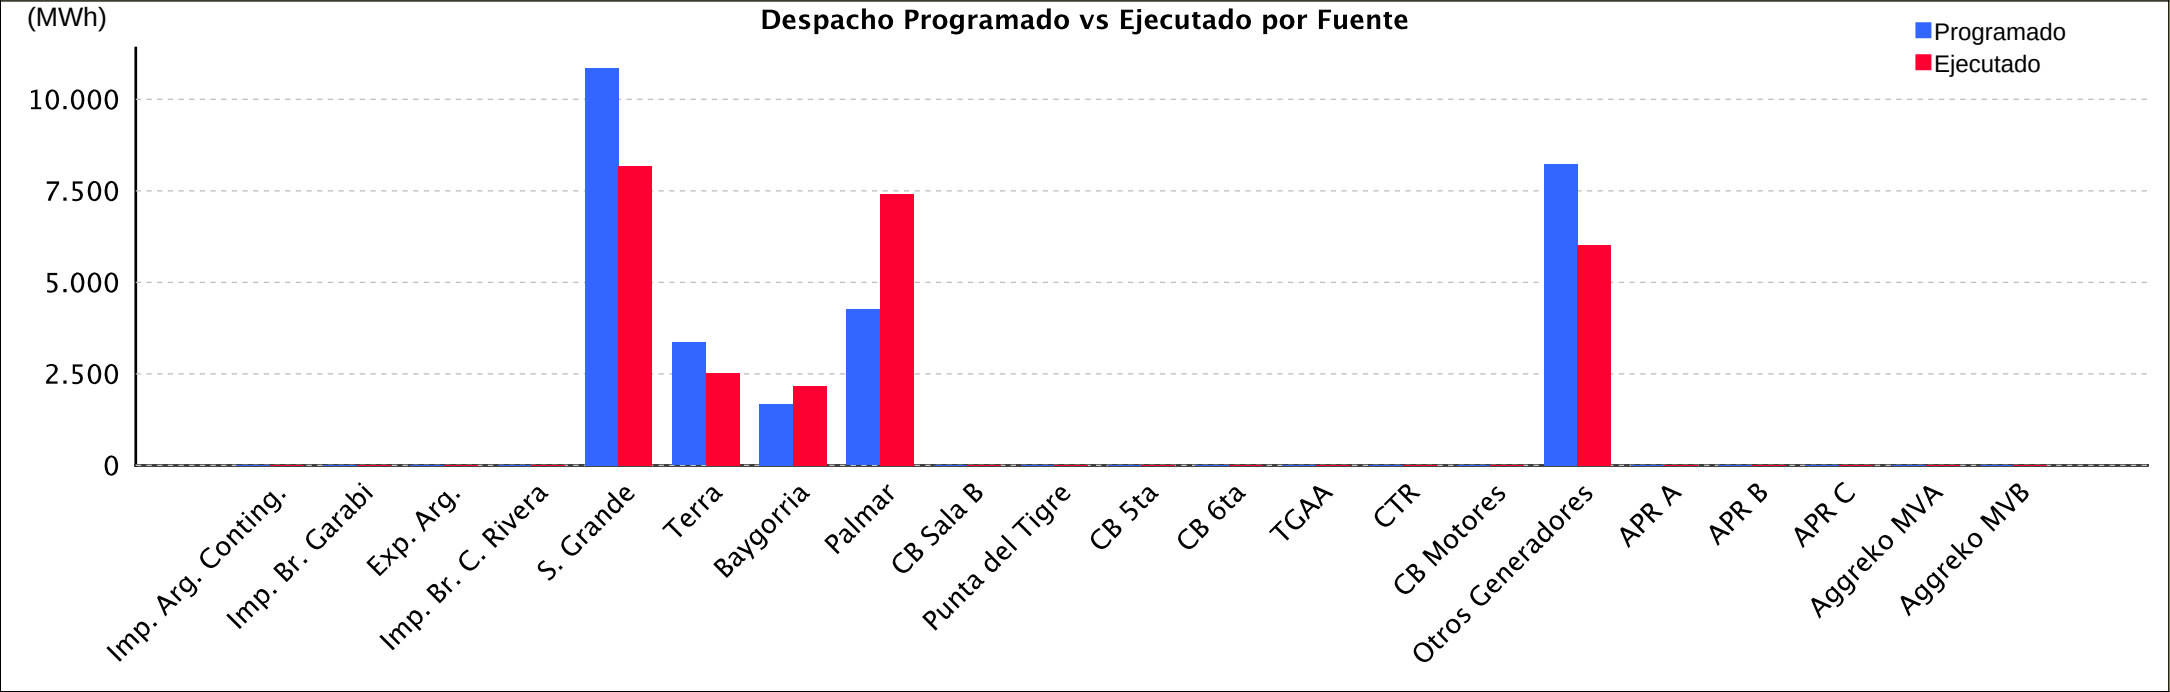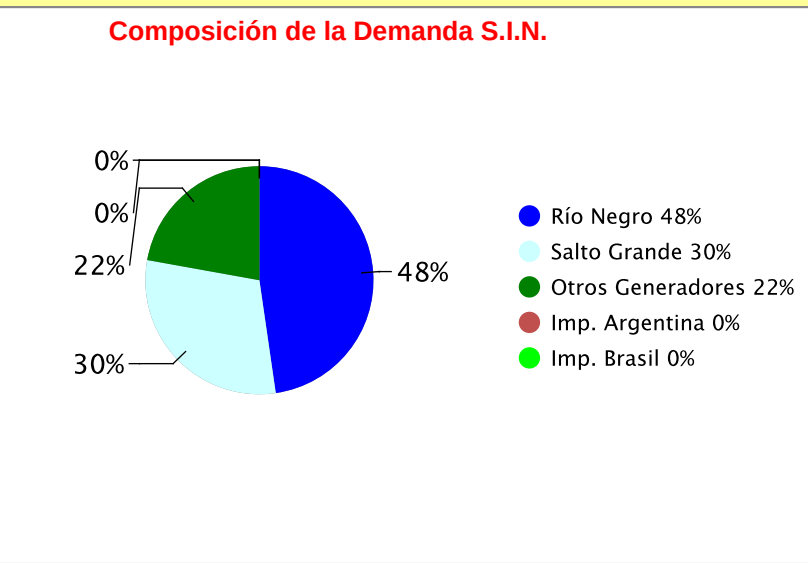



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

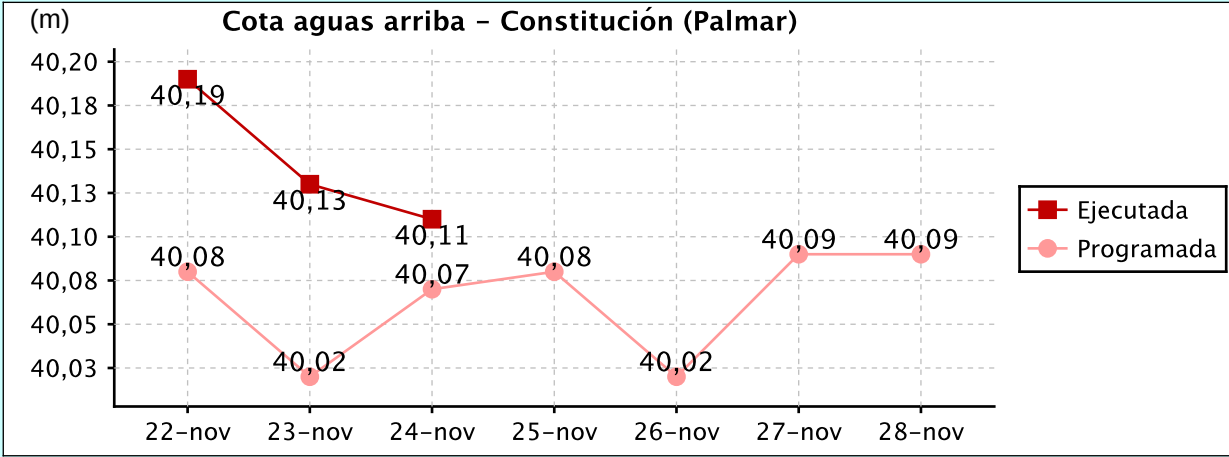
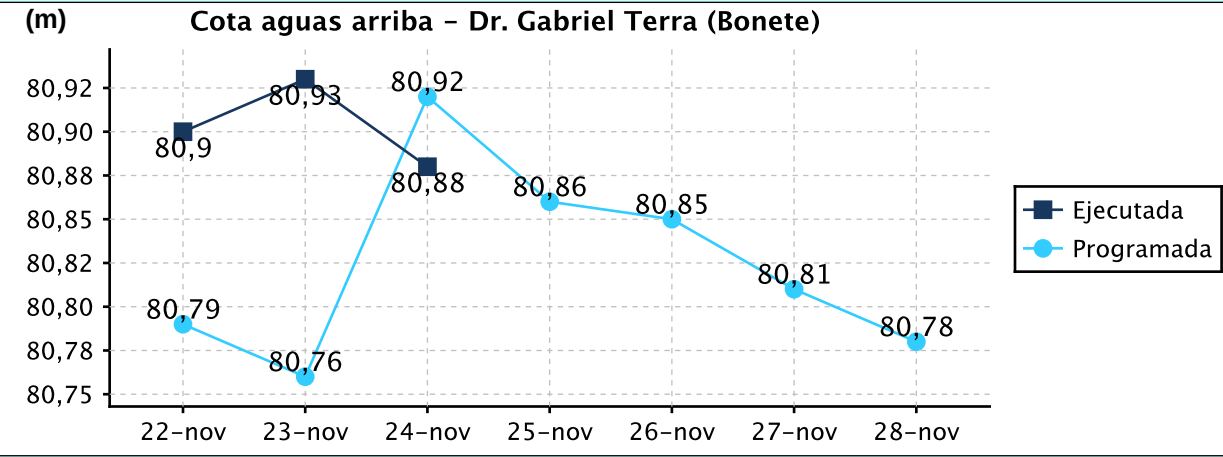


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,92	80,88
Baygorria	54,09	54,09
Palmar	40,07	40,11
SGU	35,41	35,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

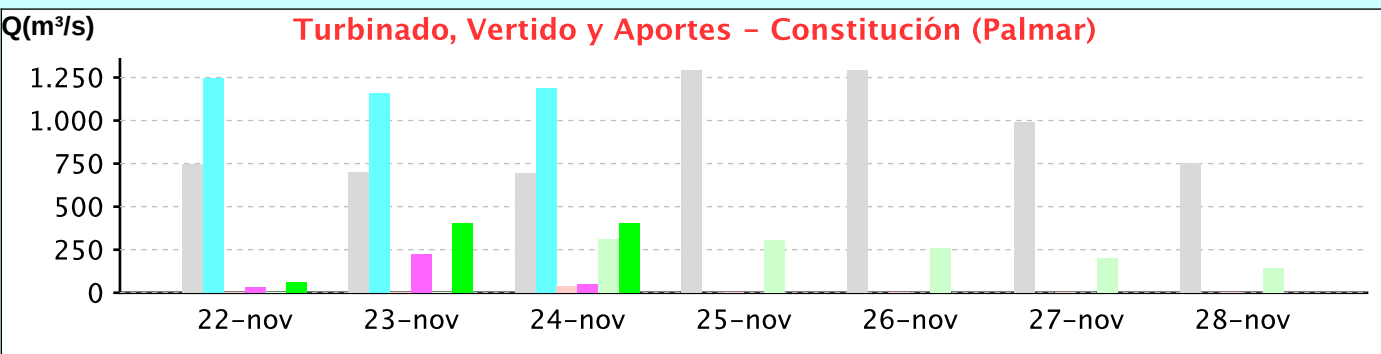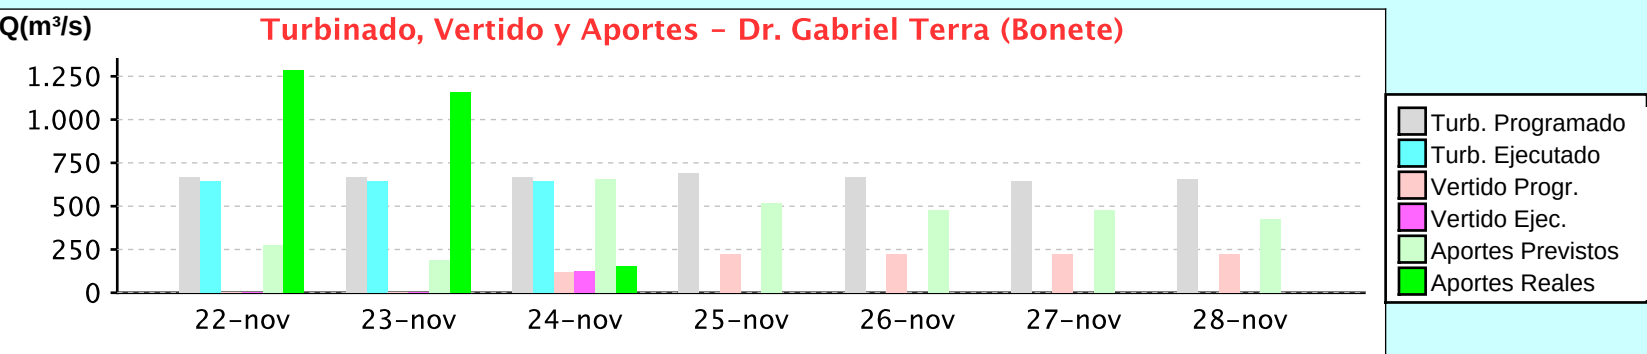

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

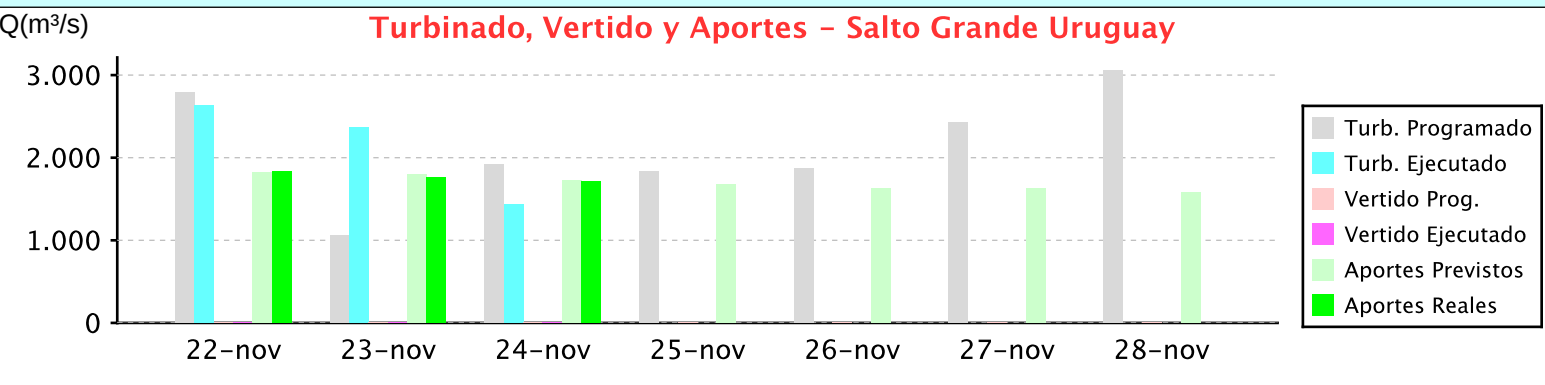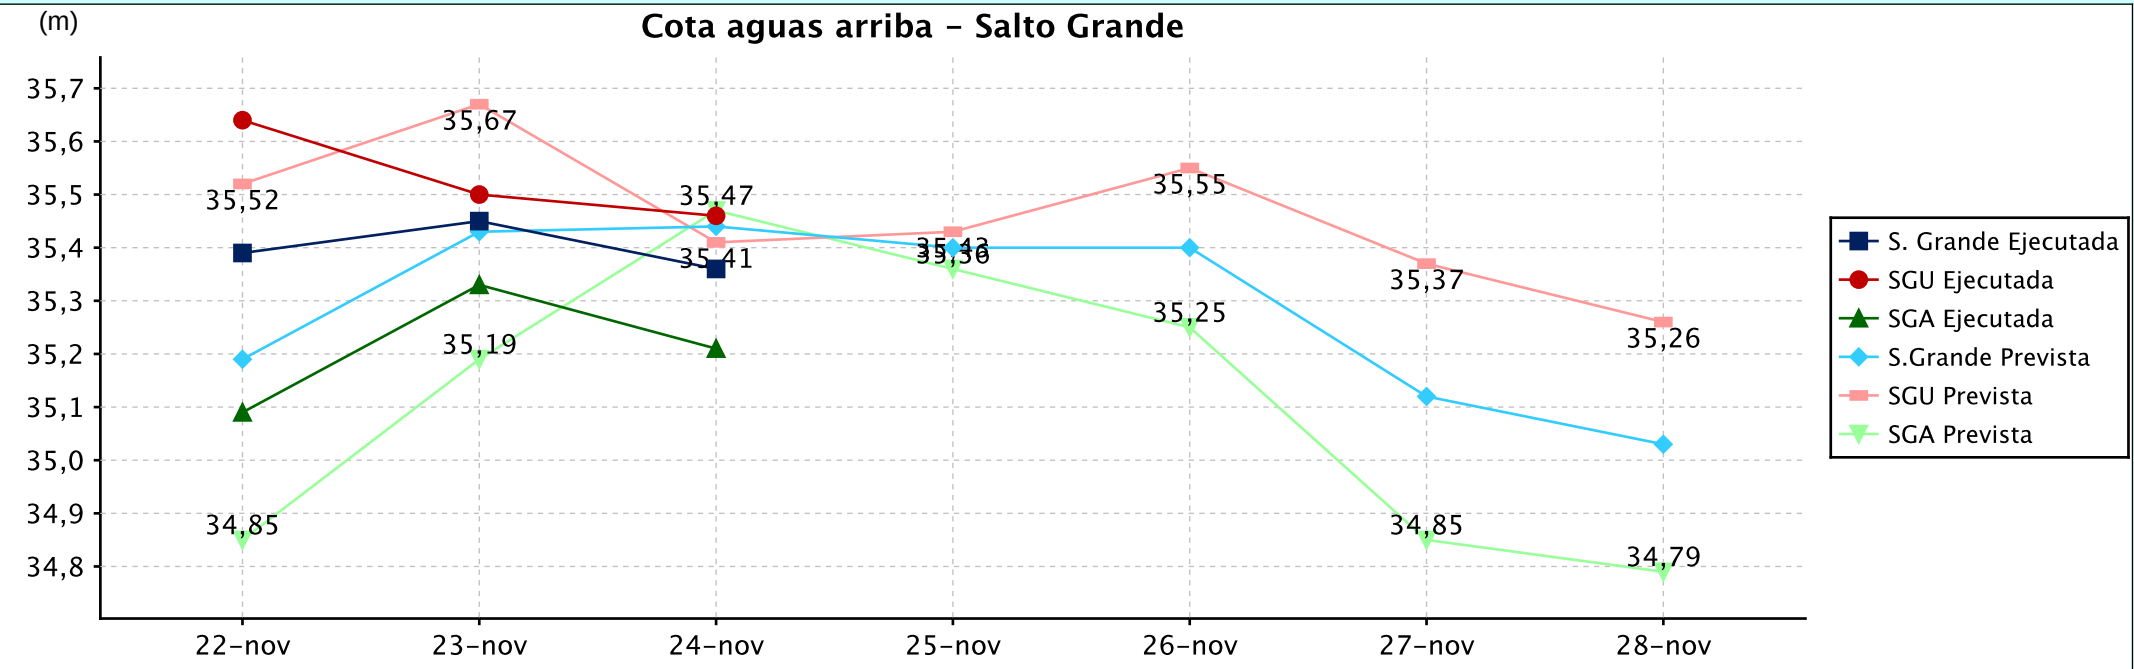

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,46
Cota Vista Arg	35,21
Cota real	35,36

Dif. Energ. (U-A)	Acumulado MWh
	5.951

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	646
Baygorria	634	799
Palmar	694	1.185
SGU	1.922	1.431

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	653	152
Baygorria	0	26
Palmar	312	406
SGU	1.725	1.716

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	120	126
Baygorria	0	0
Palmar	40	47
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
