




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 28 de noviembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.401
C. Baygorria	1.787
C. Palmar	7.881
C. Salto Grande	10.396
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.178
TOTAL Generación	28.579

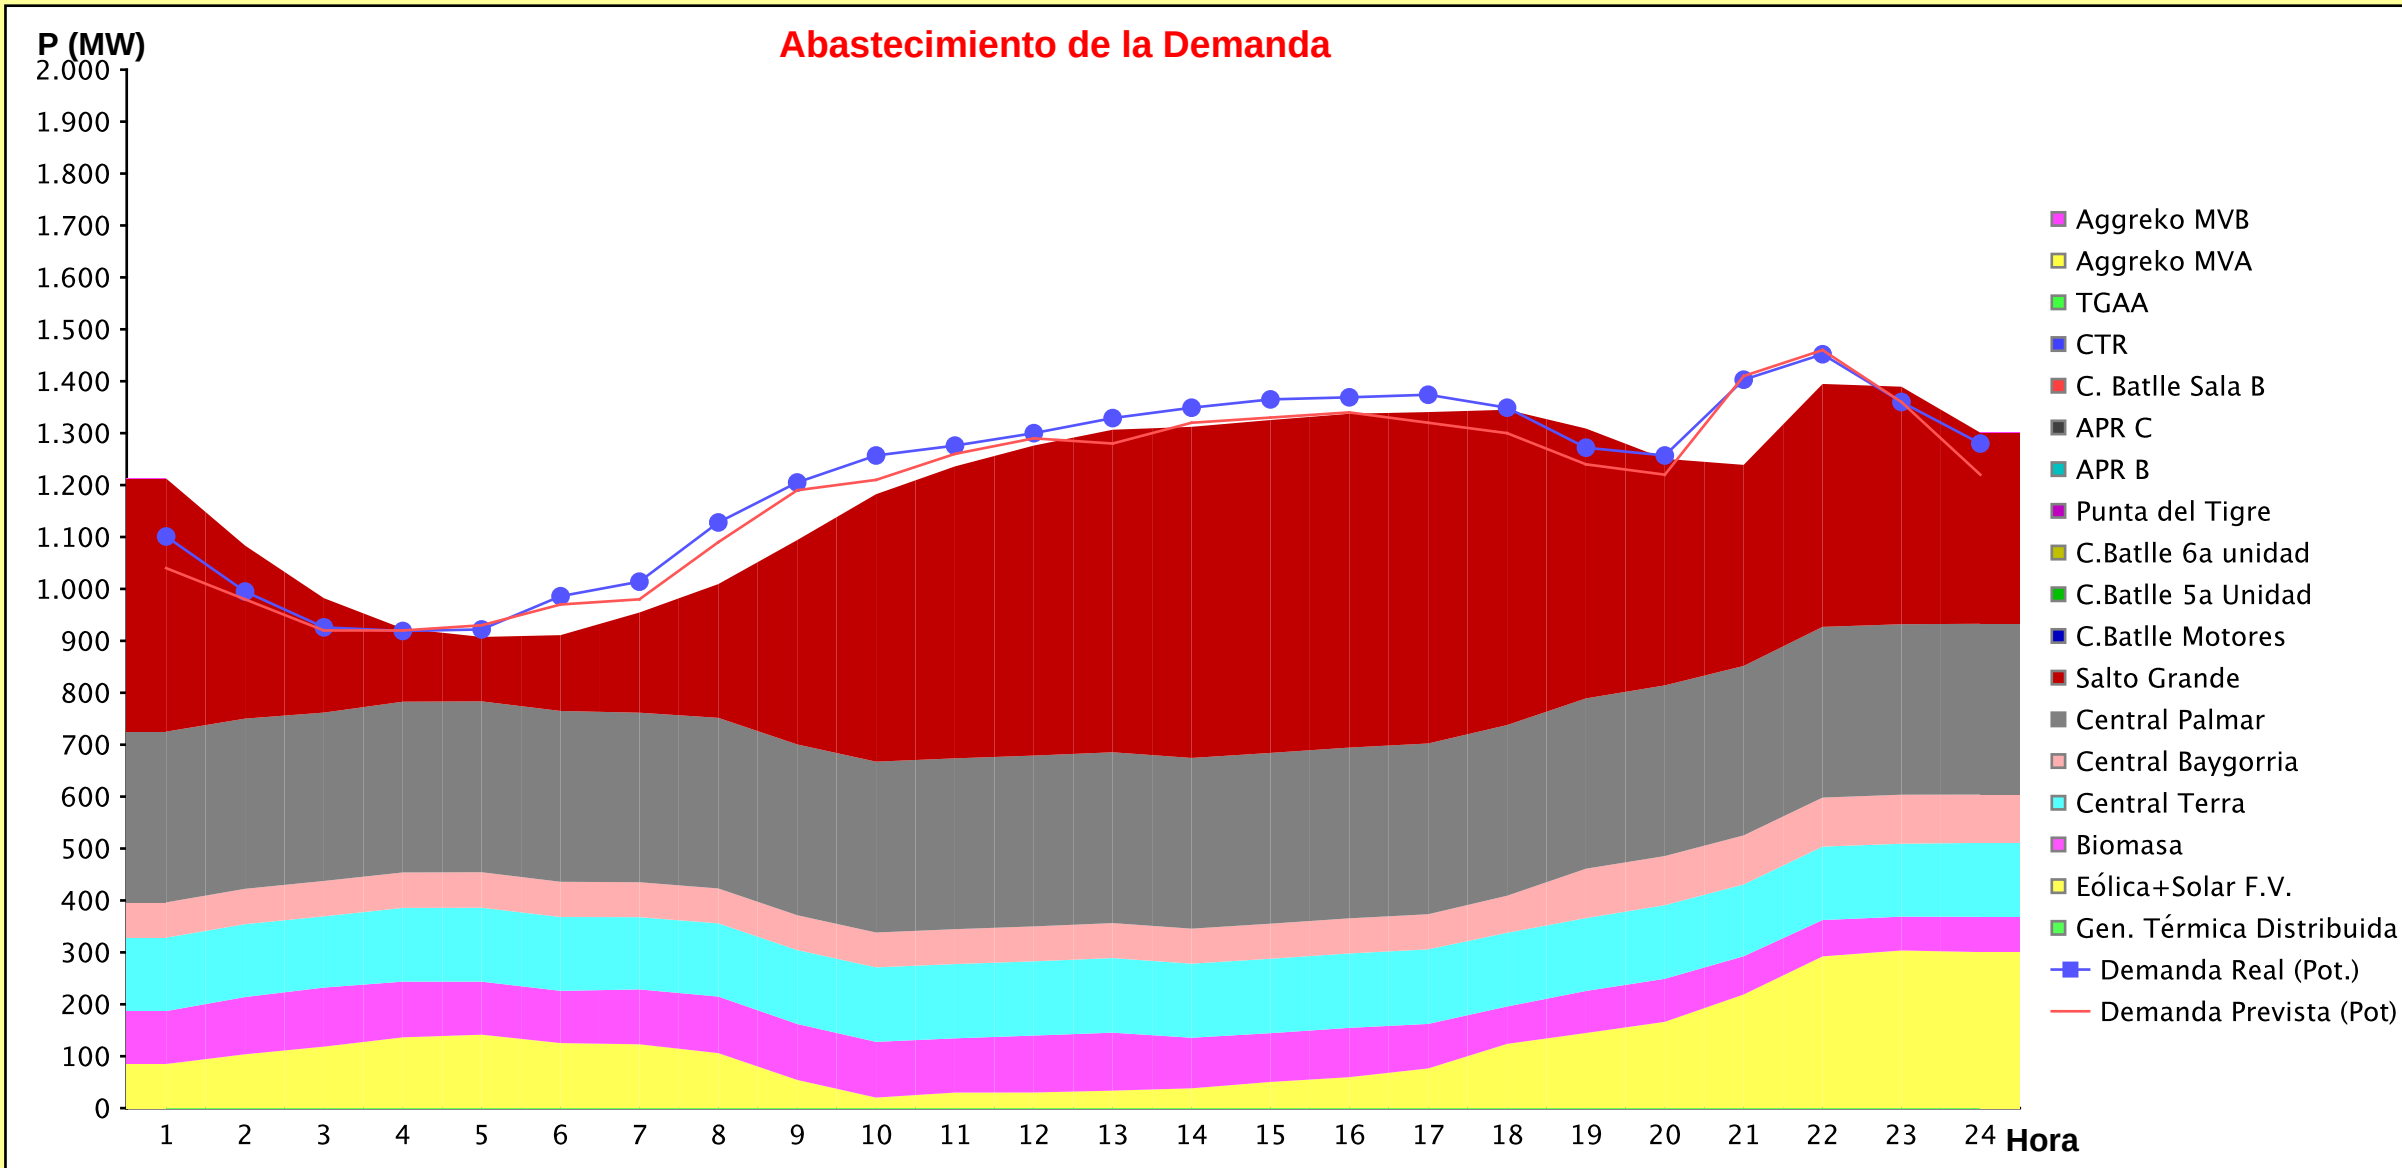

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.579
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.580
Diferencia (MWh)	-1
Ejecutada - Programada	-0,00 %

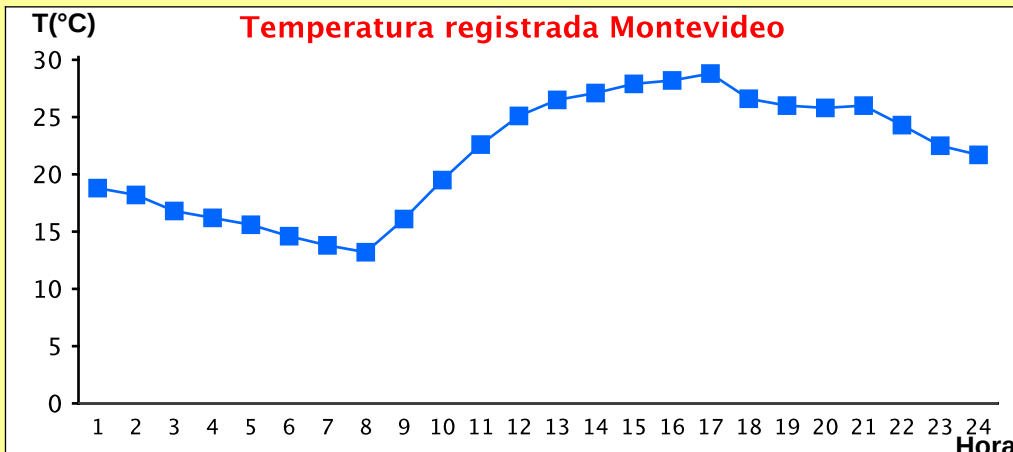



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1393,21 Hora 16:30
Potencia mínima:	912,36 Hora 03:32
Pico noche:	1480,28 Hora 21:26

Generación Media (MW)	
Eólica	121,1
Biomasa	94,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

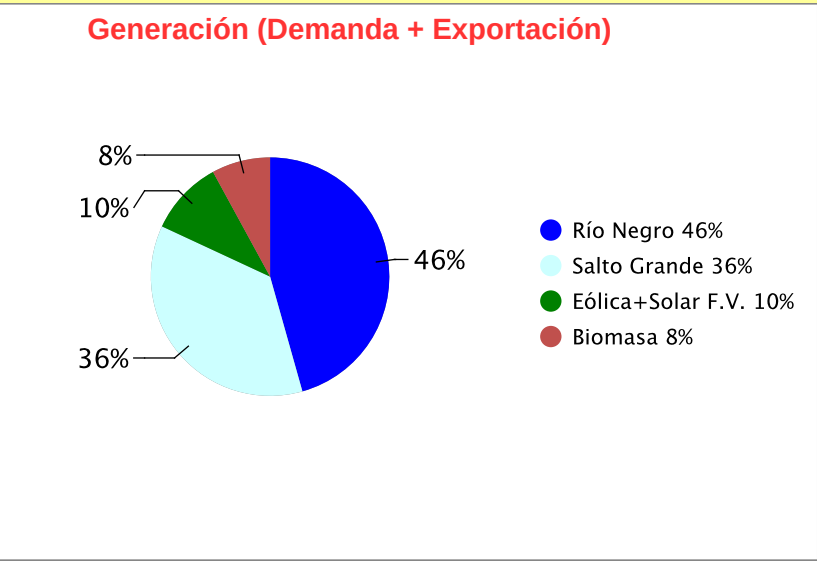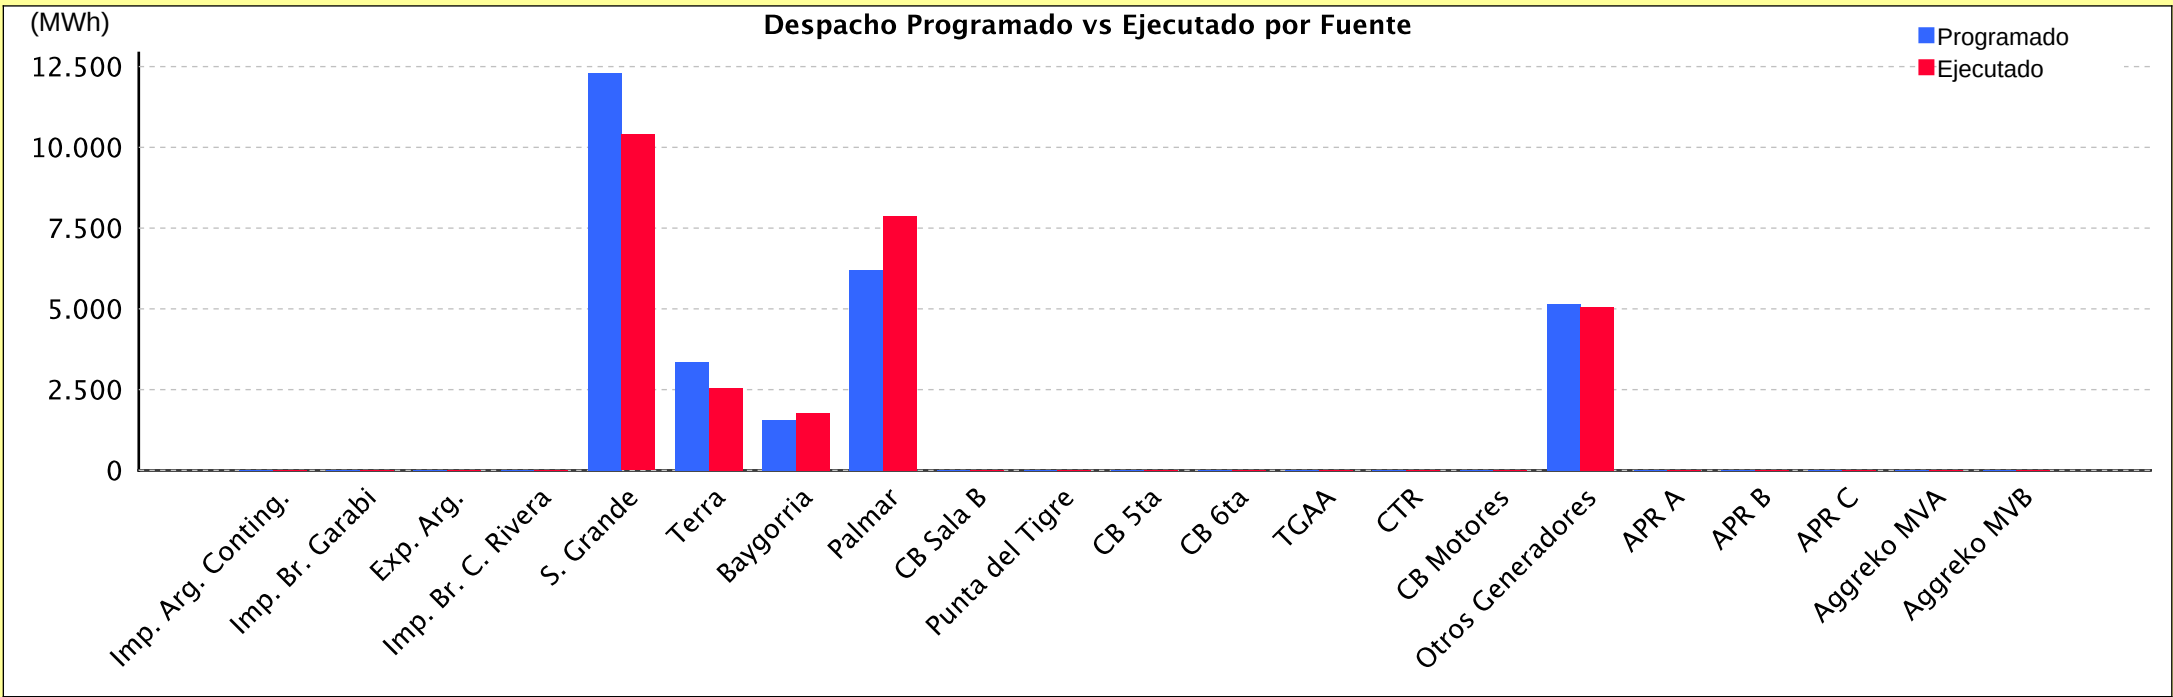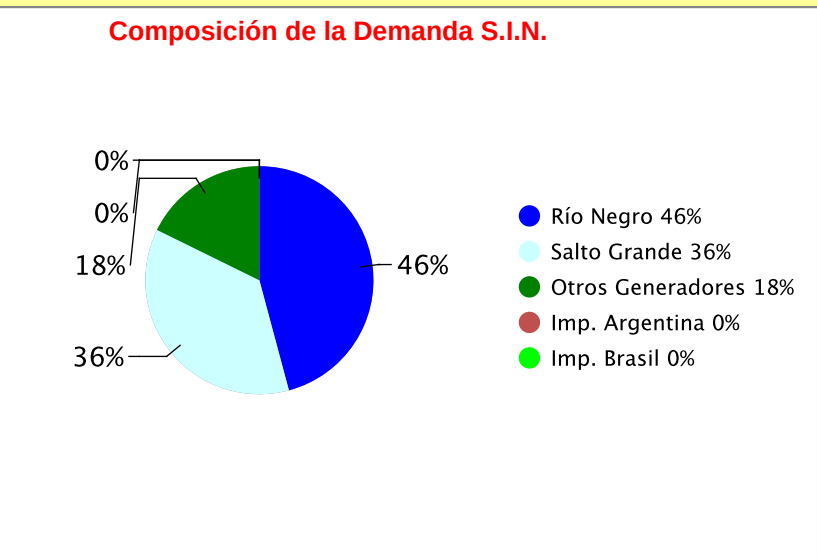



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

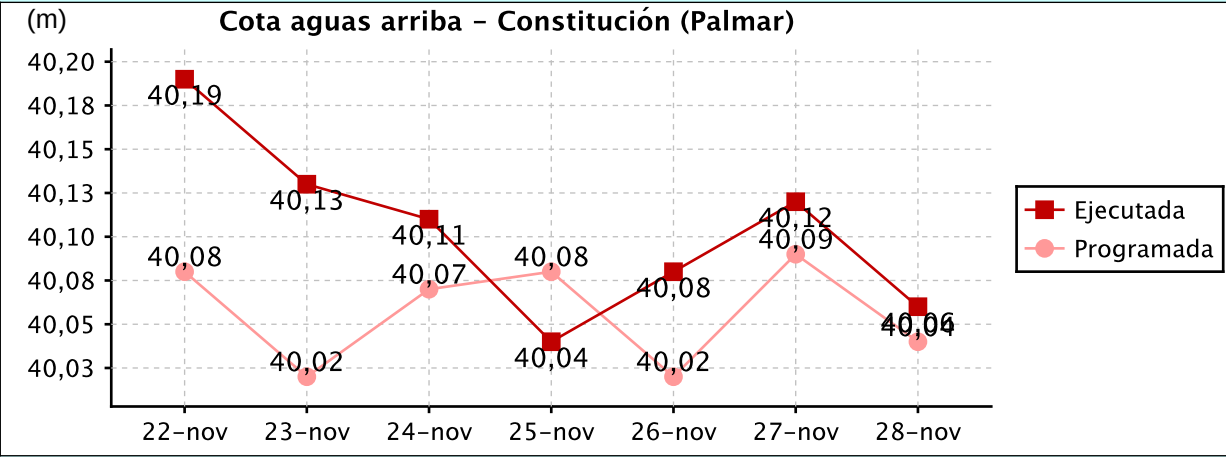
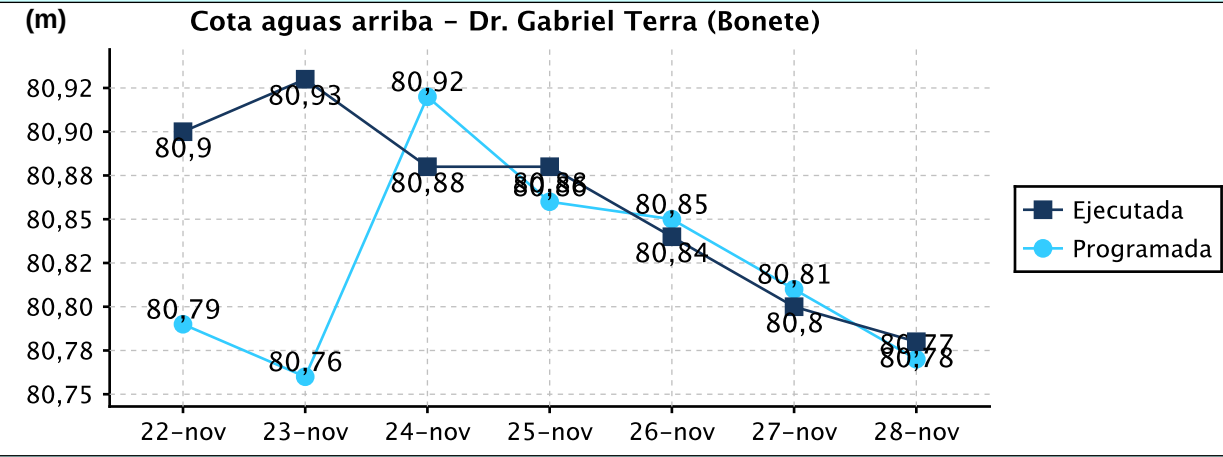


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,77	80,78
Baygorria	54,13	54,16
Palmar	40,04	40,06
SGU	34,99	35,09

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

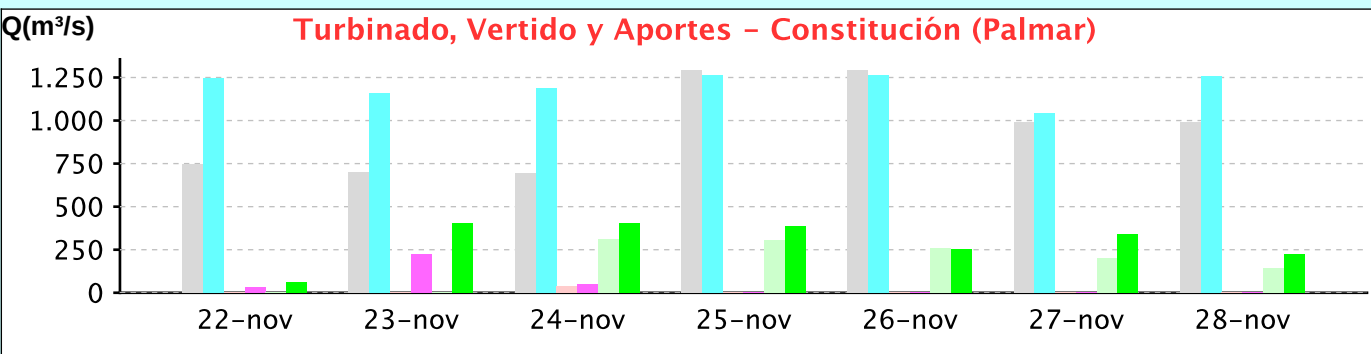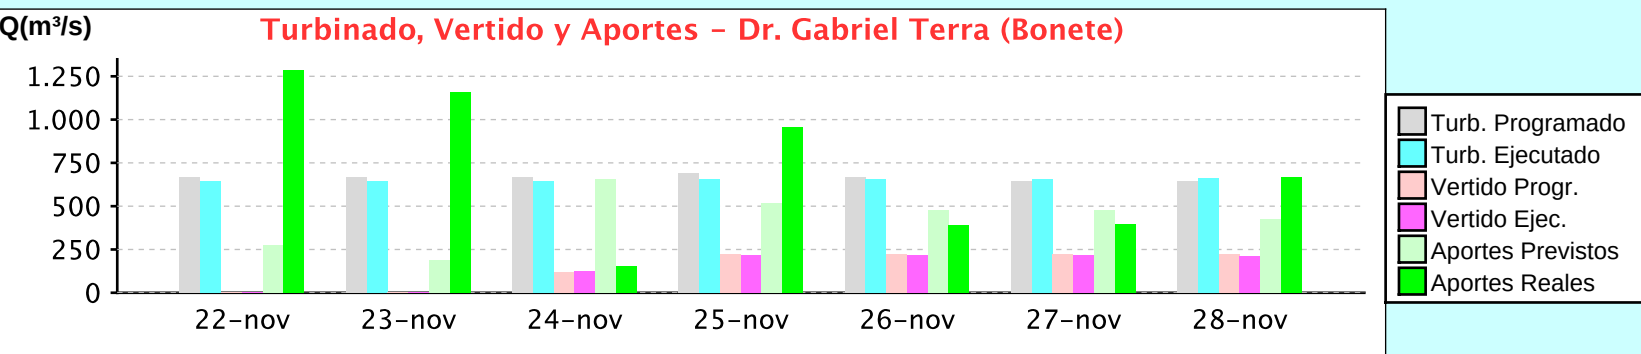

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

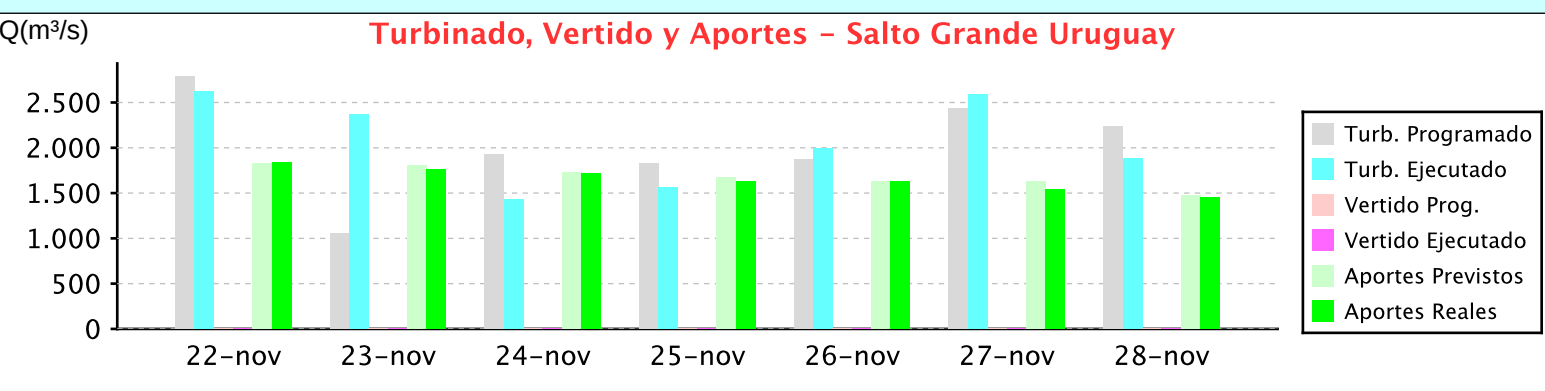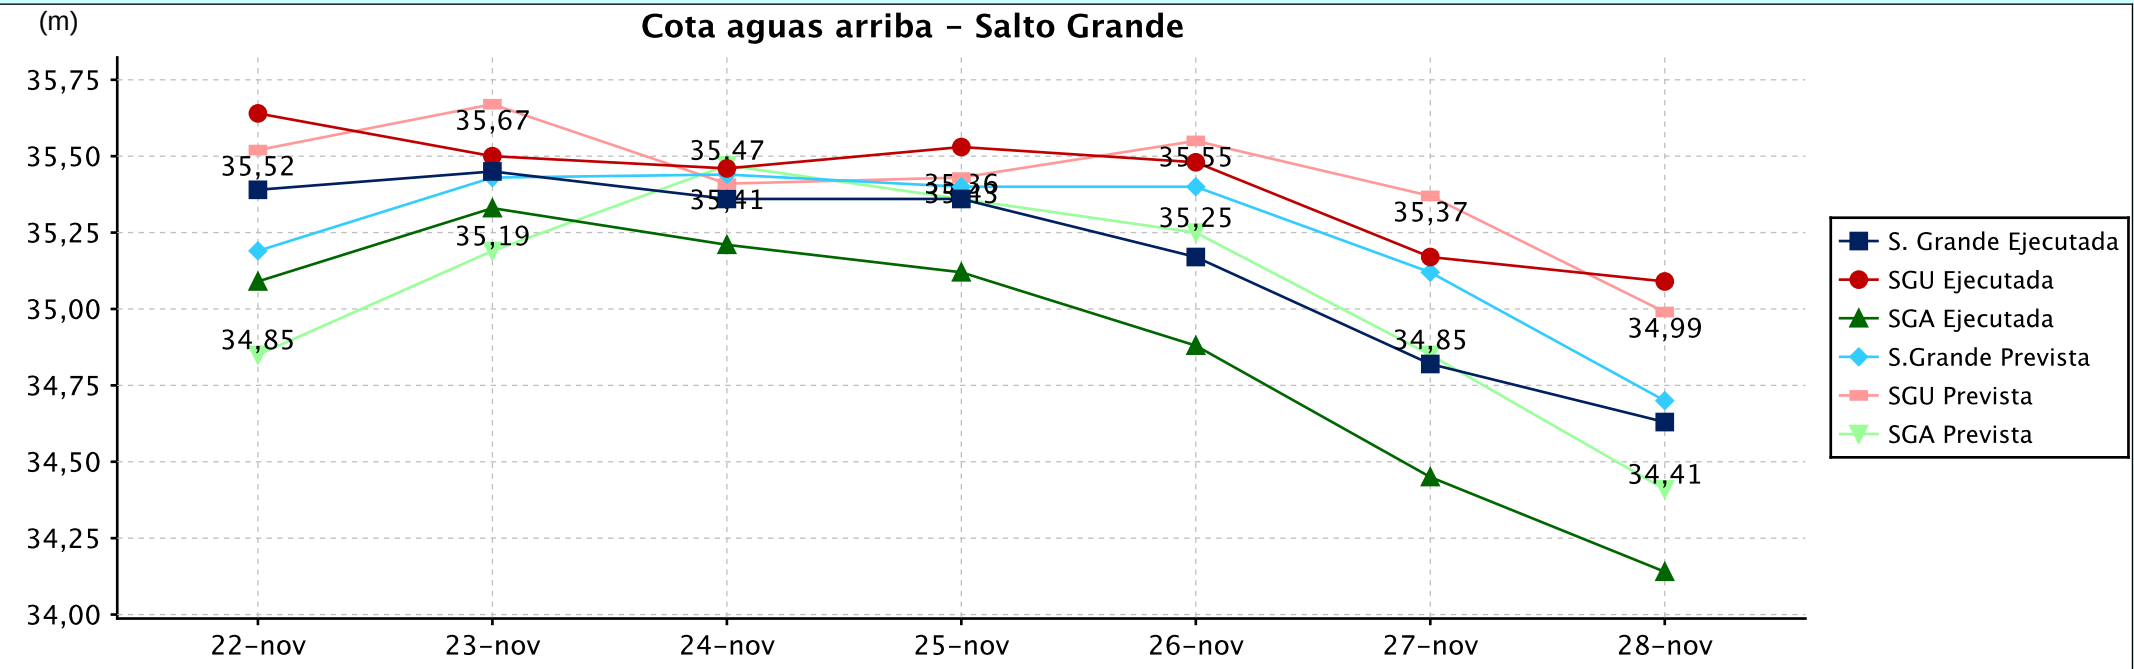

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,09
Cota Vista Arg	34,14
Cota real	34,63
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	21.501

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	661
Baygorria	579	653
Palmar	992	1.257
SGU	2.235	1.881

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	425	669
Baygorria	0	64
Palmar	145	223
SGU	1.475	1.454

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	213
Baygorria	250	216
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
