



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 29 de noviembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	13
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.403
C. Baygorria	2.256
C. Palmar	7.398
C. Salto Grande	6.514
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.550
TOTAL Generación	28.082

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.082
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.860
Diferencia (MWh)	2.222
Ejecutada - Programada	8,59 %

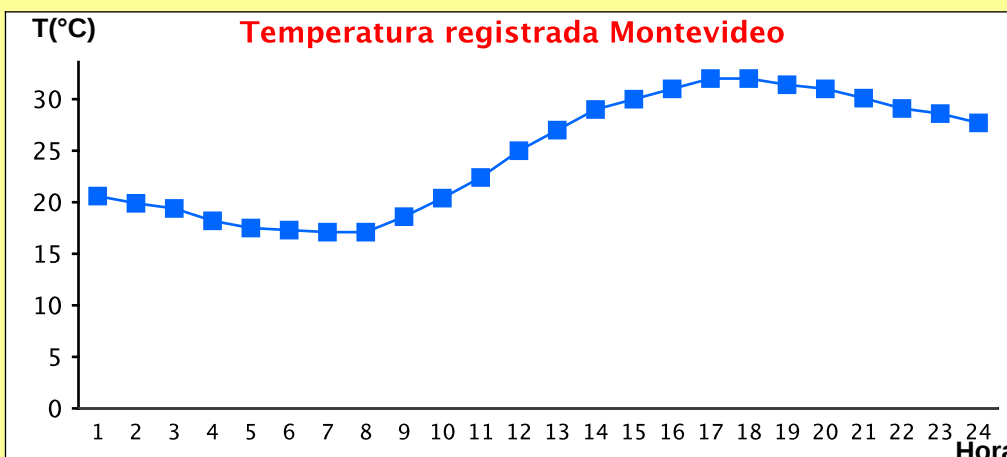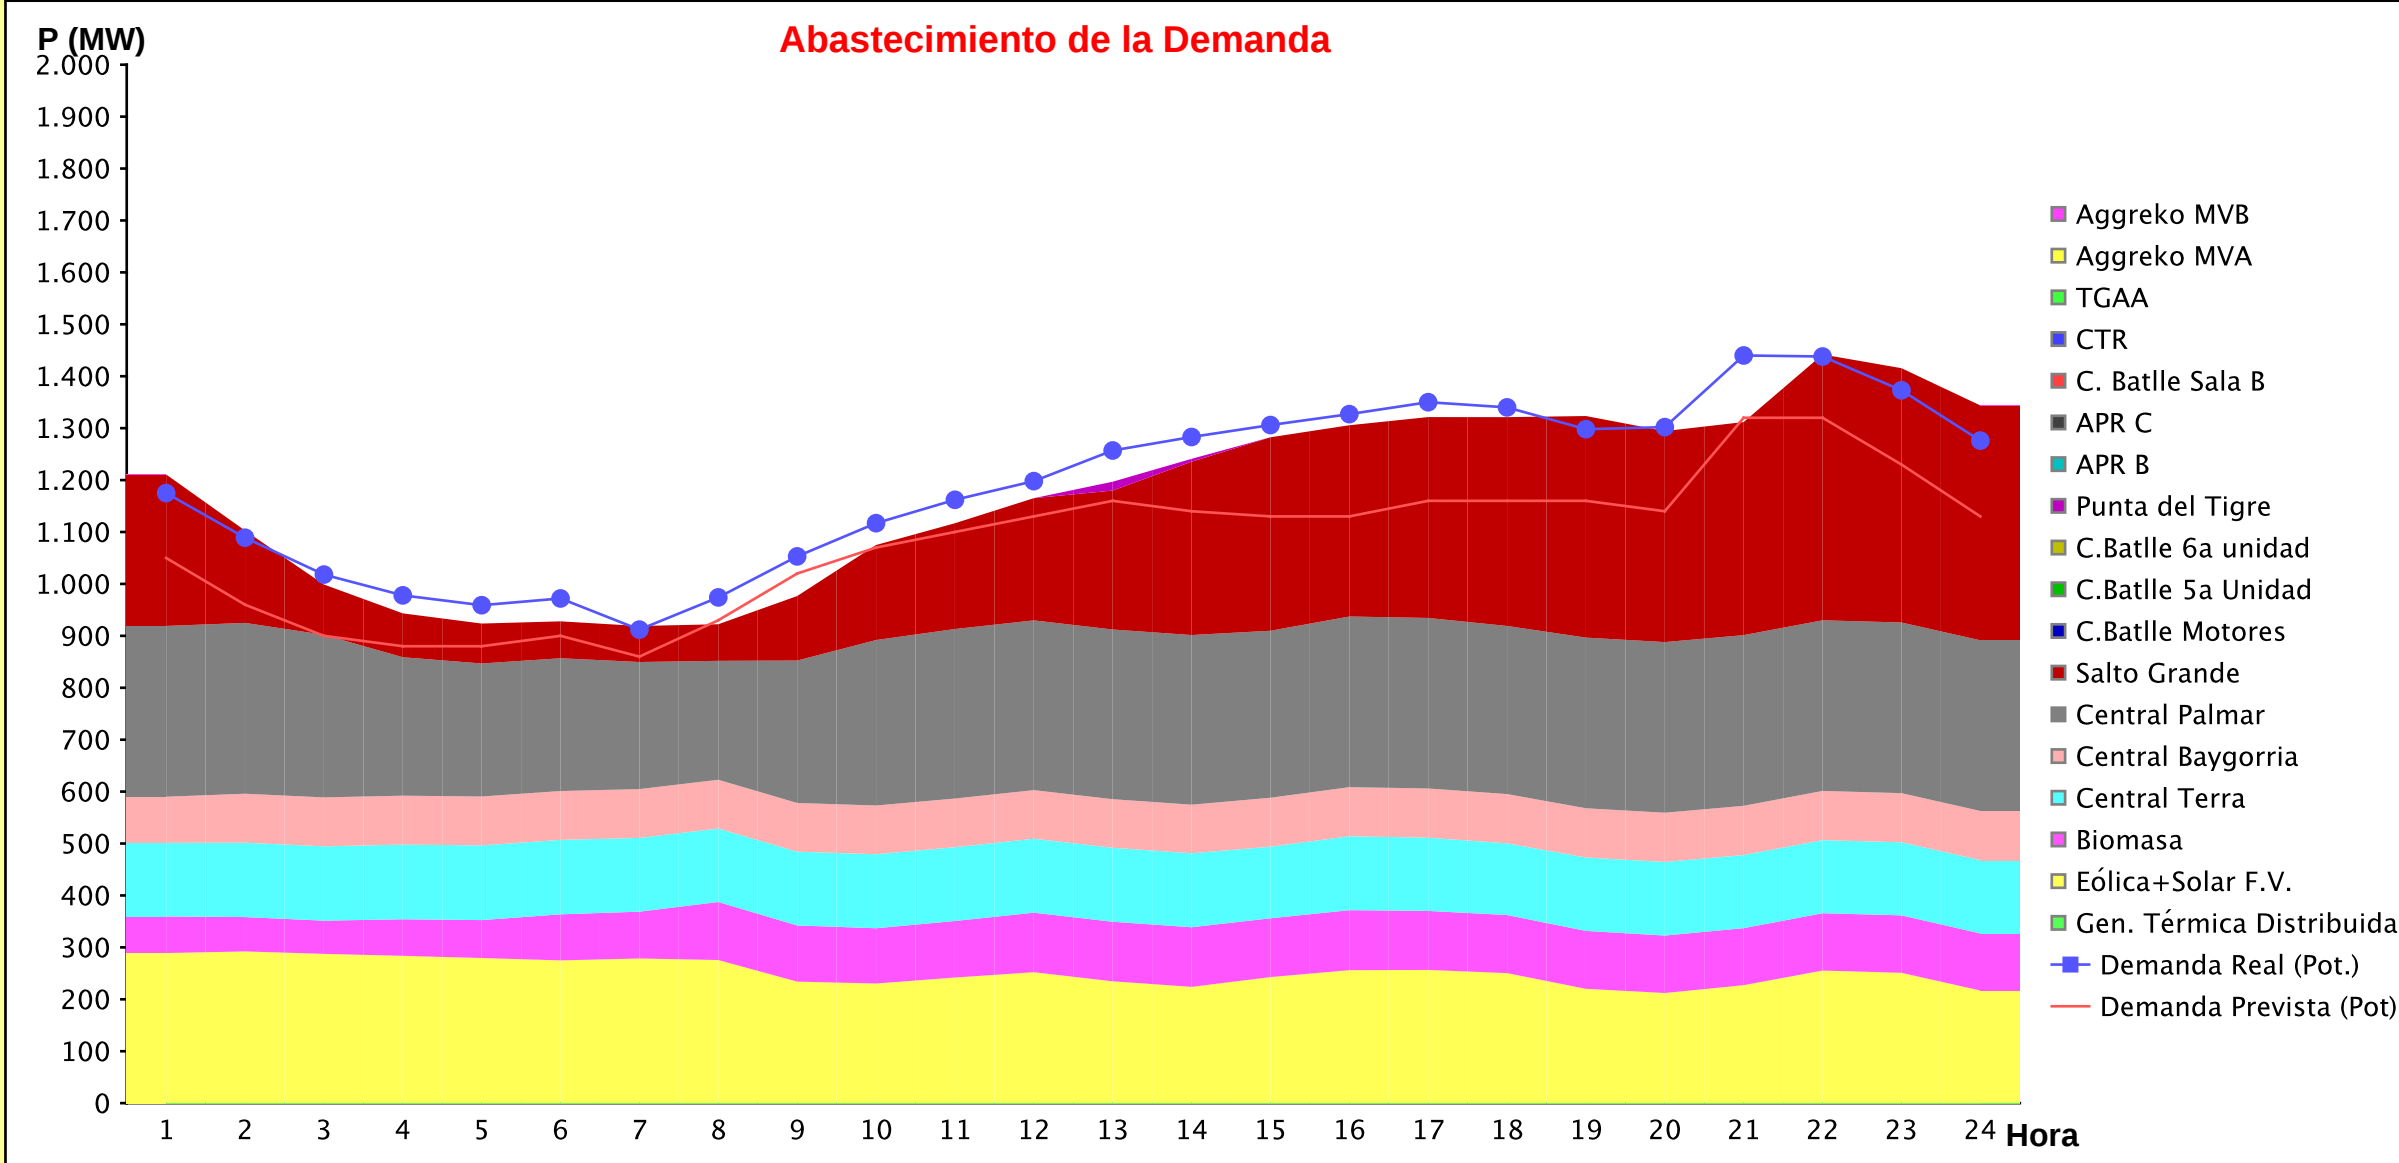



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1354,77 Hora 16:53
Potencia mínima:	905,11 Hora 06:53
Pico noche:	1468,44 Hora 21:33

Generación Media (MW)	
Eólica	253,5
Biomasa	100,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

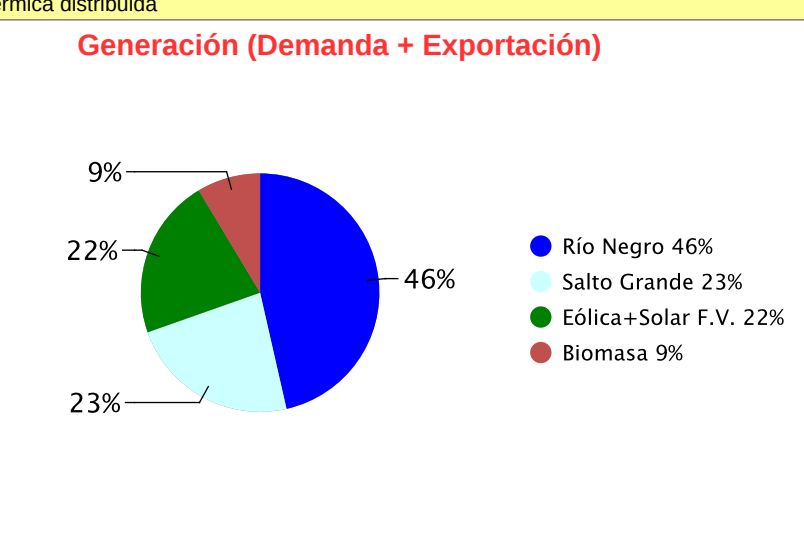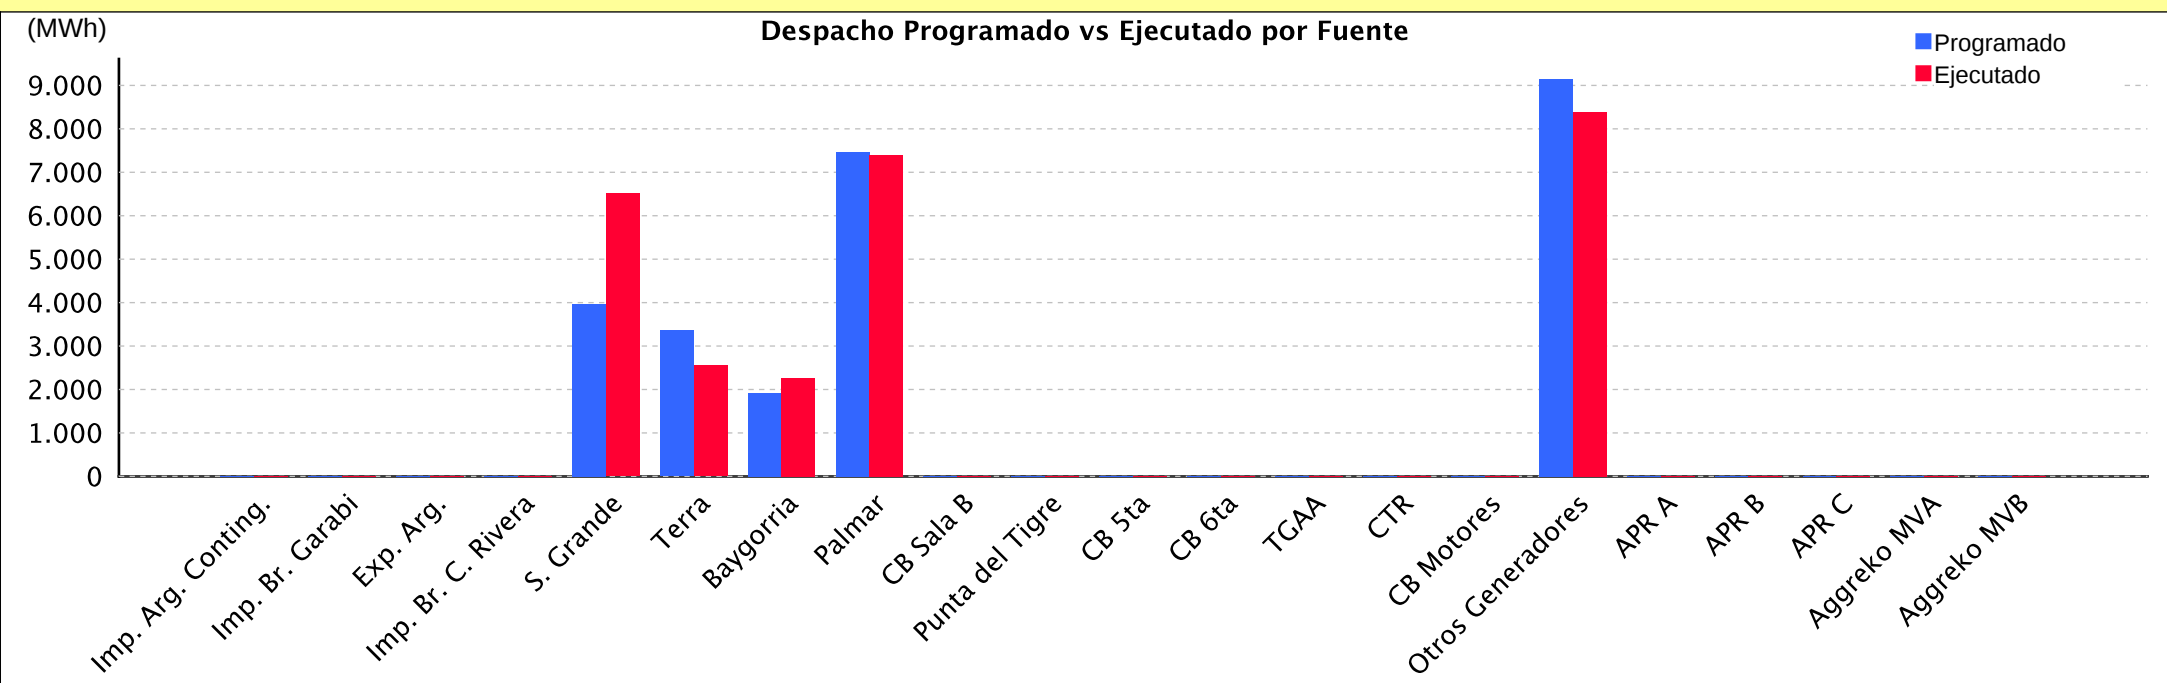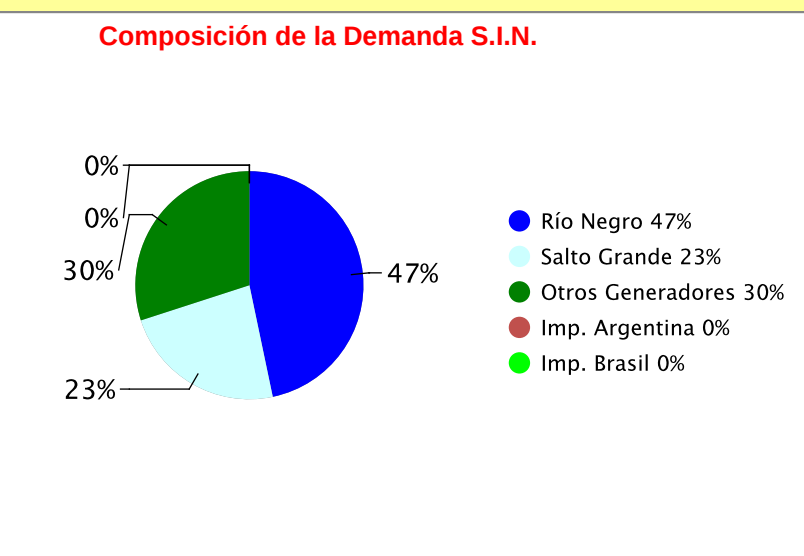



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

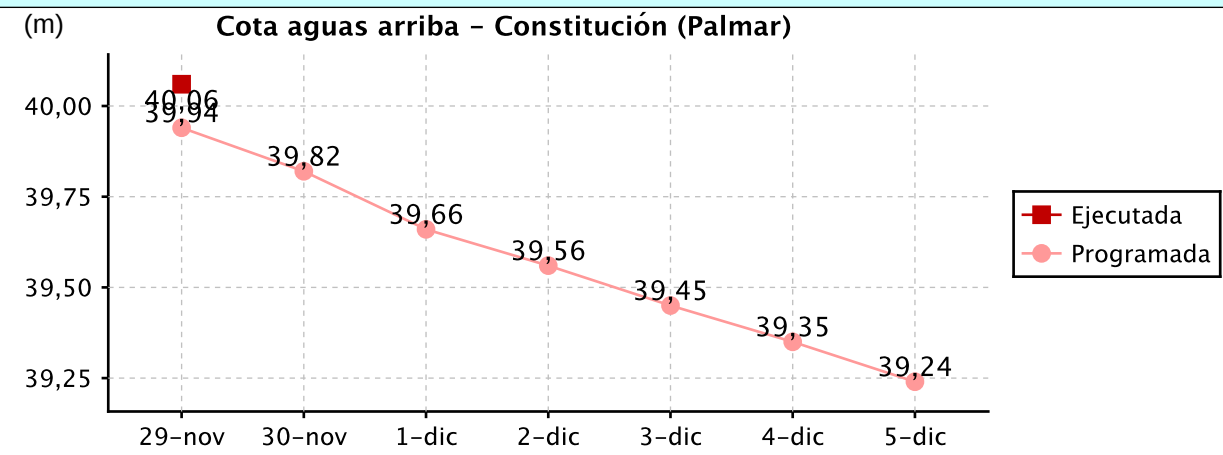
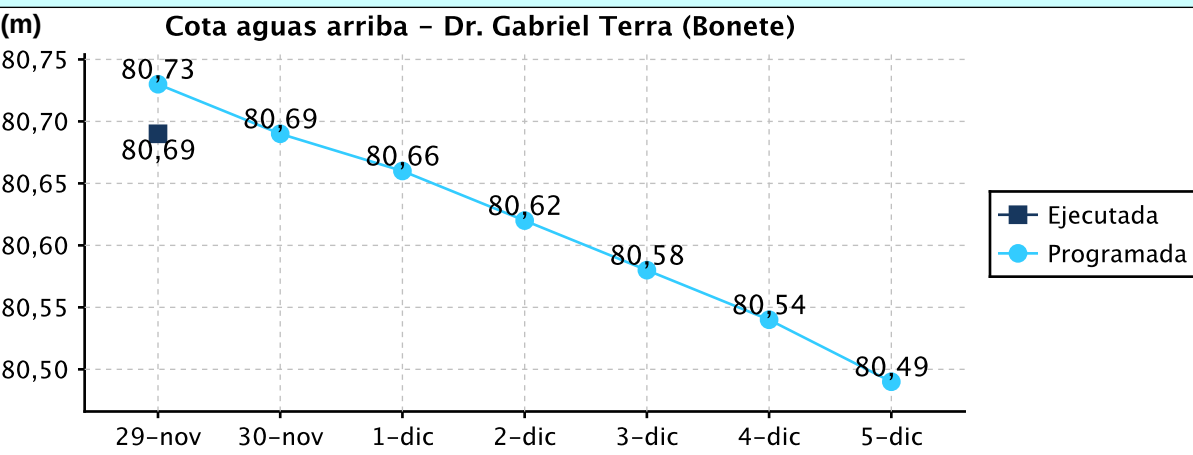


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,73	80,69
Baygorria	54,20	54,06
Palmar	39,94	40,06
SGU	34,99	35,19

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

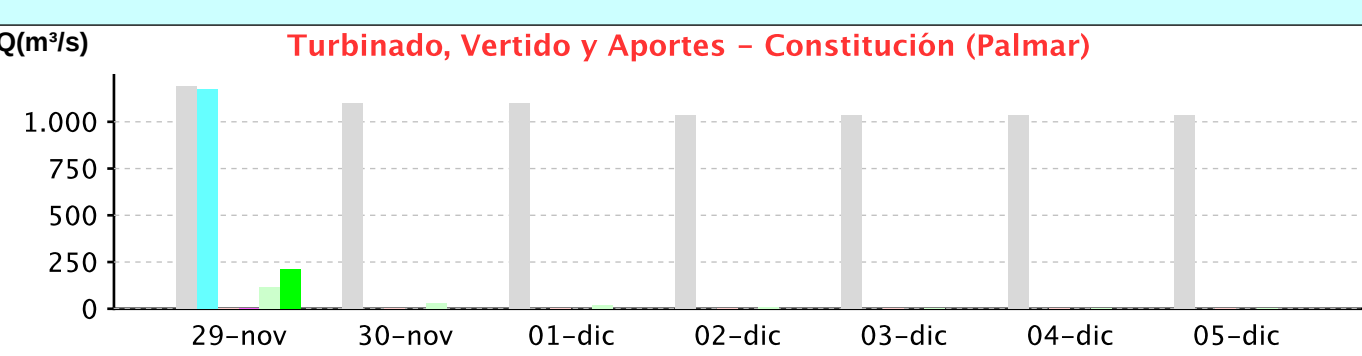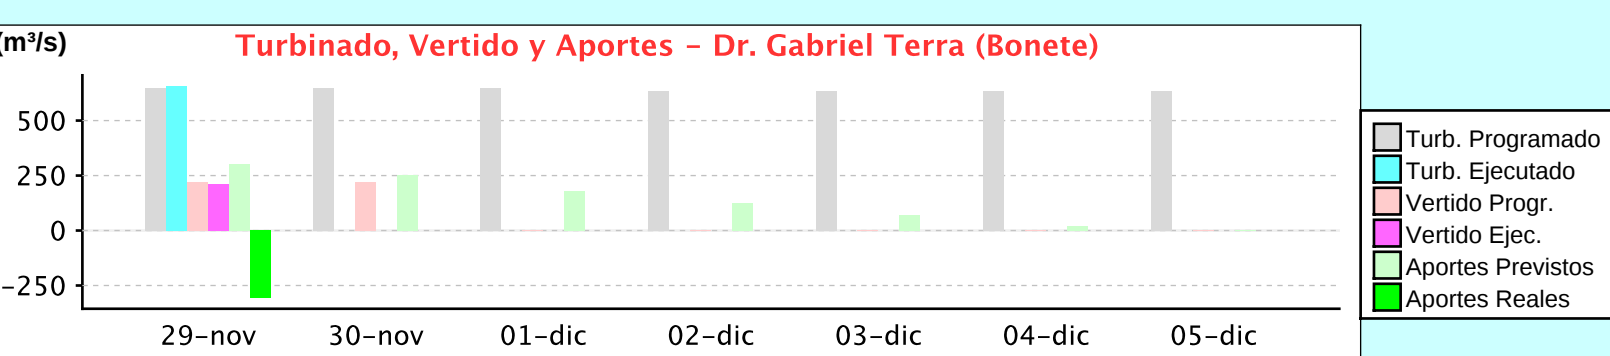

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

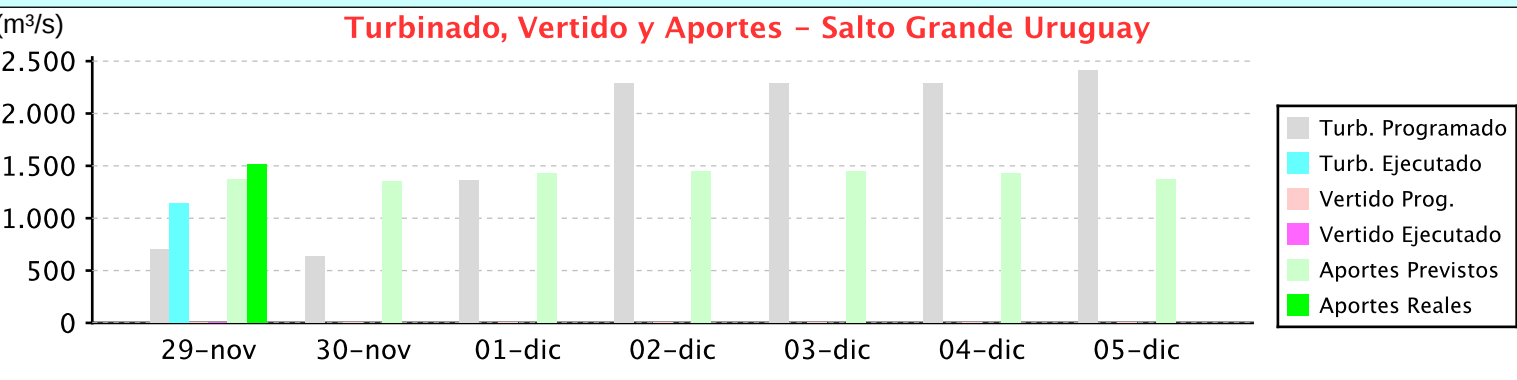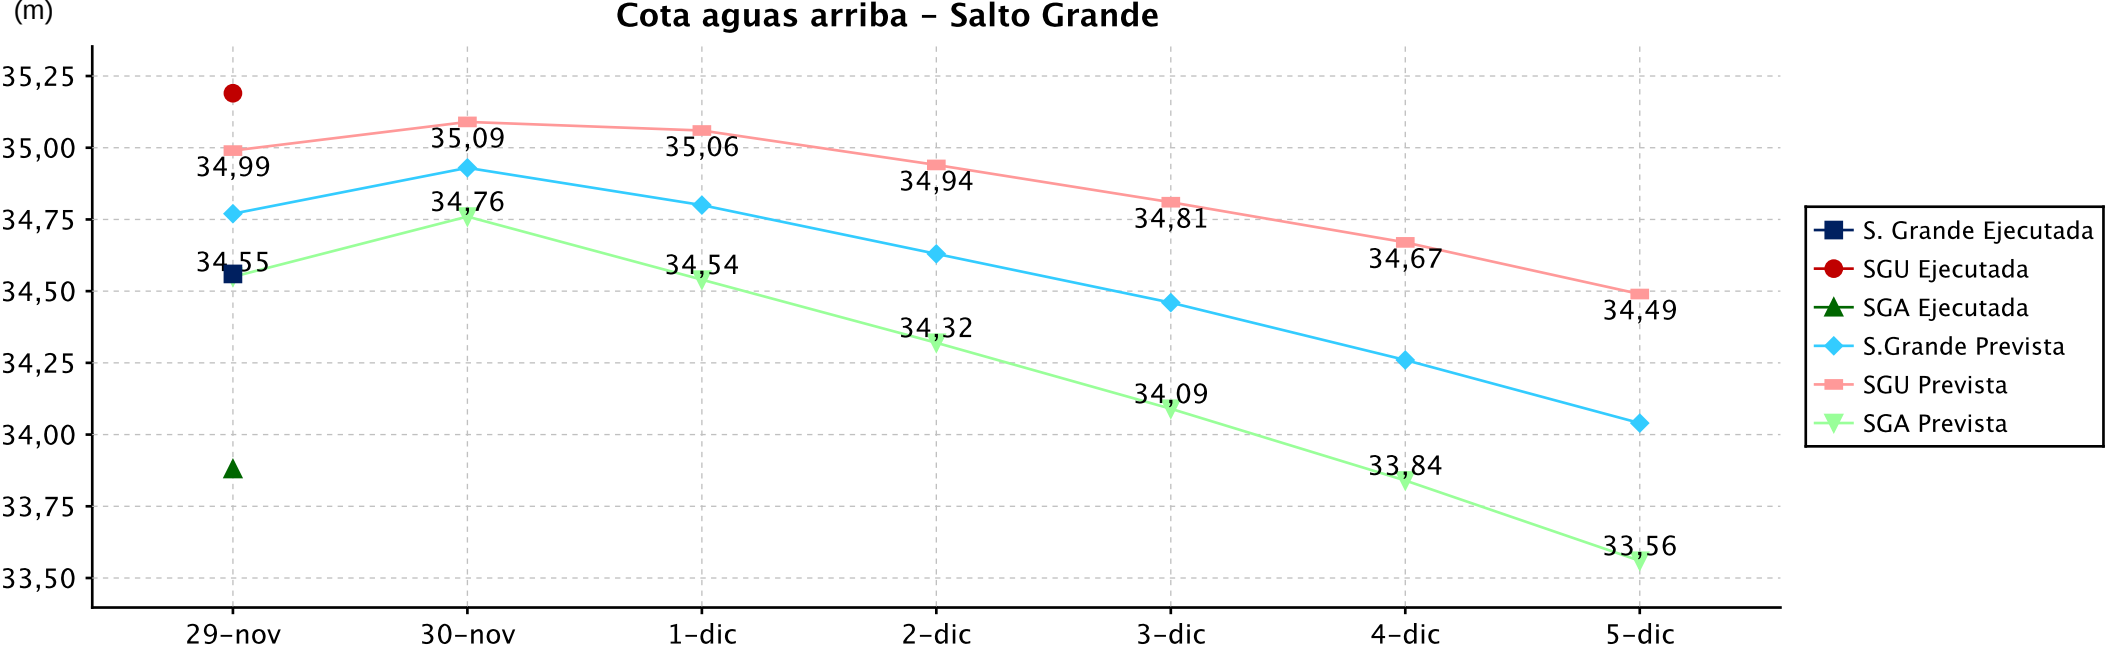

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,19
Cota Vista Arg	33,88
Cota real	34,56

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	29.086
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	658
Baygorria	712	834
Palmar	1.189	1.173
SGU	703	1.146

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	304	-308
Baygorria	0	8
Palmar	115	210
SGU	1.375	1.518

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	212
Baygorria	0	159
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
