




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 02 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-8
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-6
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.391
C. Baygorria	2.050
C. Palmar	7.903
C. Salto Grande	19.224
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.181
TOTAL Generación	37.689


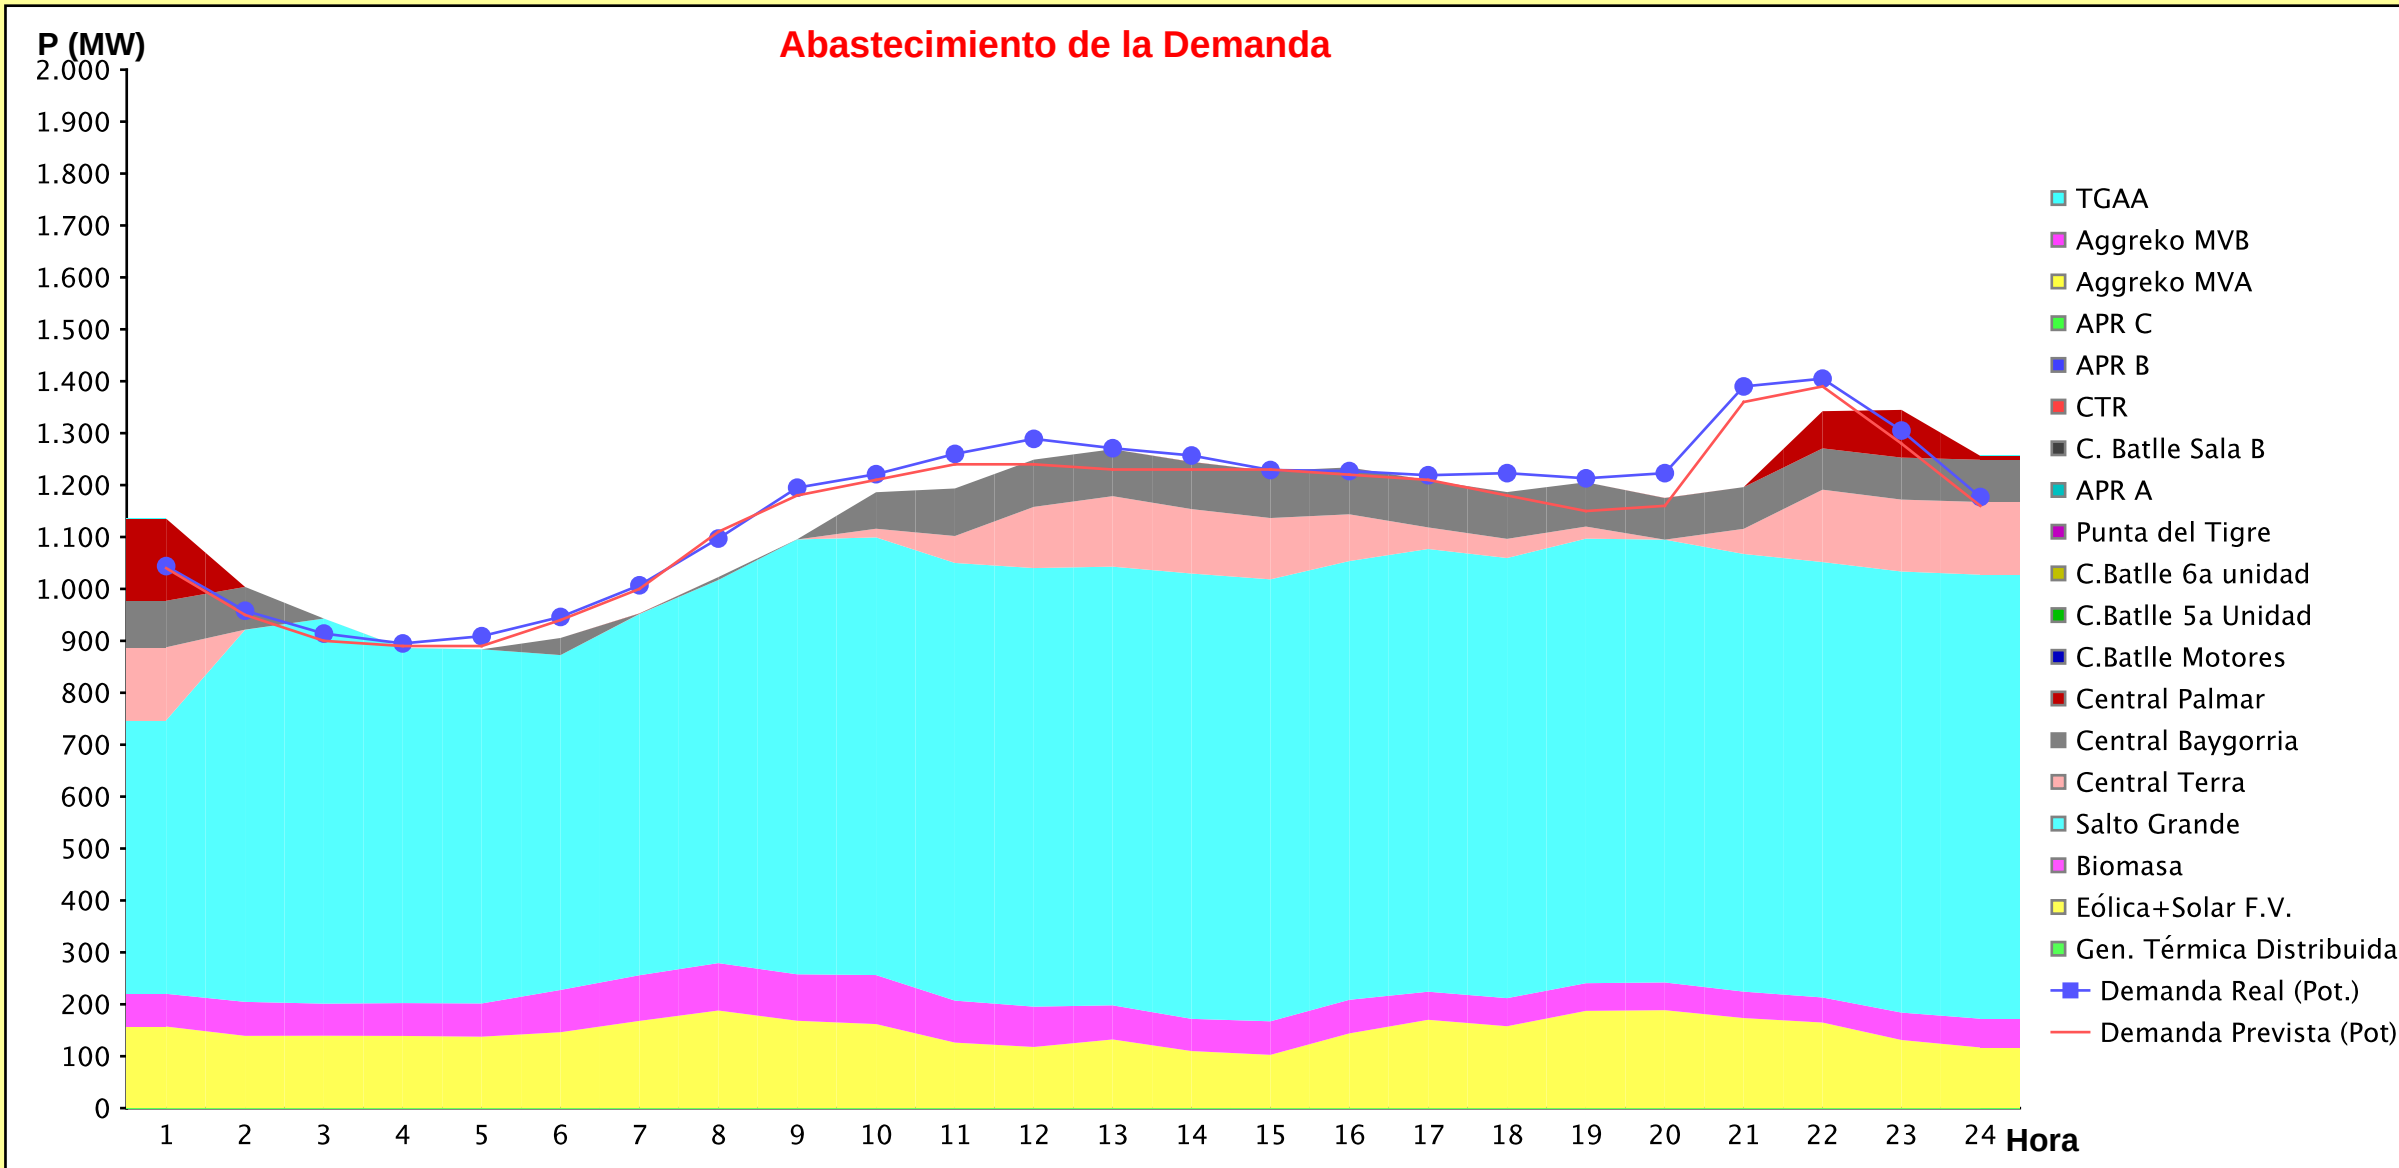


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	10.395
Hidráulica	10.395
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	10.395

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.294
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	27.390
Diferencia (MWh)	-96
Ejecutada - Programada	-0,35 %


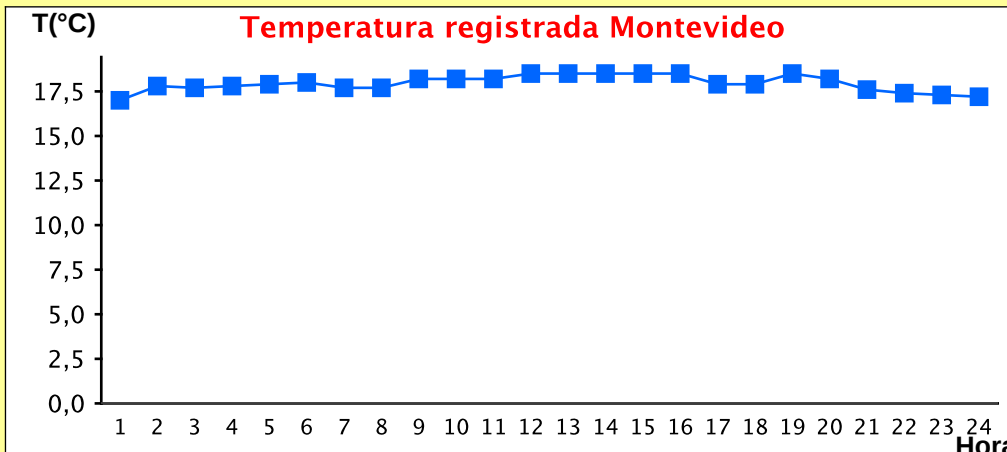


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1298,97 Hora 12:27
Potencia mínima:	876,48 Hora 04:11
Pico noche:	1436,8 Hora 21:35
Generación Media (MW)	
Eólica	149,2
Biomasa	75,2
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

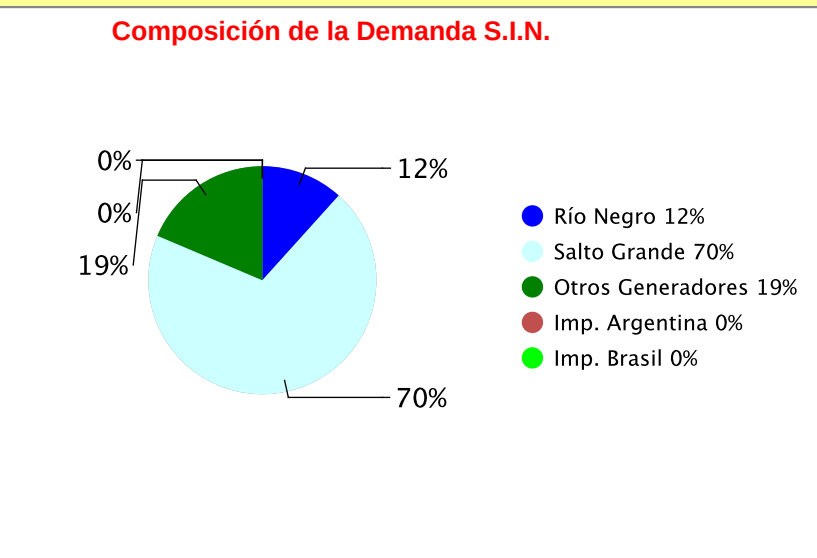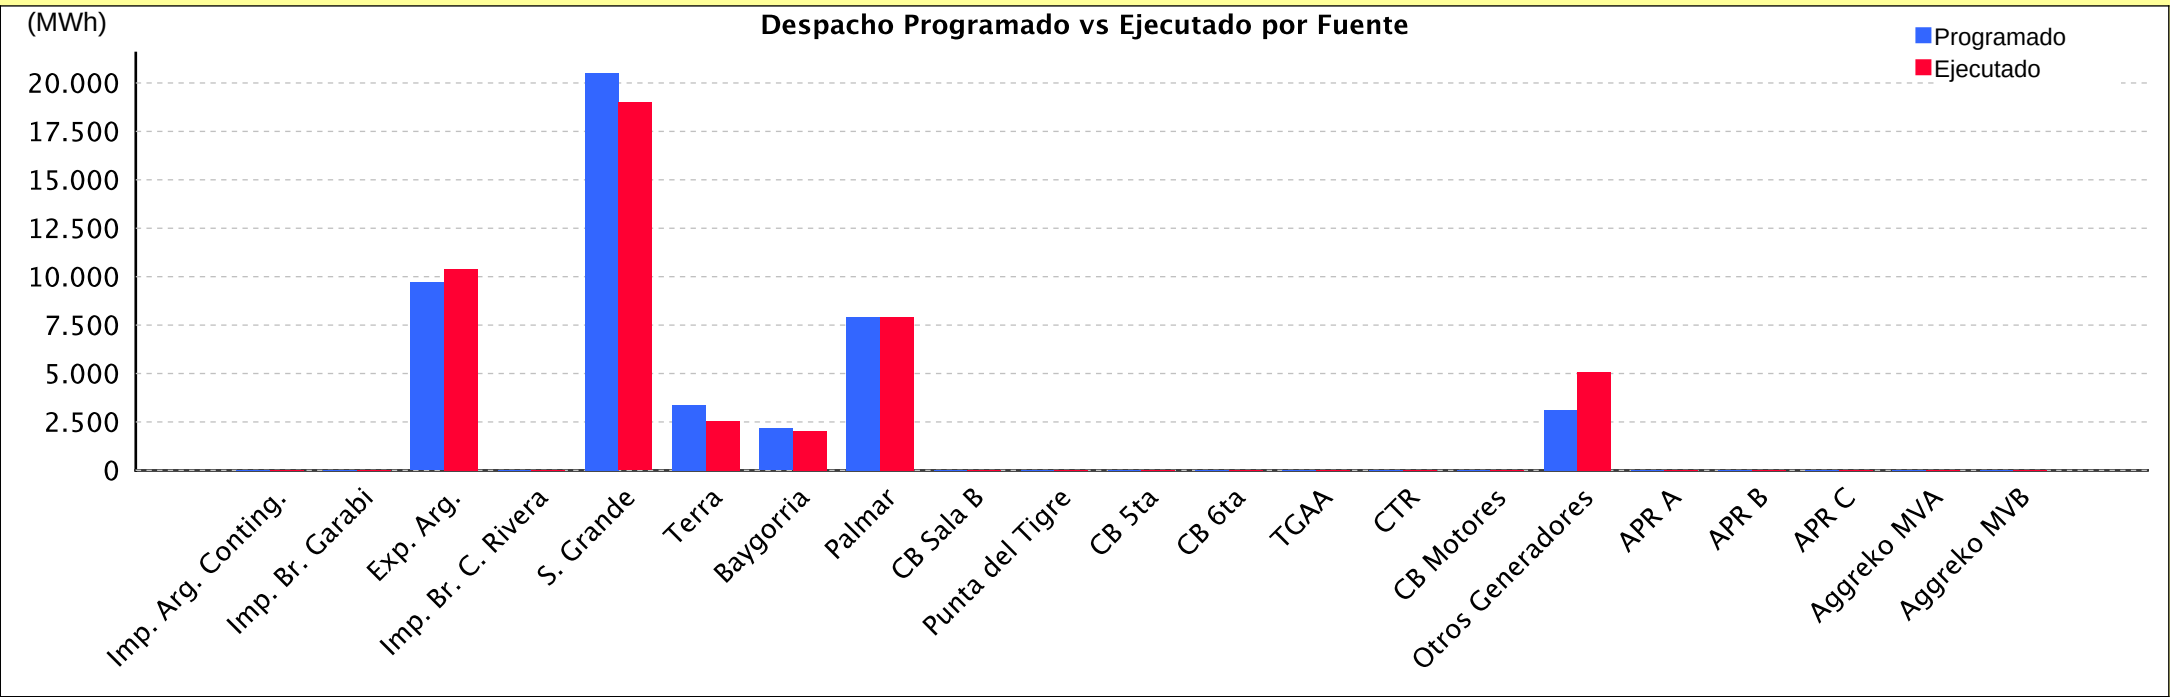



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

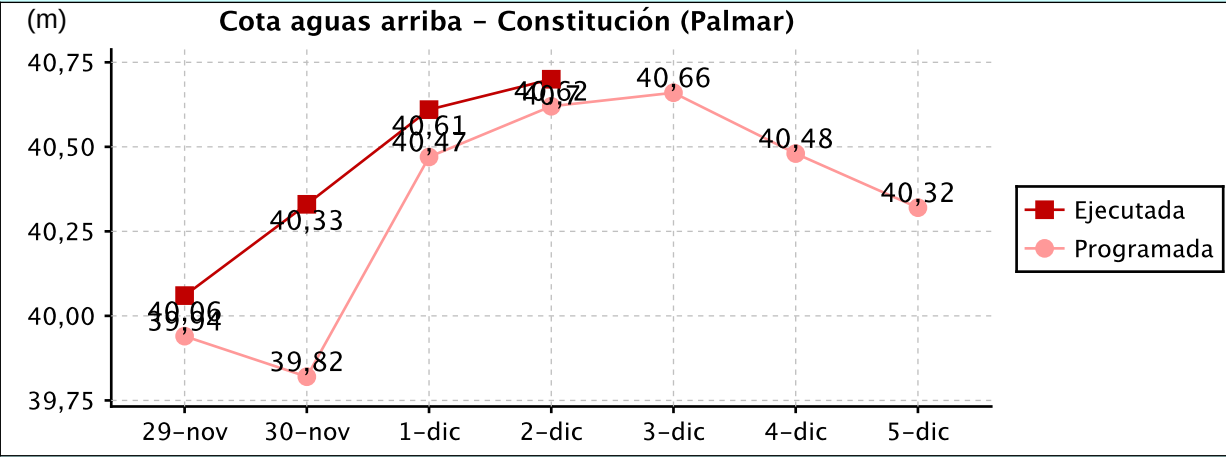
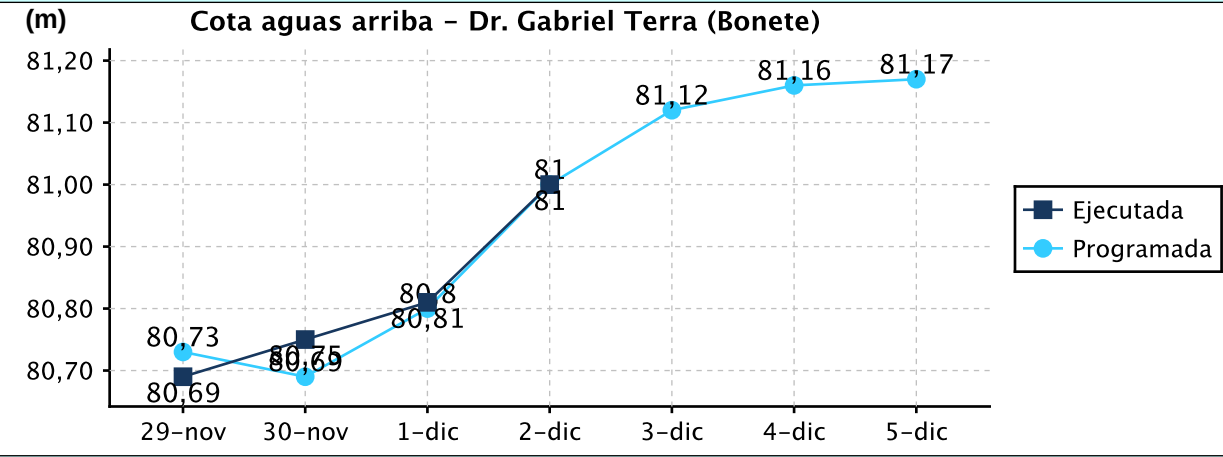


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,00	81
Baygorria	54,22	54,31
Palmar	40,62	40,7
SGU	35,41	35,63

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

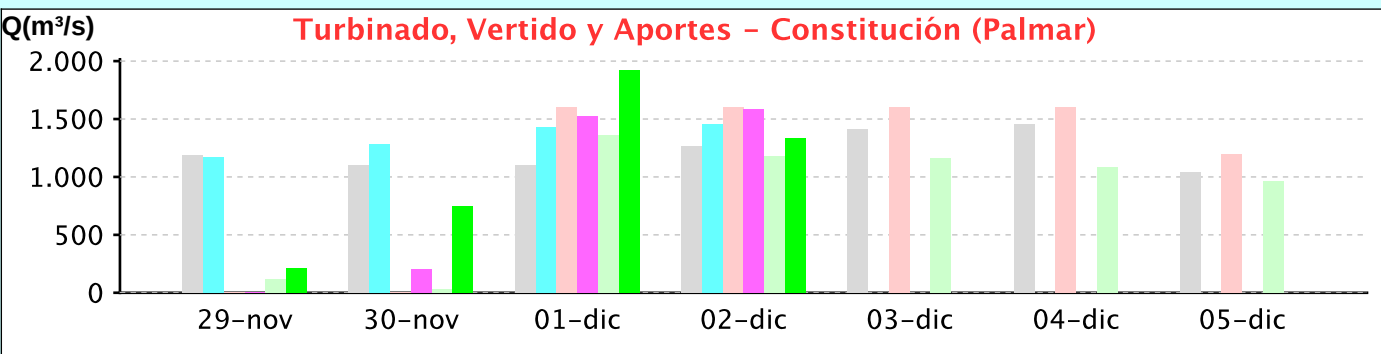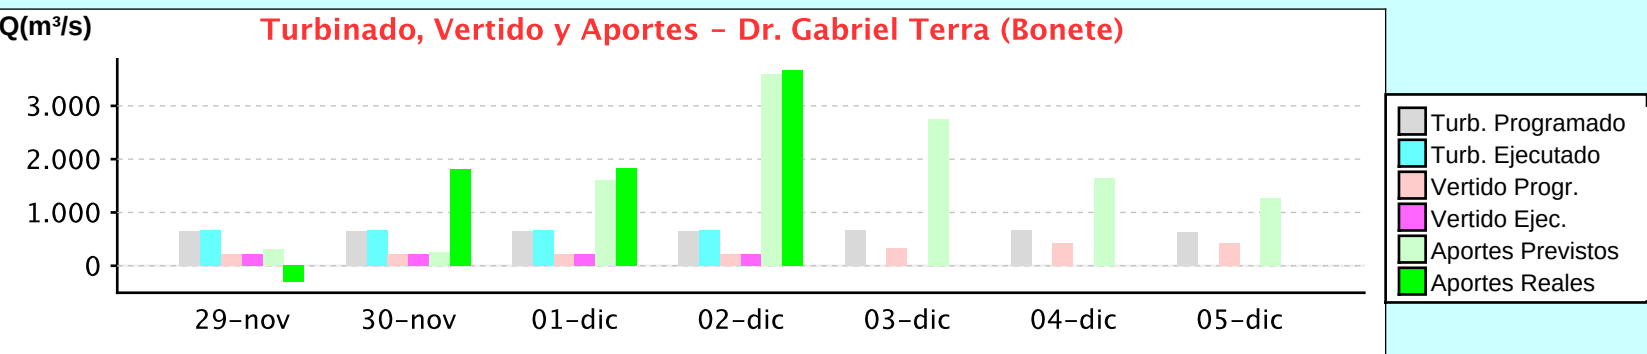

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

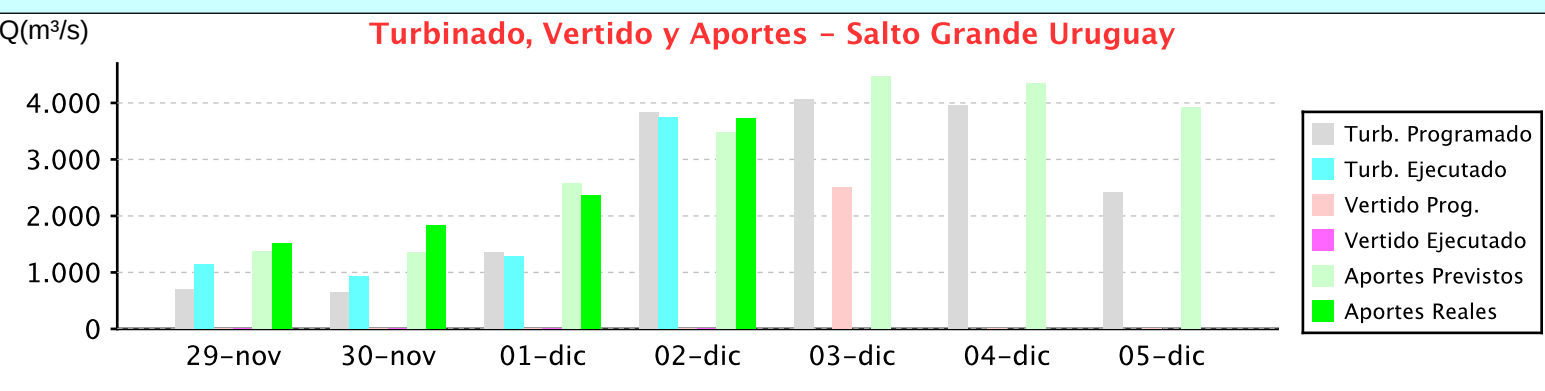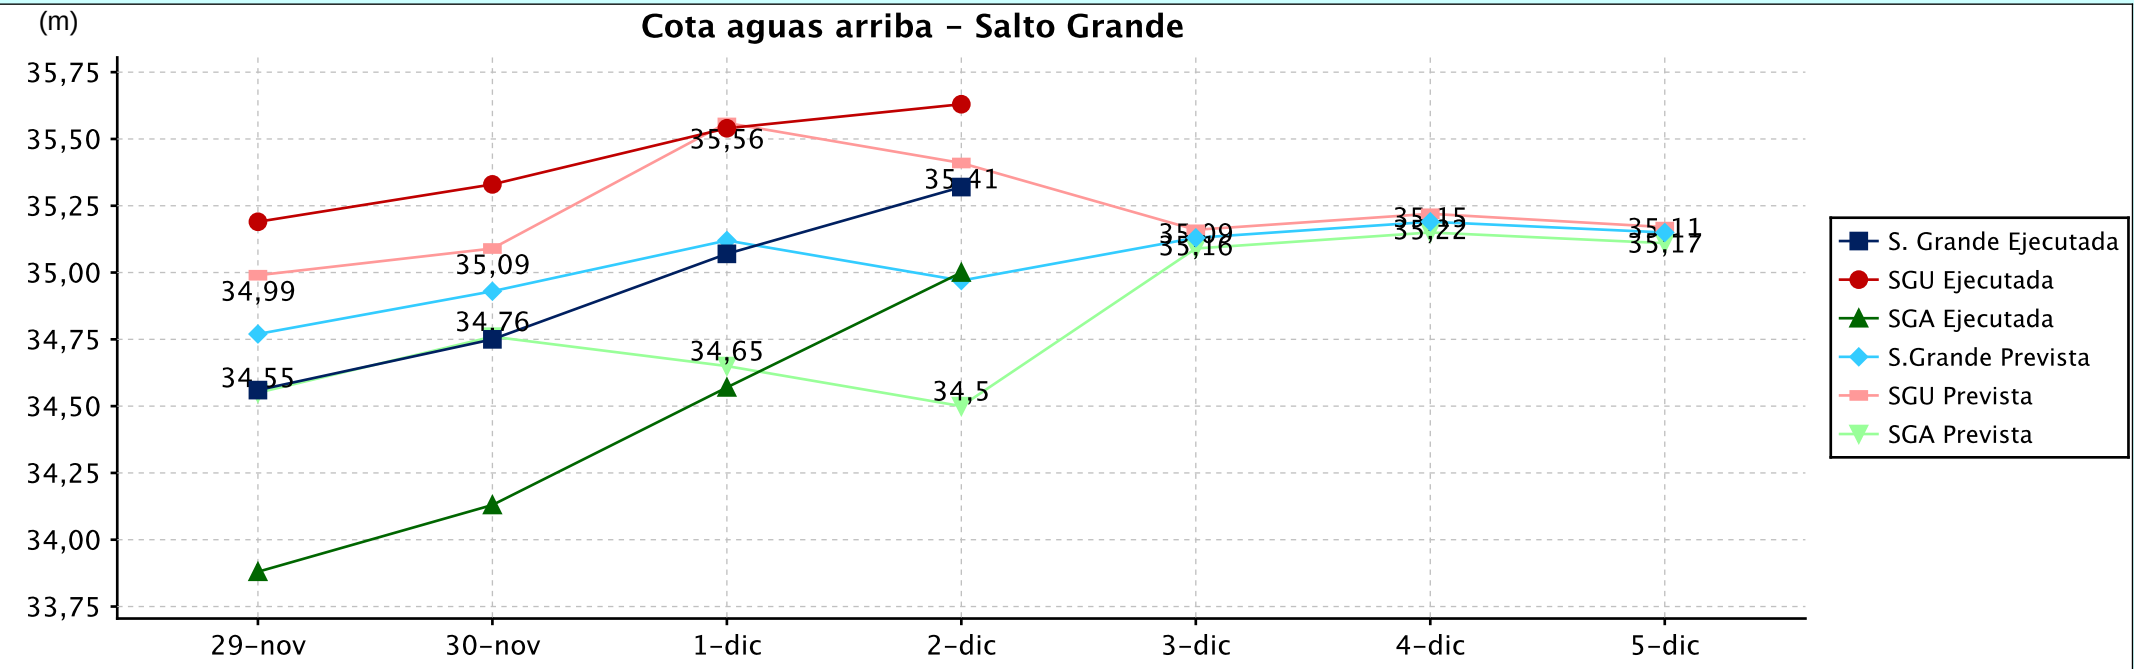

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,63
Cota Vista Arg	35,00
Cota real	35,32

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	15.211
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	666
Baygorria	801	861
Palmar	1.263	1.453
SGU	3.830	3.739

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	3.583	3.674
Baygorria	1.014	1.409
Palmar	1.176	1.333
SGU	3.475	3.720

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	1.000	1.254
Palmar	1.600	1.584
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 433 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
