




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 05 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-7
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-10
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.380
C. Baygorria	2.107
C. Palmar	7.895
C. Salto Grande	19.302
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.370
TOTAL Generación	40.988

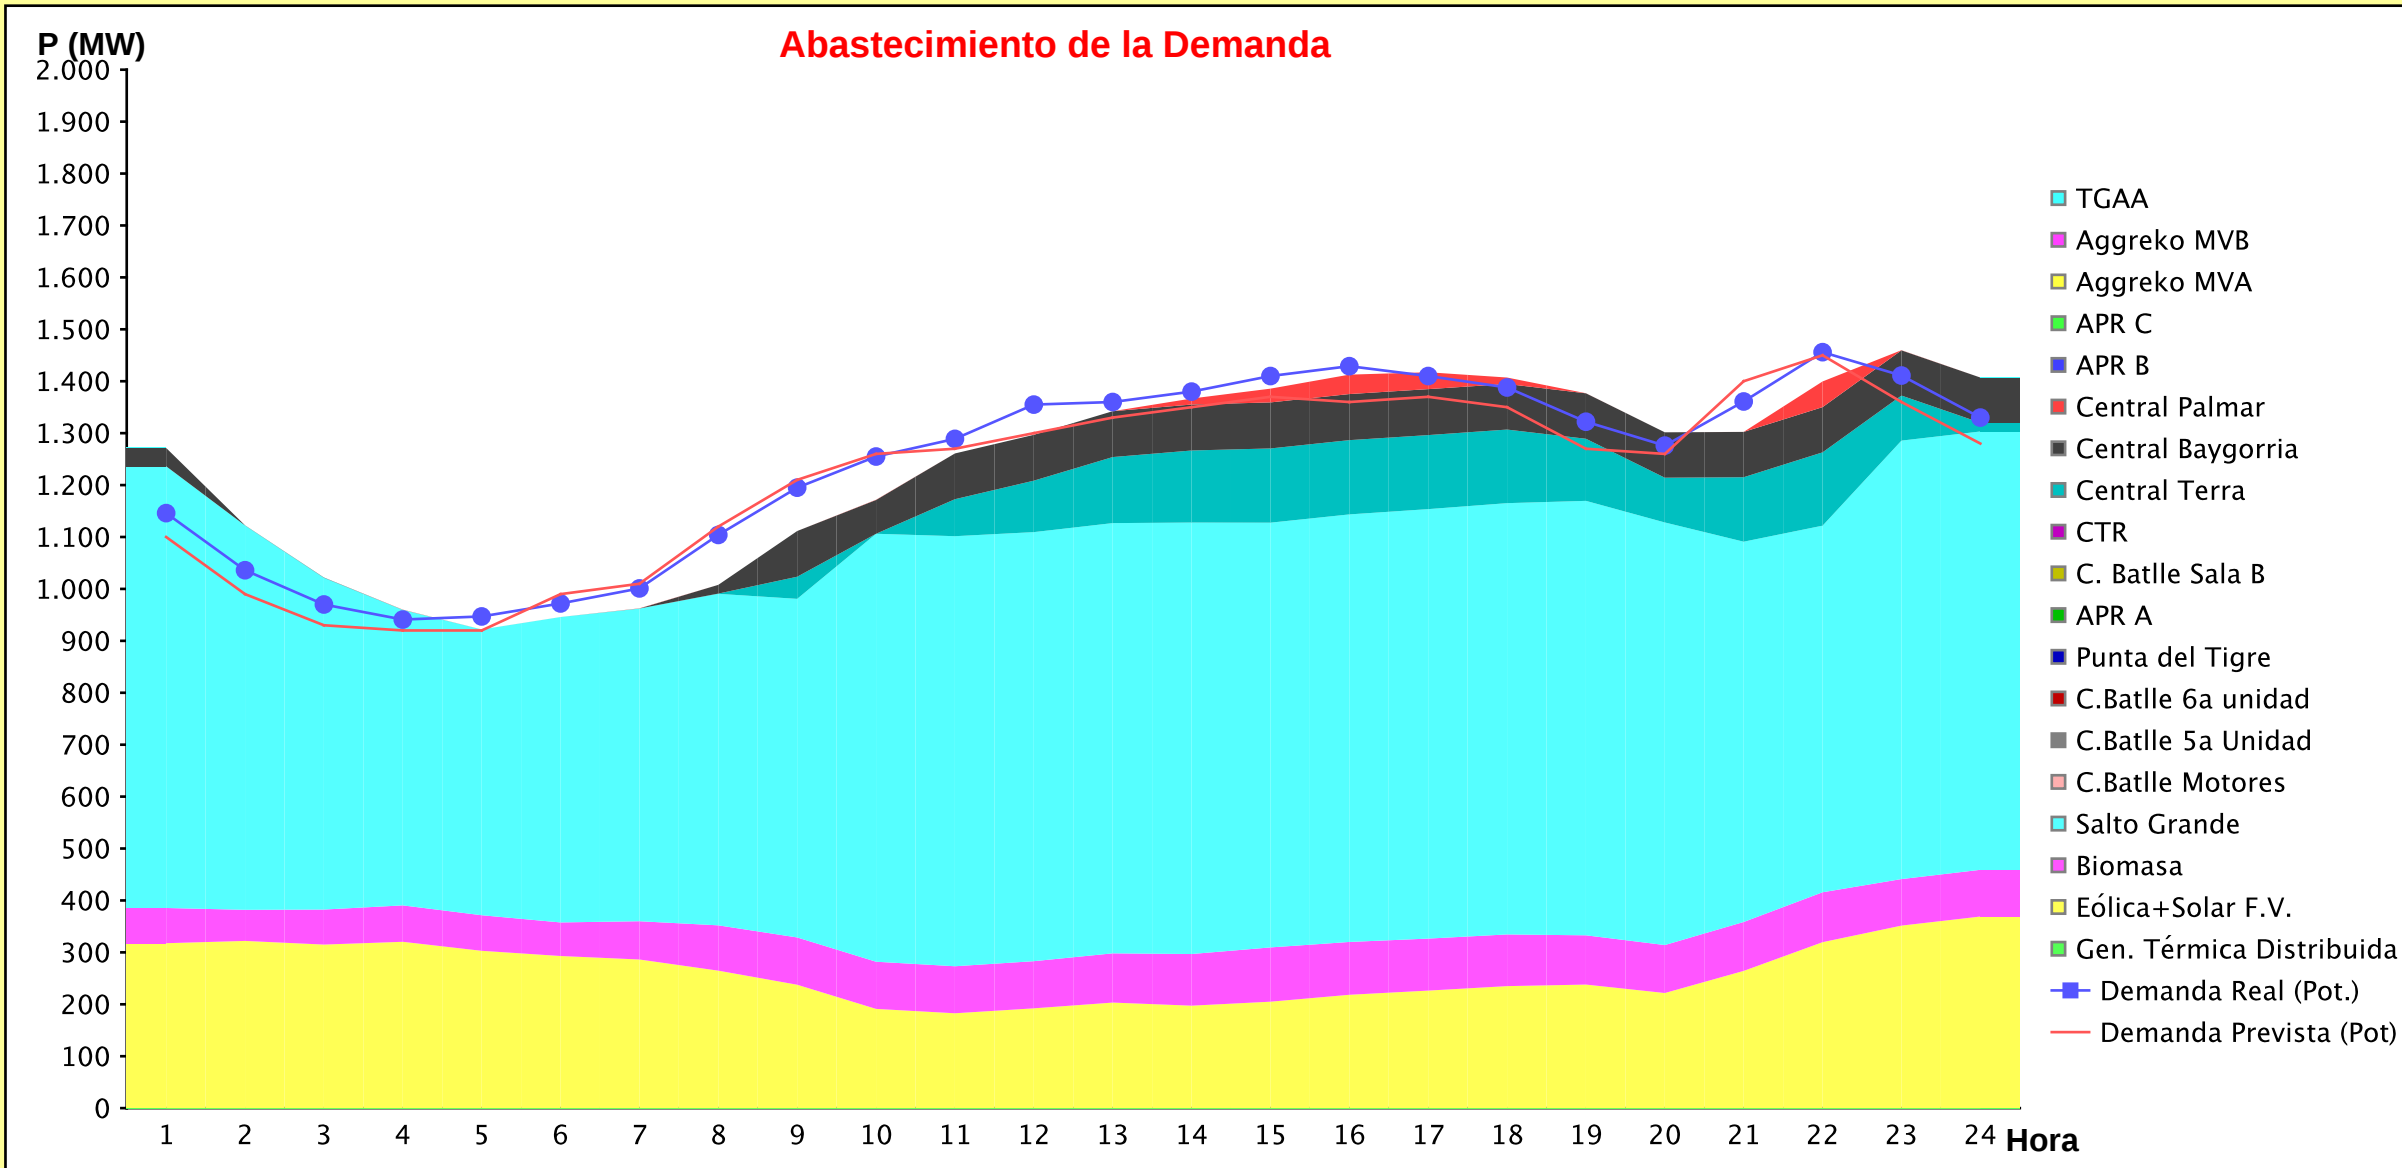

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.412
Hidráulica	11.412
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.412




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.576
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.170
Diferencia (MWh)	406
Ejecutada - Programada	1,39 %

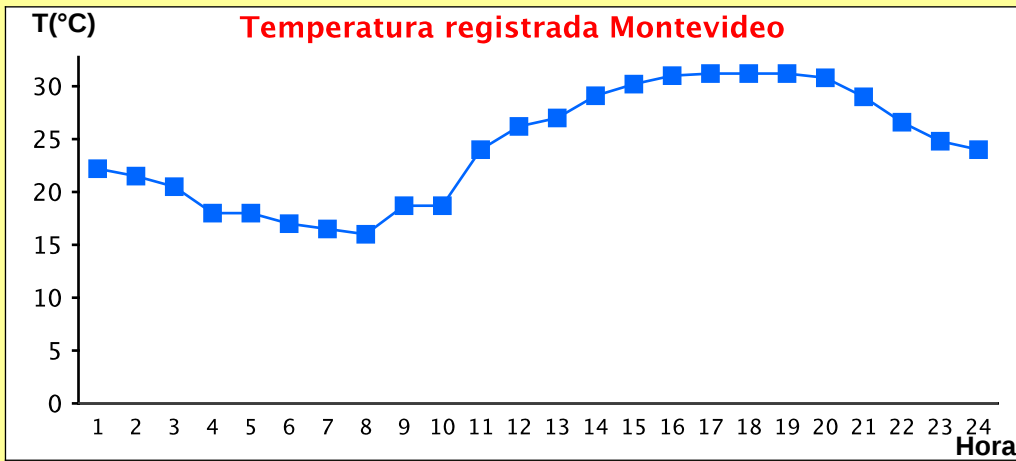



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1433,89 Hora 15:57
Potencia mínima:	928,67 Hora 04:46
Pico noche:	1466,24 Hora 21:42

Generación Media (MW)	
Eólica	261,7
Biomasa	86,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

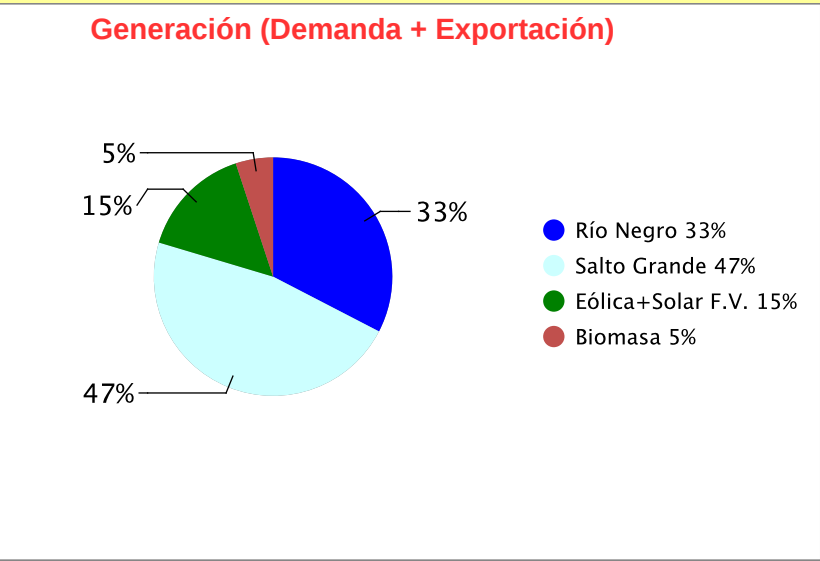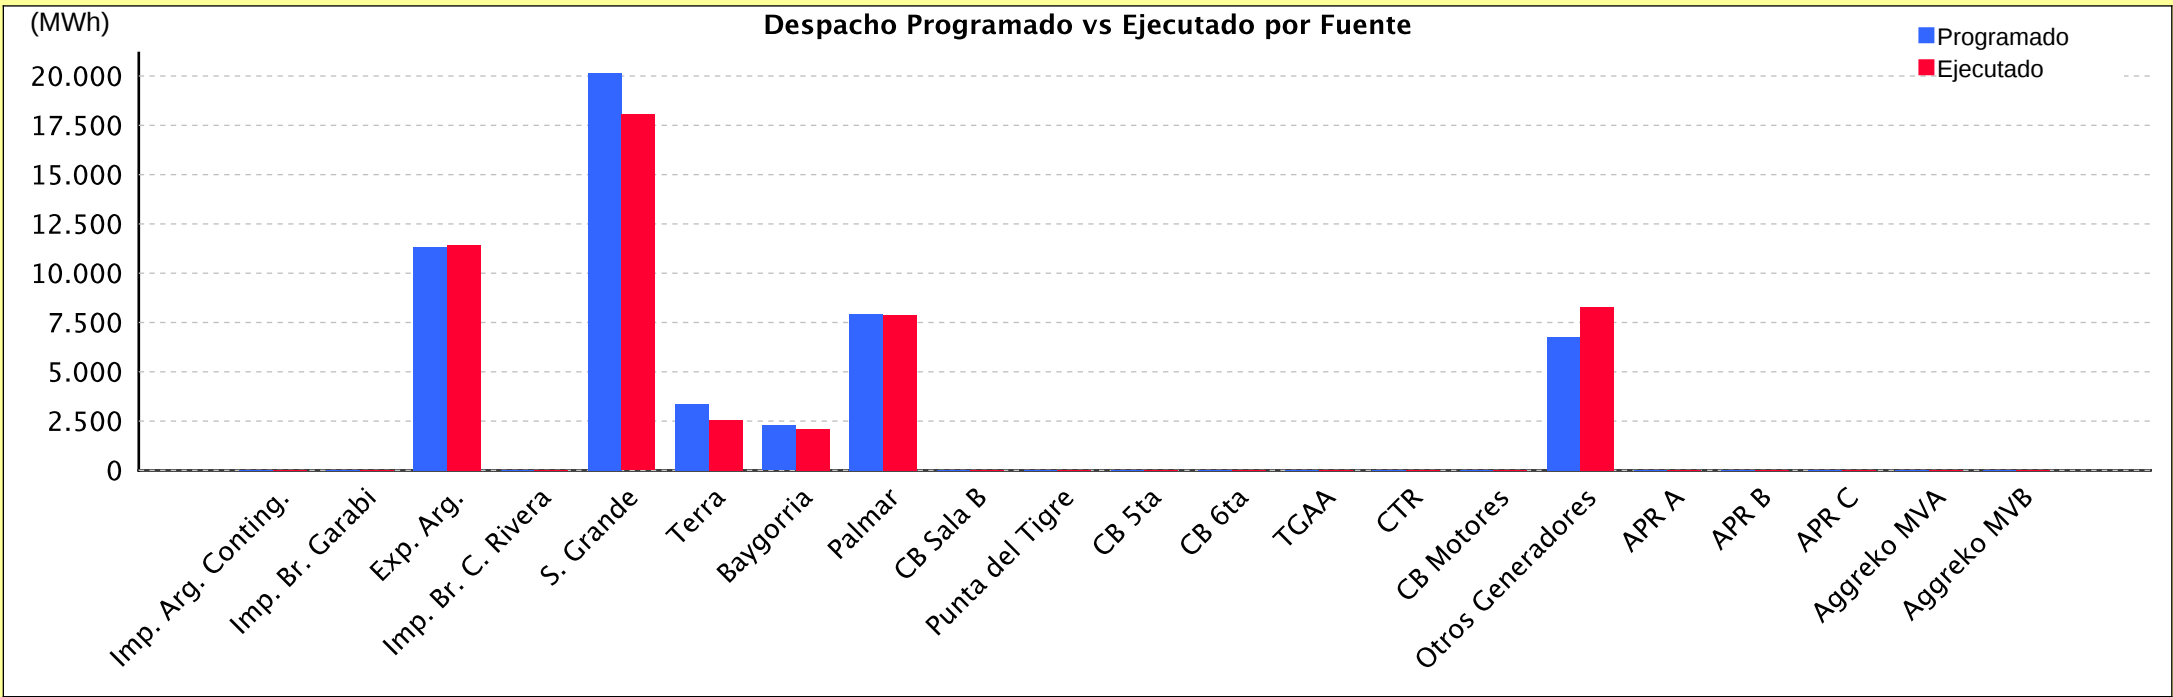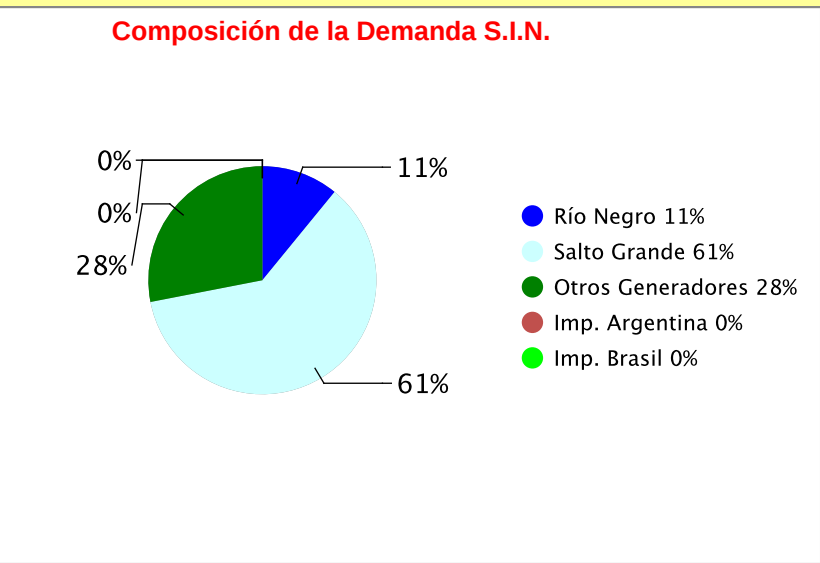



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

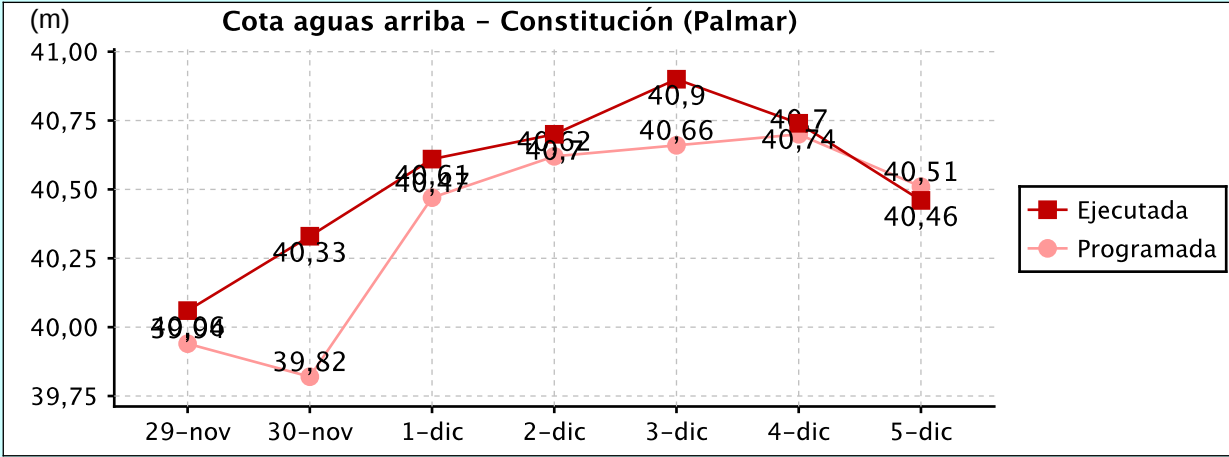
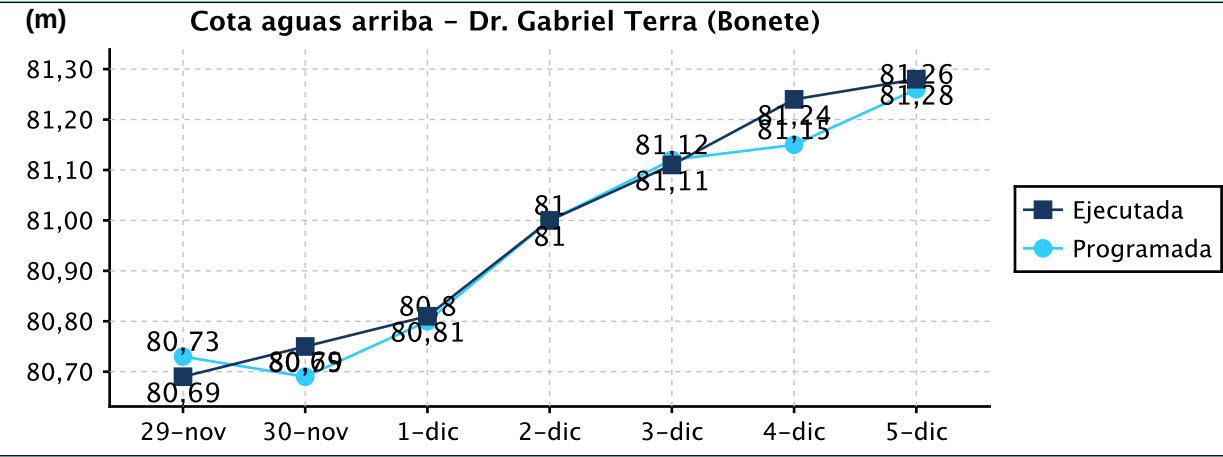


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,26	81,28
Baygorria	54,21	54,22
Palmar	40,51	40,46
SGU	35,76	35,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

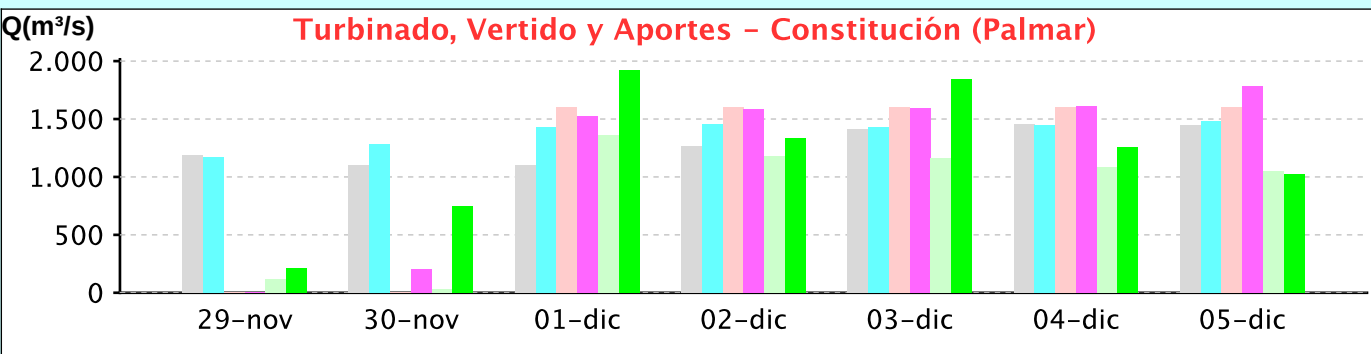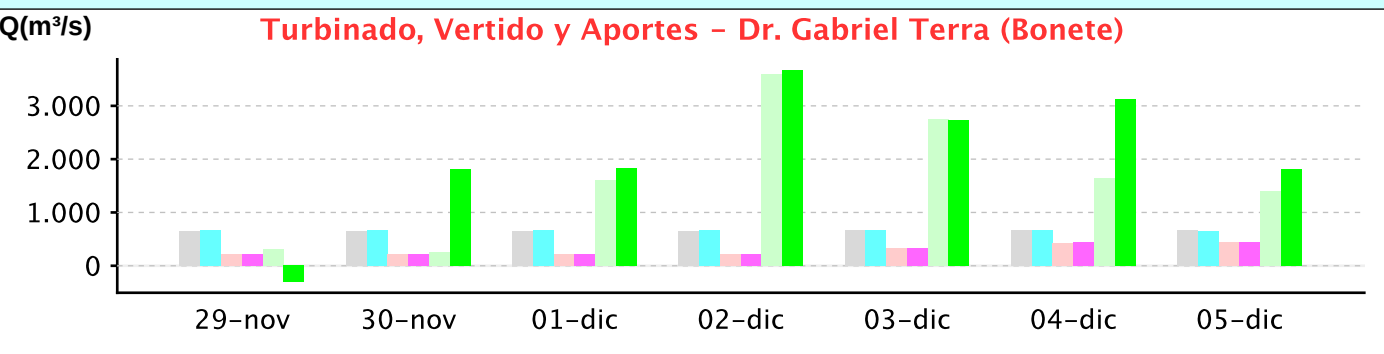

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

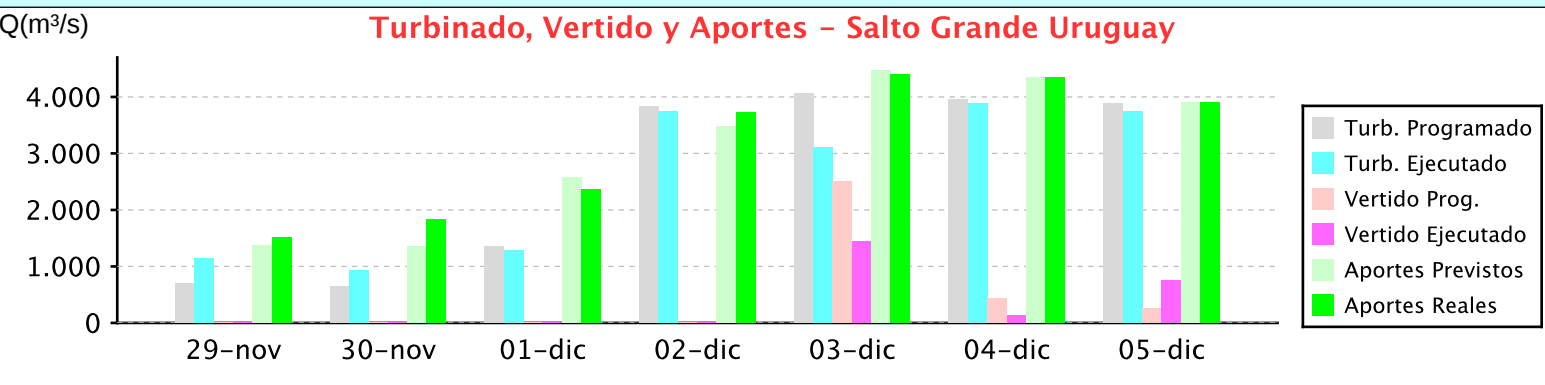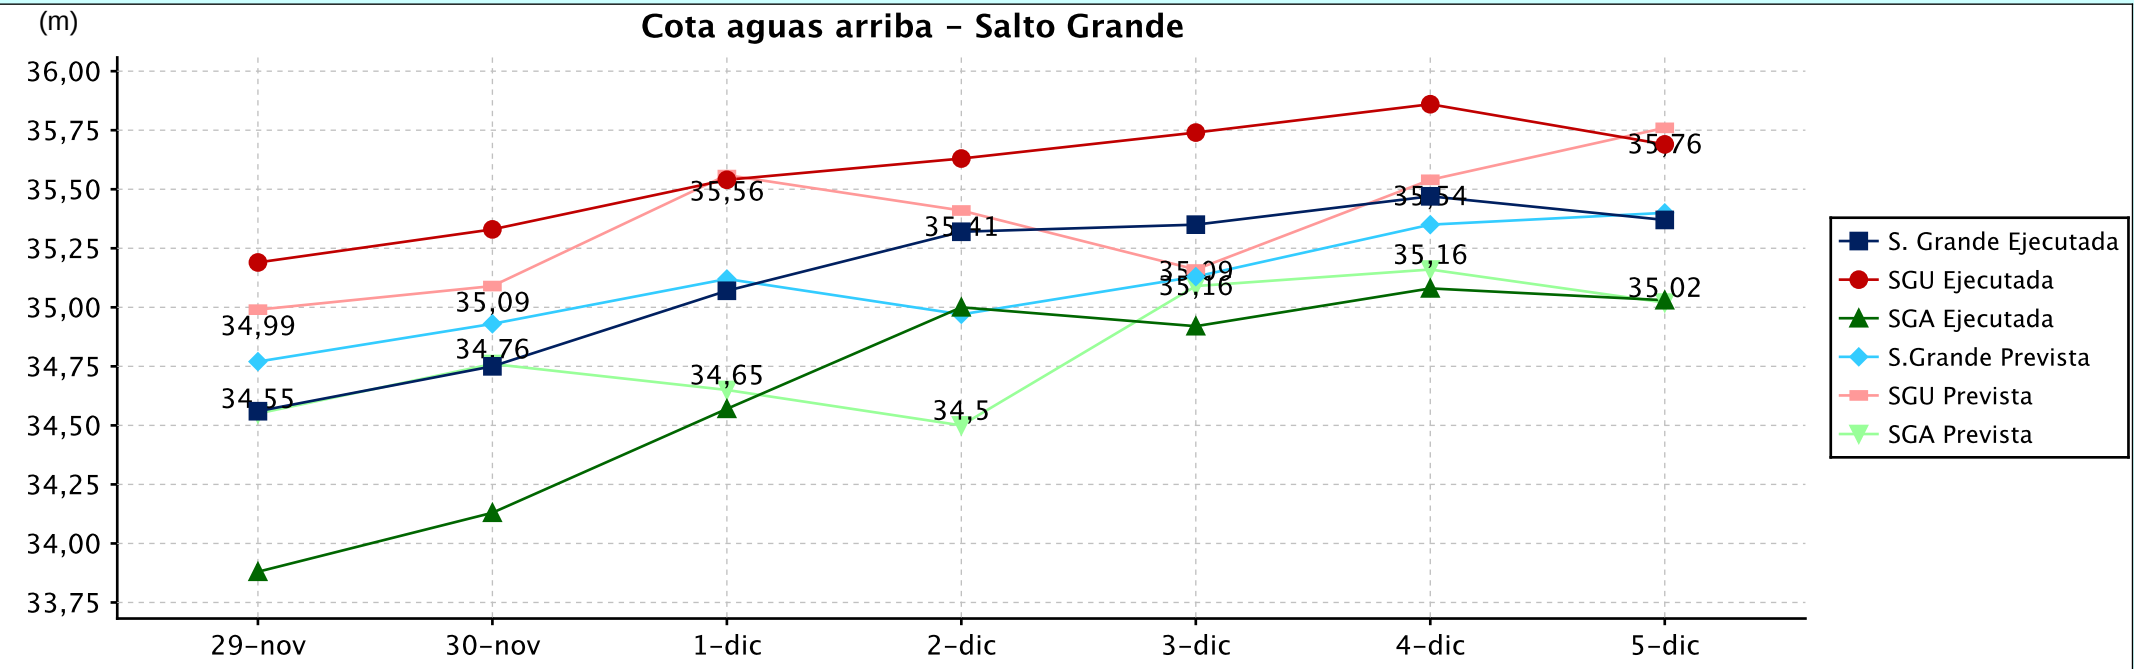

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,69
Cota Vista Arg	35,03
Cota real	35,37
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
16.082	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	656
Baygorria	942	796
Palmar	1.444	1.479
SGU	3.891	3.737

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.400	1.811
Baygorria	20	75
Palmar	1.050	1.023
SGU	3.900	3.904

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	443
Baygorria	280	364
Palmar	1.600	1.784
SGU	250	752

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
