




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 06 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-7
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.408
C. Baygorria	2.127
C. Palmar	6.988
C. Salto Grande	19.688
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.436
TOTAL Generación	40.583

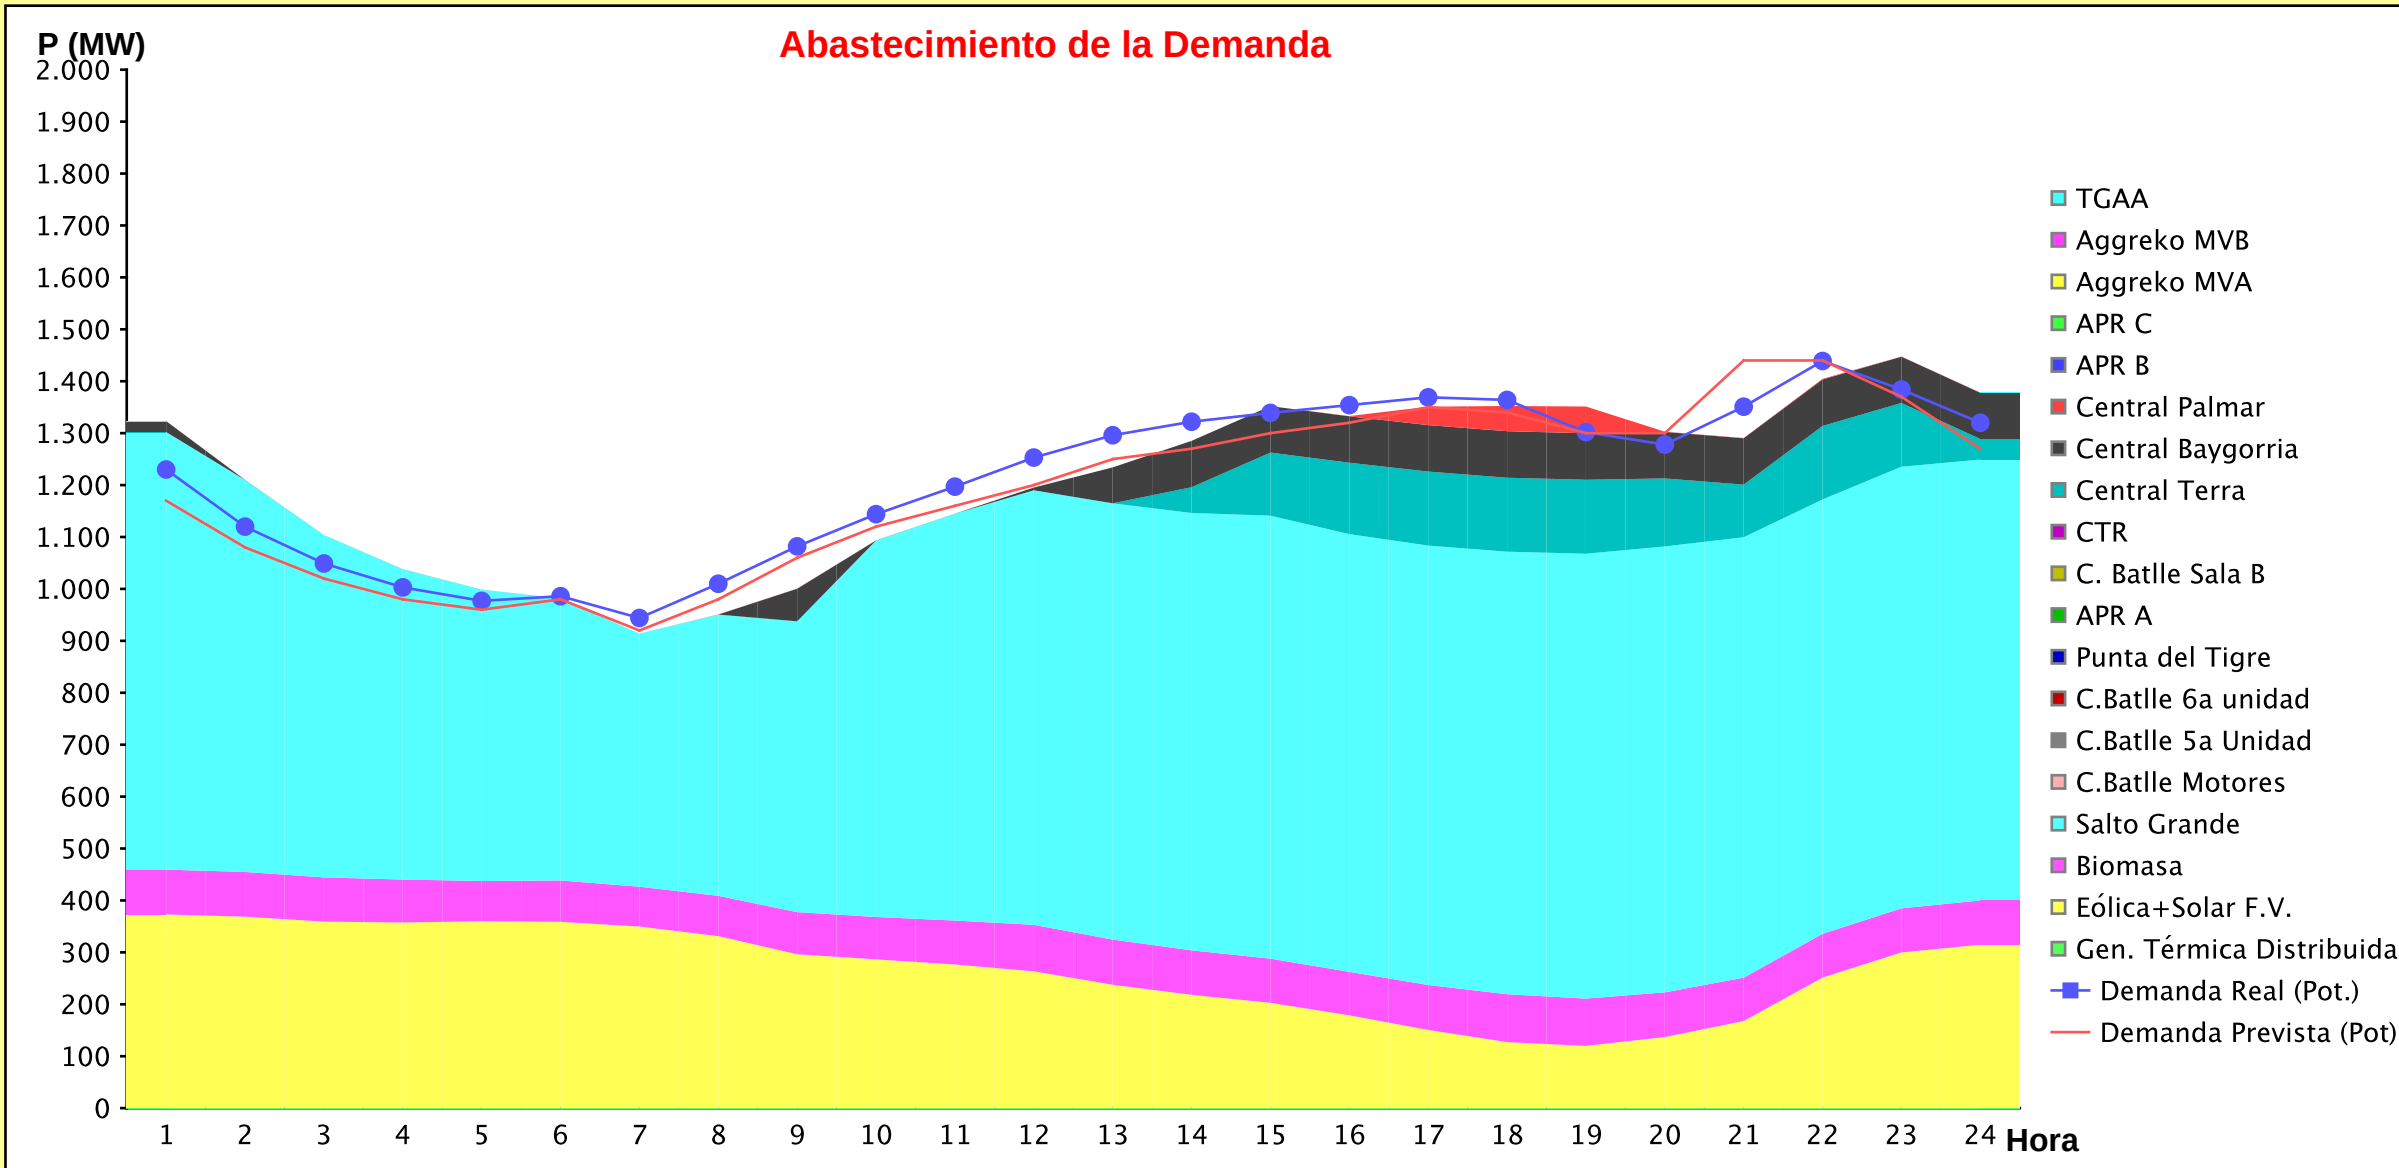

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.591
Hidráulica	11.591
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.591




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.992
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.580
Diferencia (MWh)	412
Ejecutada - Programada	1,44 %

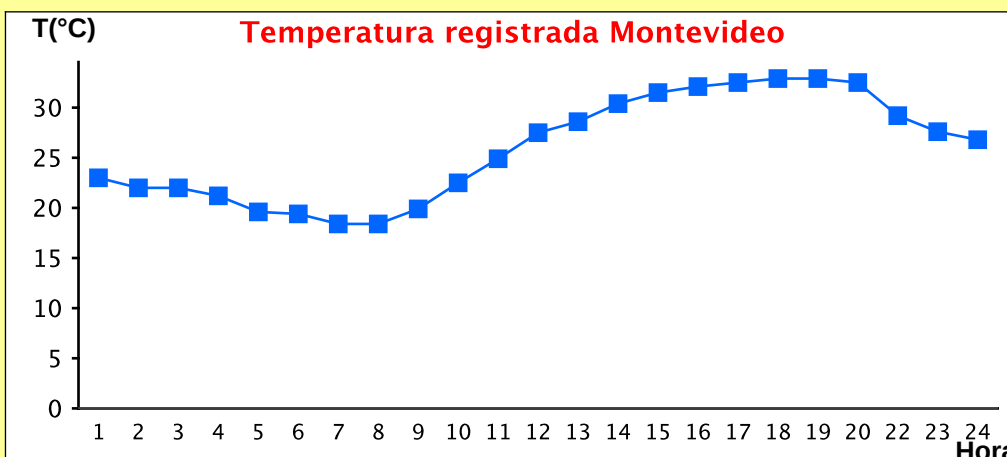



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1375,1 Hora 16:50
Potencia mínima:	931,07 Hora 06:53
Pico noche:	1457,35 Hora 21:41

Generación Media (MW)	
Eólica	266,2
Biomasa	84,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

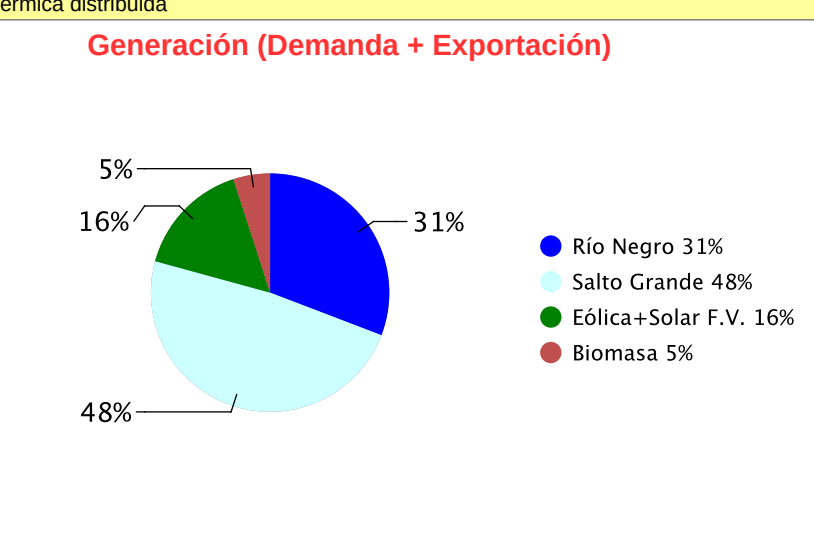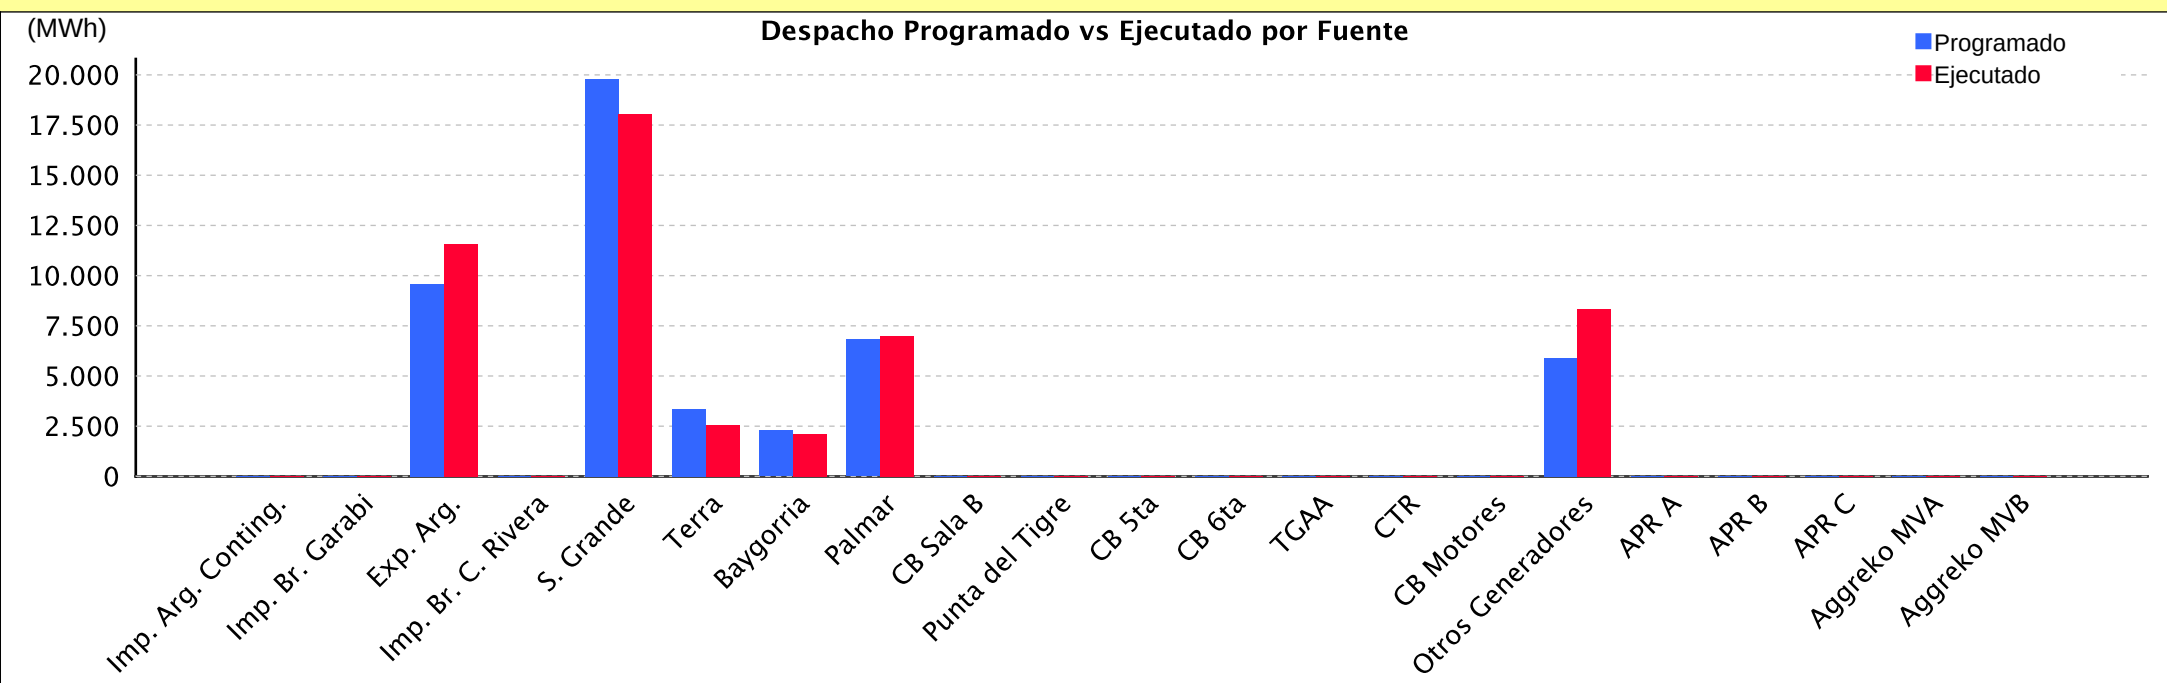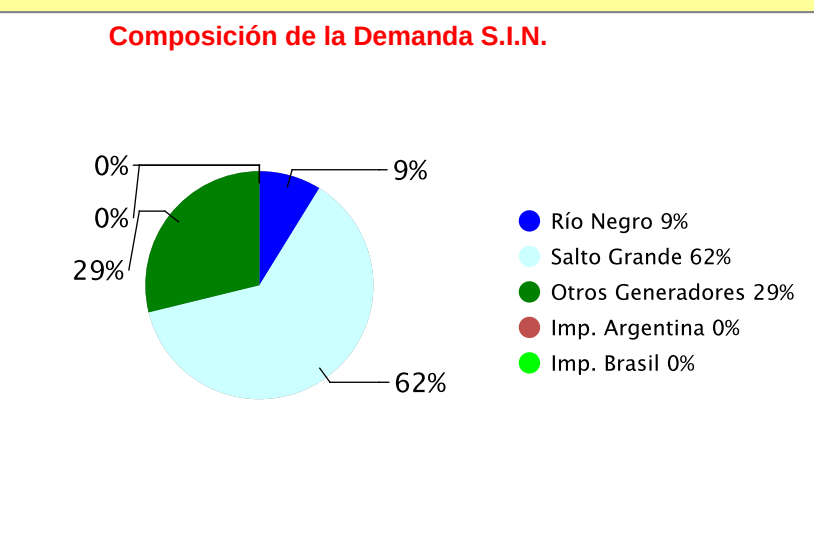



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

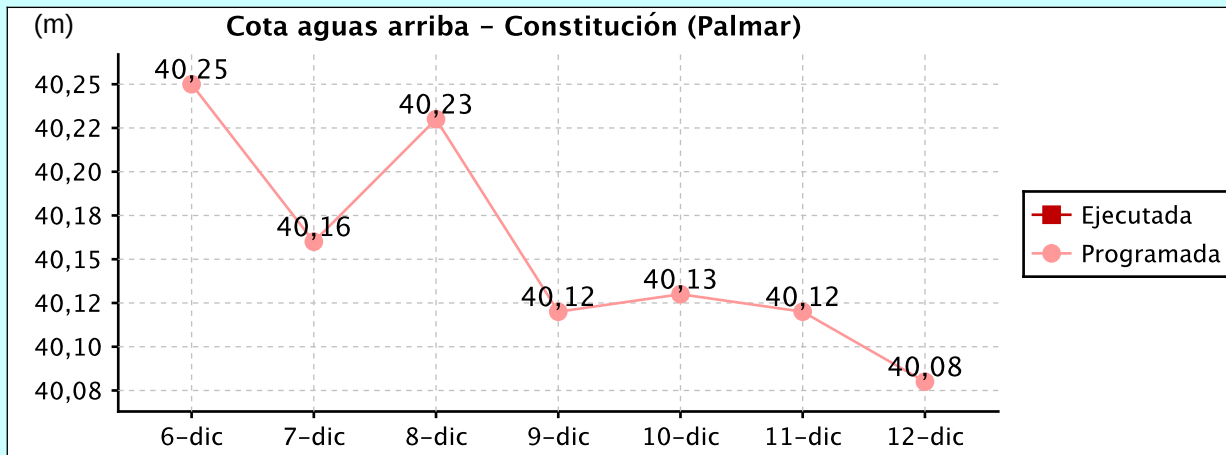
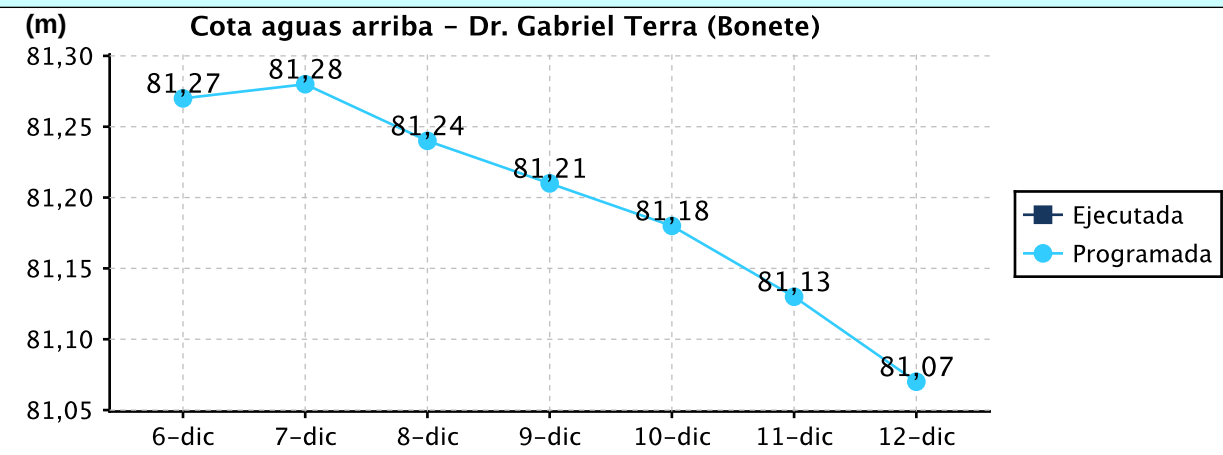


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Baygorria	54,22	
SGU	35,61	
Terra	81,27	
Palmar	40,25	

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

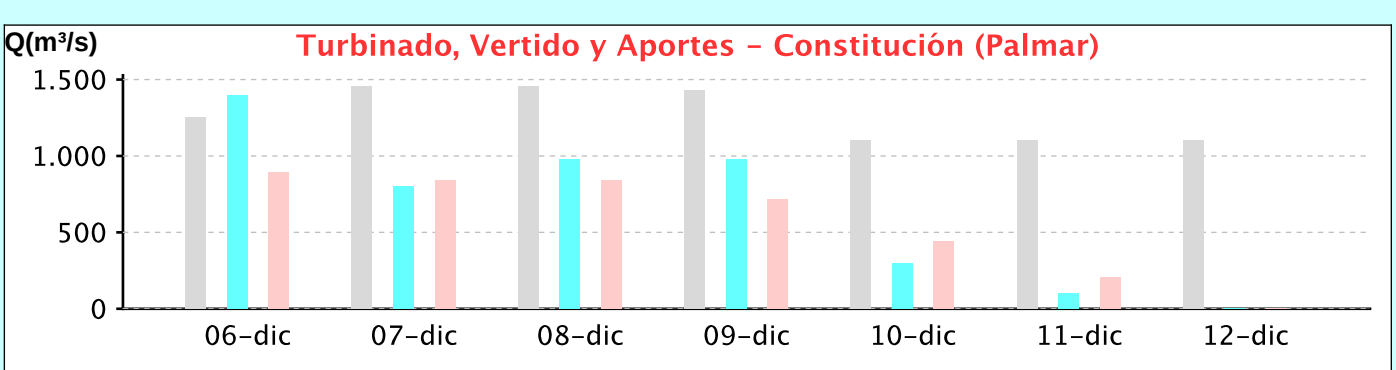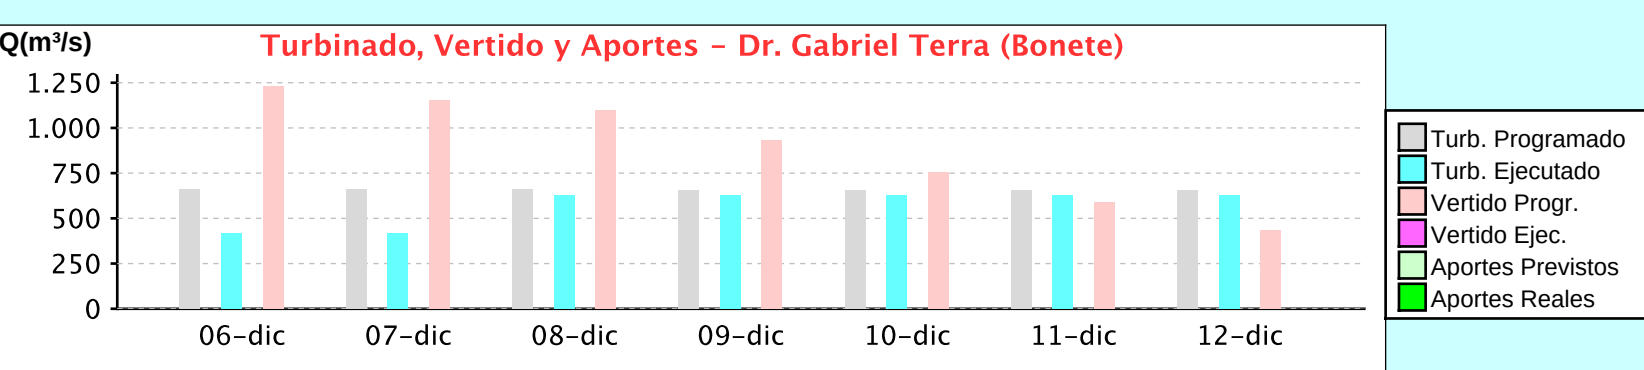

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

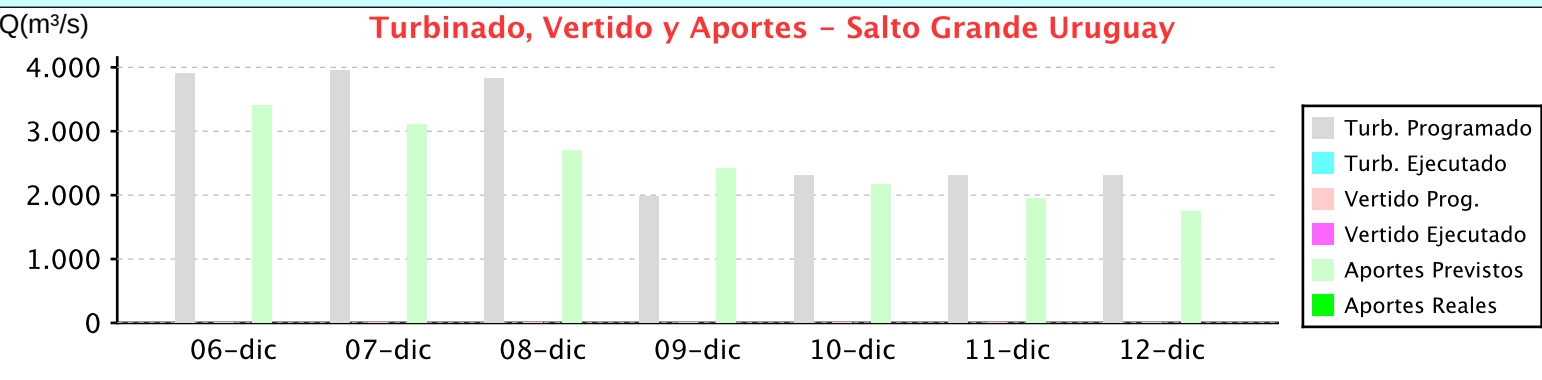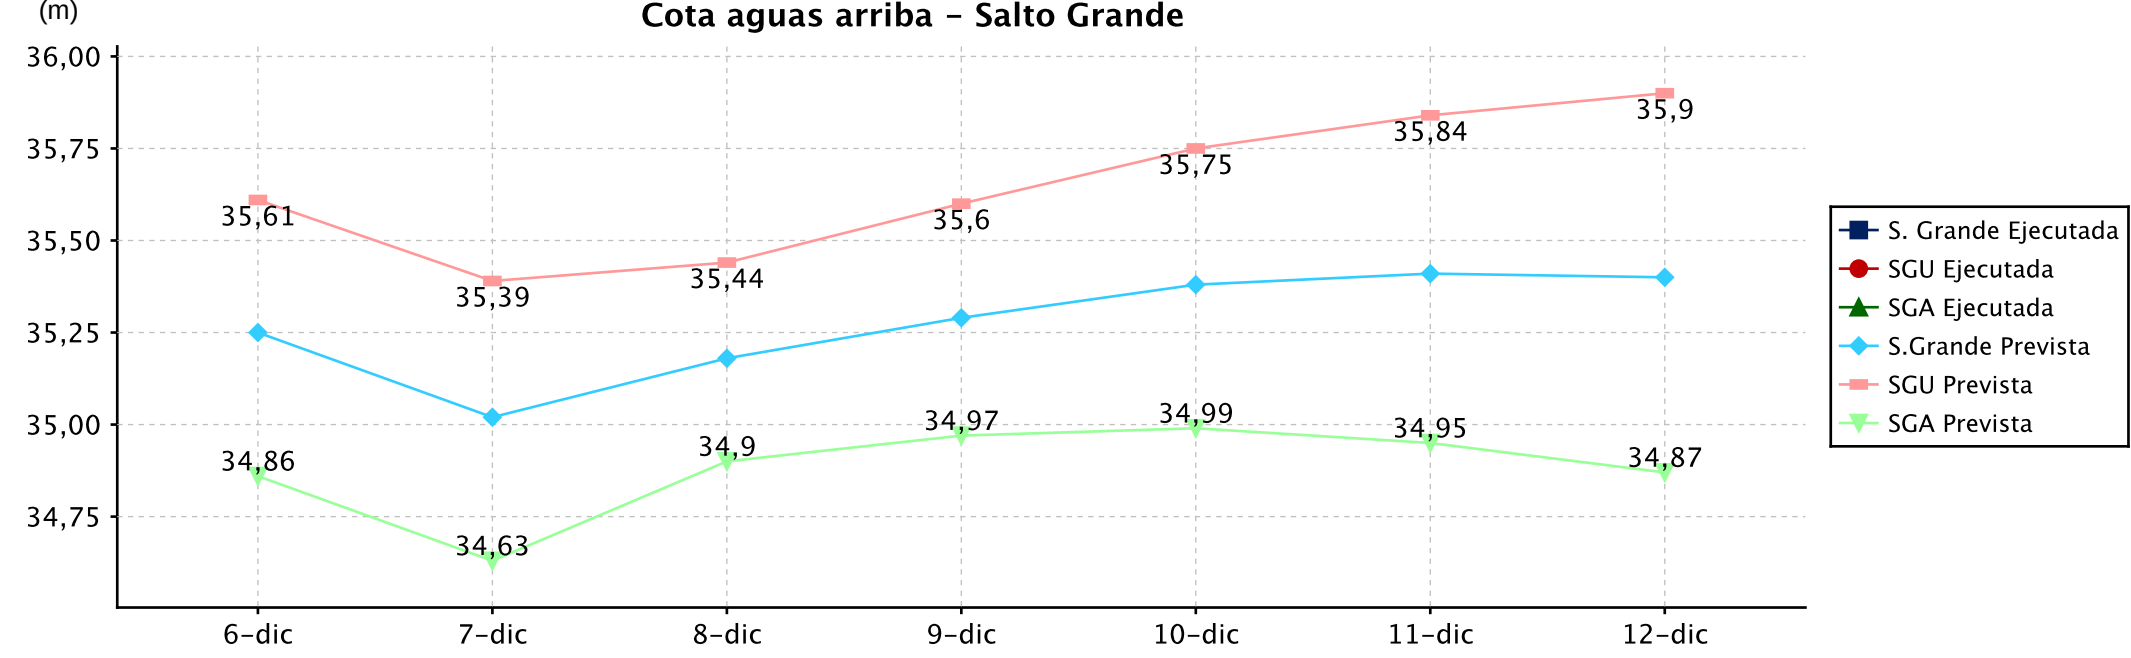

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	null
Cota Vista Arg	null
Cota real	null

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	null
------------------------------------	------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Baygorria	901	
SGU	3.909	
Terra	659	
Palmar	1.253	

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Baygorria	0	
SGU	3.400	
Terra	1.230	
Palmar	895	

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Baygorria	225	
SGU	0	
Terra	420	
Palmar	1.400	

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
