




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 07 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.372
C. Baygorria	2.235
C. Palmar	7.884
C. Salto Grande	19.883
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.753
TOTAL Generación	40.060

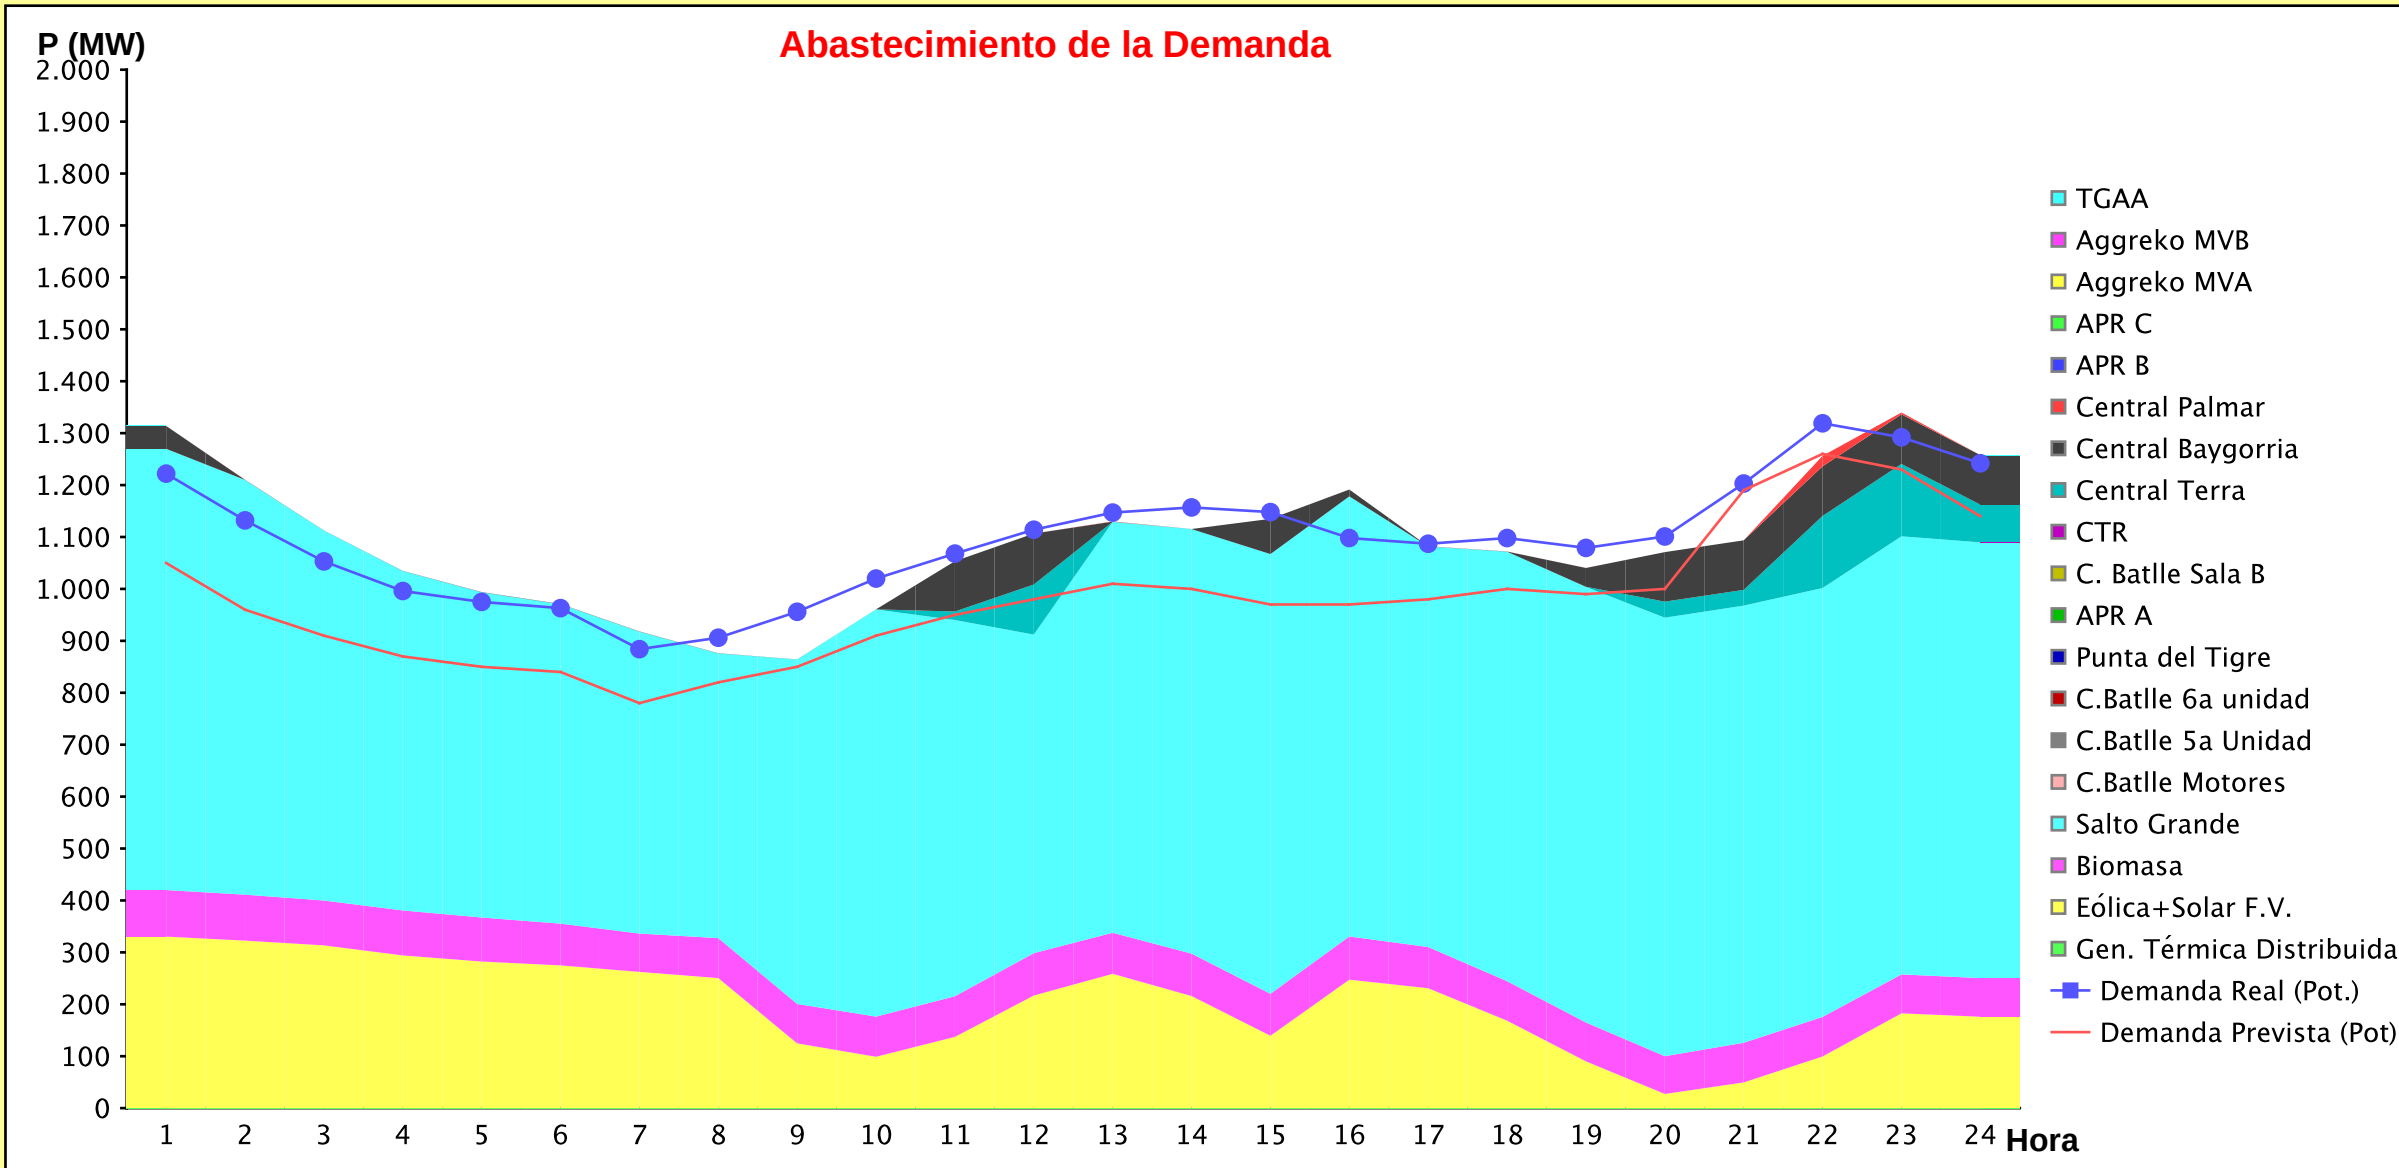

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.884
Hidráulica	13.884
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.884



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.176
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.510
Diferencia (MWh)	2.666
Ejecutada - Programada	11,34 %

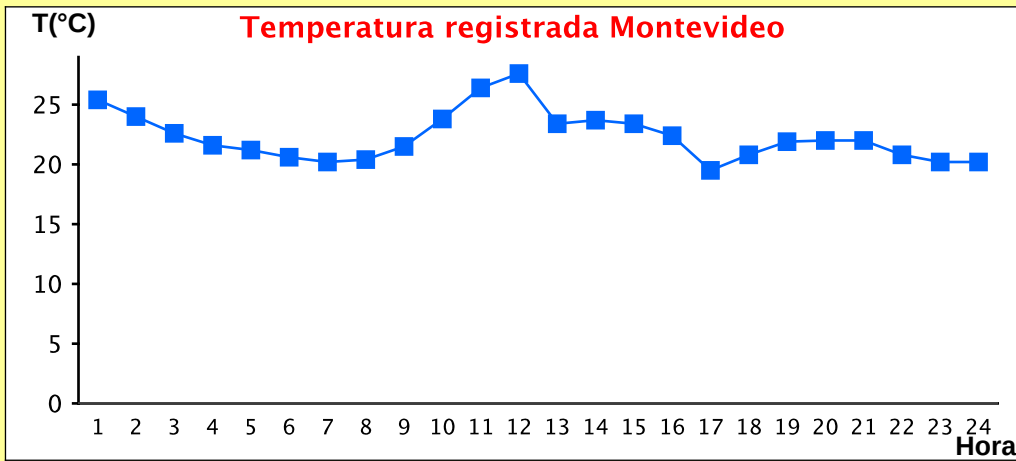


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1166,7 Hora 14:11
Potencia mínima:	871,73 Hora 06:56
Pico noche:	1335,83 Hora 21:55

Generación Media (MW)	
Eólica	200,0
Biomasa	80,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

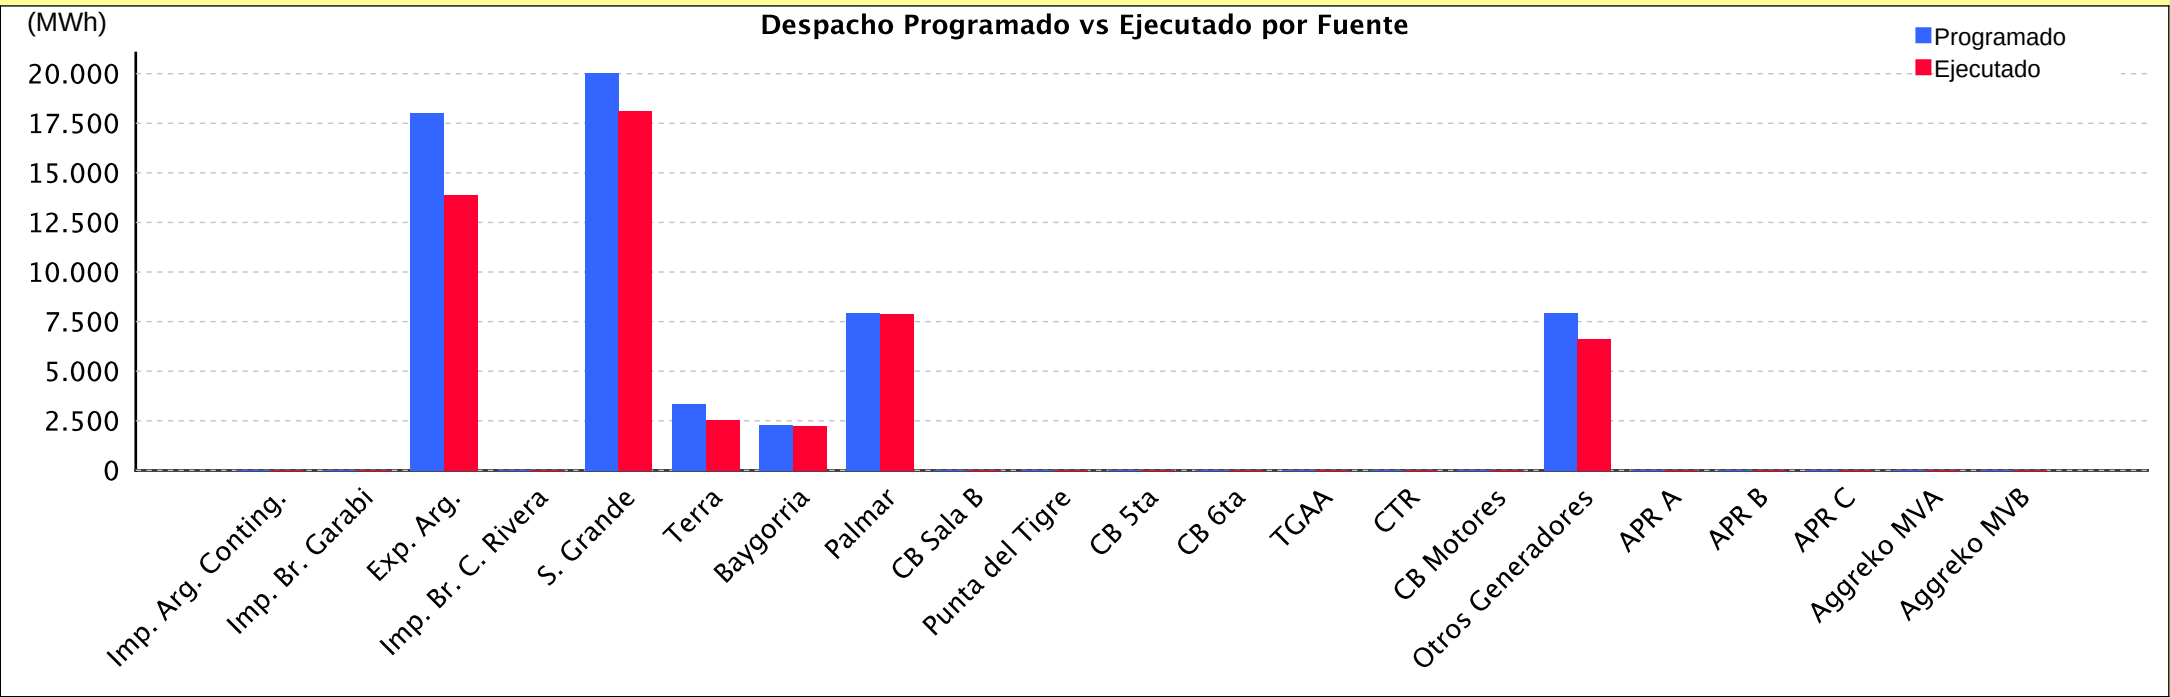
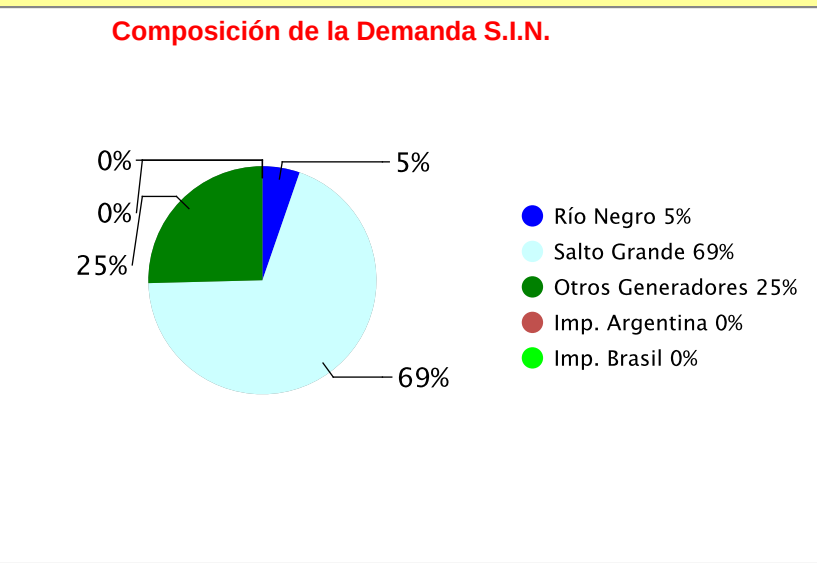


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

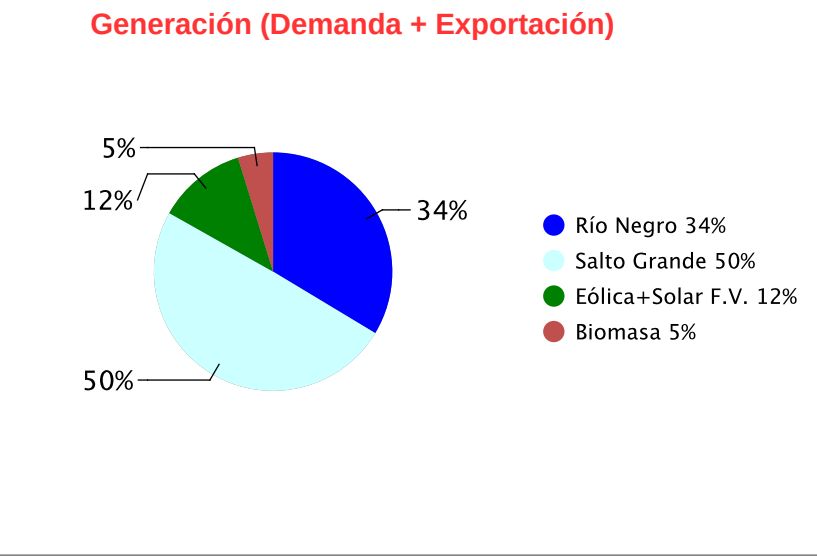



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

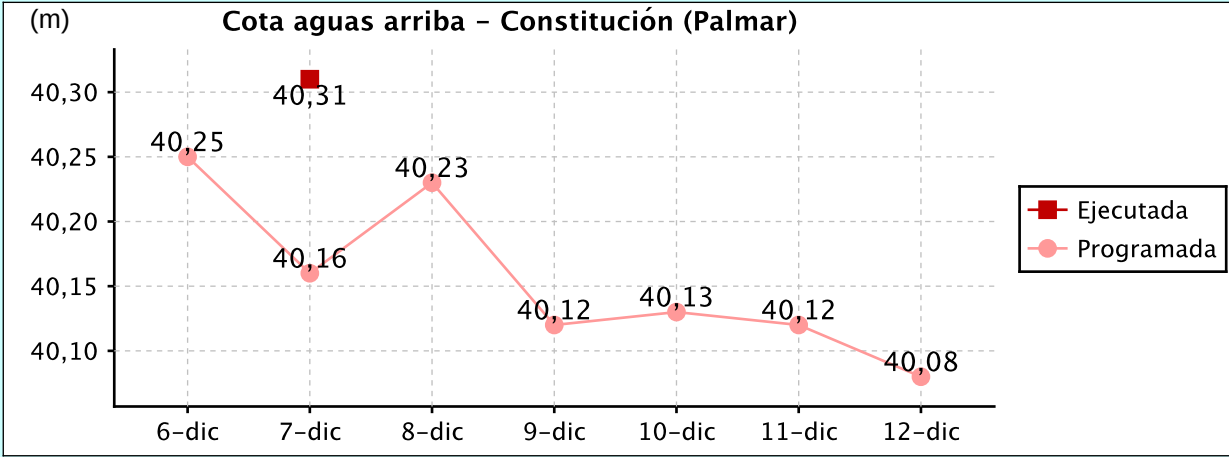
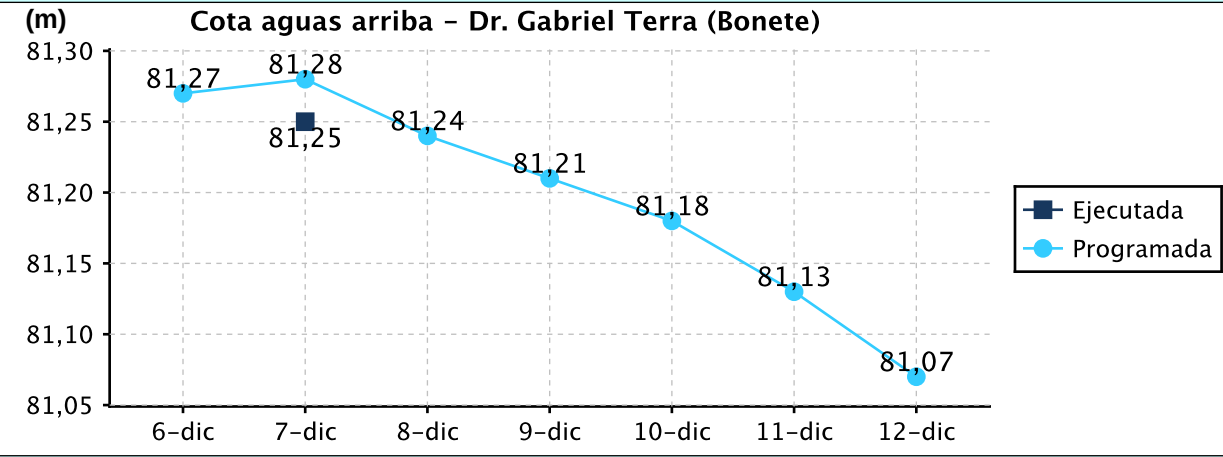


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,28	81,25
Baygorria	54,22	54,27
Palmar	40,16	40,31
SGU	35,39	35,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

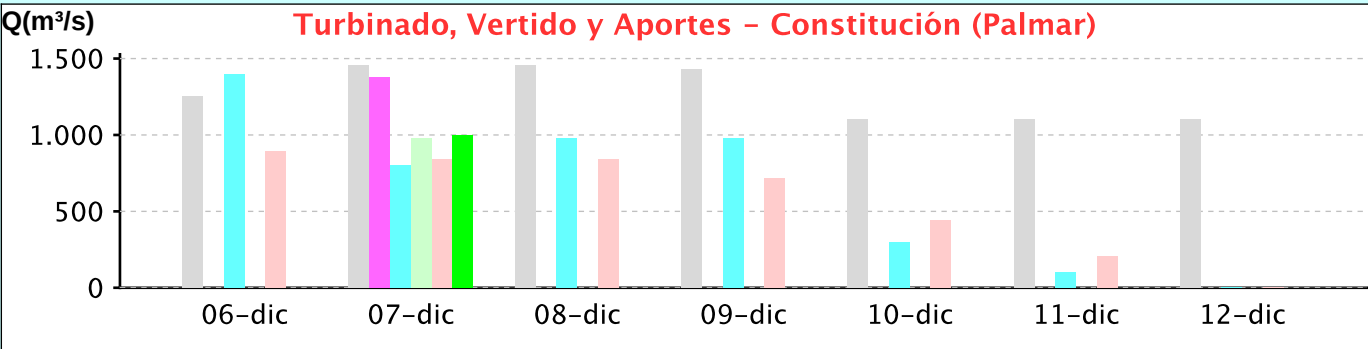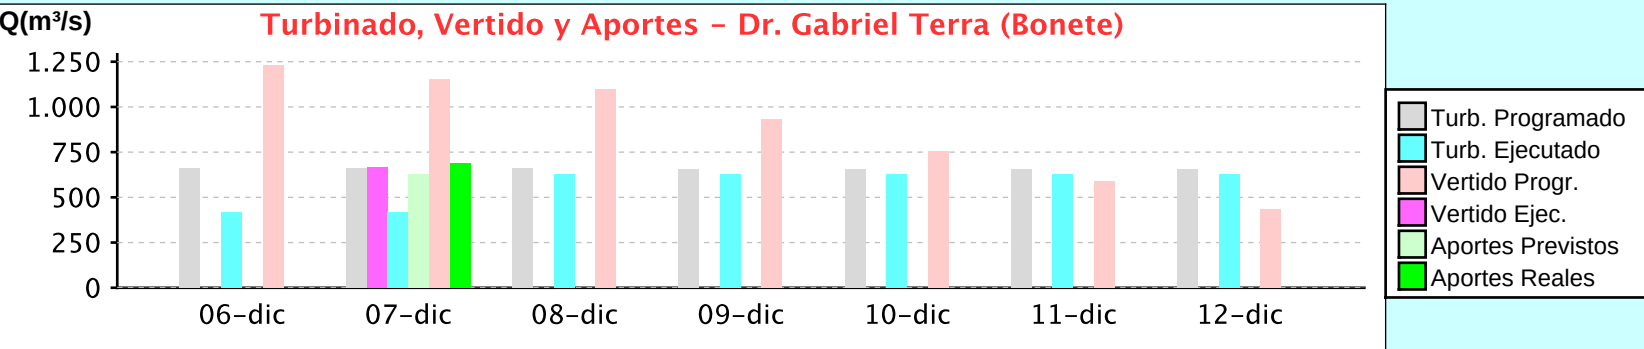

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

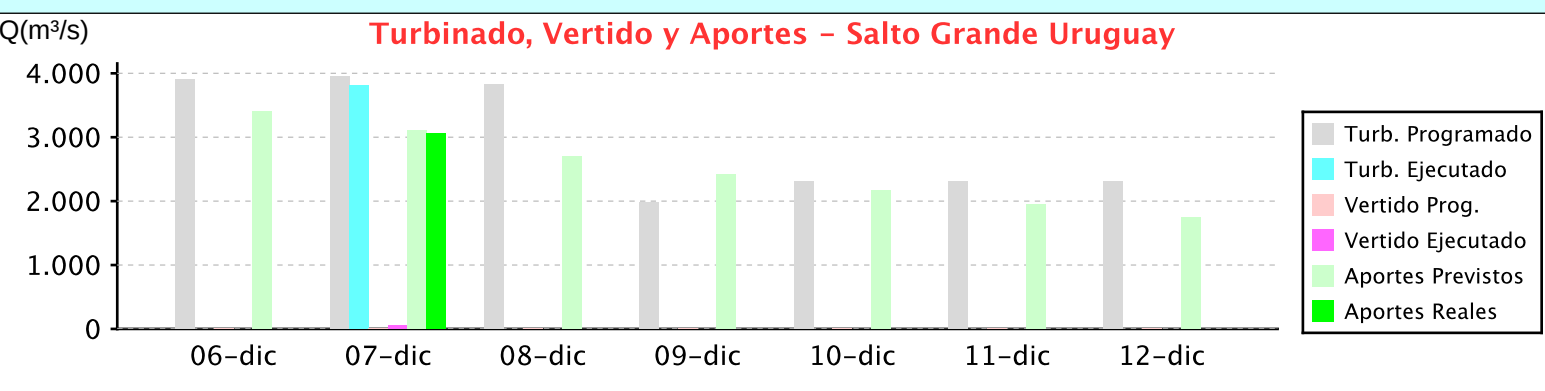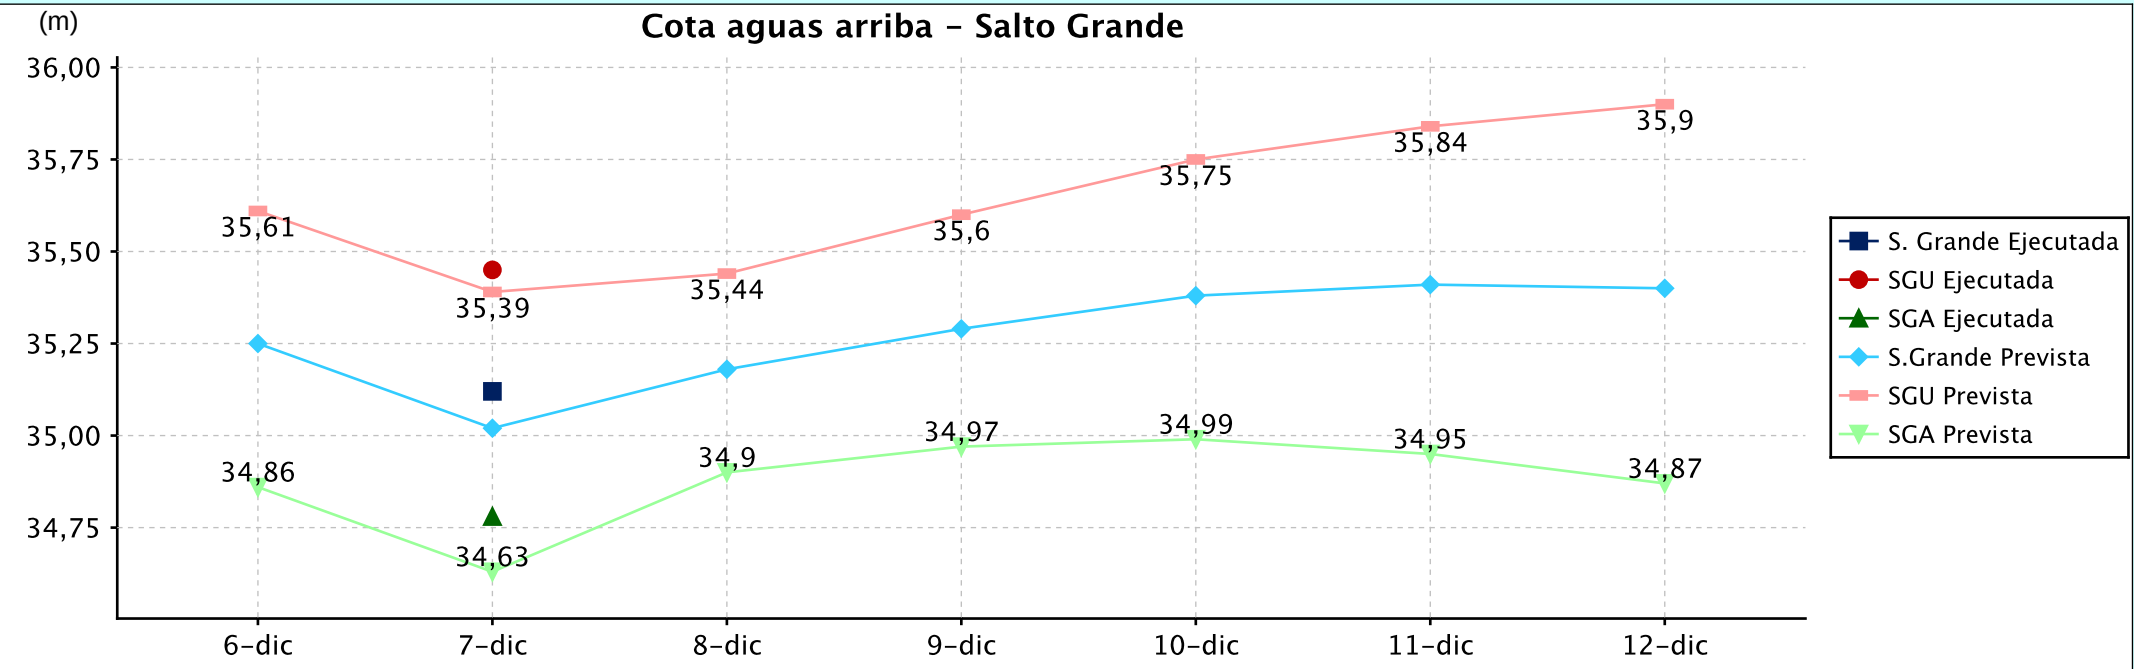

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,45
Cota Vista Arg	34,78
Cota real	35,12
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	15.874

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	666
Baygorria	901	854
Palmar	1.455	1.375
SGU	3.957	3.818

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.153	689
Baygorria	0	61
Palmar	843	996
SGU	3.100	3.068

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	630
Baygorria	225	453
Palmar	800	980
SGU	0	48

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
