



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 13 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.676
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.679
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	-11
APR A	0
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.354
C. Baygorria	2.370
C. Palmar	7.879
C. Salto Grande	7.345
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.910
TOTAL Generación	27.430

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.430
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.430
Diferencia (MWh)	1.000
Ejecutada - Programada	3,78 %

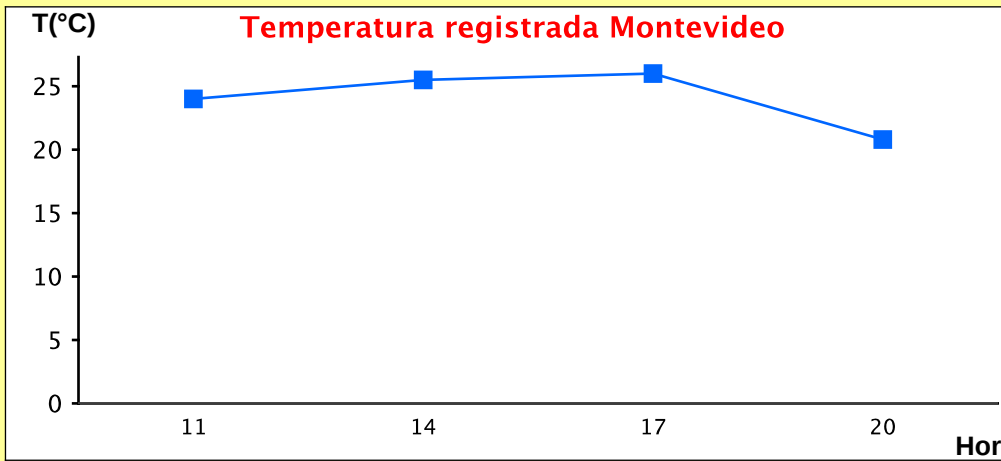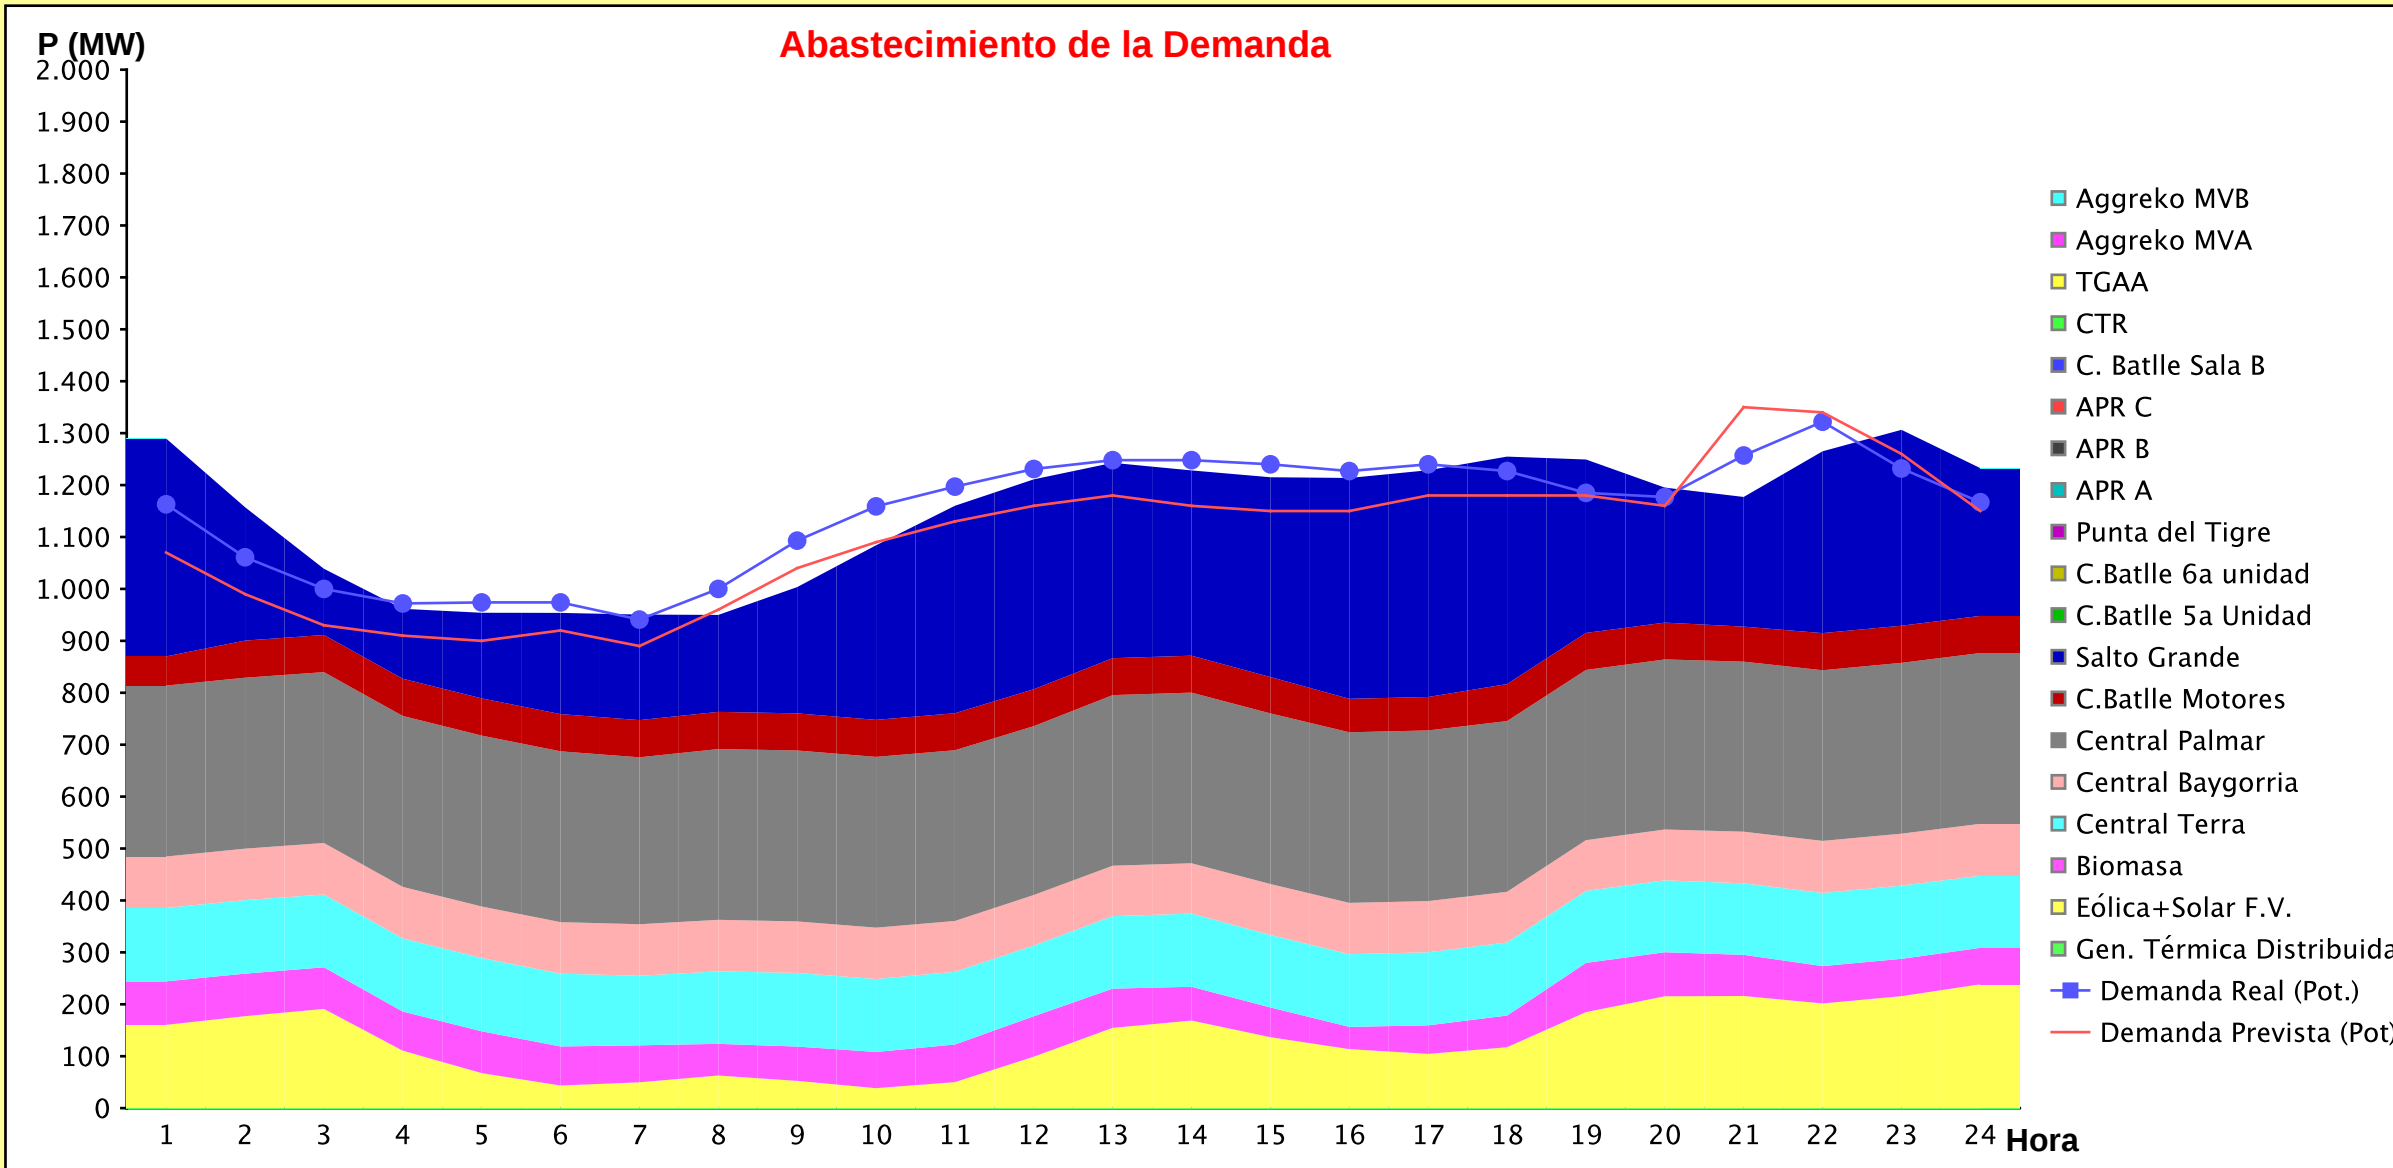



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1296,79 Hora 15:28
Potencia mínima:	924,76 Hora 06:42
Pico noche:	1338,56 Hora 21:30

Generación Media (MW)	
Eólica	132,5
Biomasa	72,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

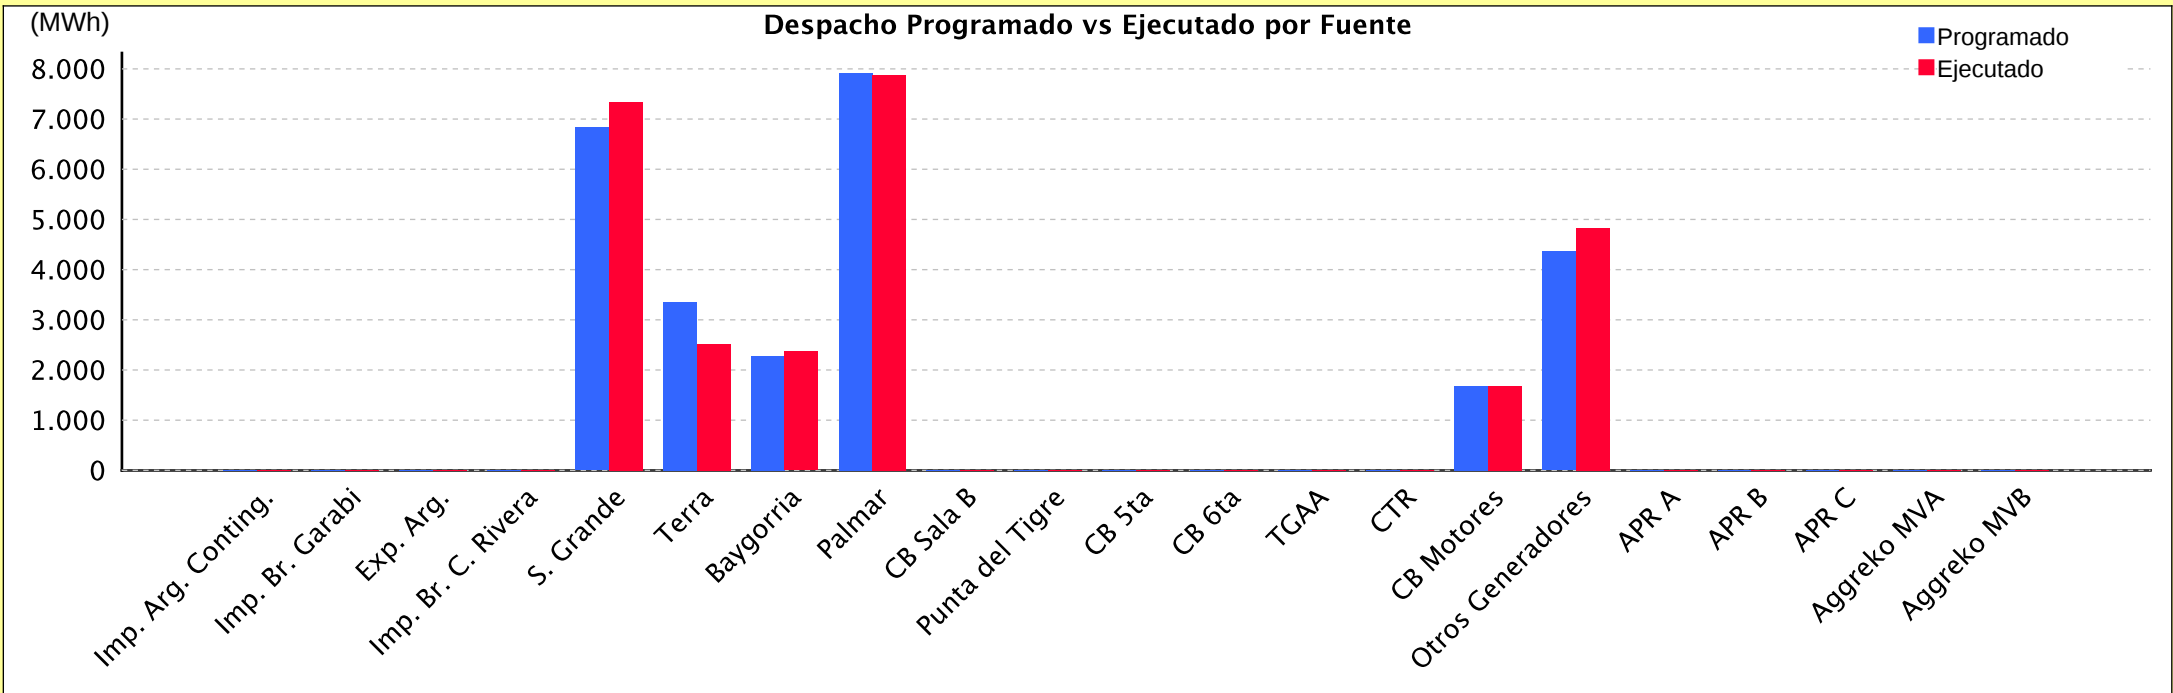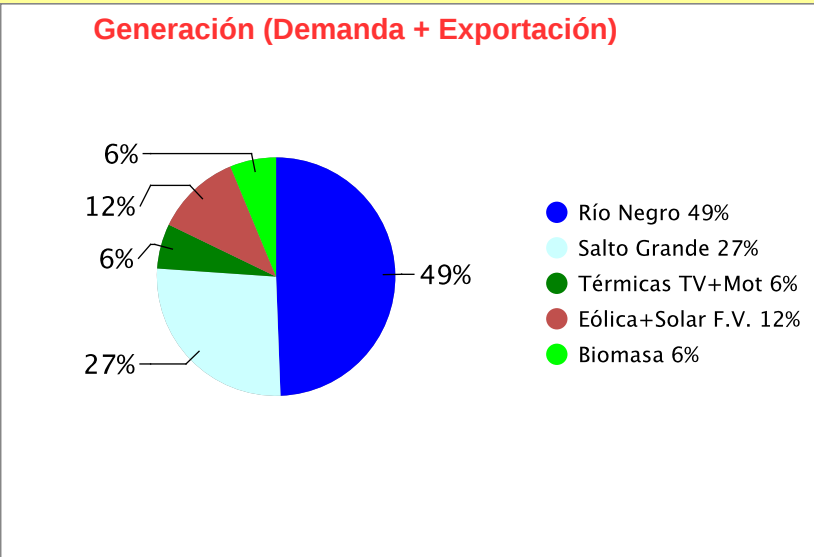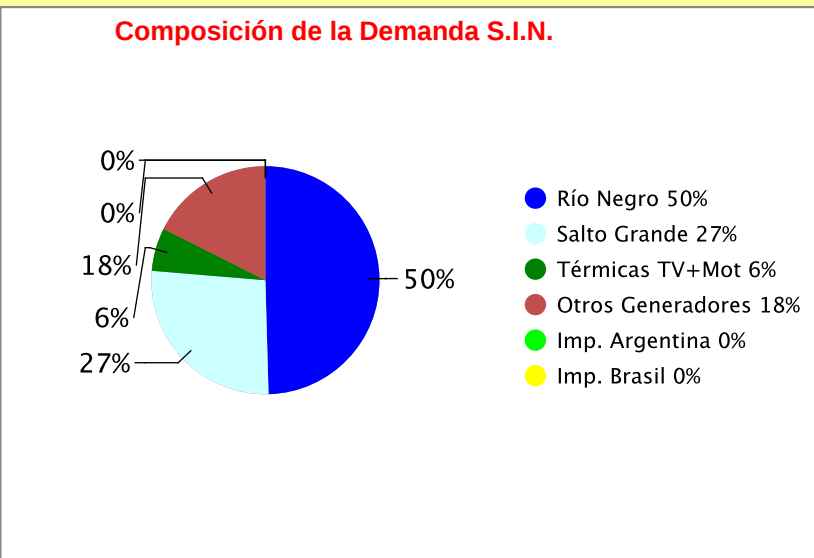



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

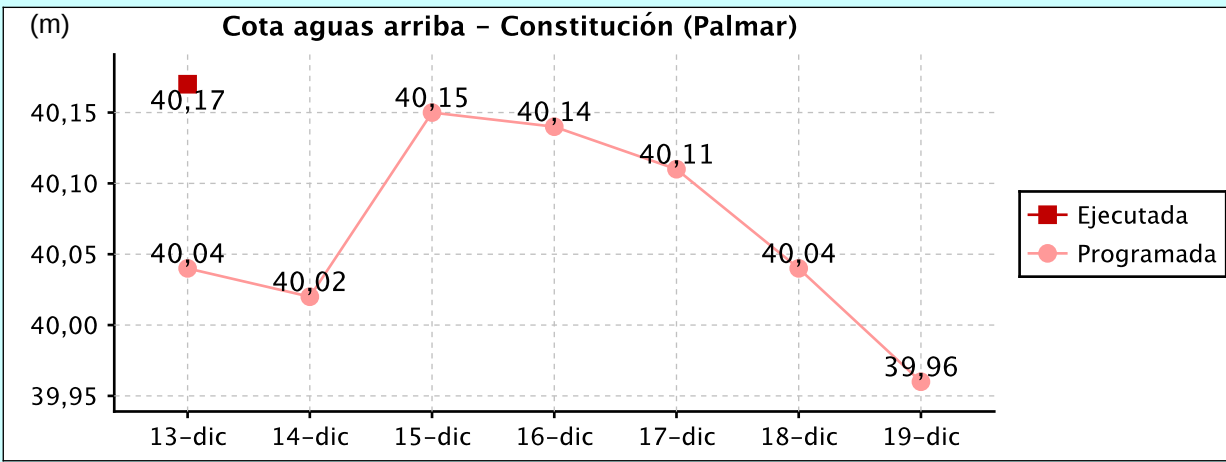
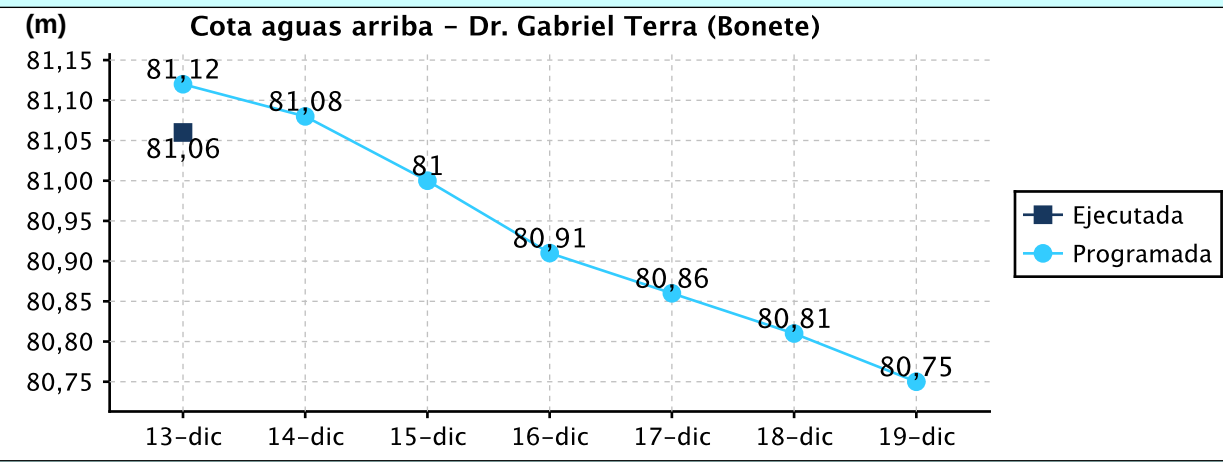


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,12	81,06
Baygorria	54,27	54,24
Palmar	40,04	40,17
SGU	35,33	35,3

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

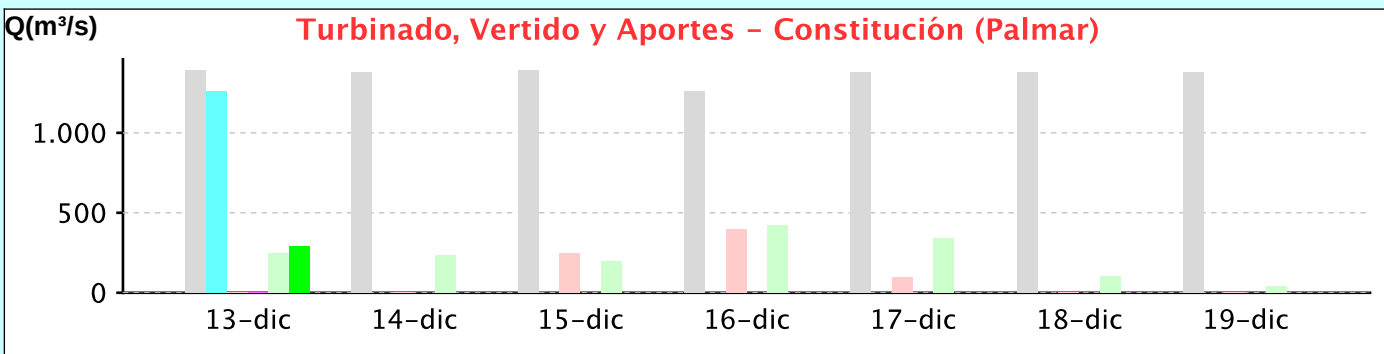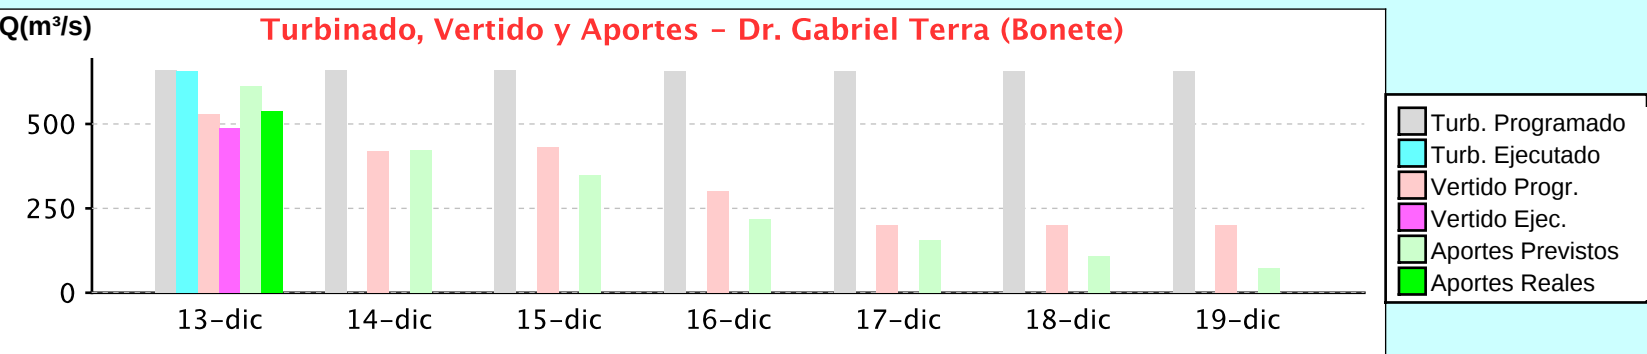

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

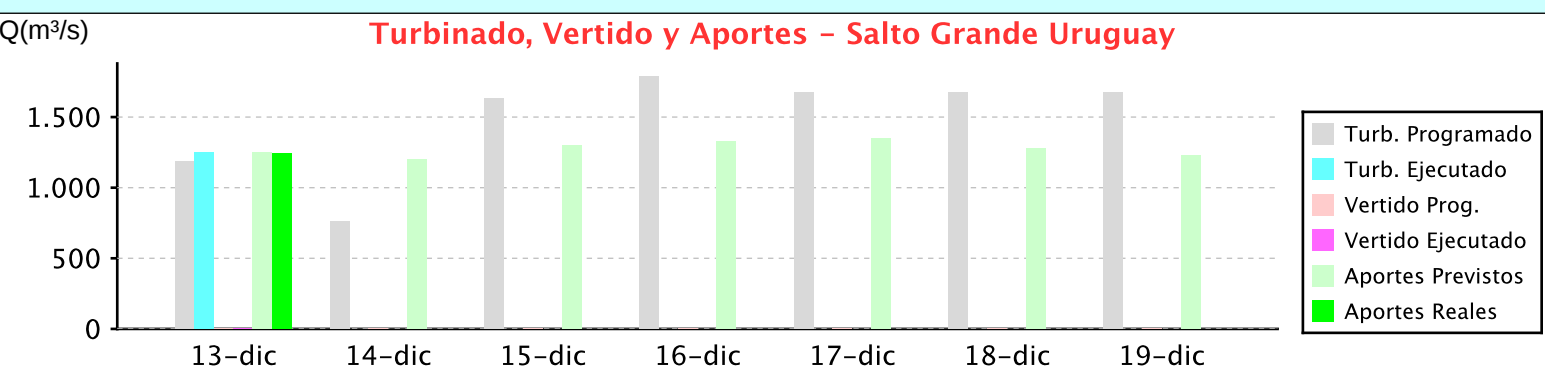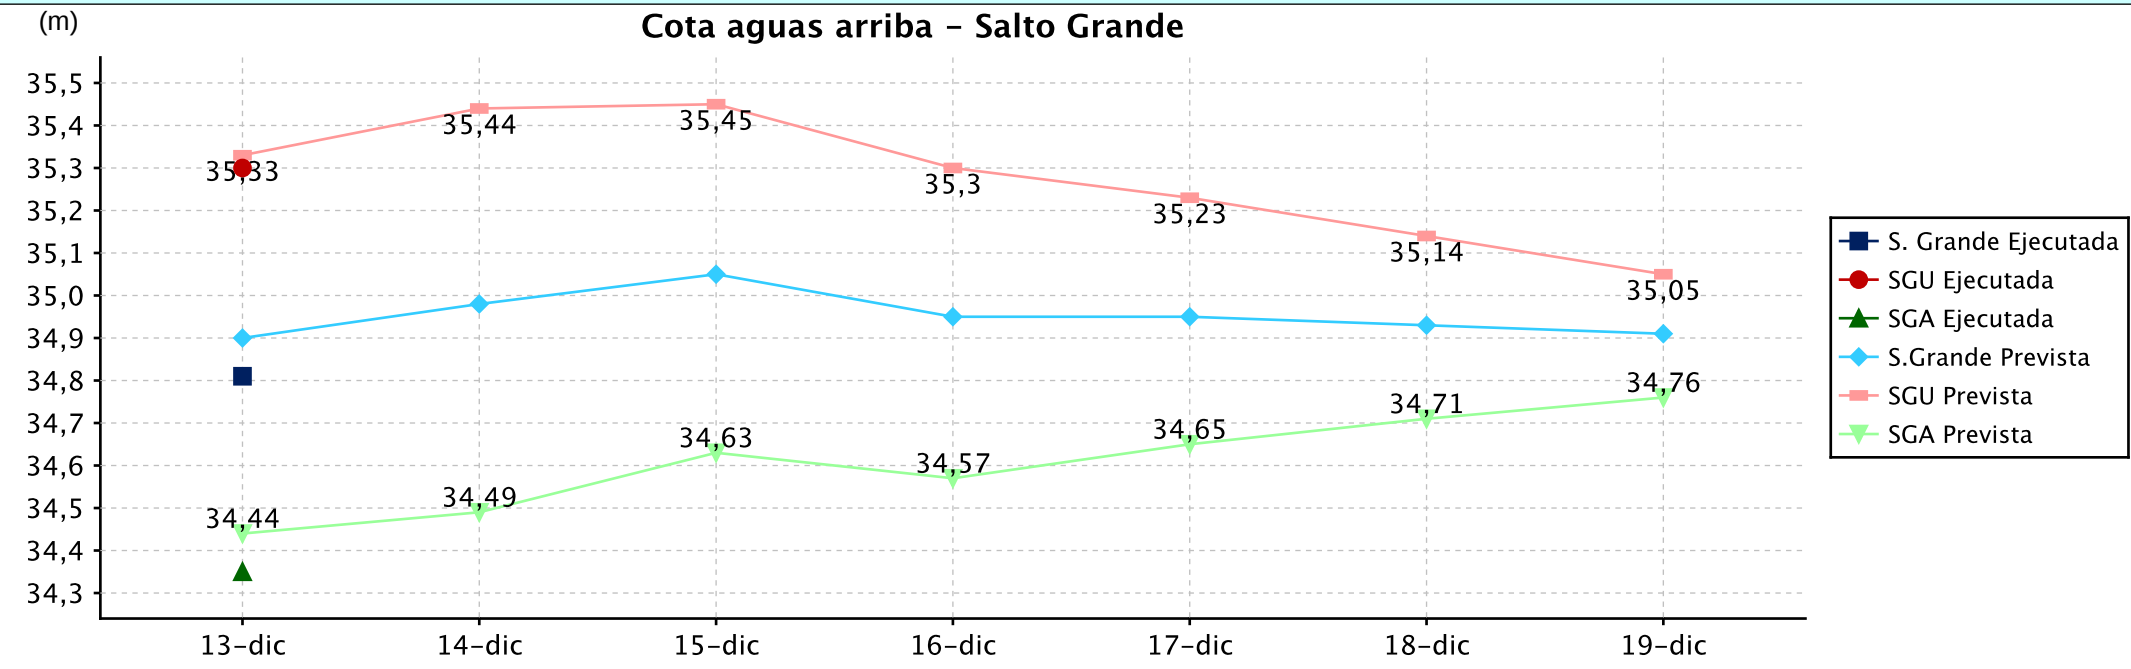

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,30
Cota Vista Arg	34,35
Cota real	34,81

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	21.861
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	659	658
Baygorria	872	886
Palmar	1.390	1.257
SGU	1.189	1.249

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	613	537
Baygorria	0	93
Palmar	246	292
SGU	1.250	1.245

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	530	488
Baygorria	300	349
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
