




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 17 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.246
C. Baygorria	2.306
C. Palmar	7.891
C. Salto Grande	13.297
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.325
TOTAL Generación	29.967

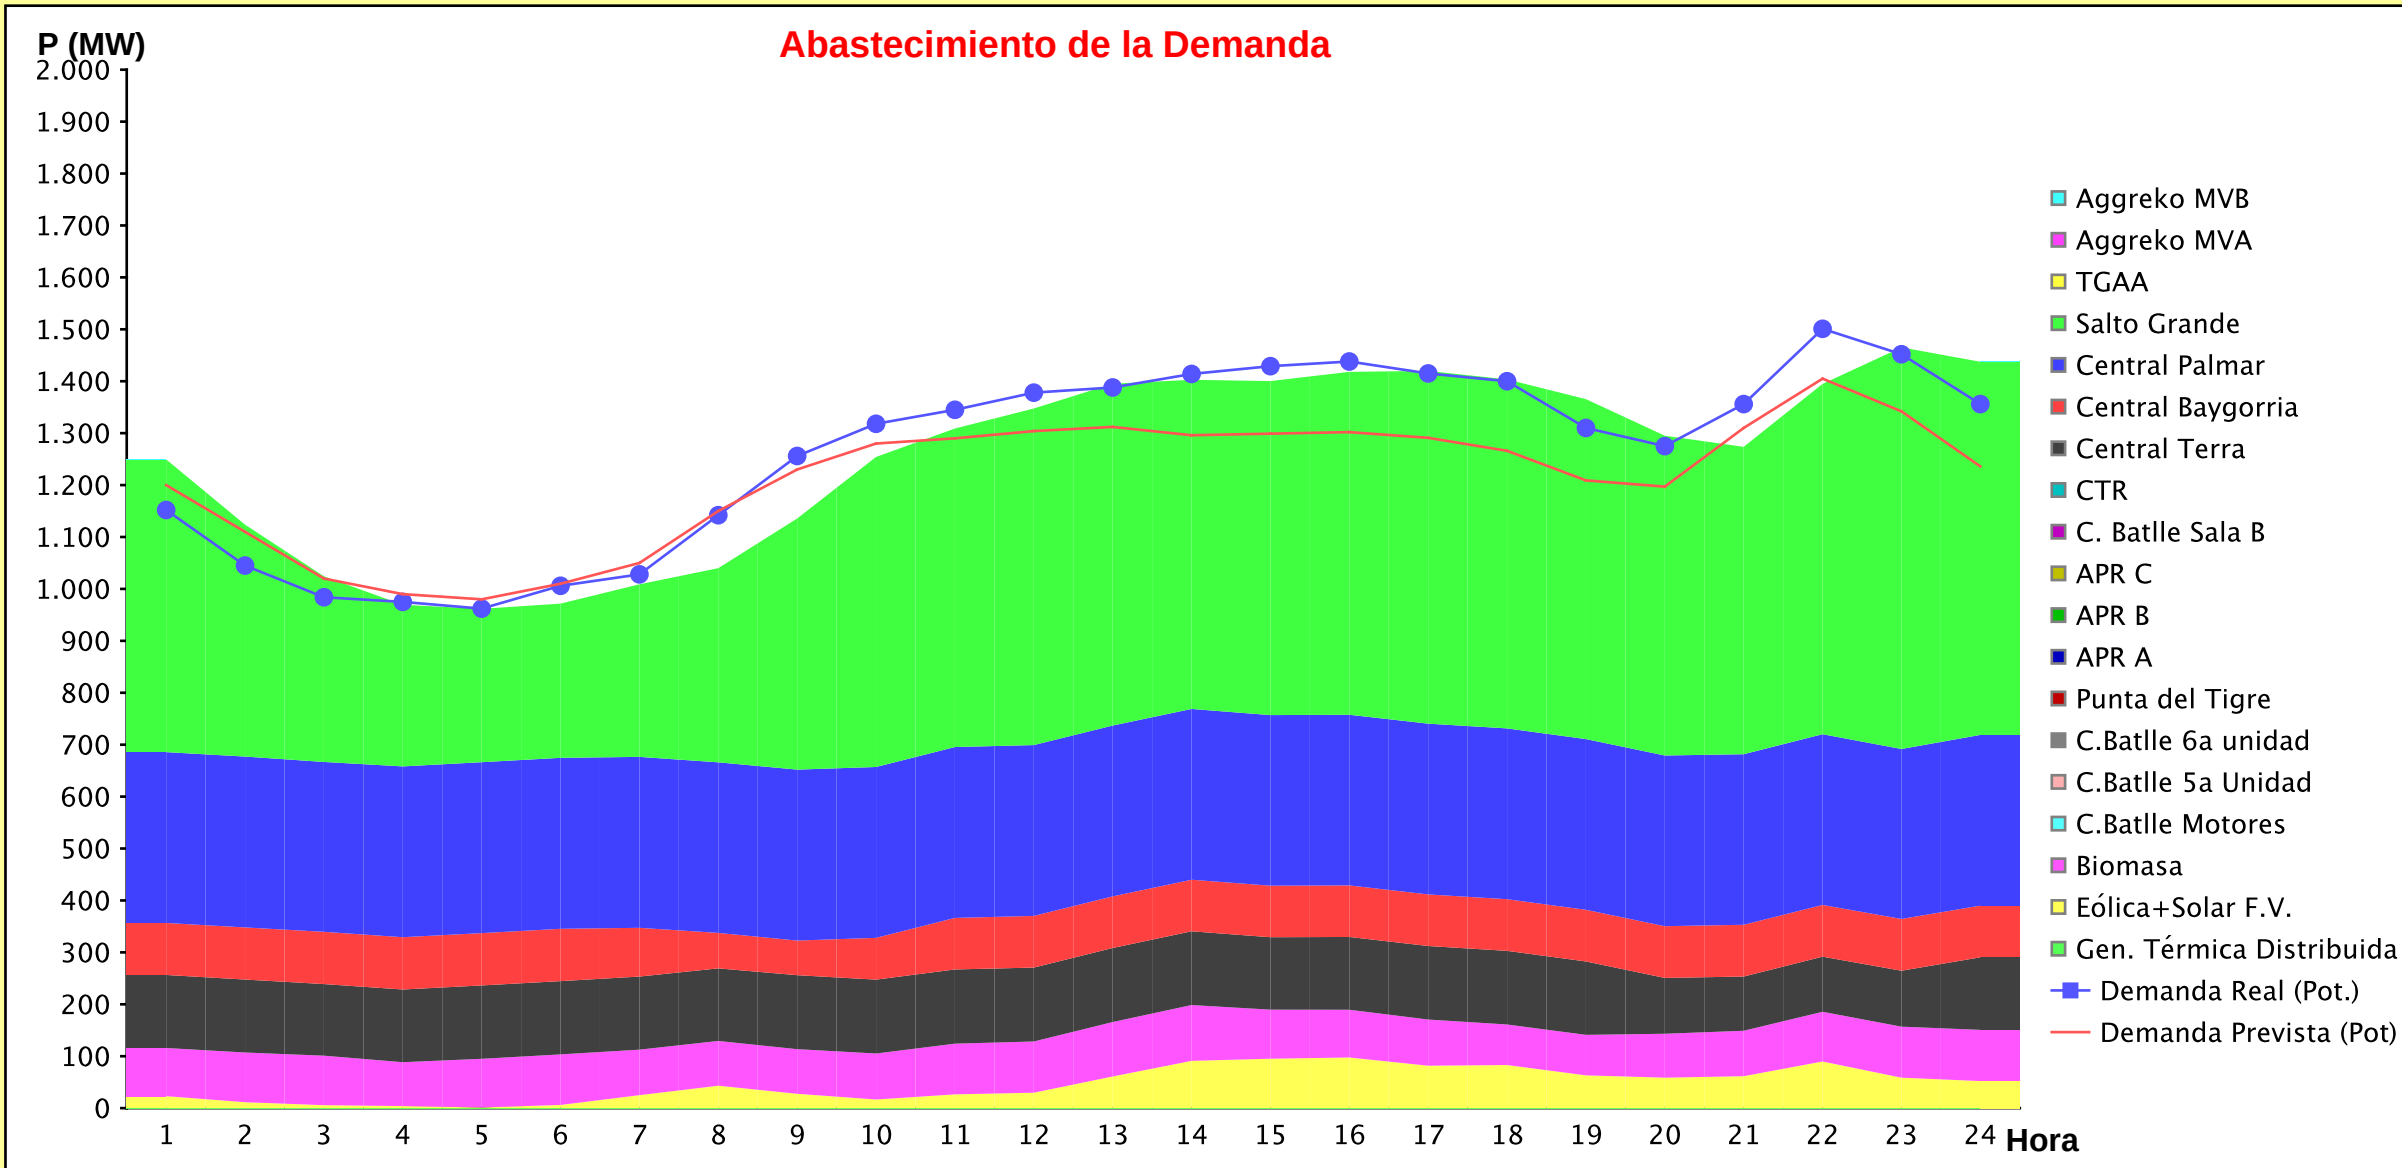

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.967
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.079
Diferencia (MWh)	888
Ejecutada - Programada	3,05 %


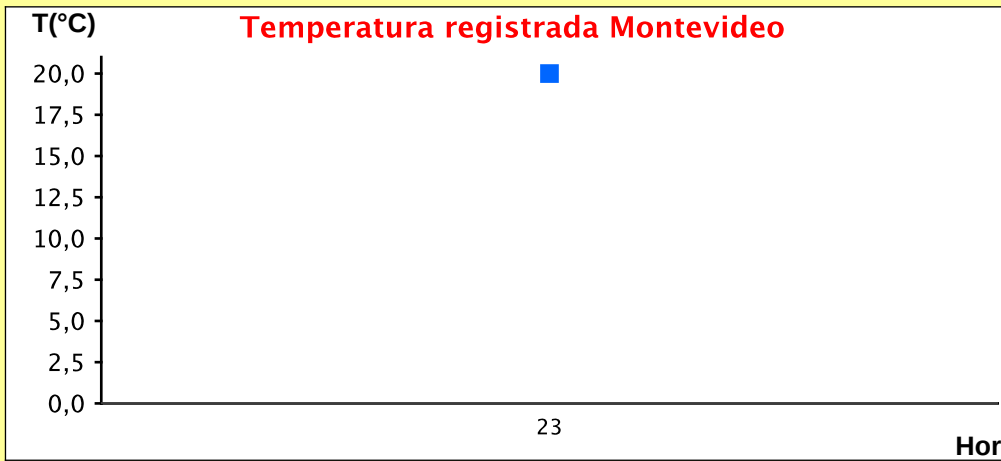


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1455,79 Hora 16:23
Potencia mínima:	951 Hora 03:57
Pico noche:	1515,87 Hora 21:49

Generación Media (MW)	
Eólica	47,5
Biomasa	93,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


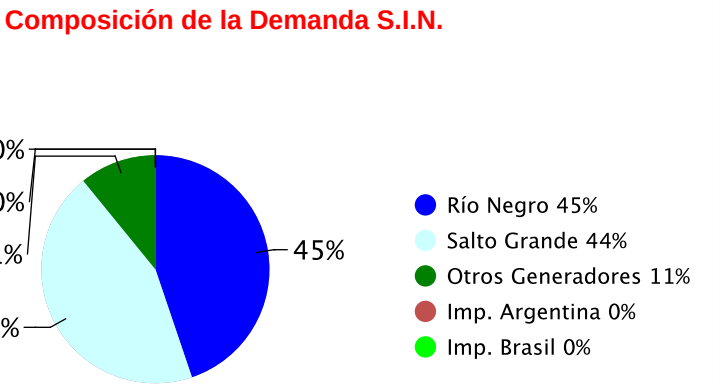


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

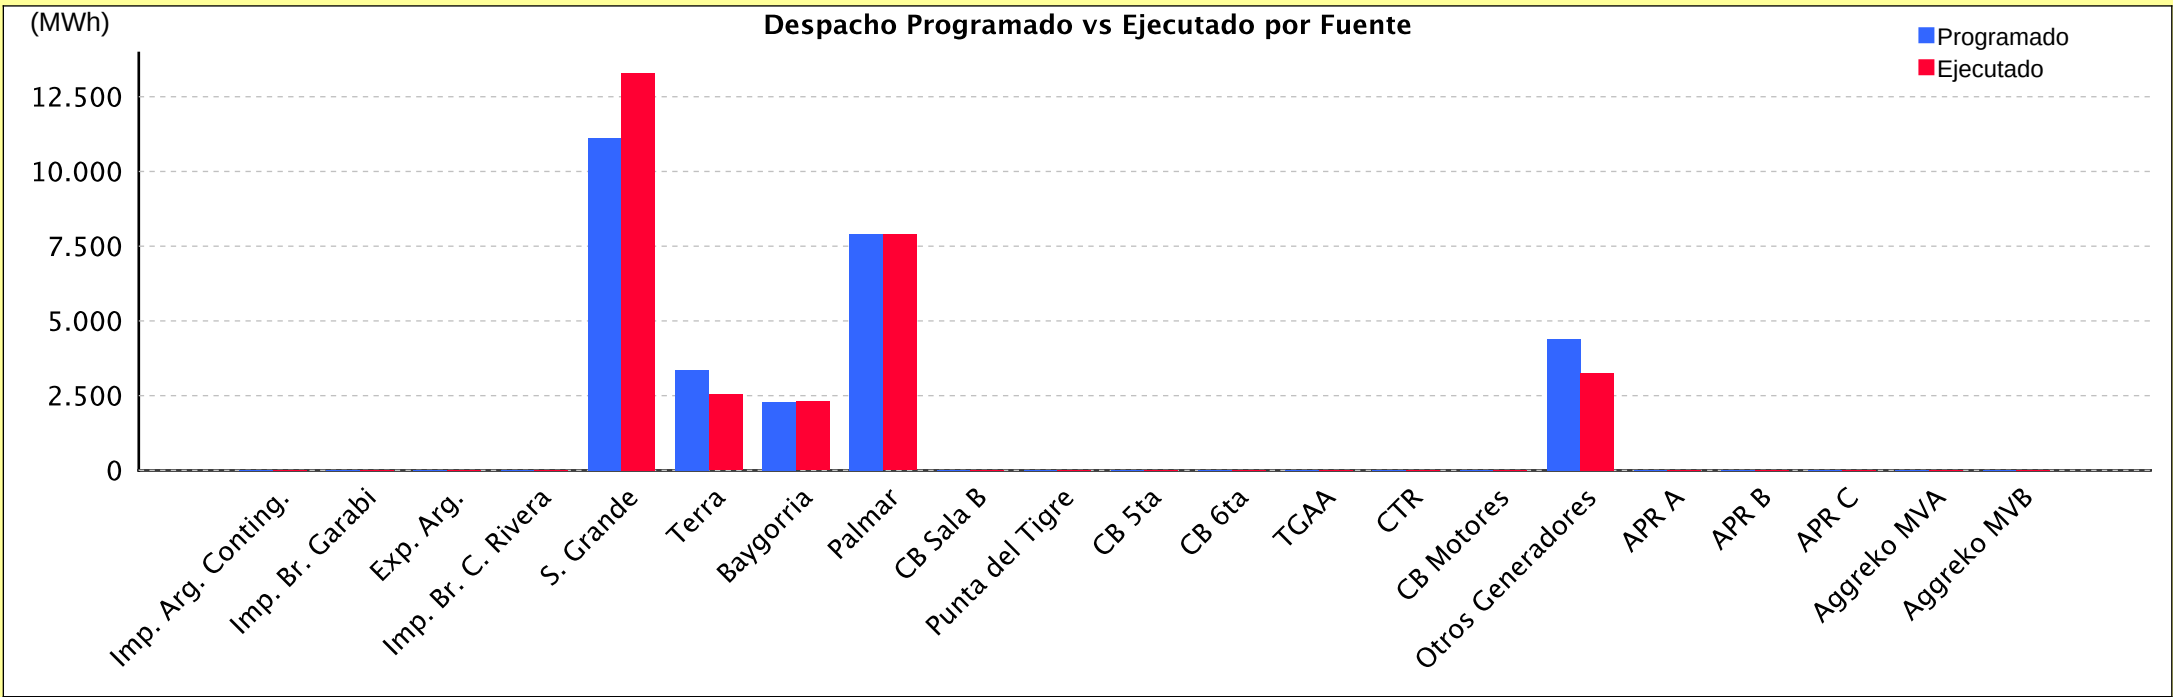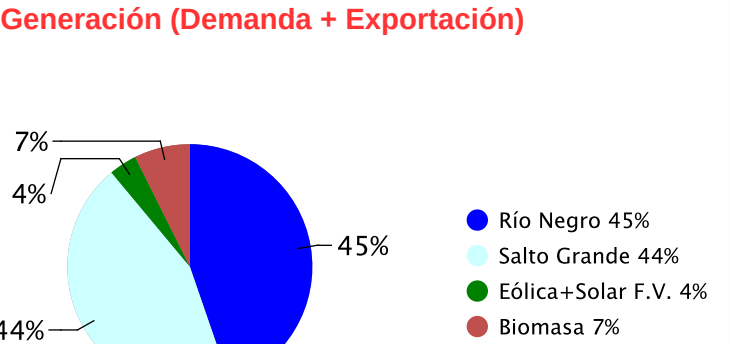



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

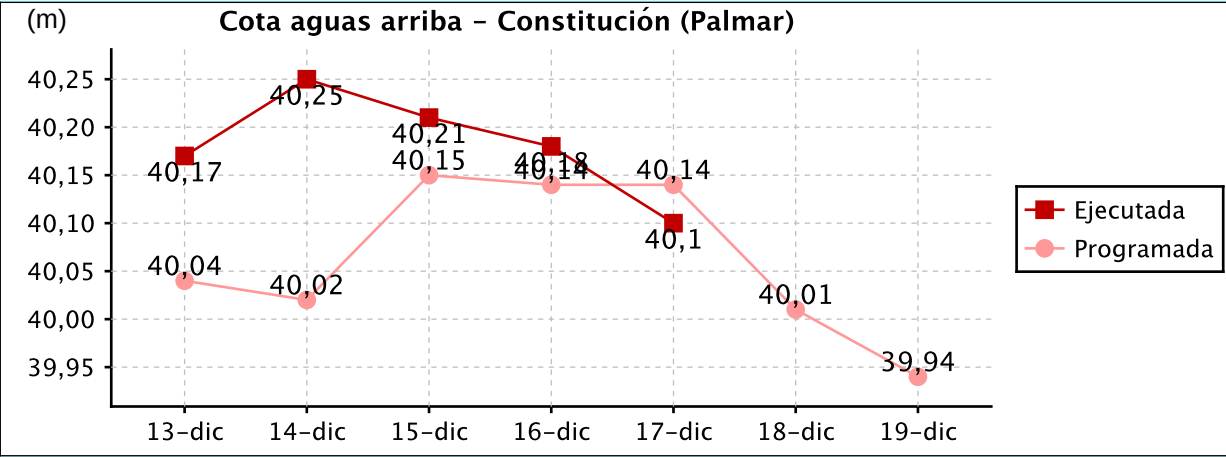
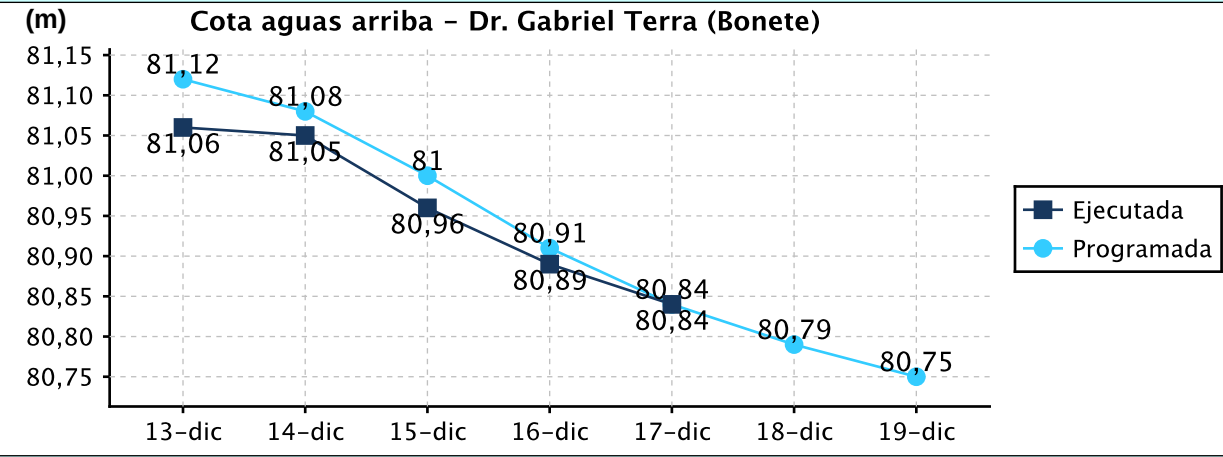


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,84	80,84
Baygorria	54,16	54,17
Palmar	40,14	40,1
SGU	35,29	35,11

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

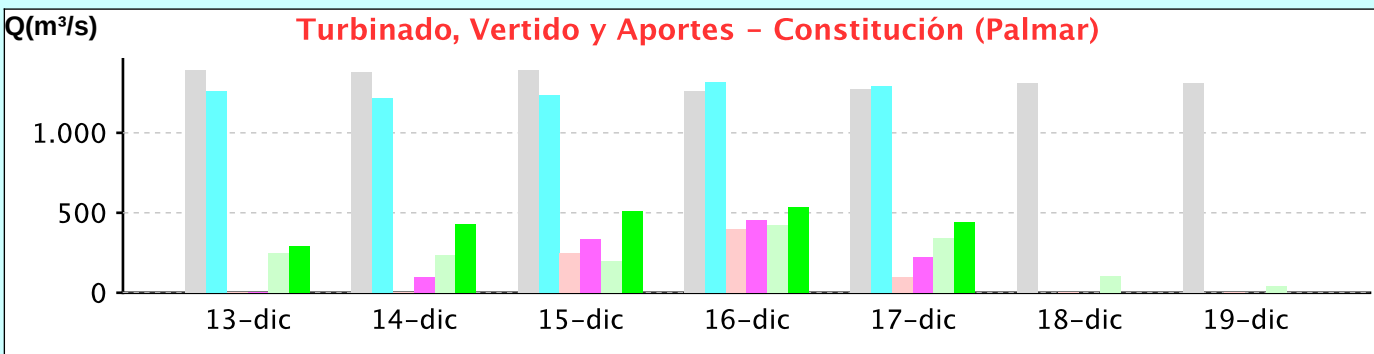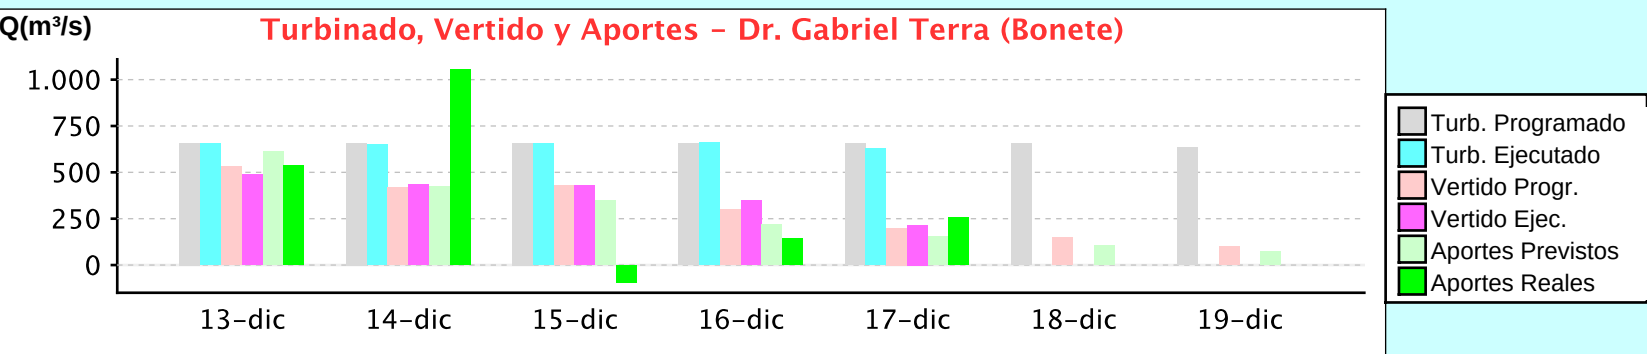

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

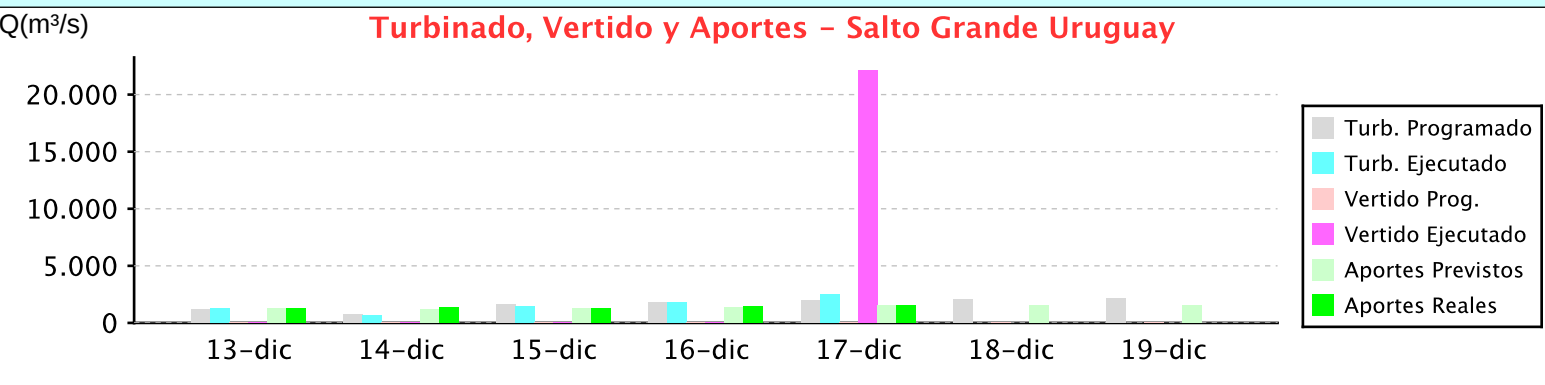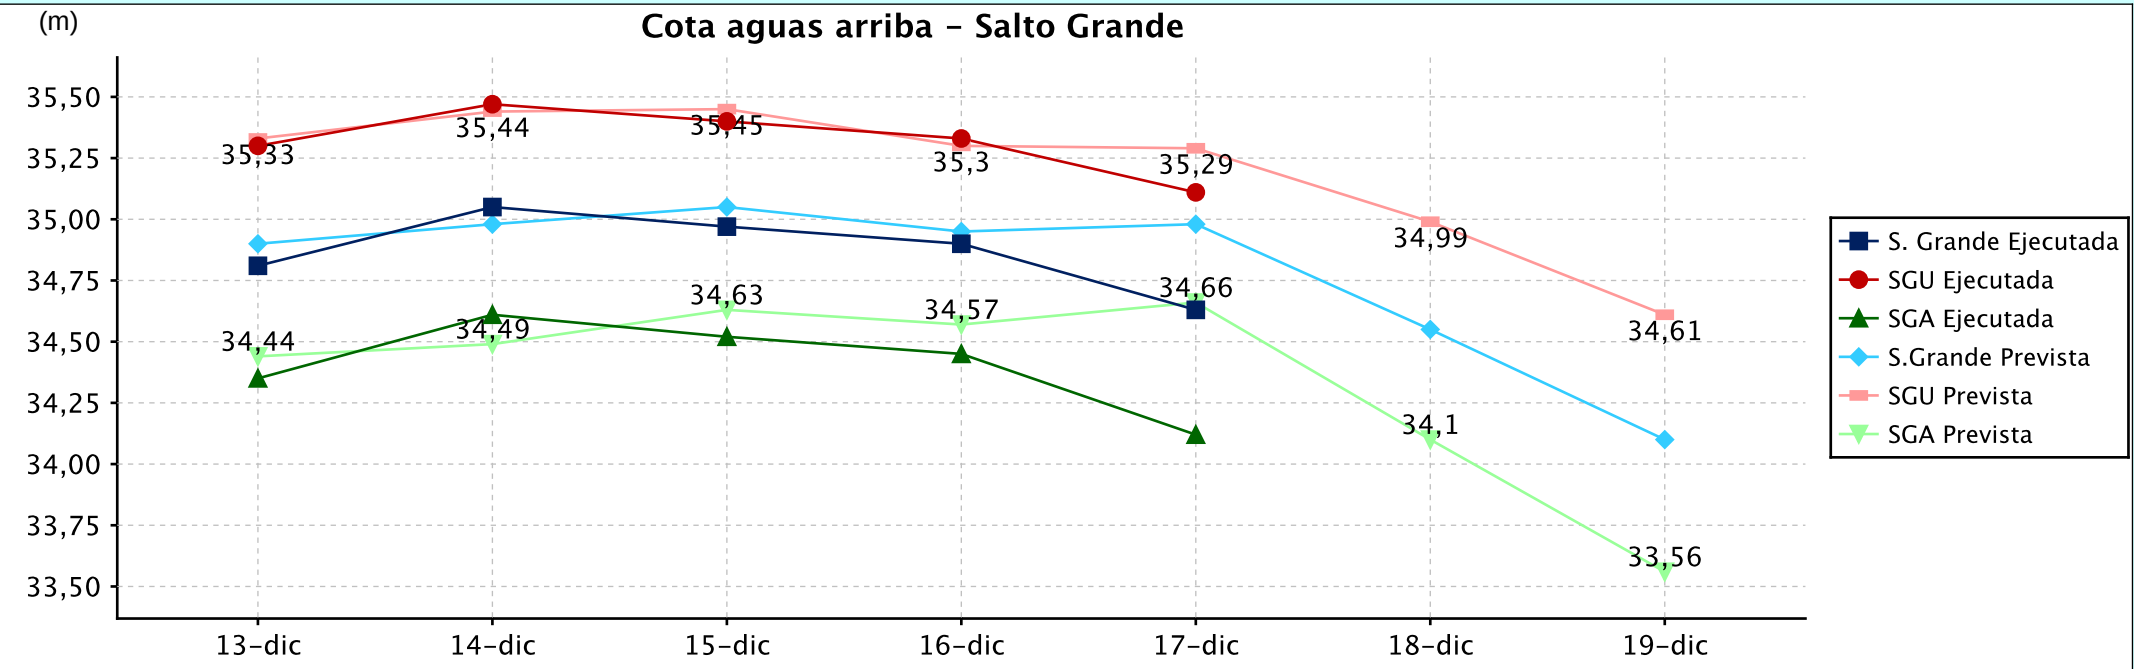

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,11
Cota Vista Arg	34,12
Cota real	34,63
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	22.147

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	656	631
Baygorria	858	861
Palmar	1.269	1.291
SGU	1.959	2.529

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	154	259
Baygorria	0	-6
Palmar	339	438
SGU	1.550	1.506

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	216
Baygorria	0	0
Palmar	100	223
SGU	0	22.147

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
