




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 19 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-76
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.384
C. Baygorria	2.401
C. Palmar	7.765
C. Salto Grande	10.439
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.248
TOTAL Generación	32.140

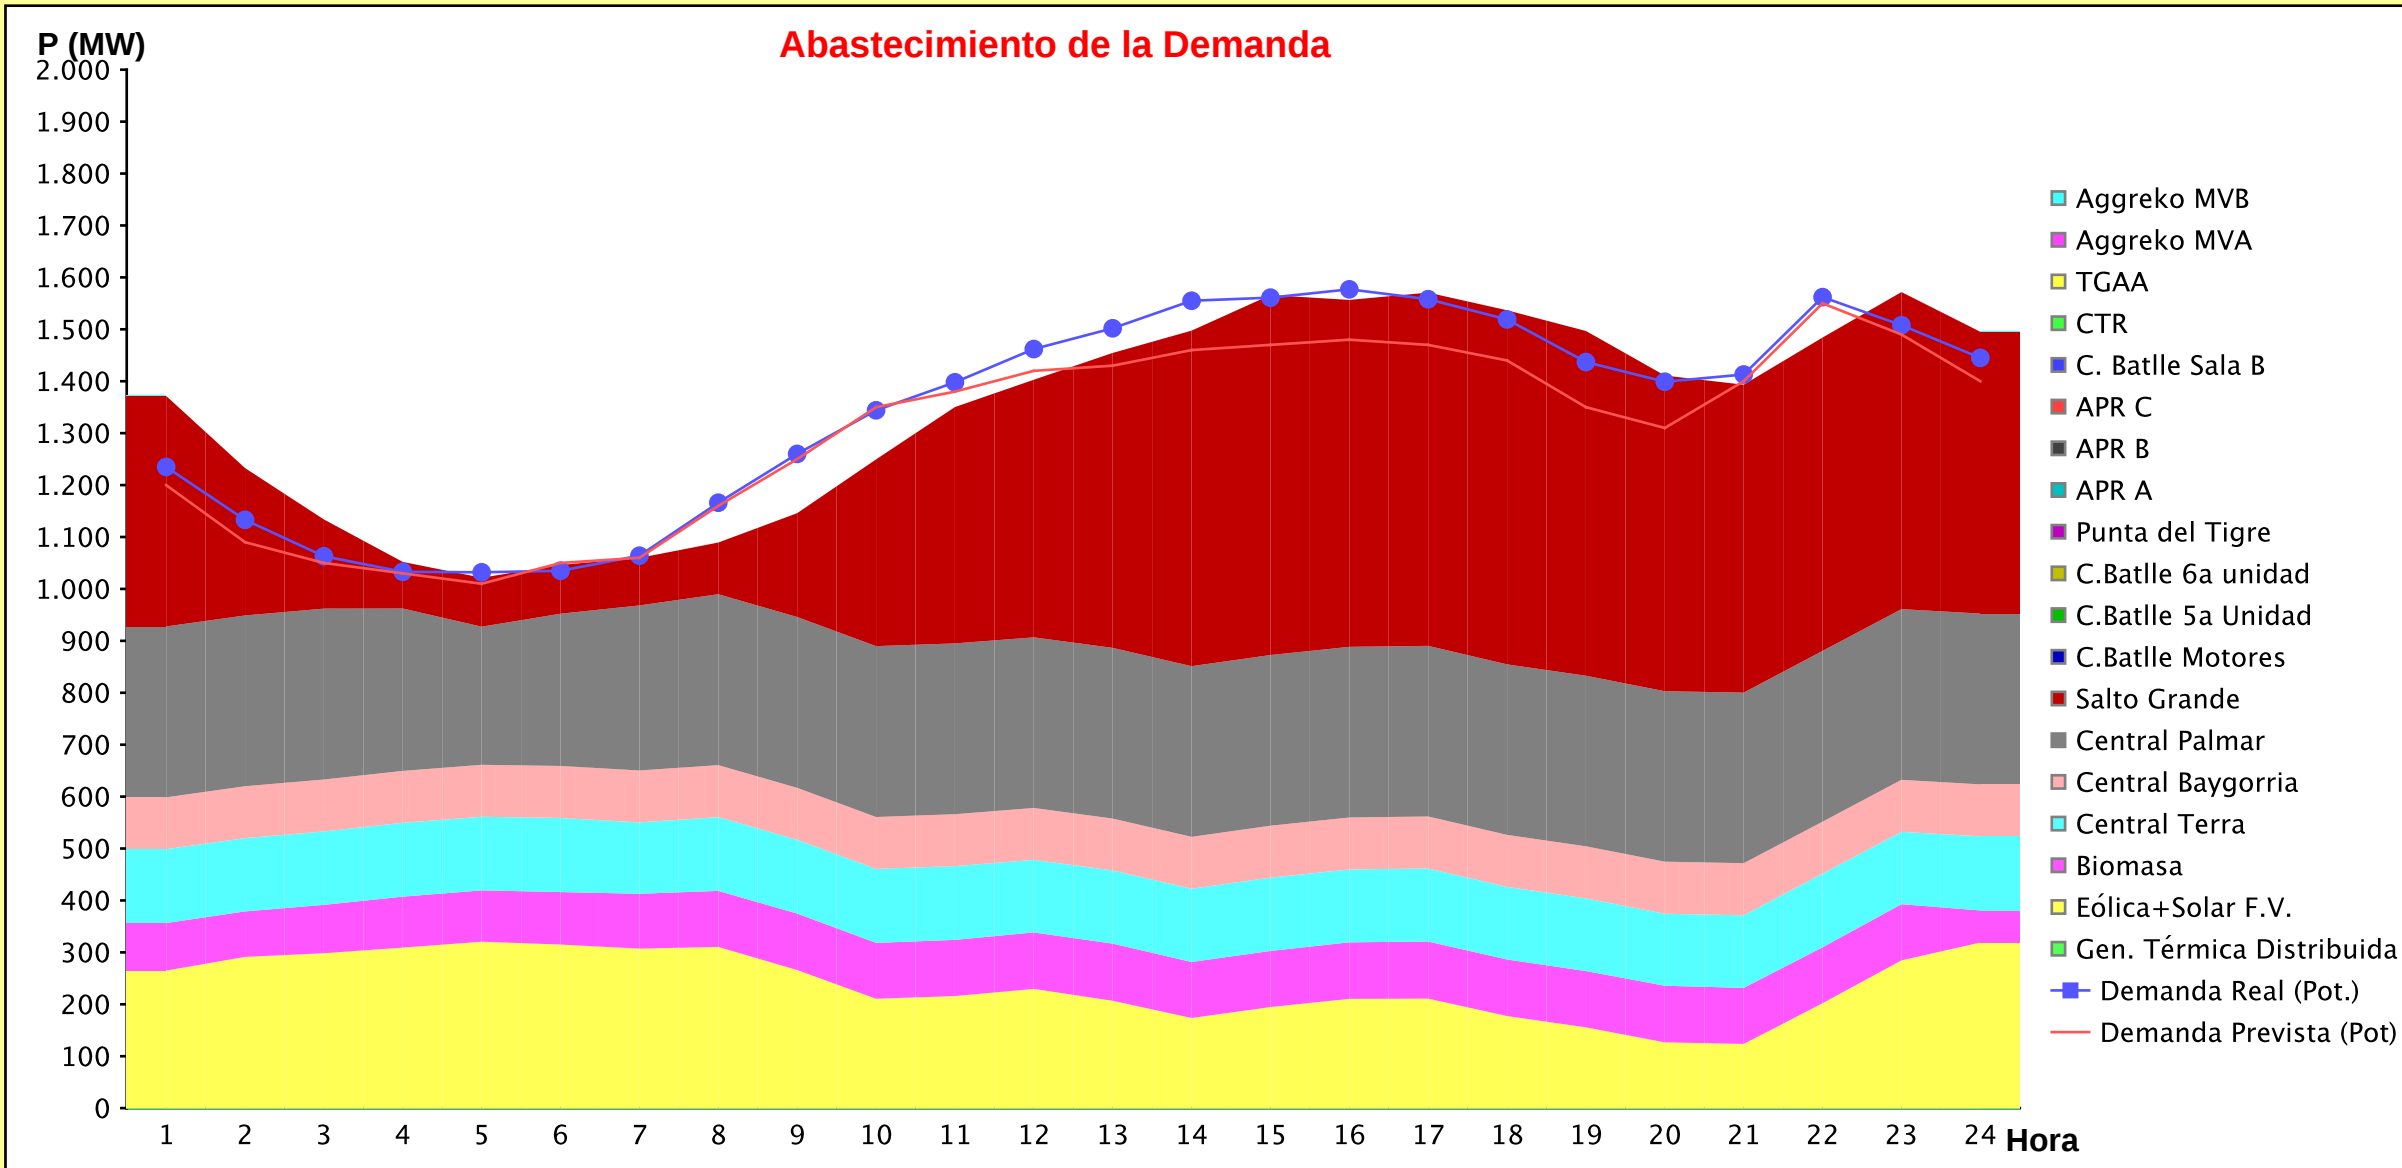

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.140
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.300
Diferencia (MWh)	840
Ejecutada - Programada	2,68 %





Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1590,73 Hora 16:27
Potencia mínima:	1009,88 Hora 04:42
Pico noche:	1569,88 Hora 21:56

Generación Media (MW)	
Eólica	238,7
Biomasa	104,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

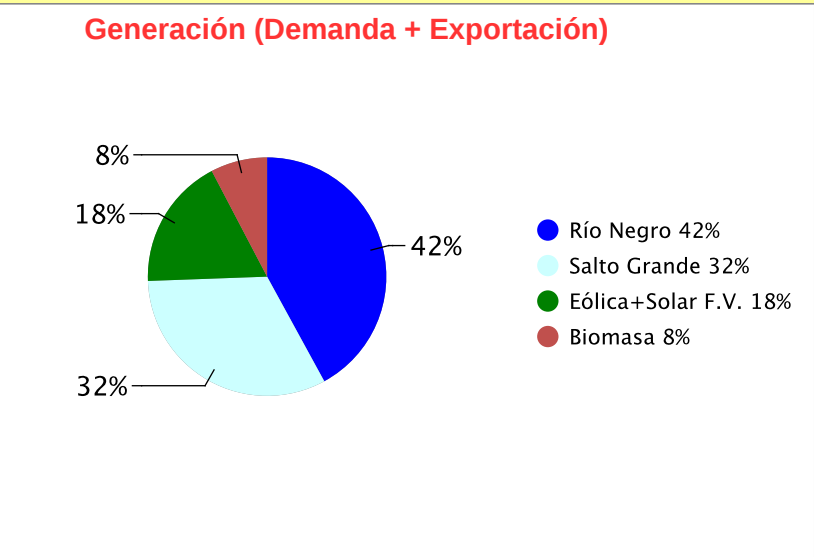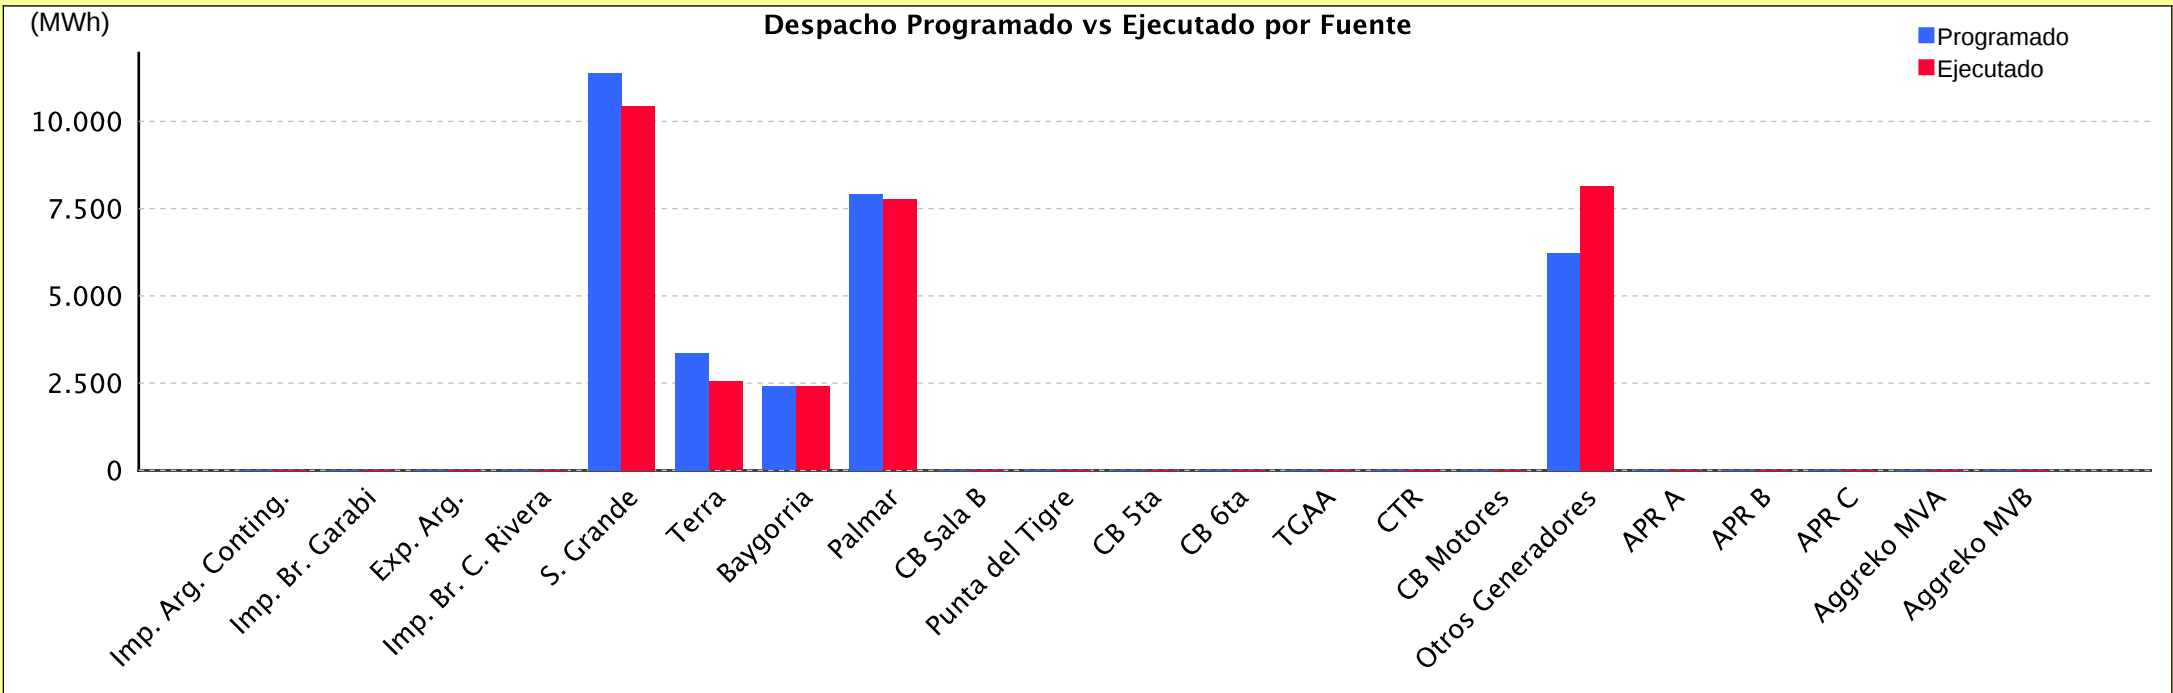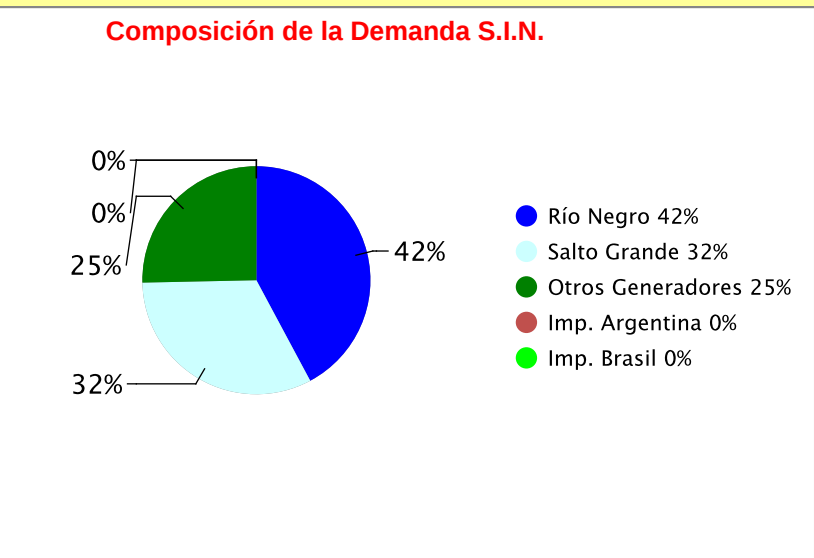



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

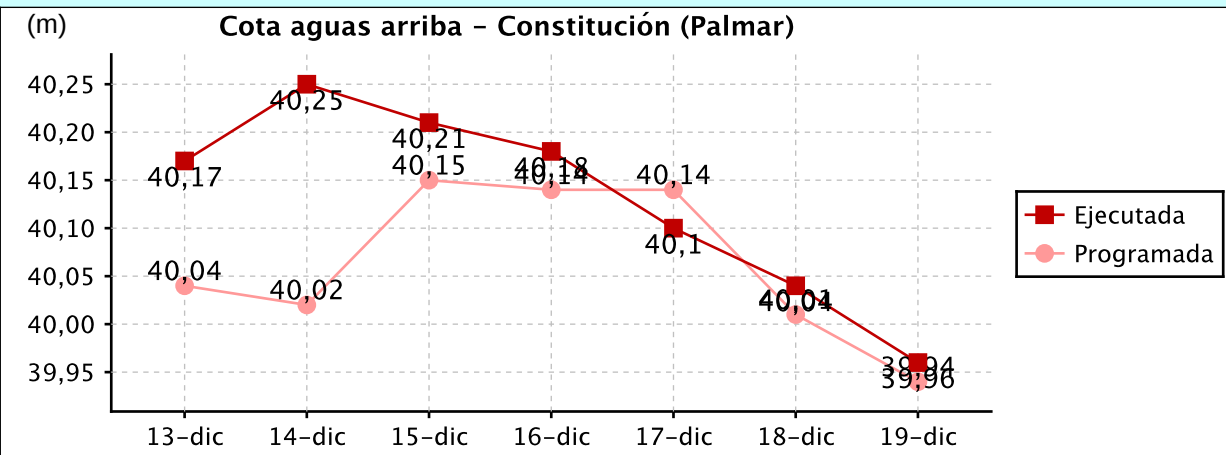
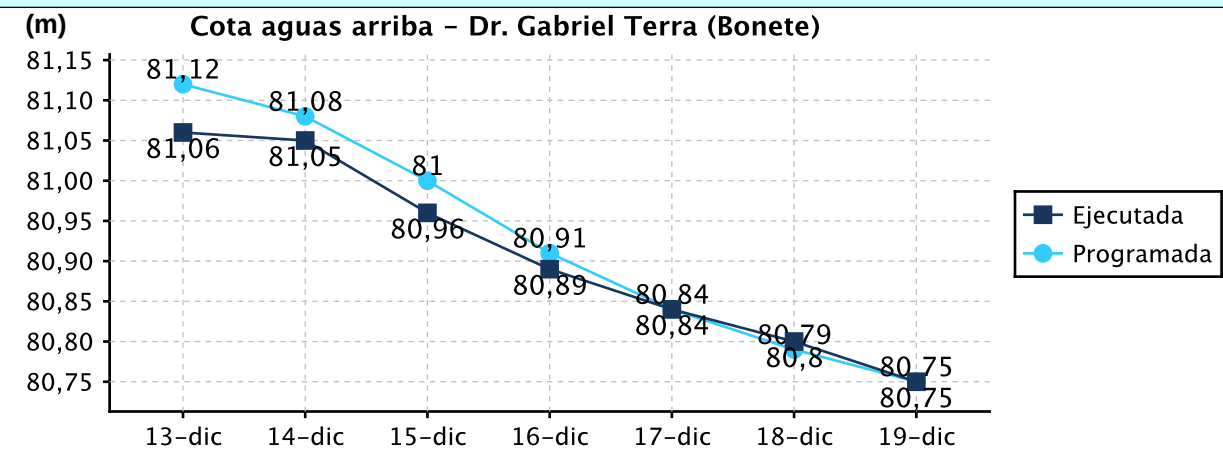


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,75
Baygorria	54,03	54,11
Palmar	39,94	39,96
SGU	34,61	34,67

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

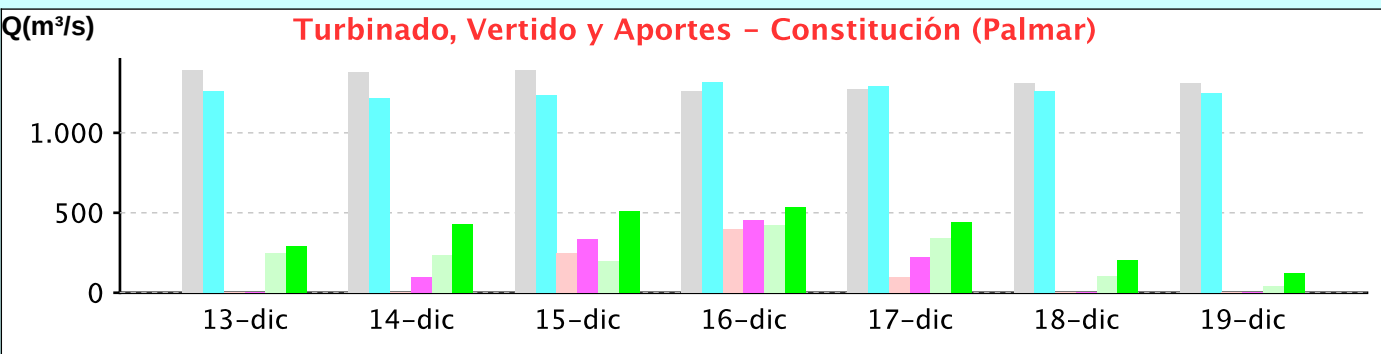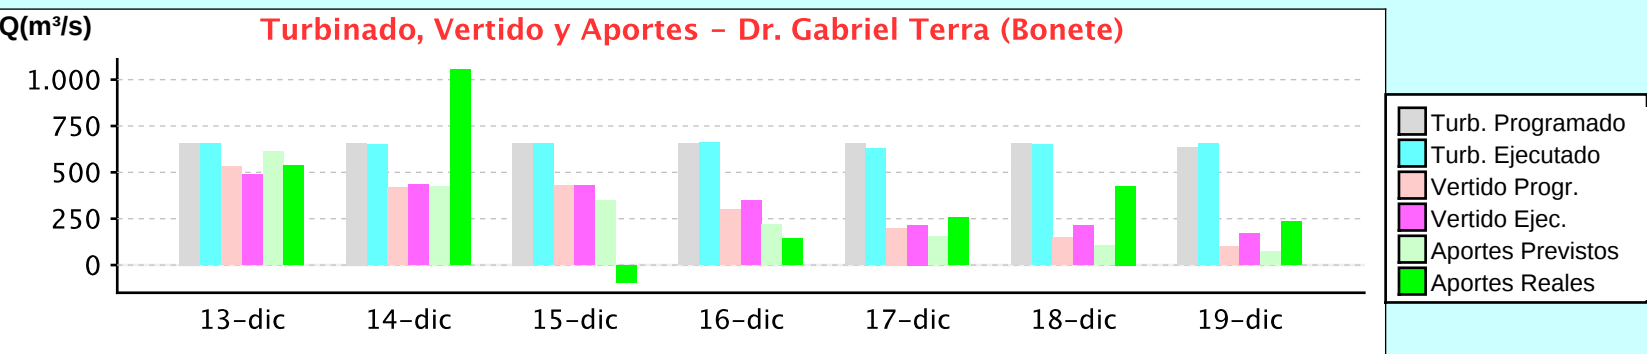

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

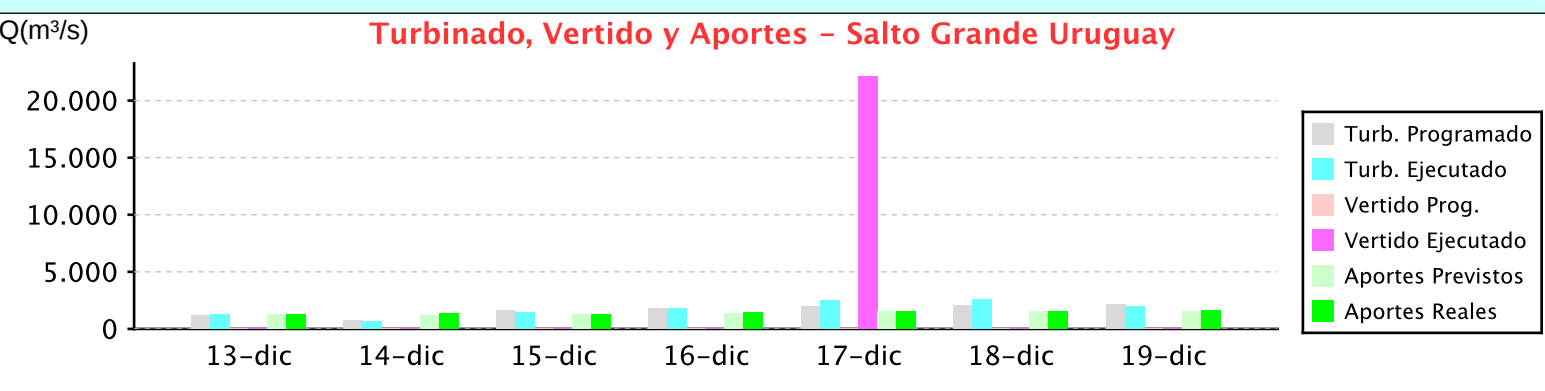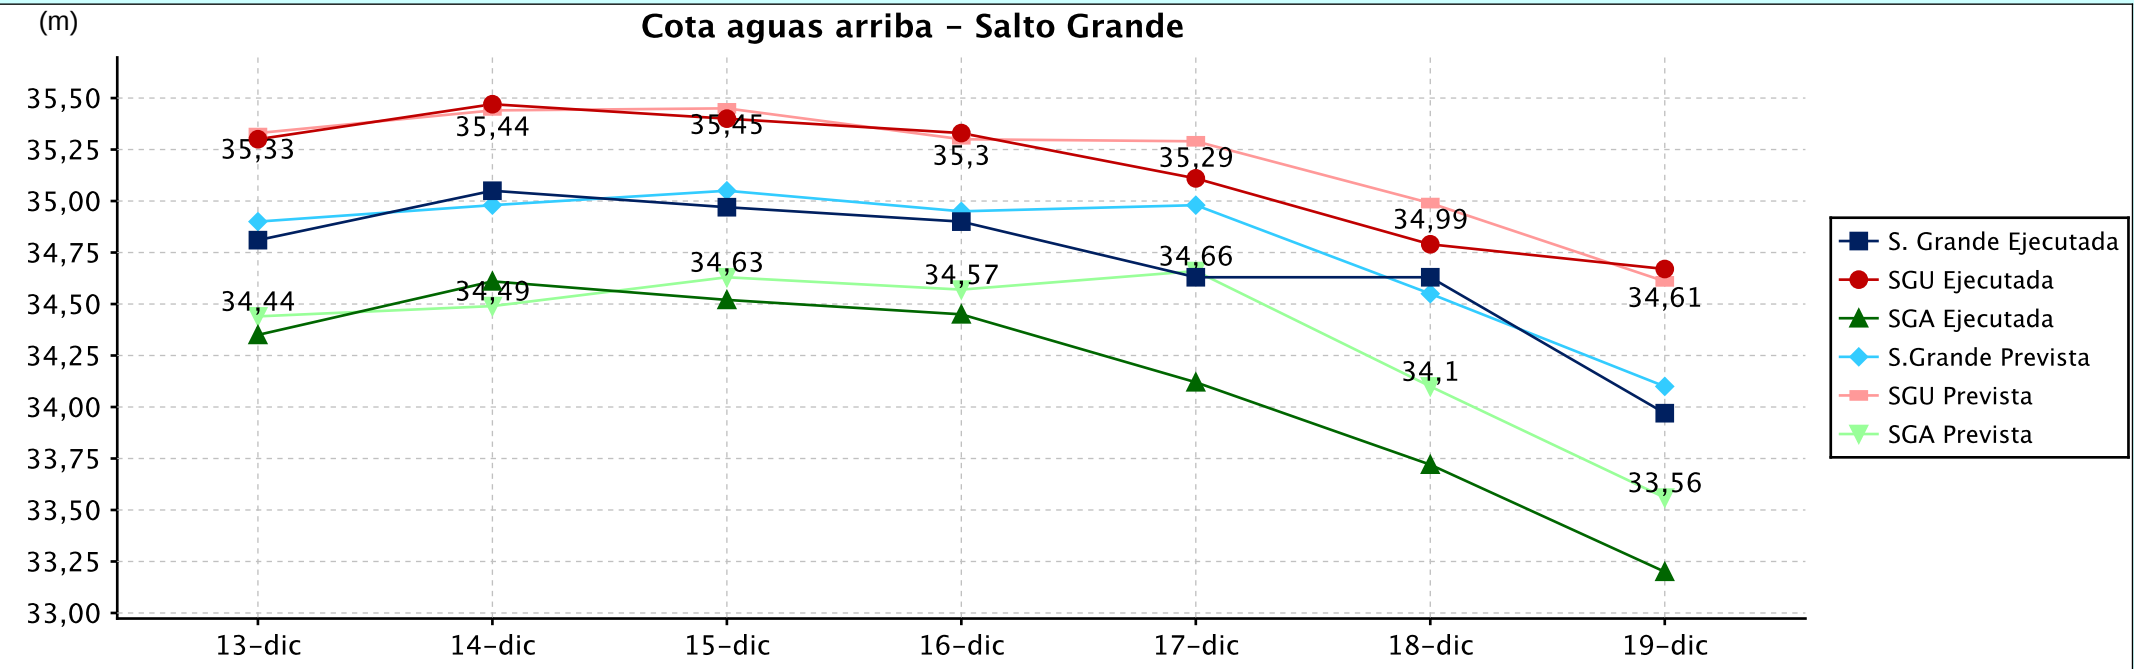

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,67
Cota Vista Arg	33,20
Cota real	33,97
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	30.324

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	635	655
Baygorria	871	889
Palmar	1.308	1.248
SGU	2.161	1.965

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	71	235
Baygorria	0	44
Palmar	39	120
SGU	1.550	1.642

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	169
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
