




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 22 de diciembre de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.797
C. Baygorria	388
C. Palmar	352
C. Salto Grande	18.958
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.164
TOTAL Generación	26.565

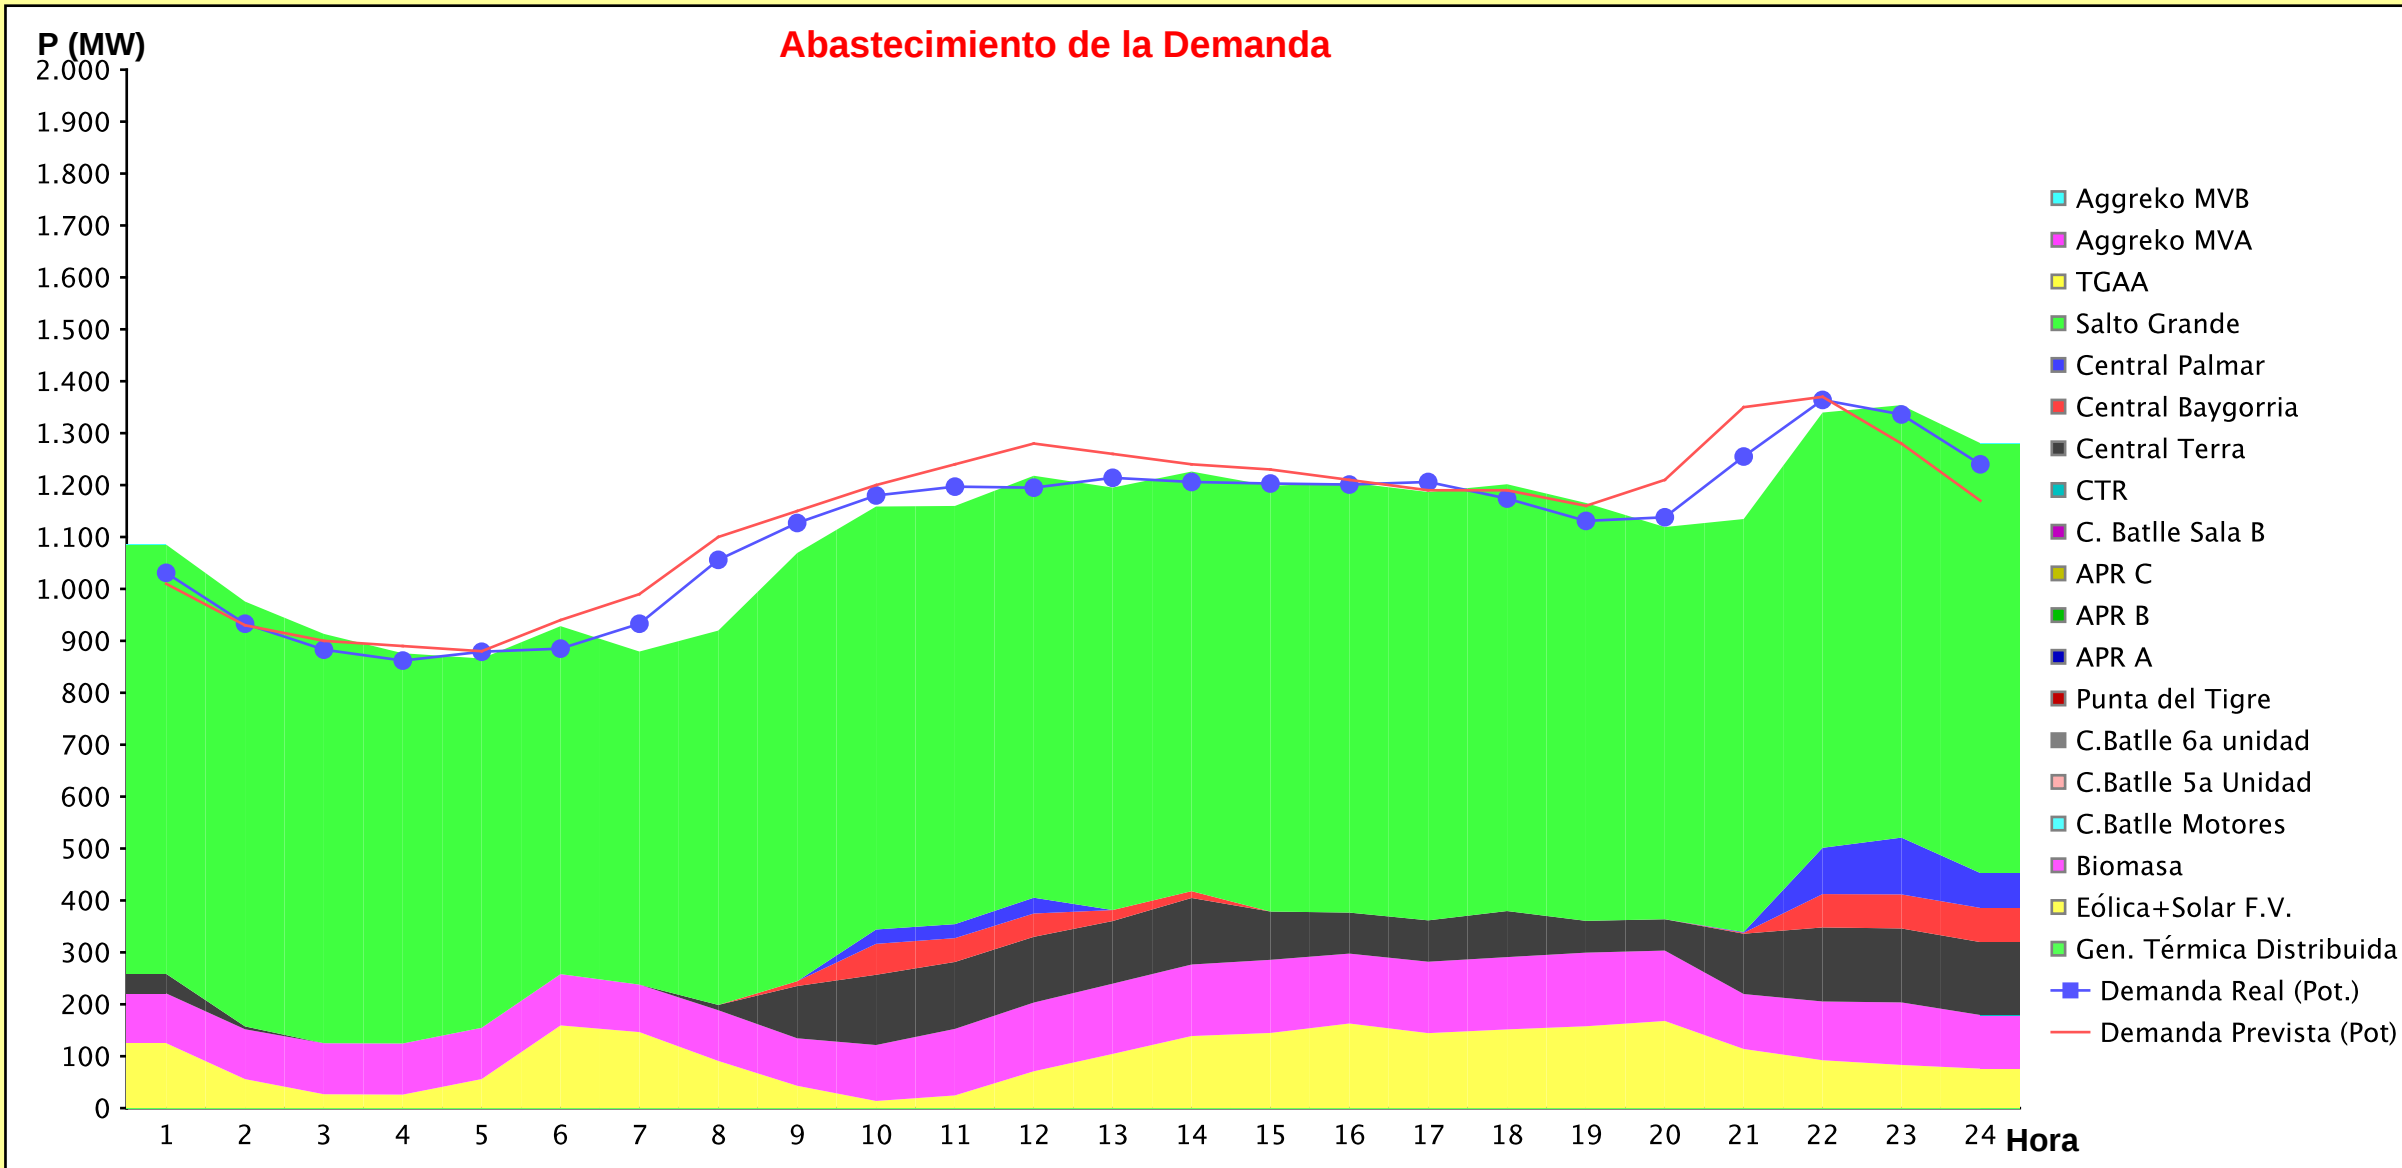

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.565
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.370
Diferencia (MWh)	-805
Ejecutada - Programada	-2,94 %

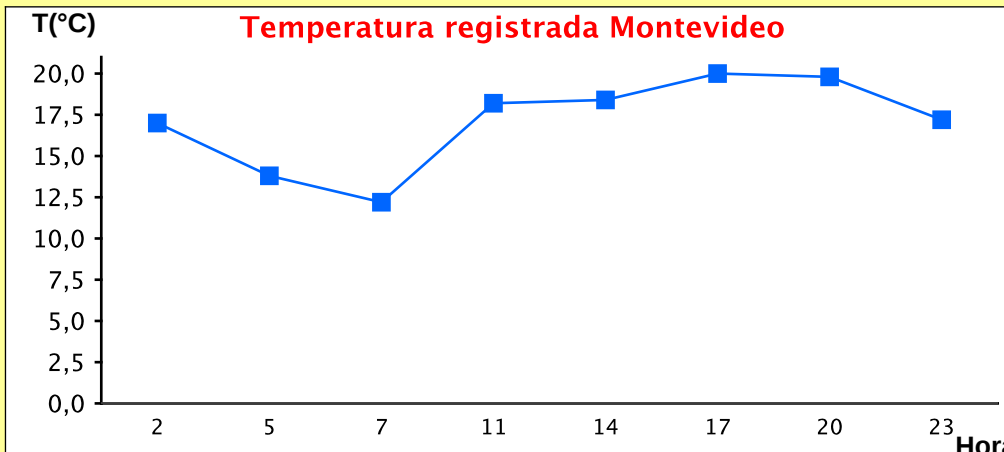



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1235,14 Hora 13:40
Potencia mínima:	854,75 Hora 03:51
Pico noche:	1388,18 Hora 21:37

Generación Media (MW)	
Eólica	99,4
Biomasa	117,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

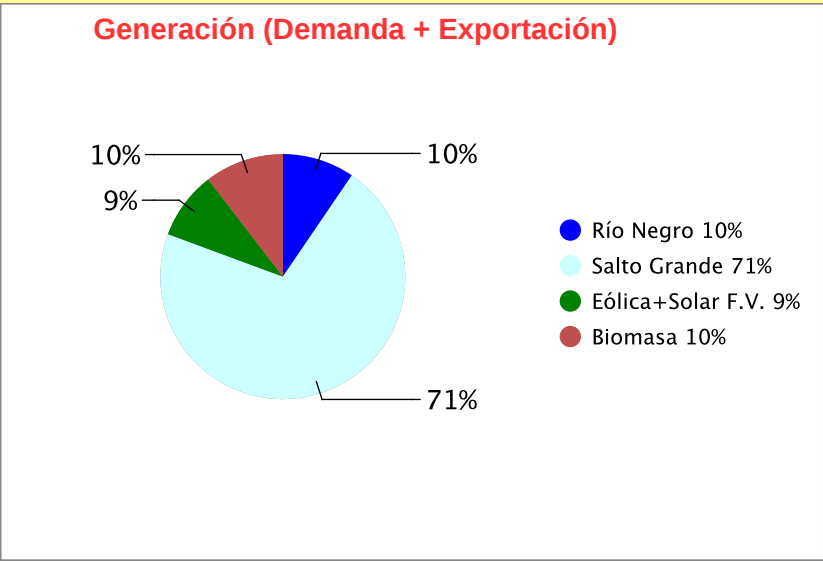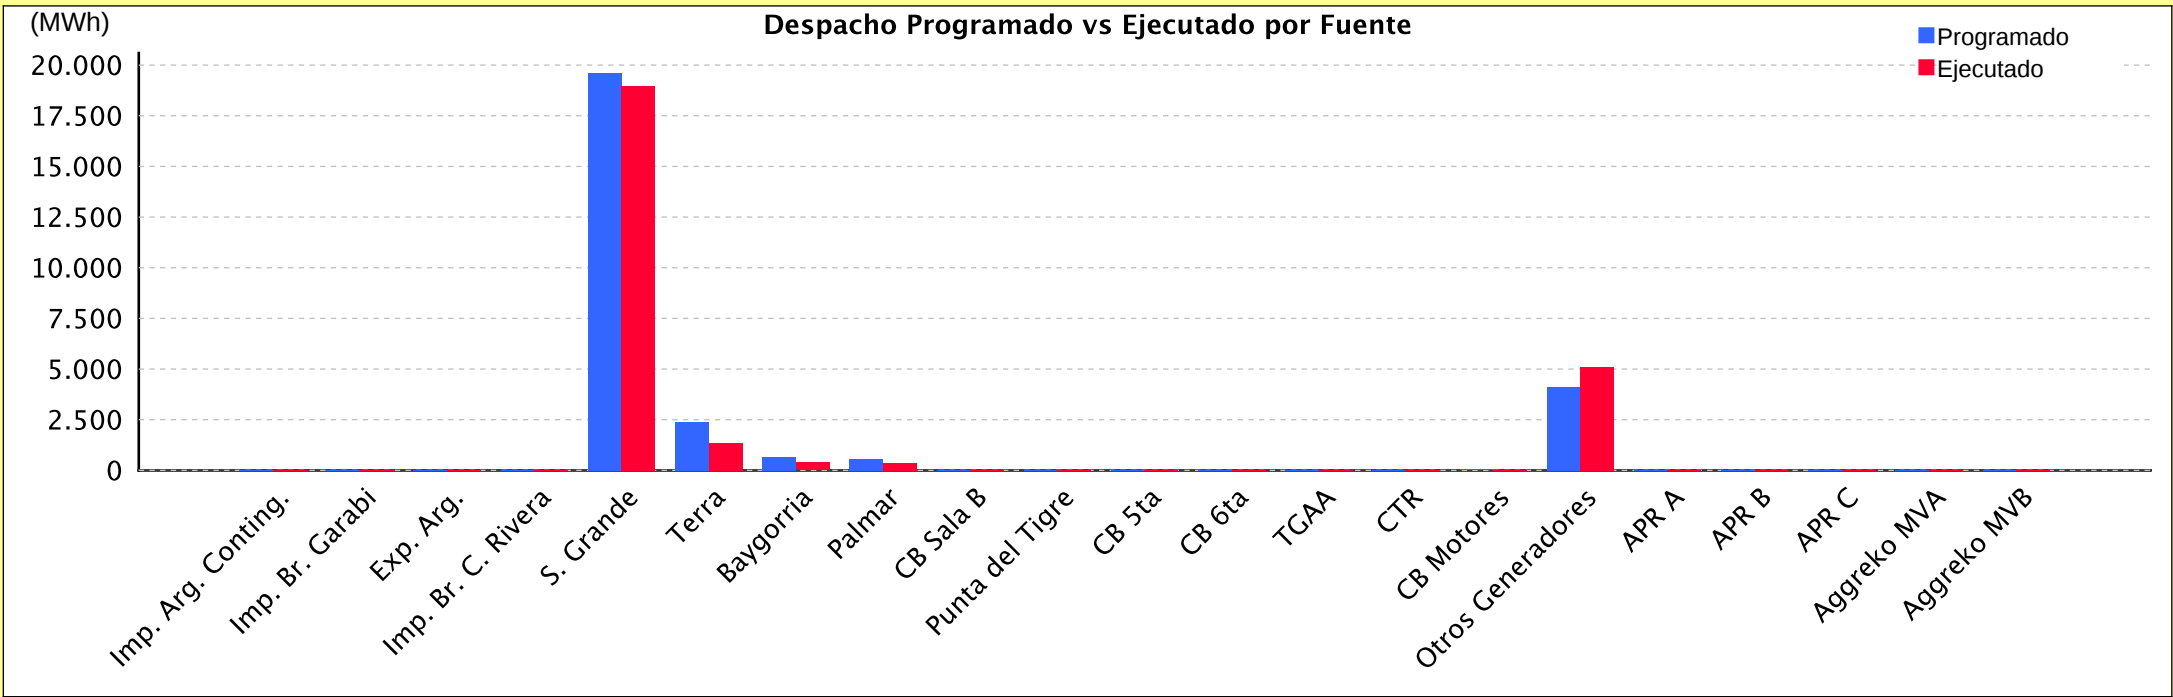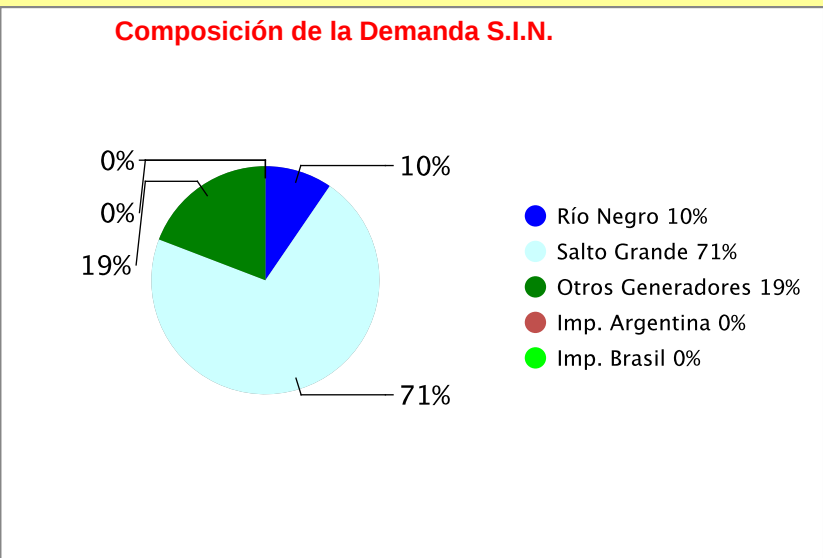



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

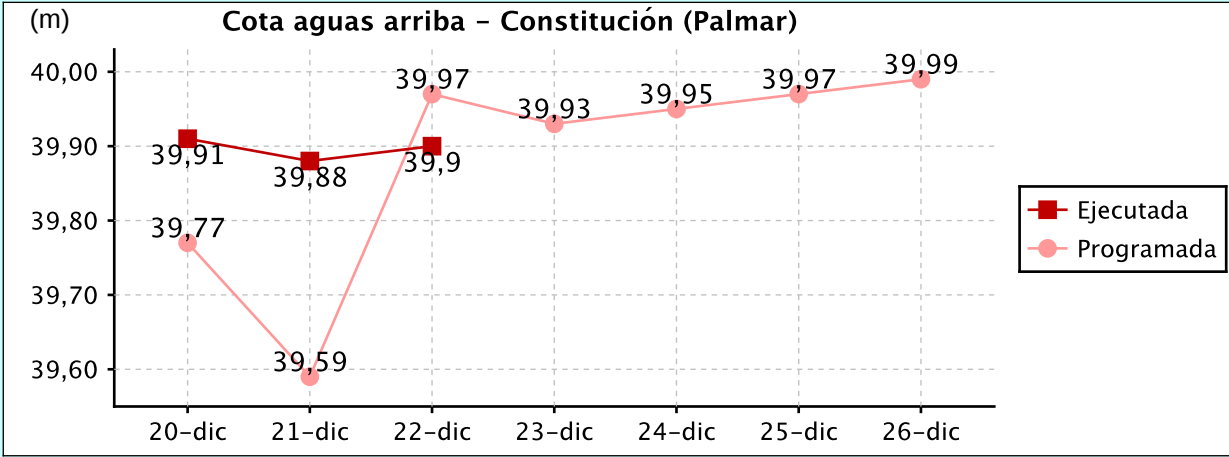
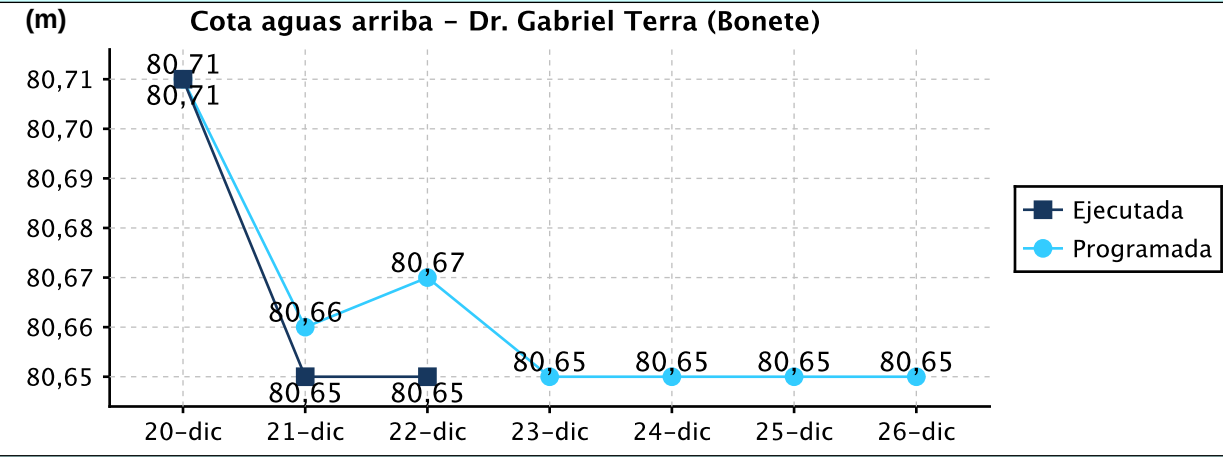


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,67	80,65
Baygorria	54,02	54,15
Palmar	39,97	39,9
SGU	35,73	35,54

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

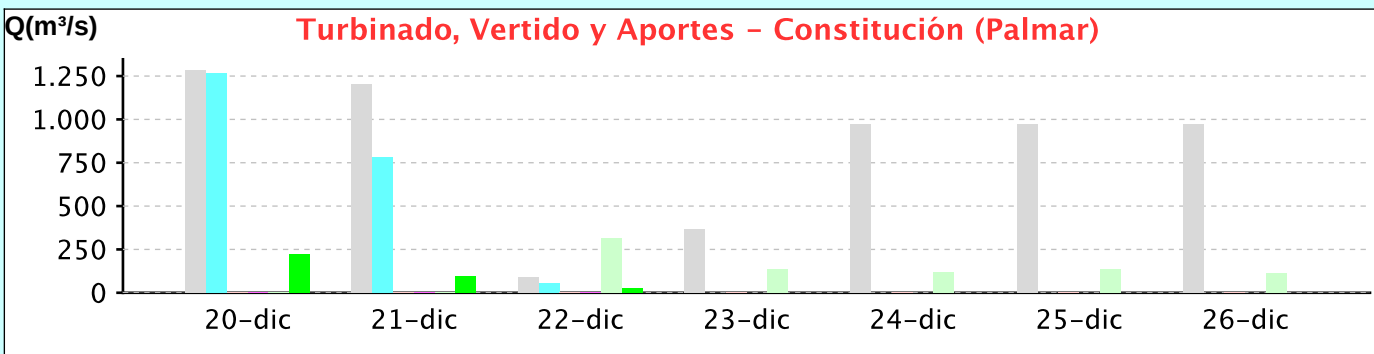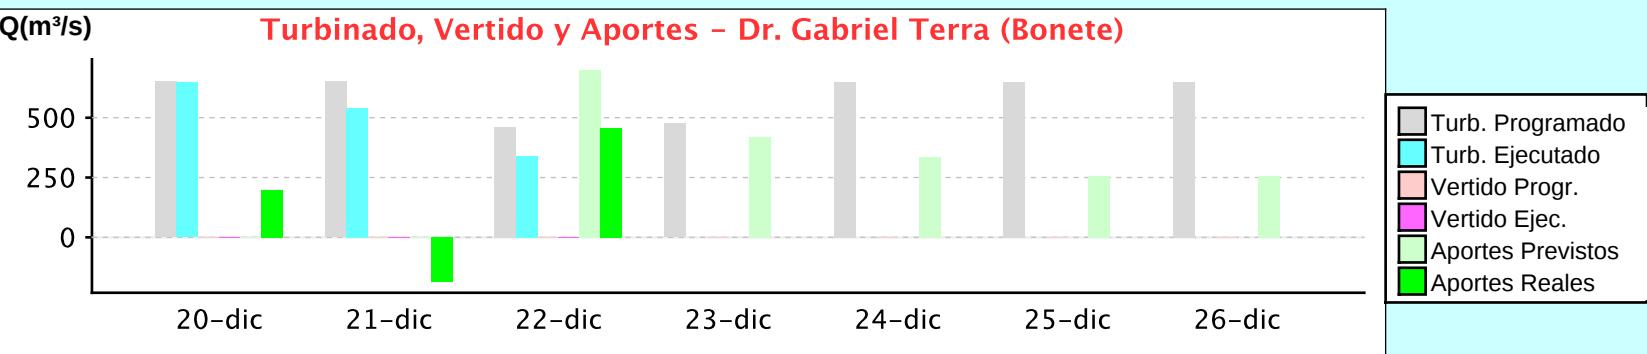

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

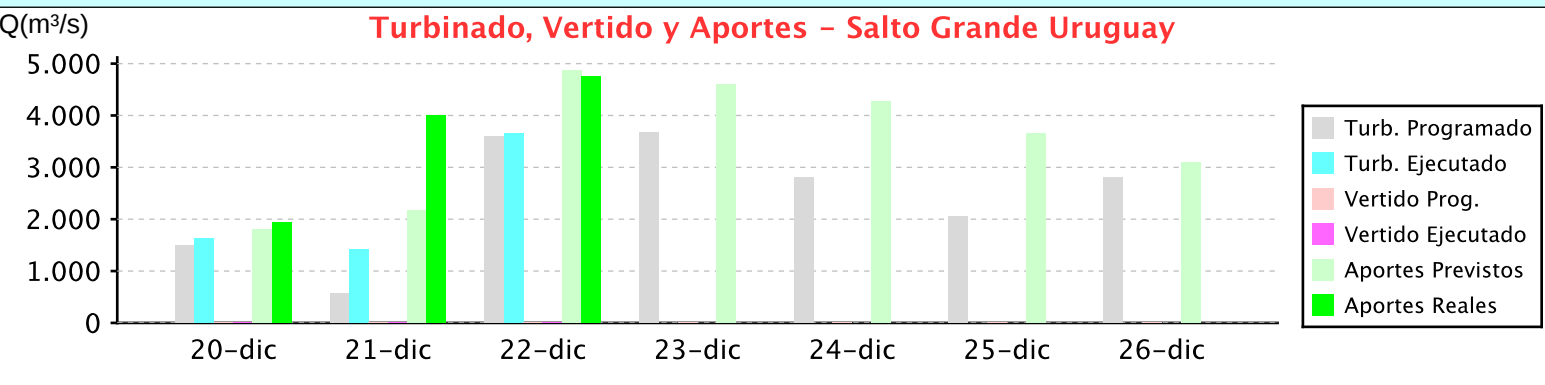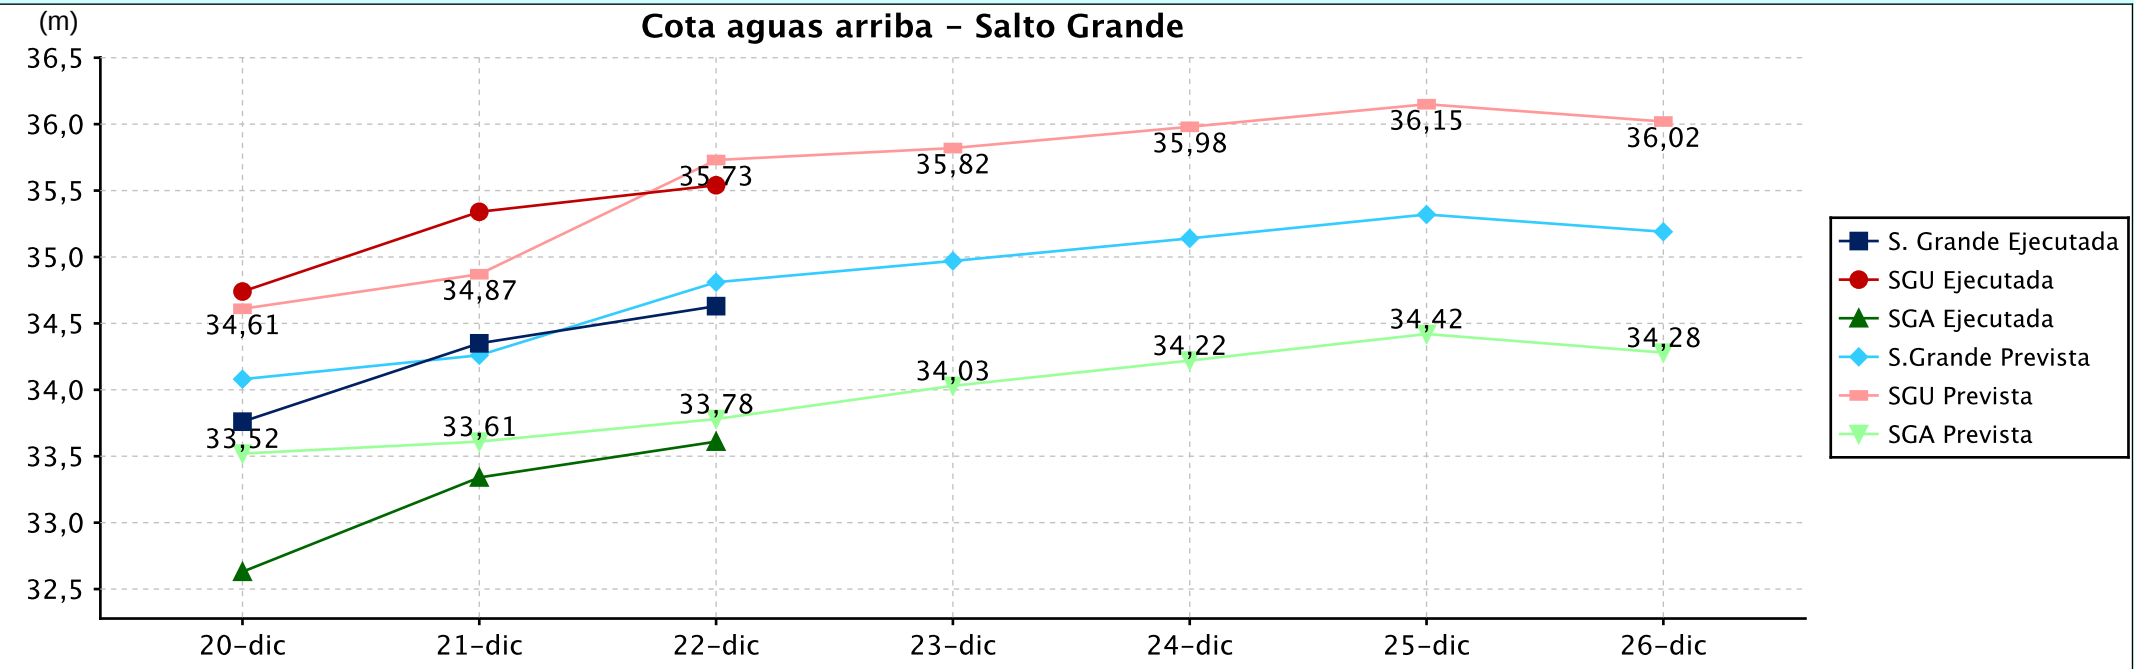

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,54
Cota Vista Arg	33,61
Cota real	34,63
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	43.058

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	462	341
Baygorria	244	139
Palmar	90	55
SGU	3.596	3.661

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	700	457
Baygorria	70	101
Palmar	316	24
SGU	4.875	4.757

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
