



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 23 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	46
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	50
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.428
C. Baygorria	1.056
C. Palmar	2.183
C. Salto Grande	19.578
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.353
TOTAL Generación	27.555

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.555
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.040
Diferencia (MWh)	-485
Ejecutada - Programada	-1,73 %

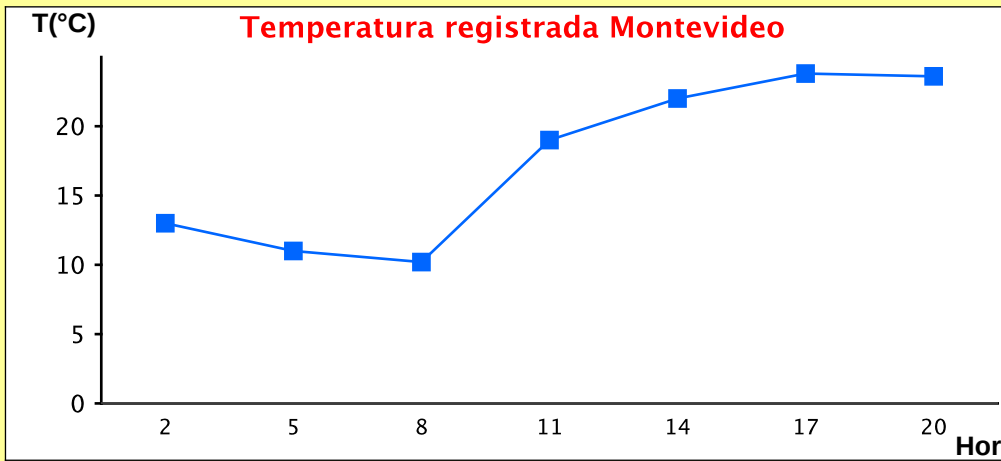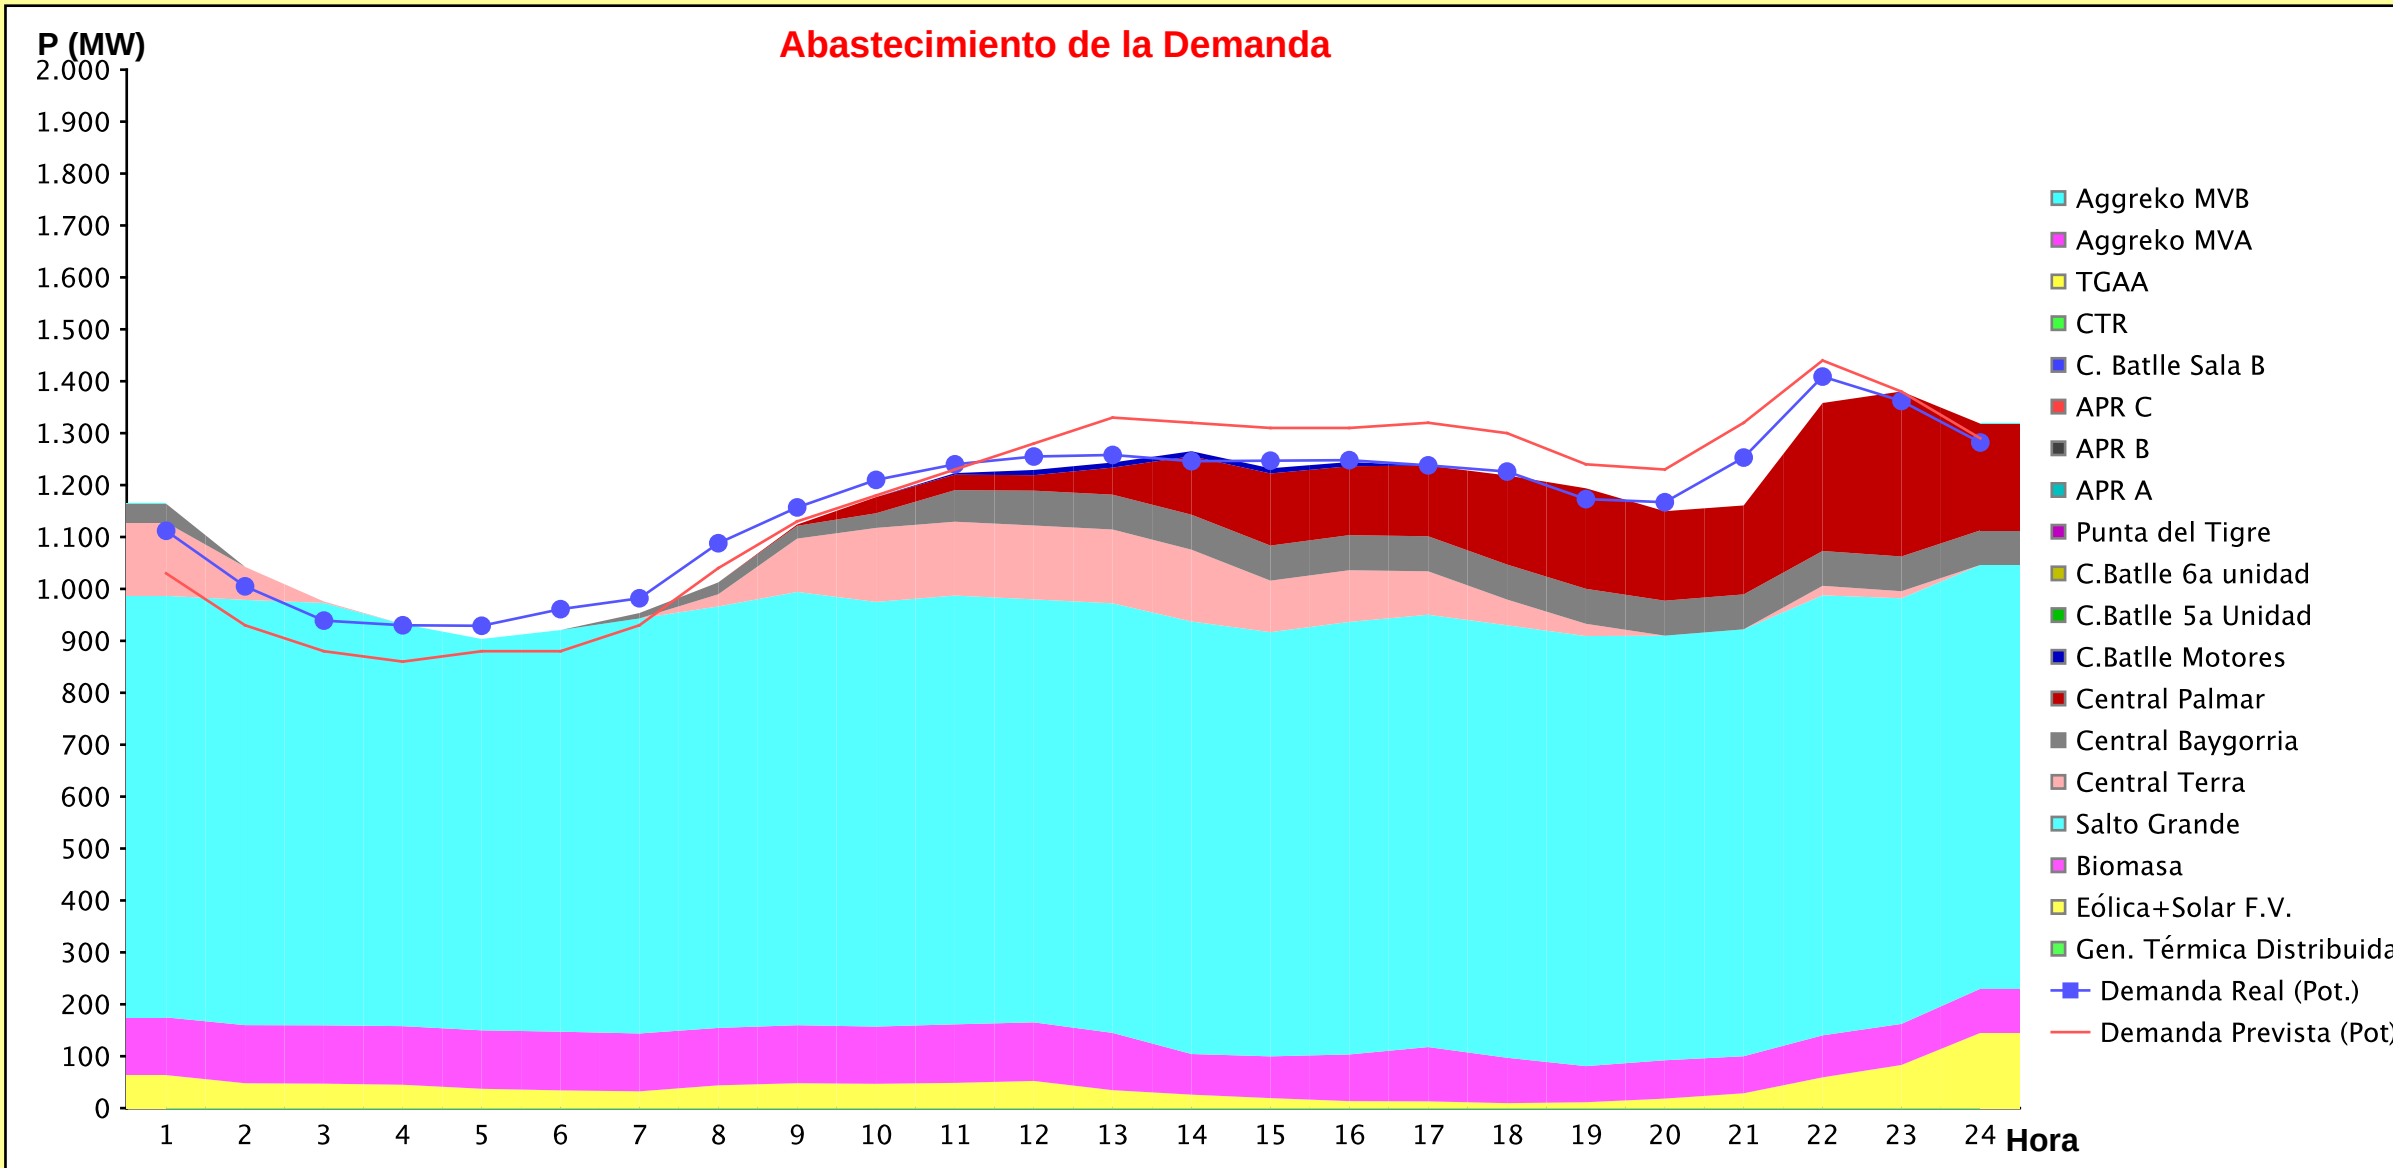


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1327,72 Hora 13:17
Potencia mínima:	901,82 Hora 03:45
Pico noche:	1416,41 Hora 21:51

Generación Media (MW)	
Eólica	42,6
Biomasa	99,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

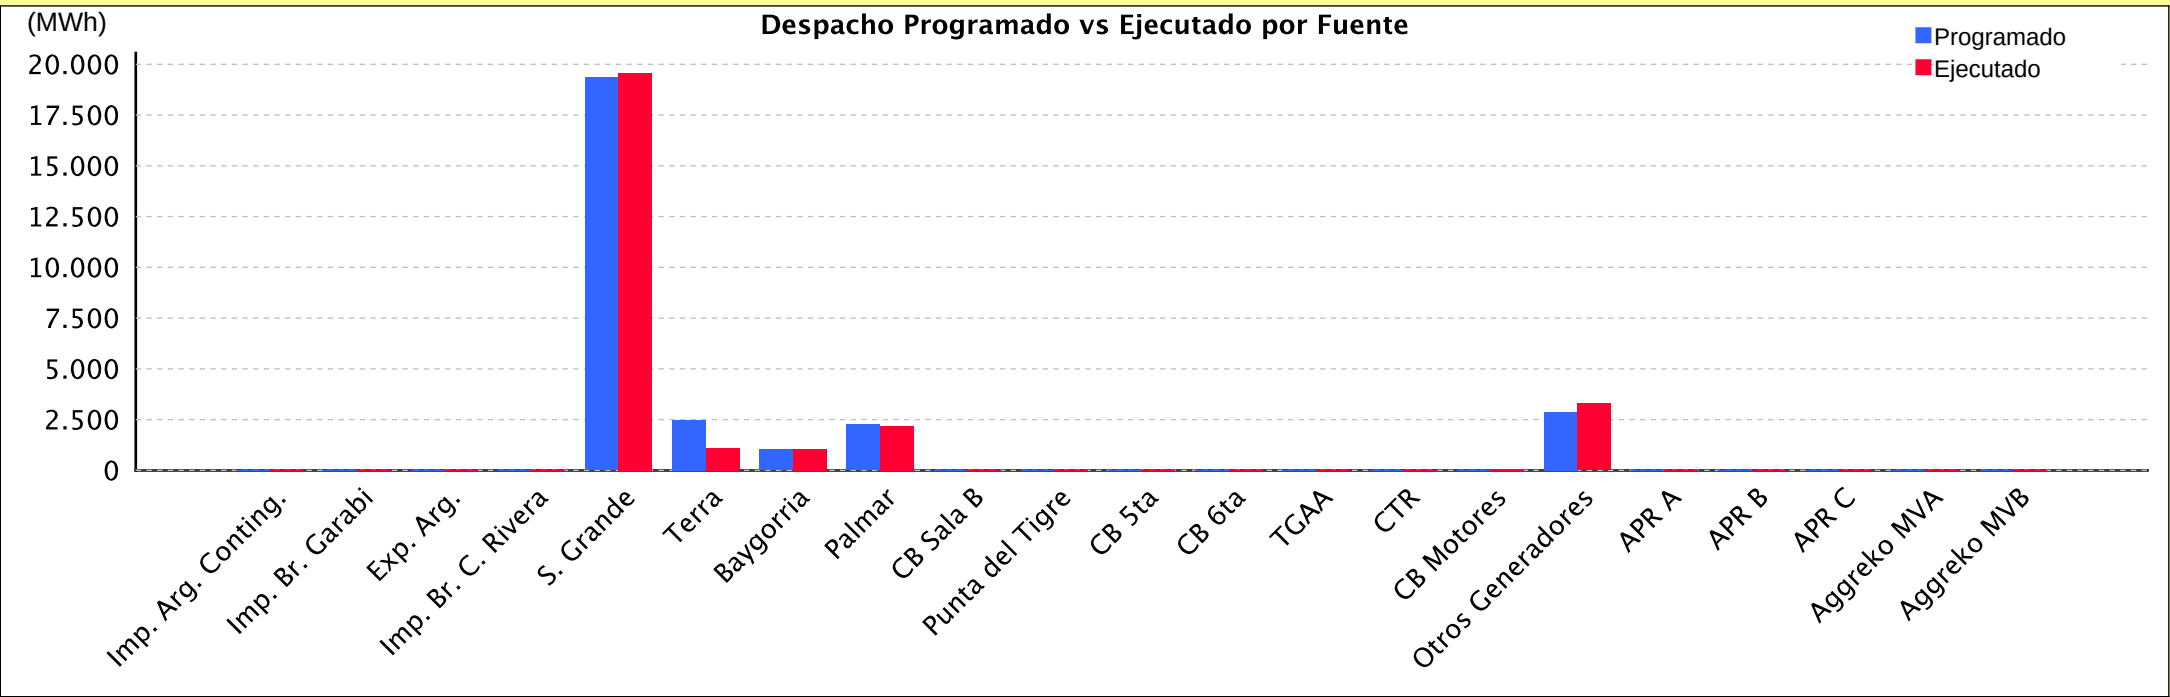
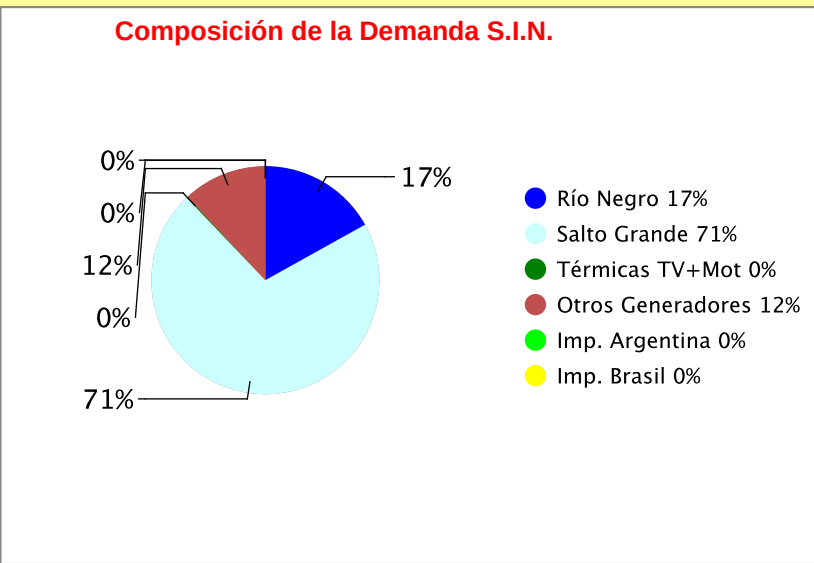


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

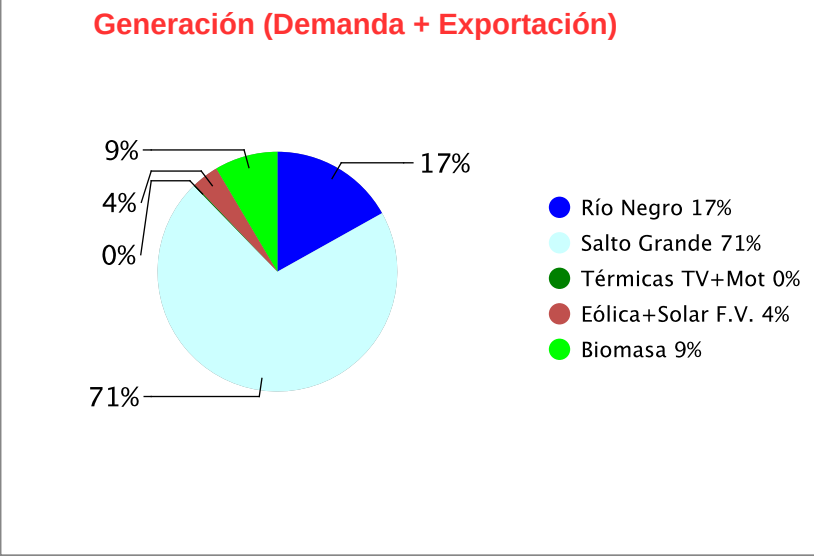



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

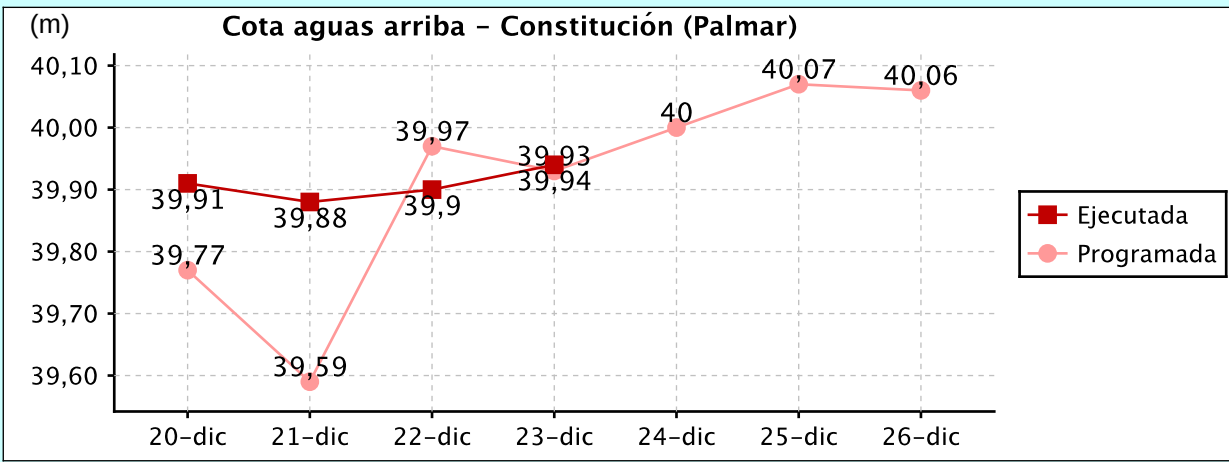
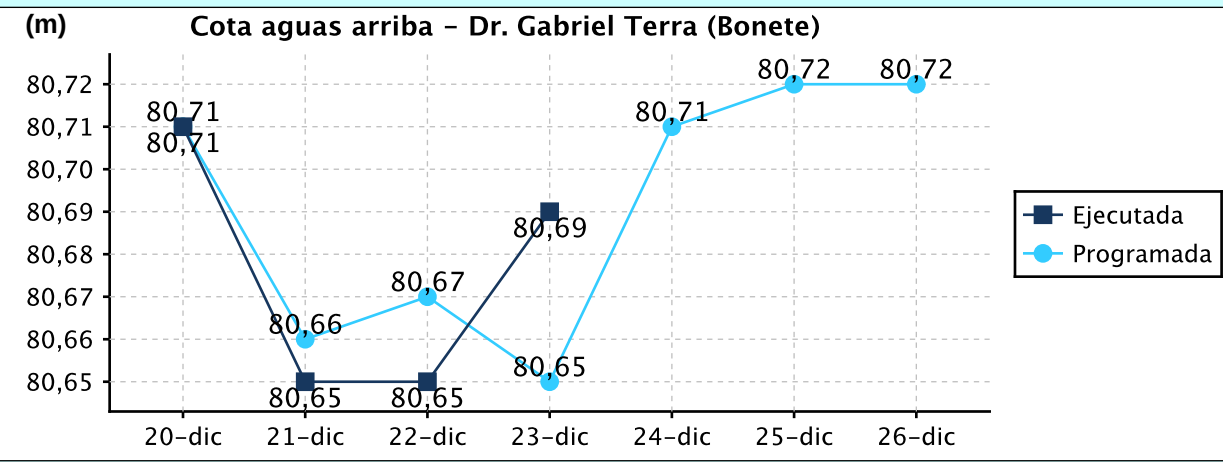


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,65	80,69
Baygorria	54,23	54,21
Palmar	39,93	39,94
SGU	35,82	35,72

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

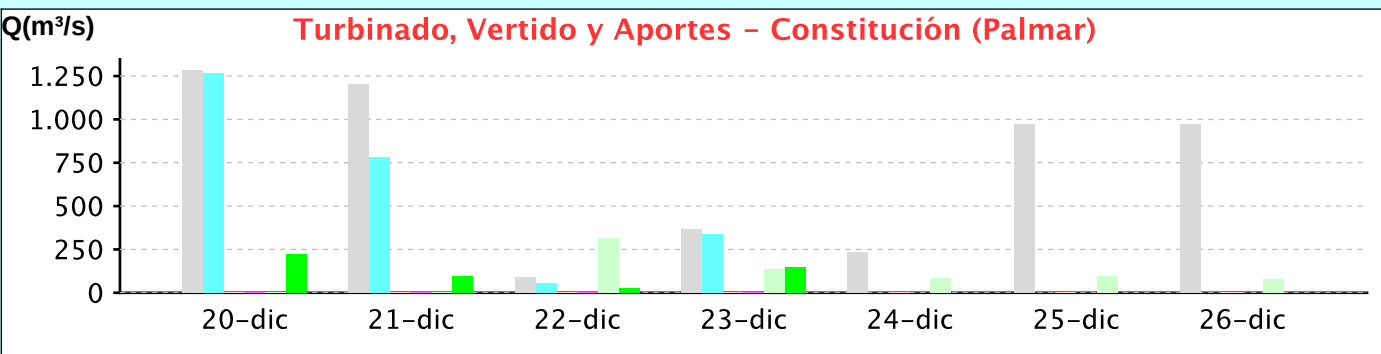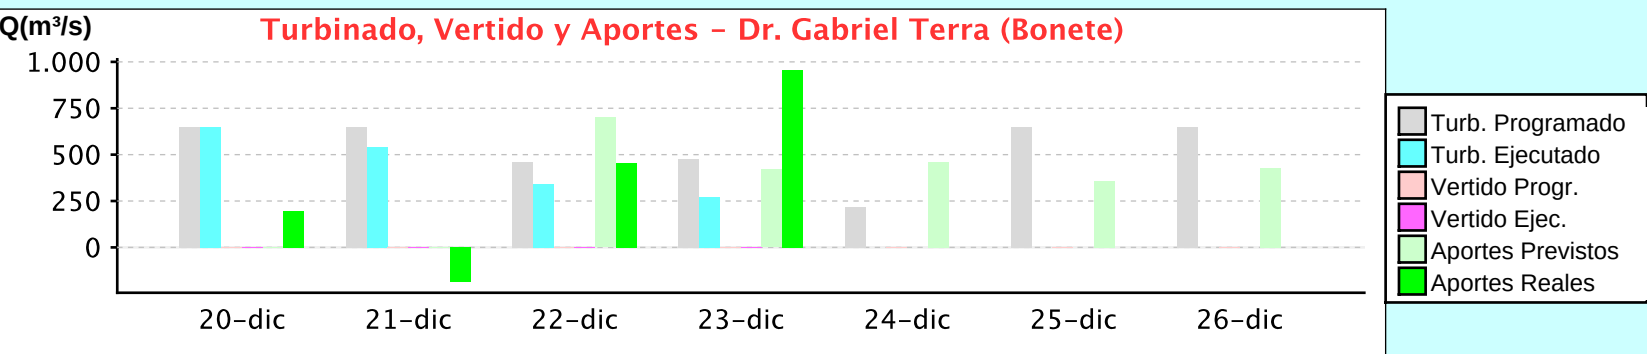

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

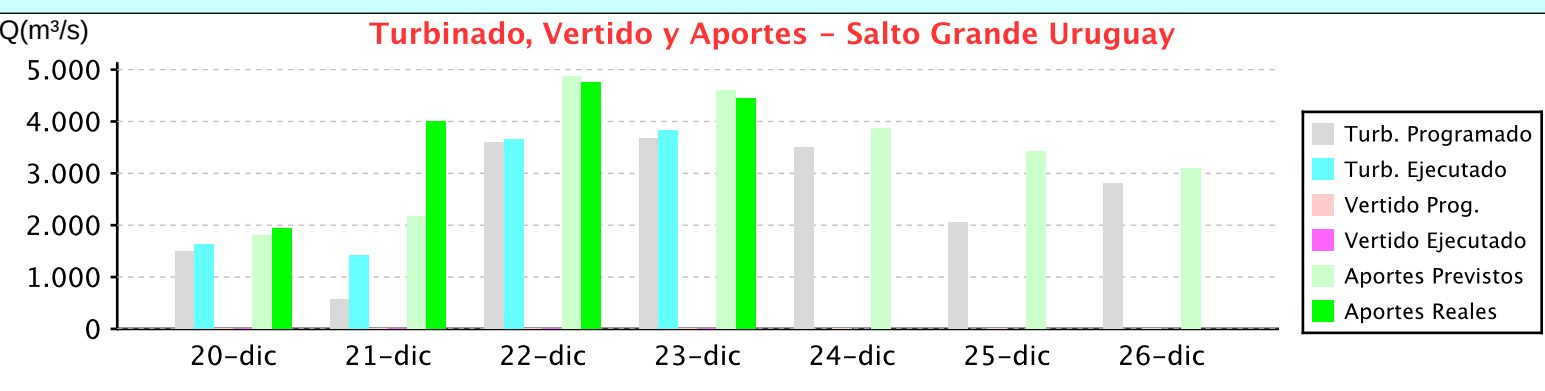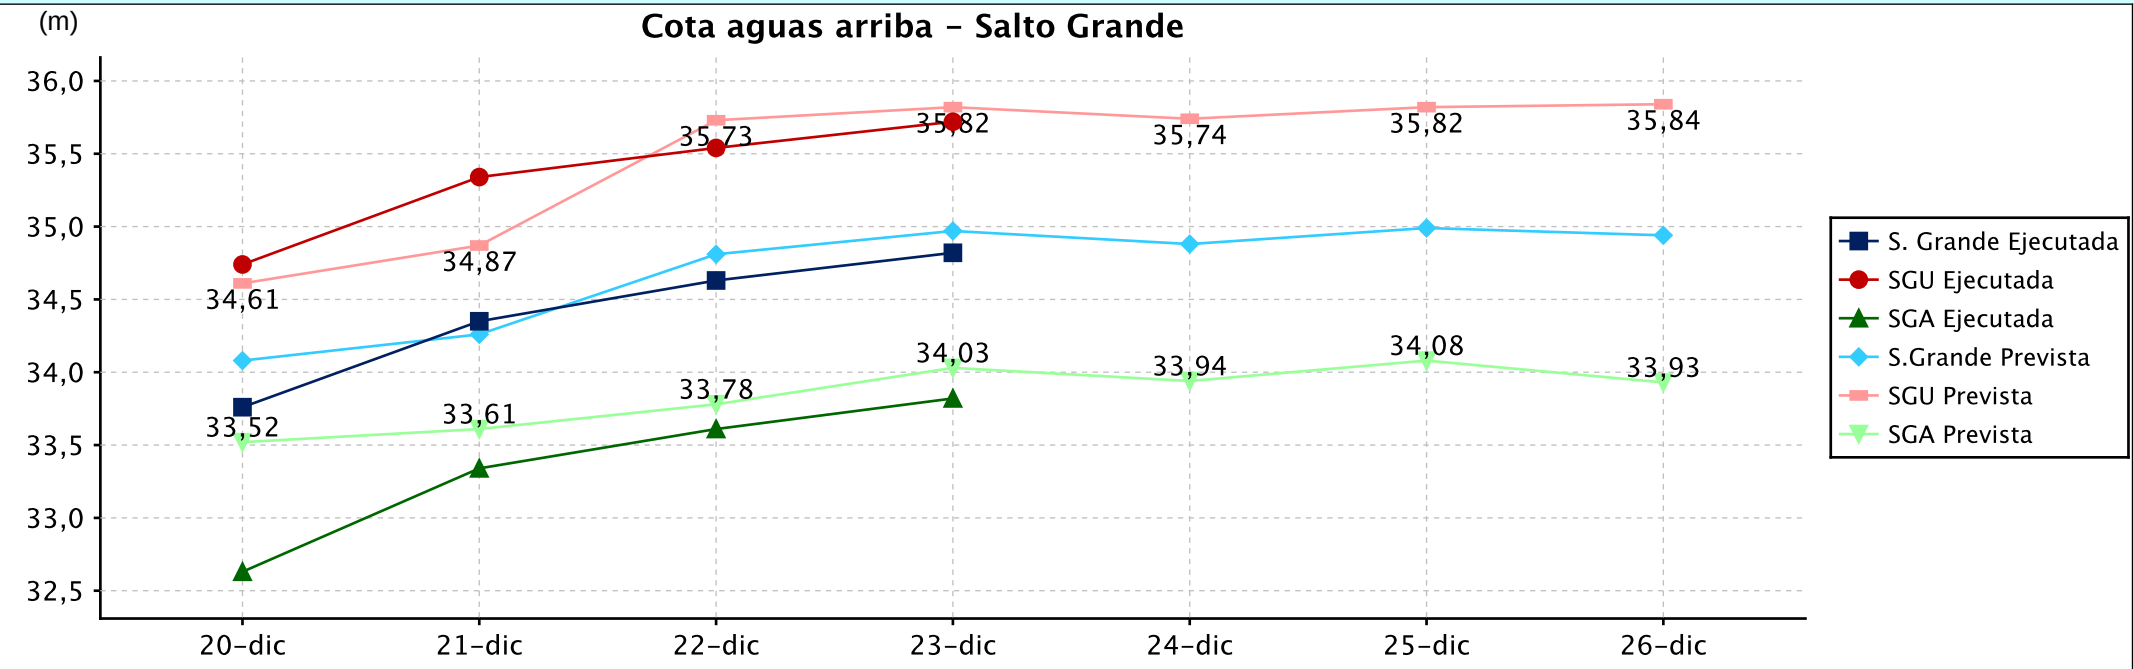

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,72
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	34,82
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	43.443

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	476	273
Baygorria	391	378
Palmar	369	339
SGU	3.673	3.829

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	957
Baygorria	38	199
Palmar	134	150
SGU	4.600	4.450

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
