




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 29 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	396
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	400
Central La Tablada	-72
Central P. del Tigre	639
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.394
C. Baygorria	2.103
C. Palmar	6.265
C. Salto Grande	19.341
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.322
TOTAL Generación	35.384

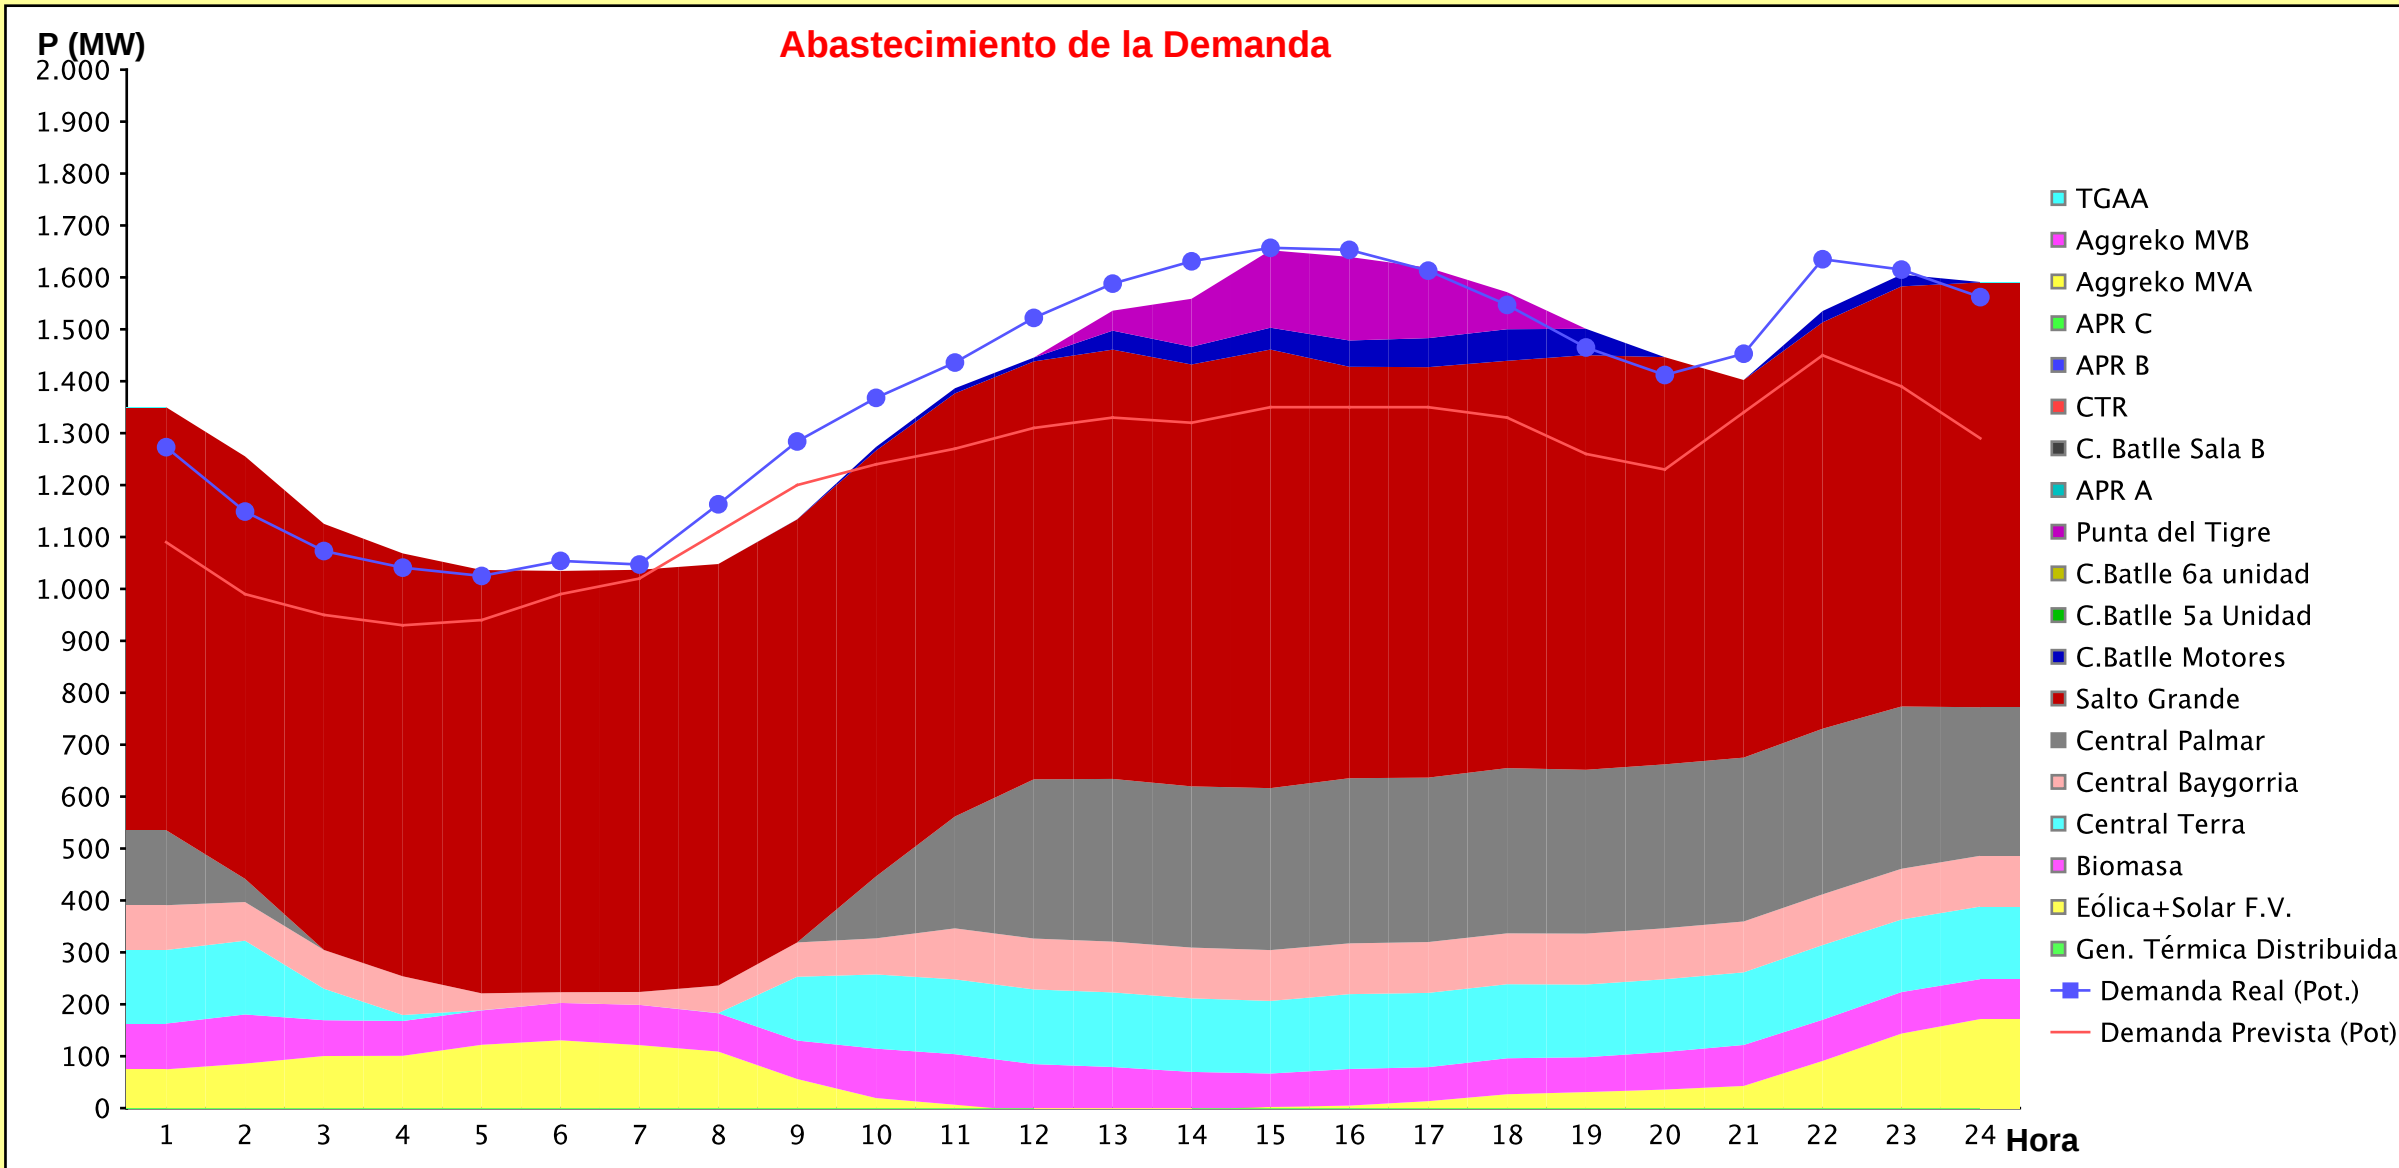



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.624
Hidráulica	2.624
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.624

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.760
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.030
Diferencia (MWh)	3.730
Ejecutada - Programada	12,85 %

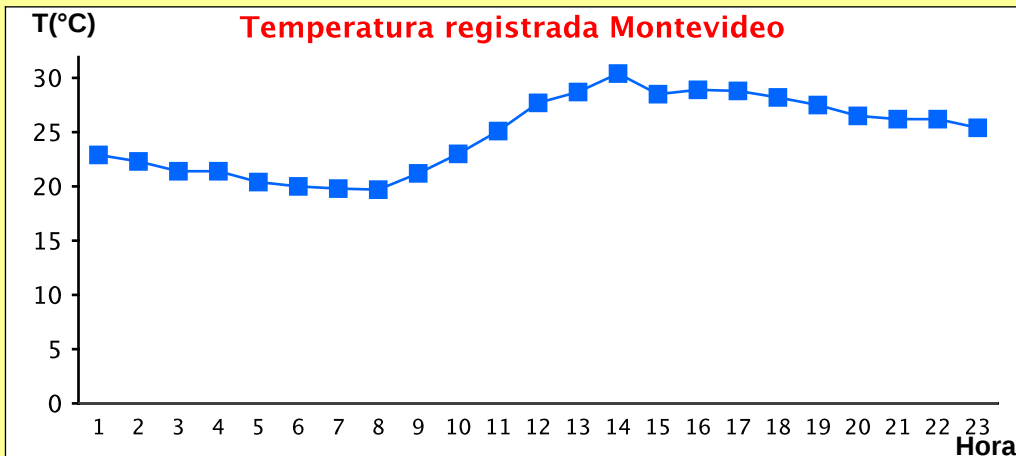


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1664,89 Hora 15:21
Potencia mínima:	1013,57 Hora 04:56
Pico noche:	1640,04 Hora 21:57

Generación Media (MW)	
Eólica	62,6
Biomasa	76,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

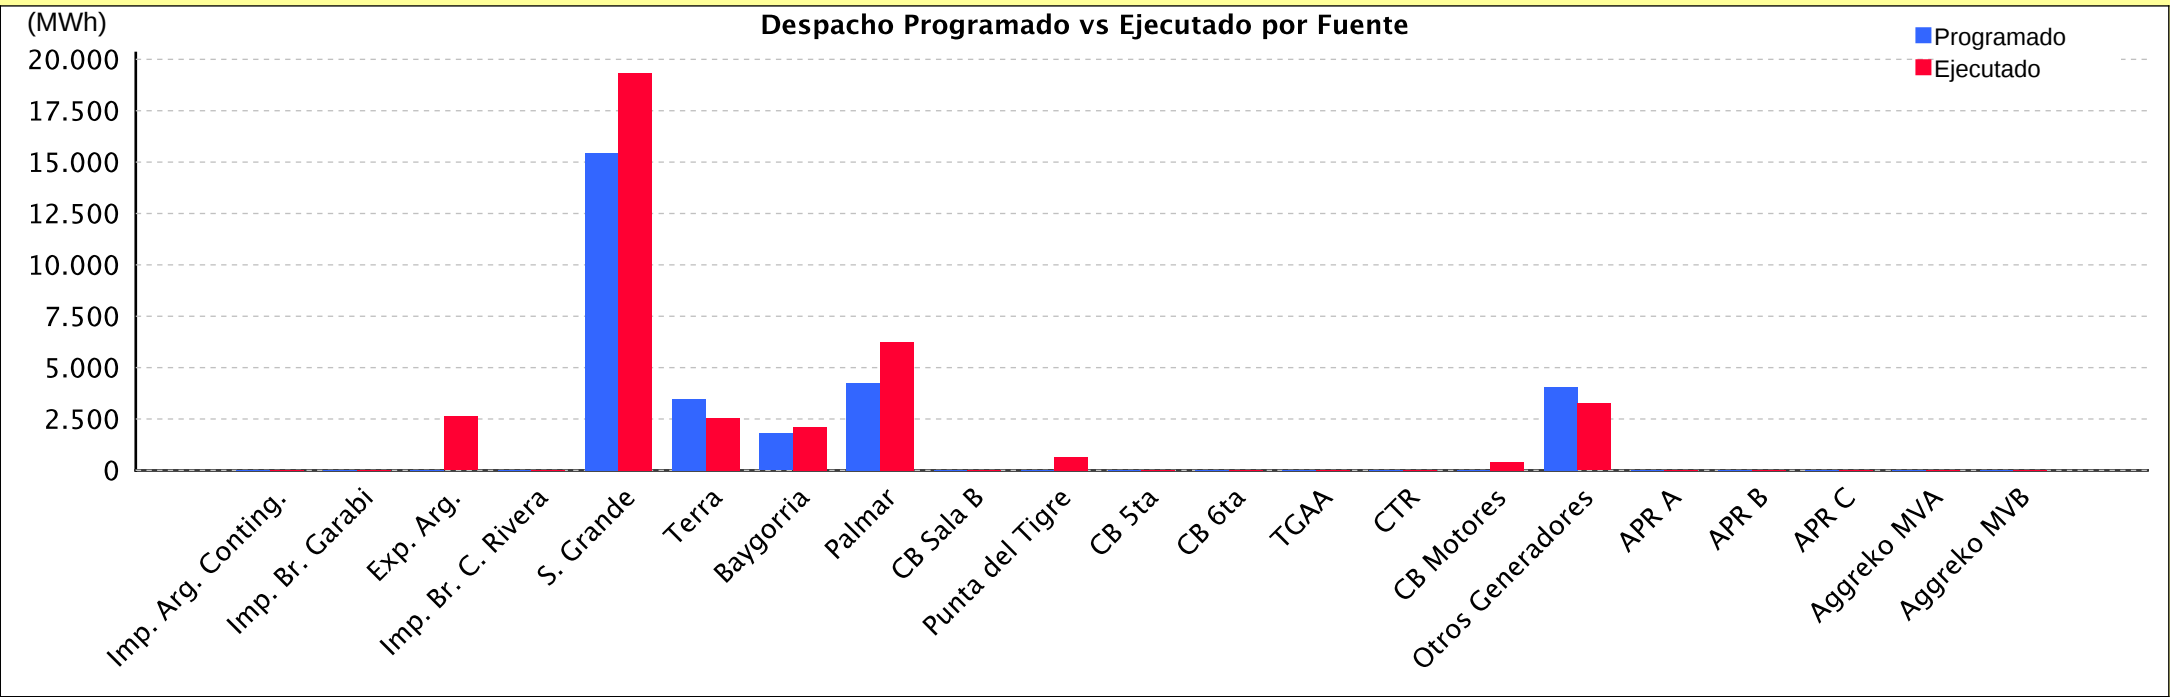
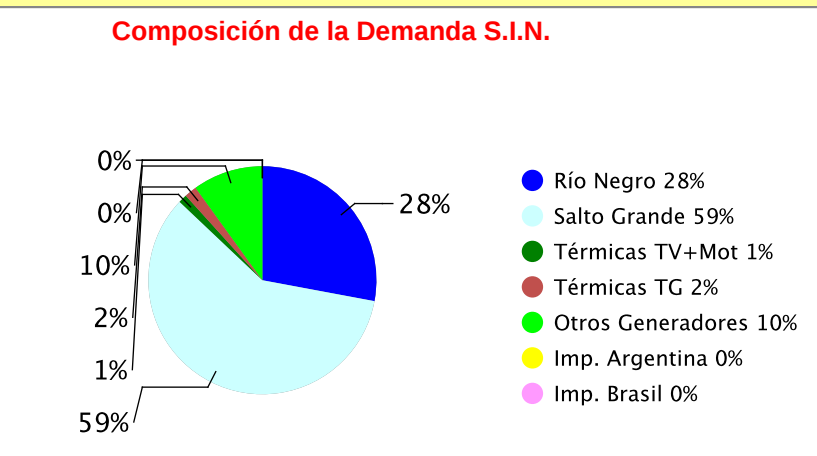


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

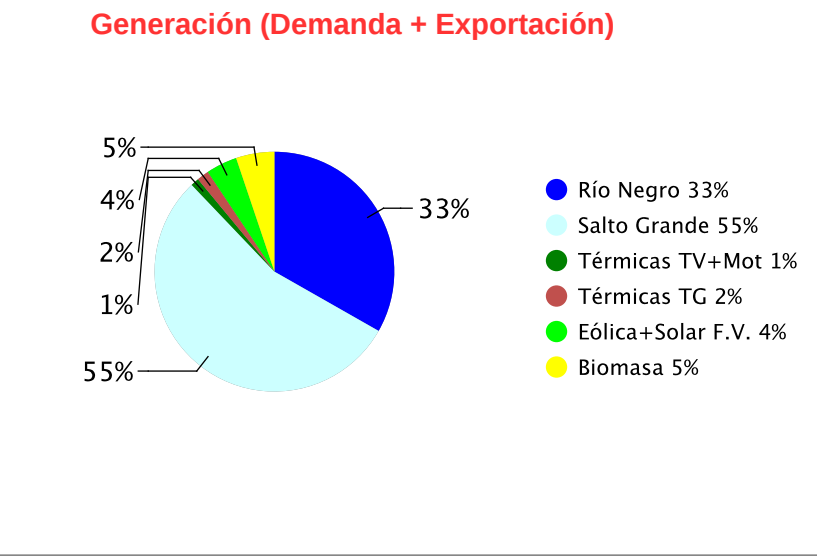



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

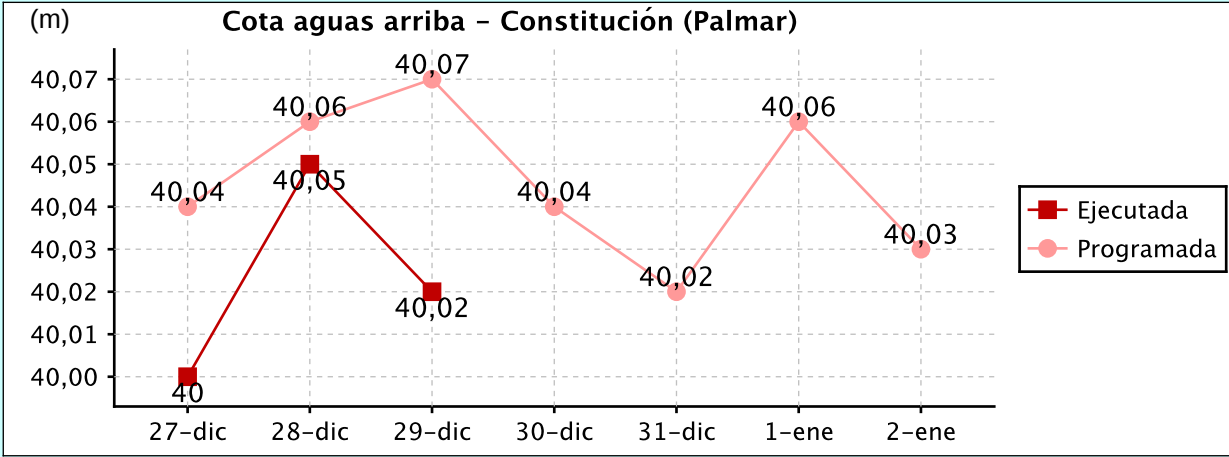
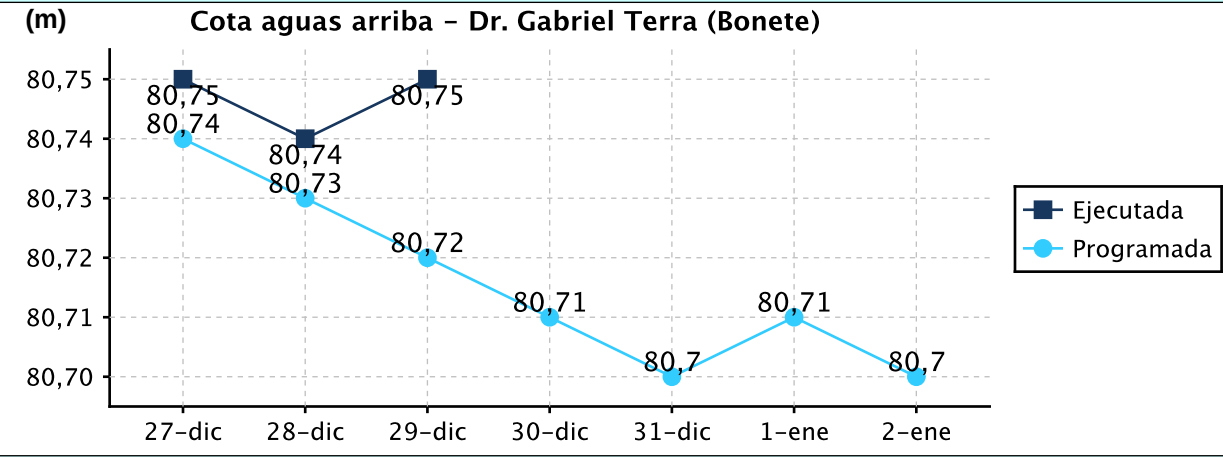


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,72	80,75
Baygorria	54,16	54,1
Palmar	40,07	40,02
SGU	34,99	35,03

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

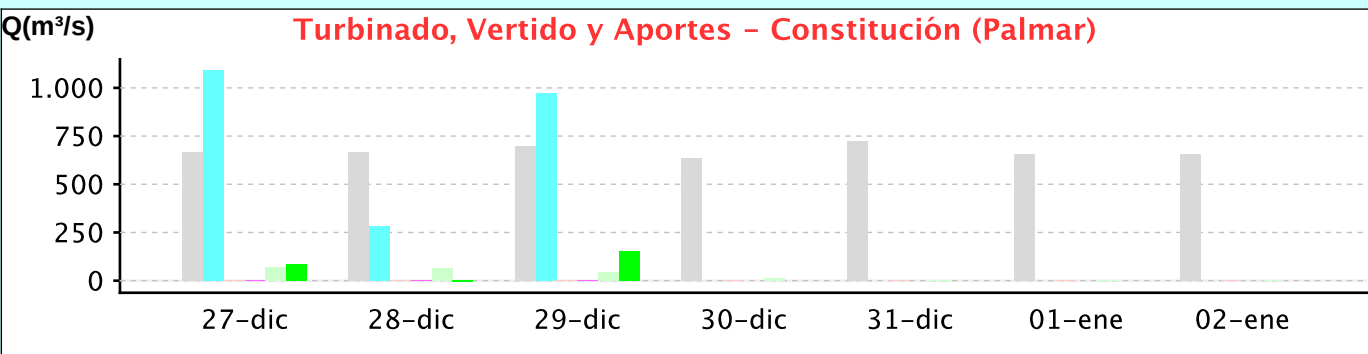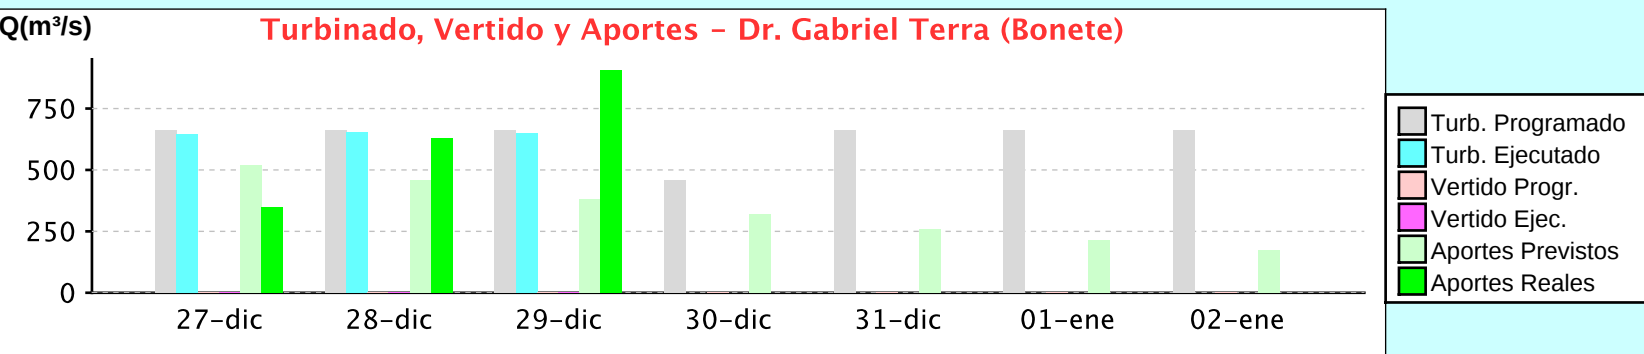

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

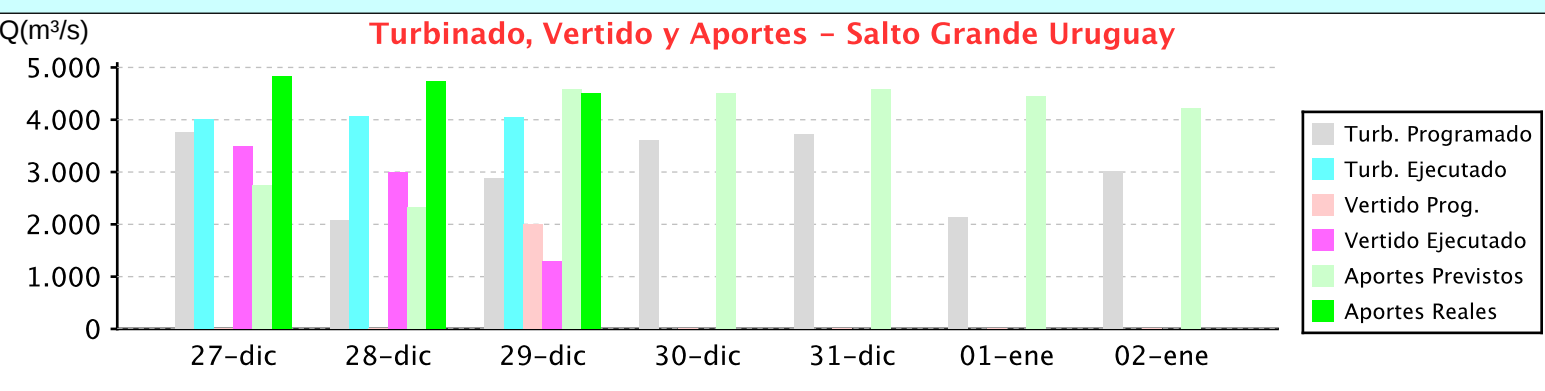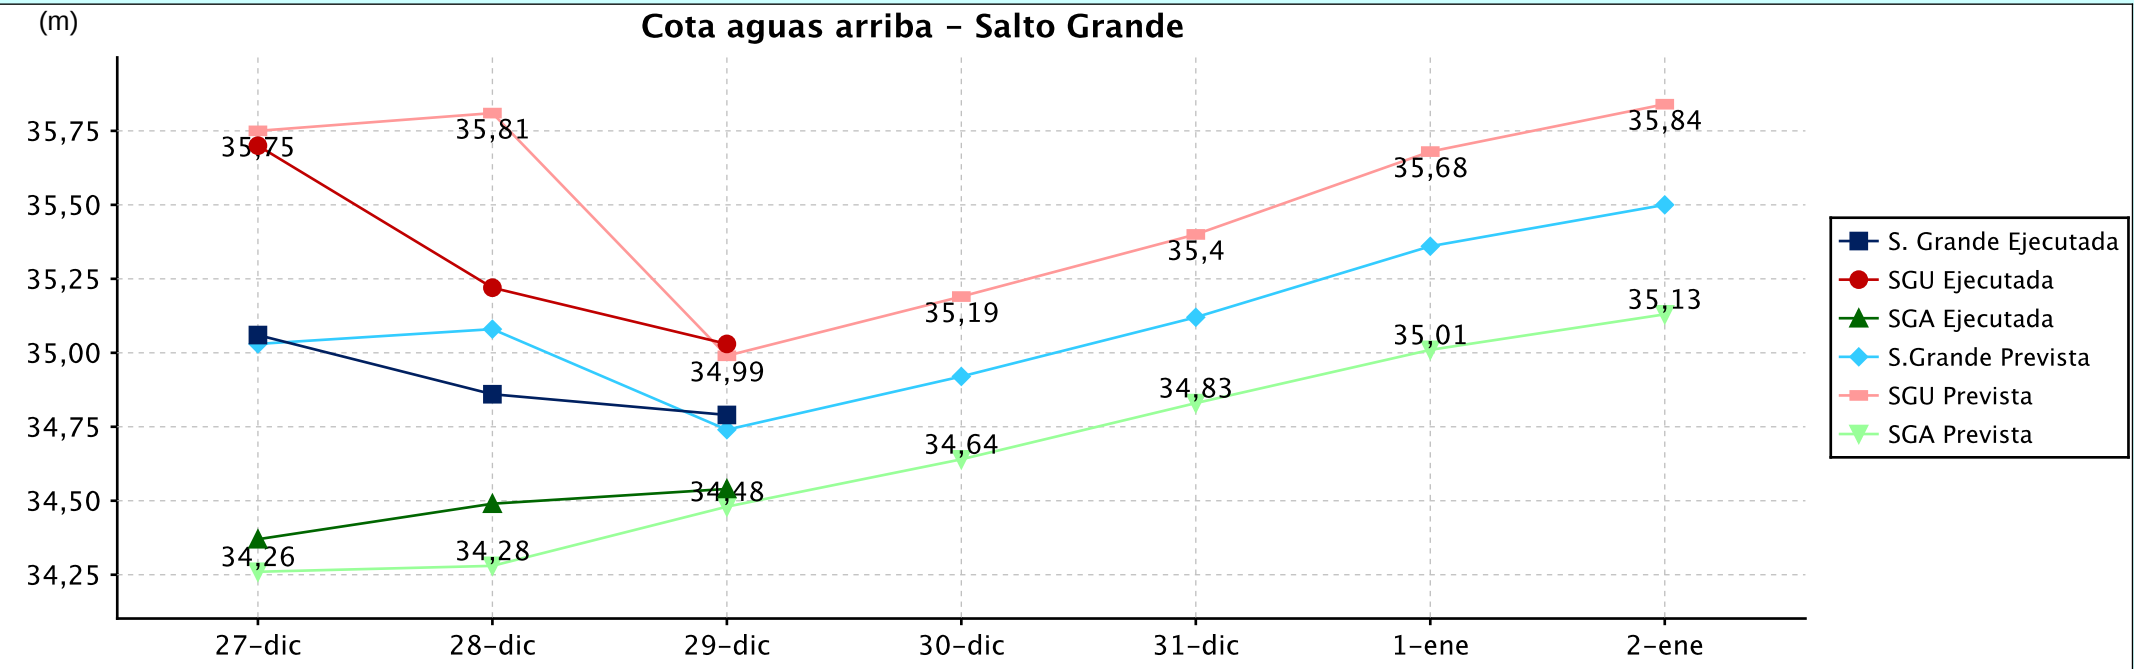

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,03
Cota Vista Arg	34,54
Cota real	34,79

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	11.199
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	662	649
Baygorria	687	766
Palmar	697	972
SGU	2.881	4.042

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	383	905
Baygorria	0	50
Palmar	42	152
SGU	4.575	4.502

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.000	1.292

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 109 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

30/12/2014 16:34
