



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 31 de diciembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-76
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.420
C. Baygorria	1.849
C. Palmar	4.928
C. Salto Grande	18.503
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.442
TOTAL Generación	33.049

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.624
Hidráulica	2.624
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.624


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.425
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.470
Diferencia (MWh)	955
Ejecutada - Programada	3,24 %

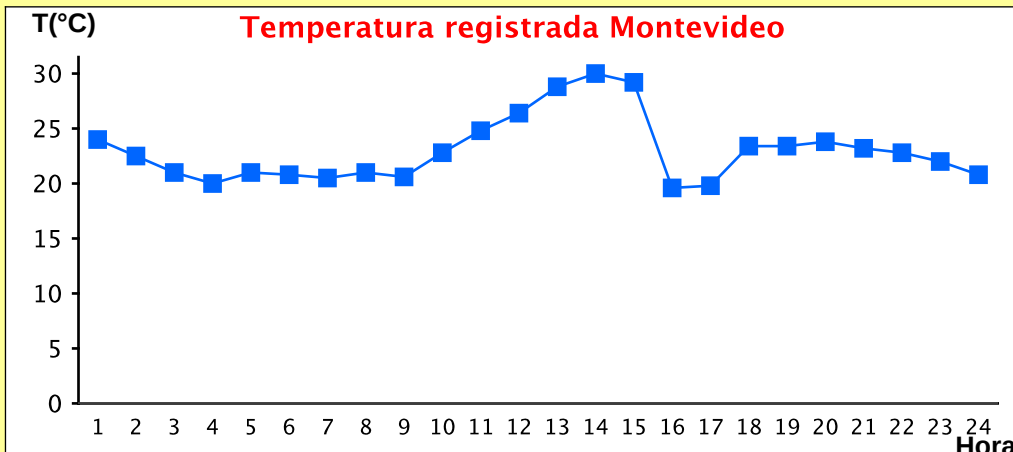
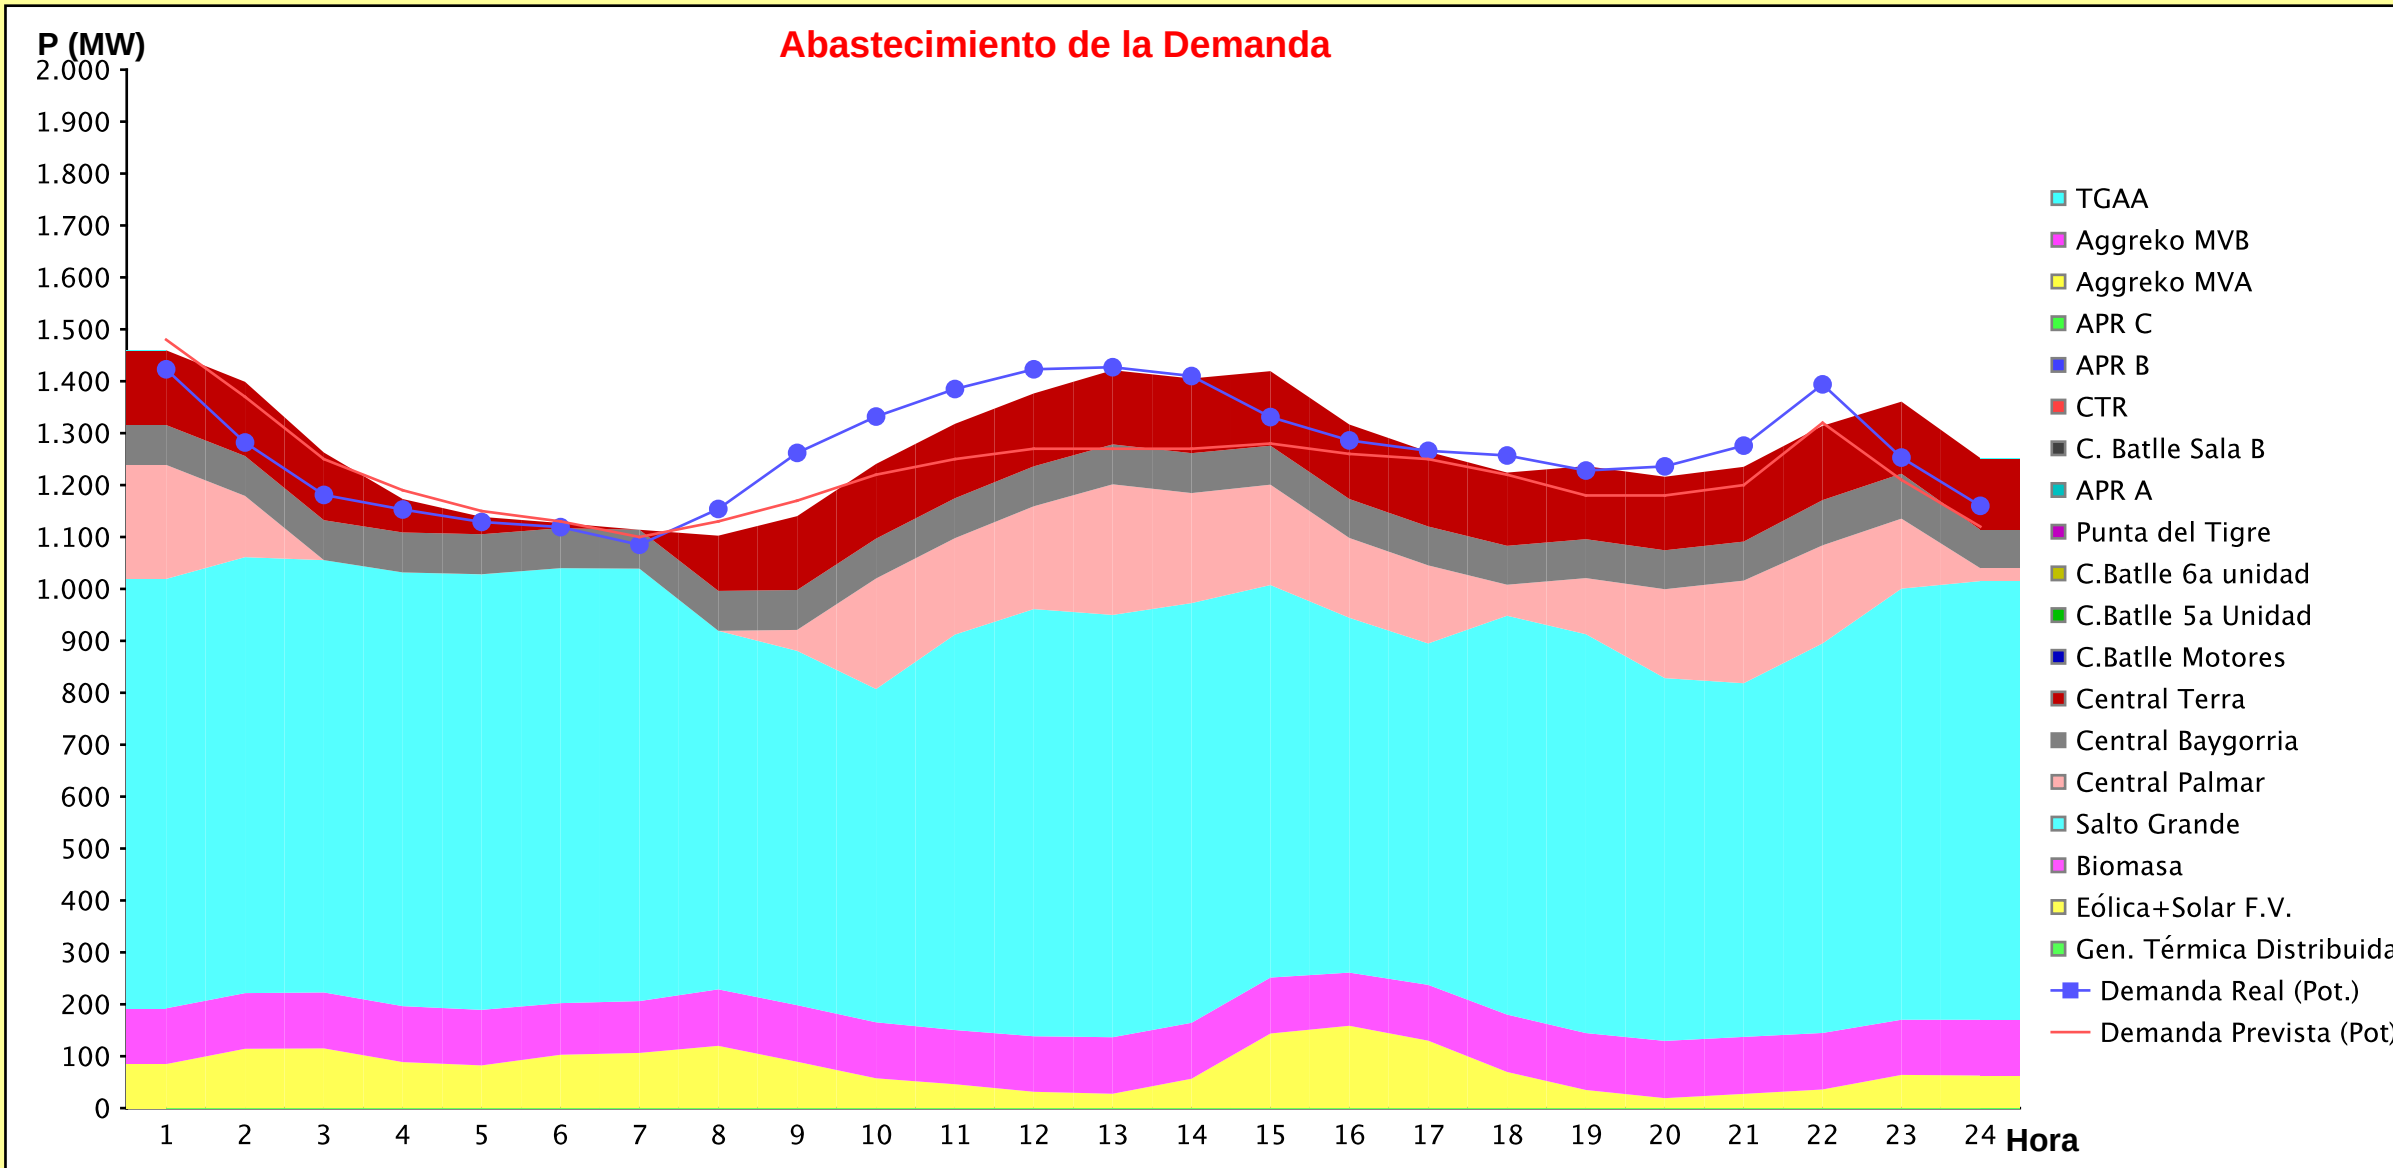


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1436,16 Hora 12:50
Potencia mínima:	1071,41 Hora 06:51
Pico noche:	1420,09 Hora 21:39

Generación Media (MW)	
Eólica	78,2
Biomasa	107,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


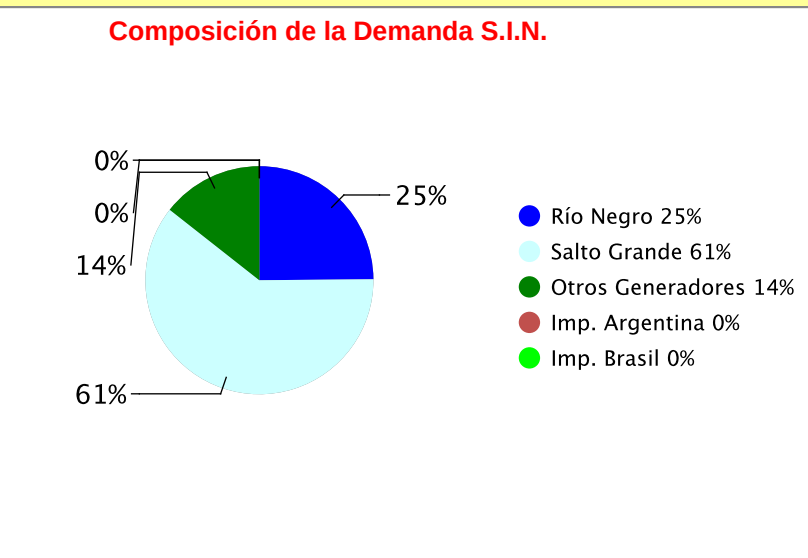


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

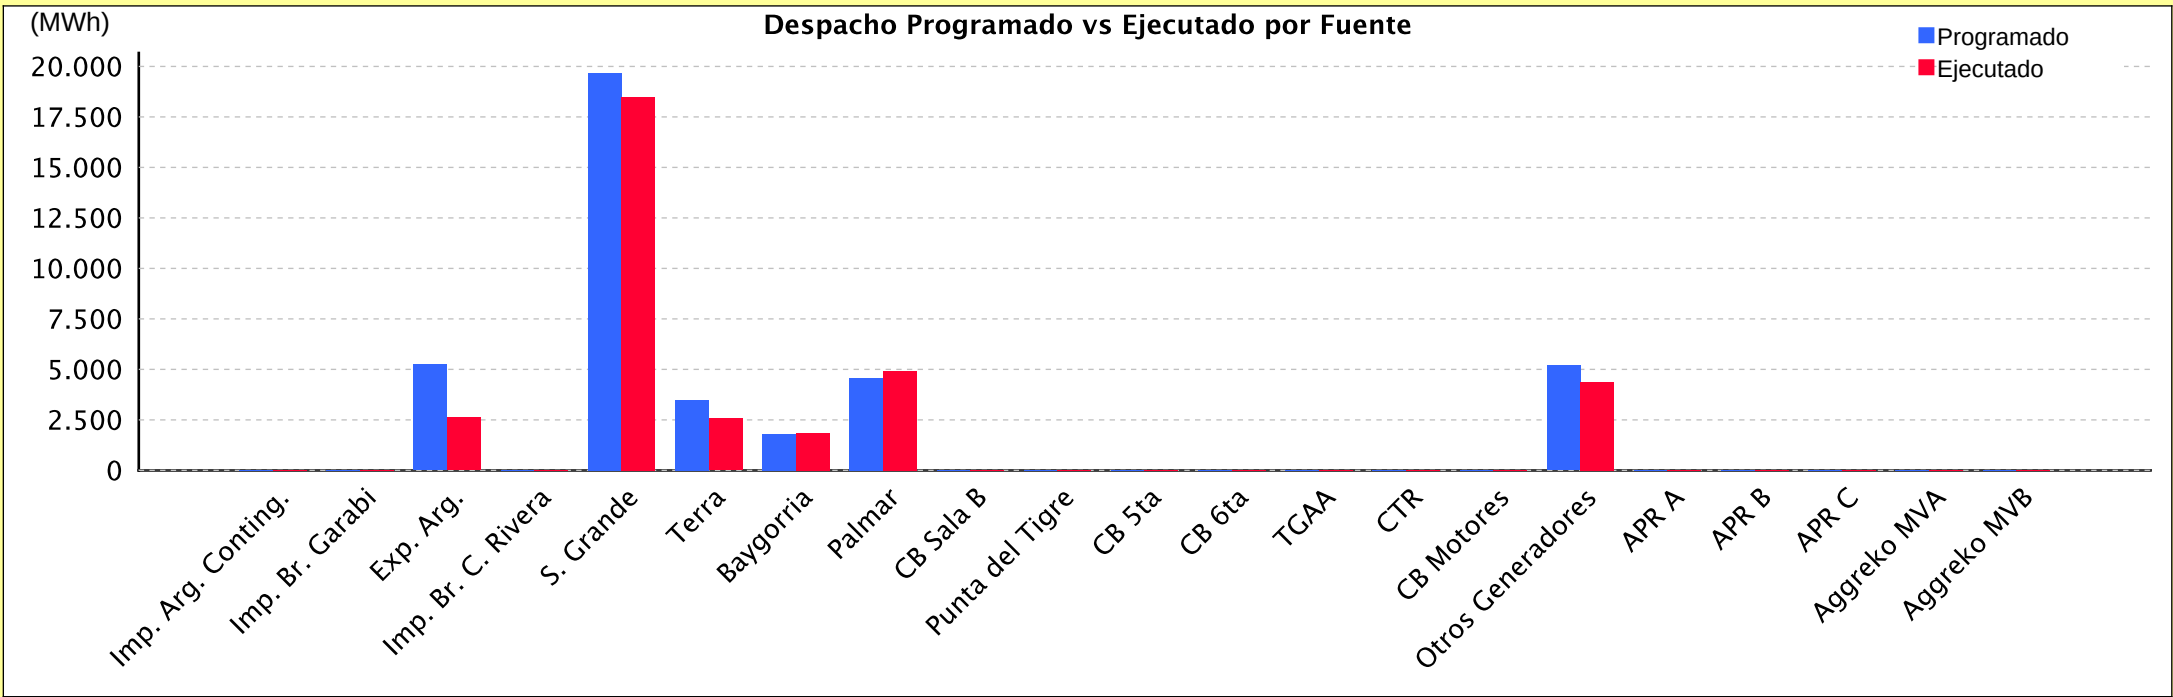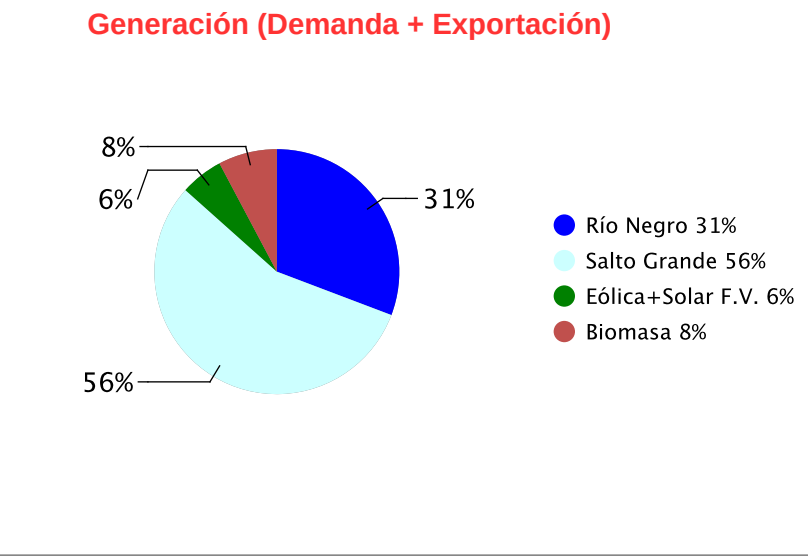



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

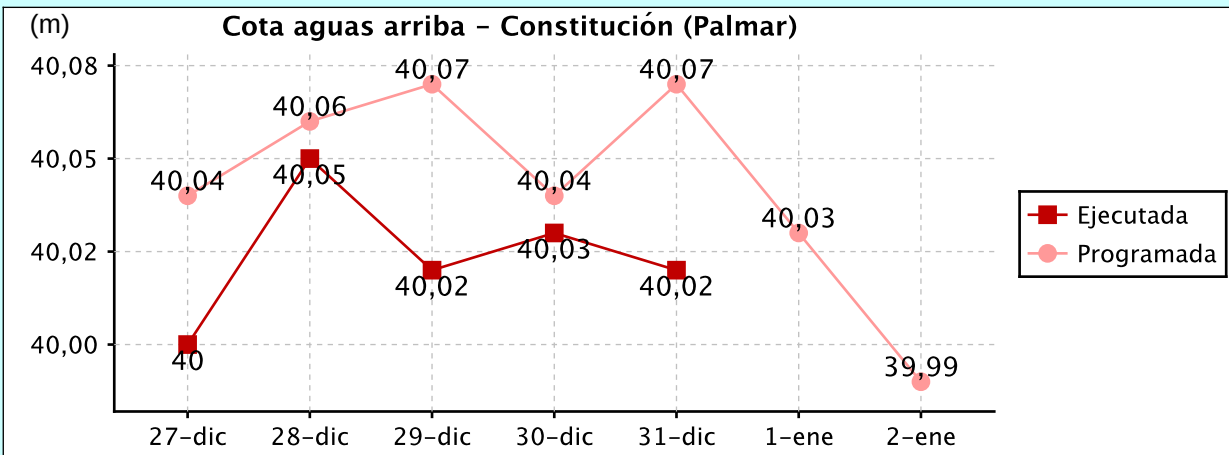
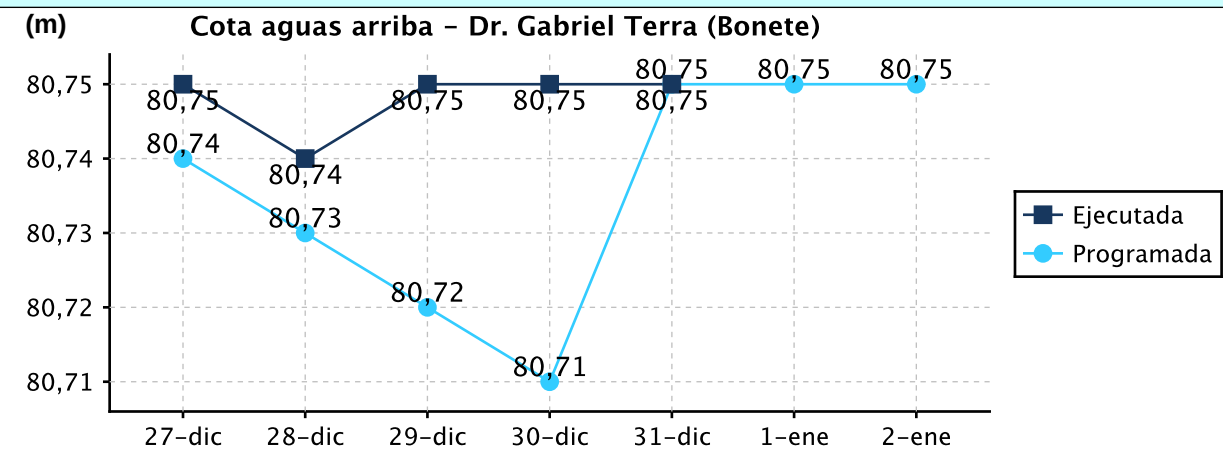


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,75
Baygorria	54,19	54,19
Palmar	40,07	40,02
SGU	35,03	34,94

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

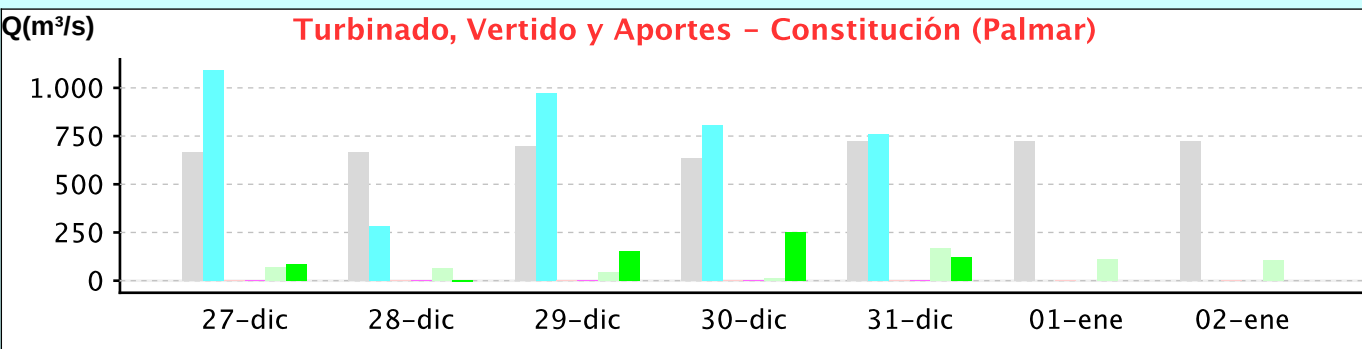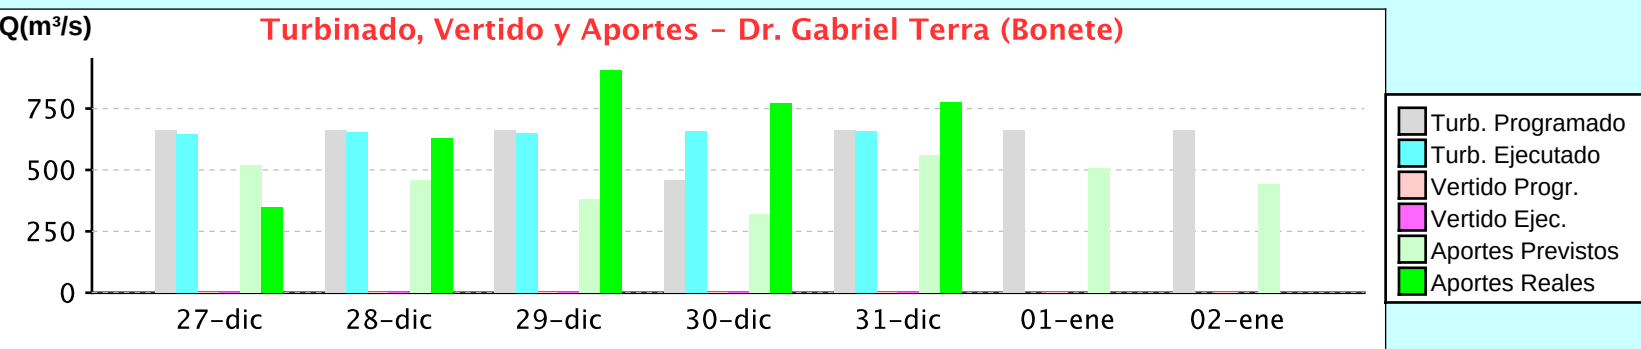

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

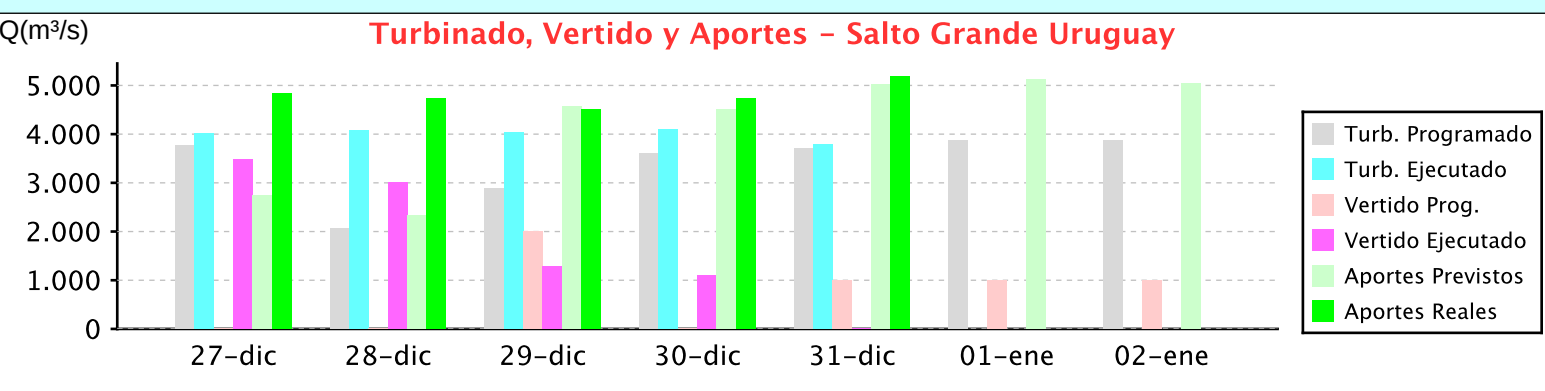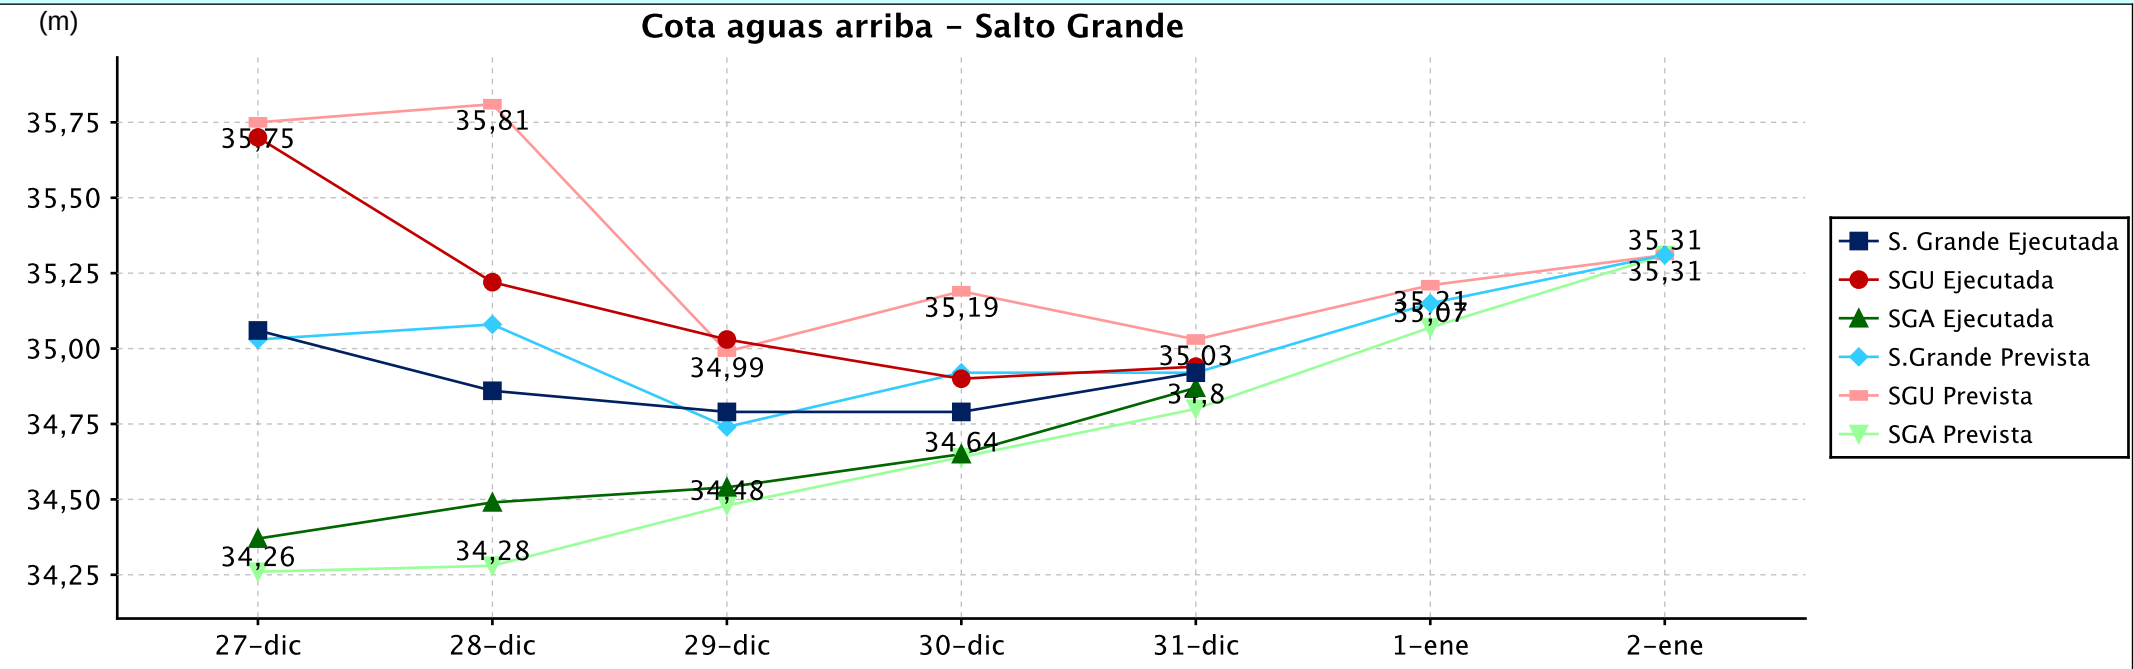

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,94
Cota Vista Arg	34,87
Cota real	34,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	1.626

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	662	658
Baygorria	687	651
Palmar	723	759
SGU	3.713	3.792

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	560	775
Baygorria	15	-16
Palmar	171	123
SGU	5.025	5.192

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.000	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 109 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
