



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 01 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.845
C. Baygorria	1.637
C. Palmar	3.345
C. Salto Grande	14.218
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.392
TOTAL Generación	27.334

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.242
Hidráulica	4.242
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.242


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.092
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.760
Diferencia (MWh)	-668
Ejecutada - Programada	-2,81 %

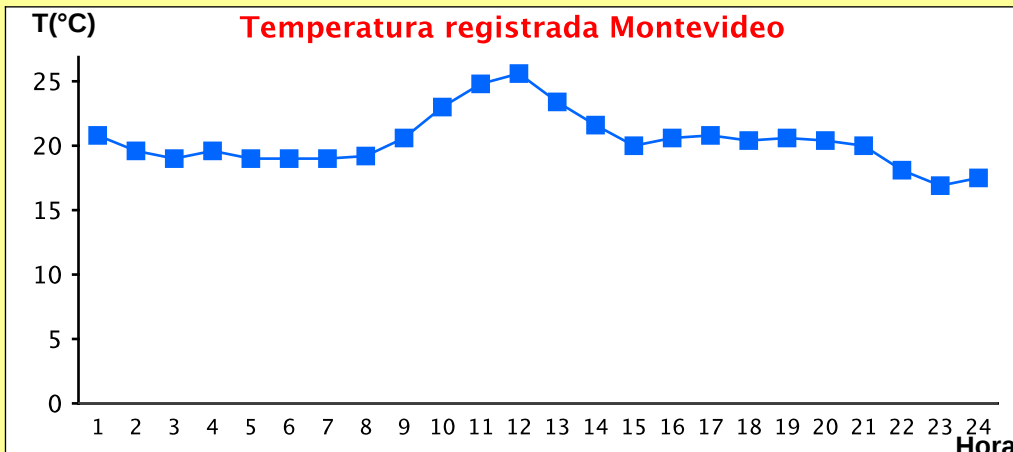
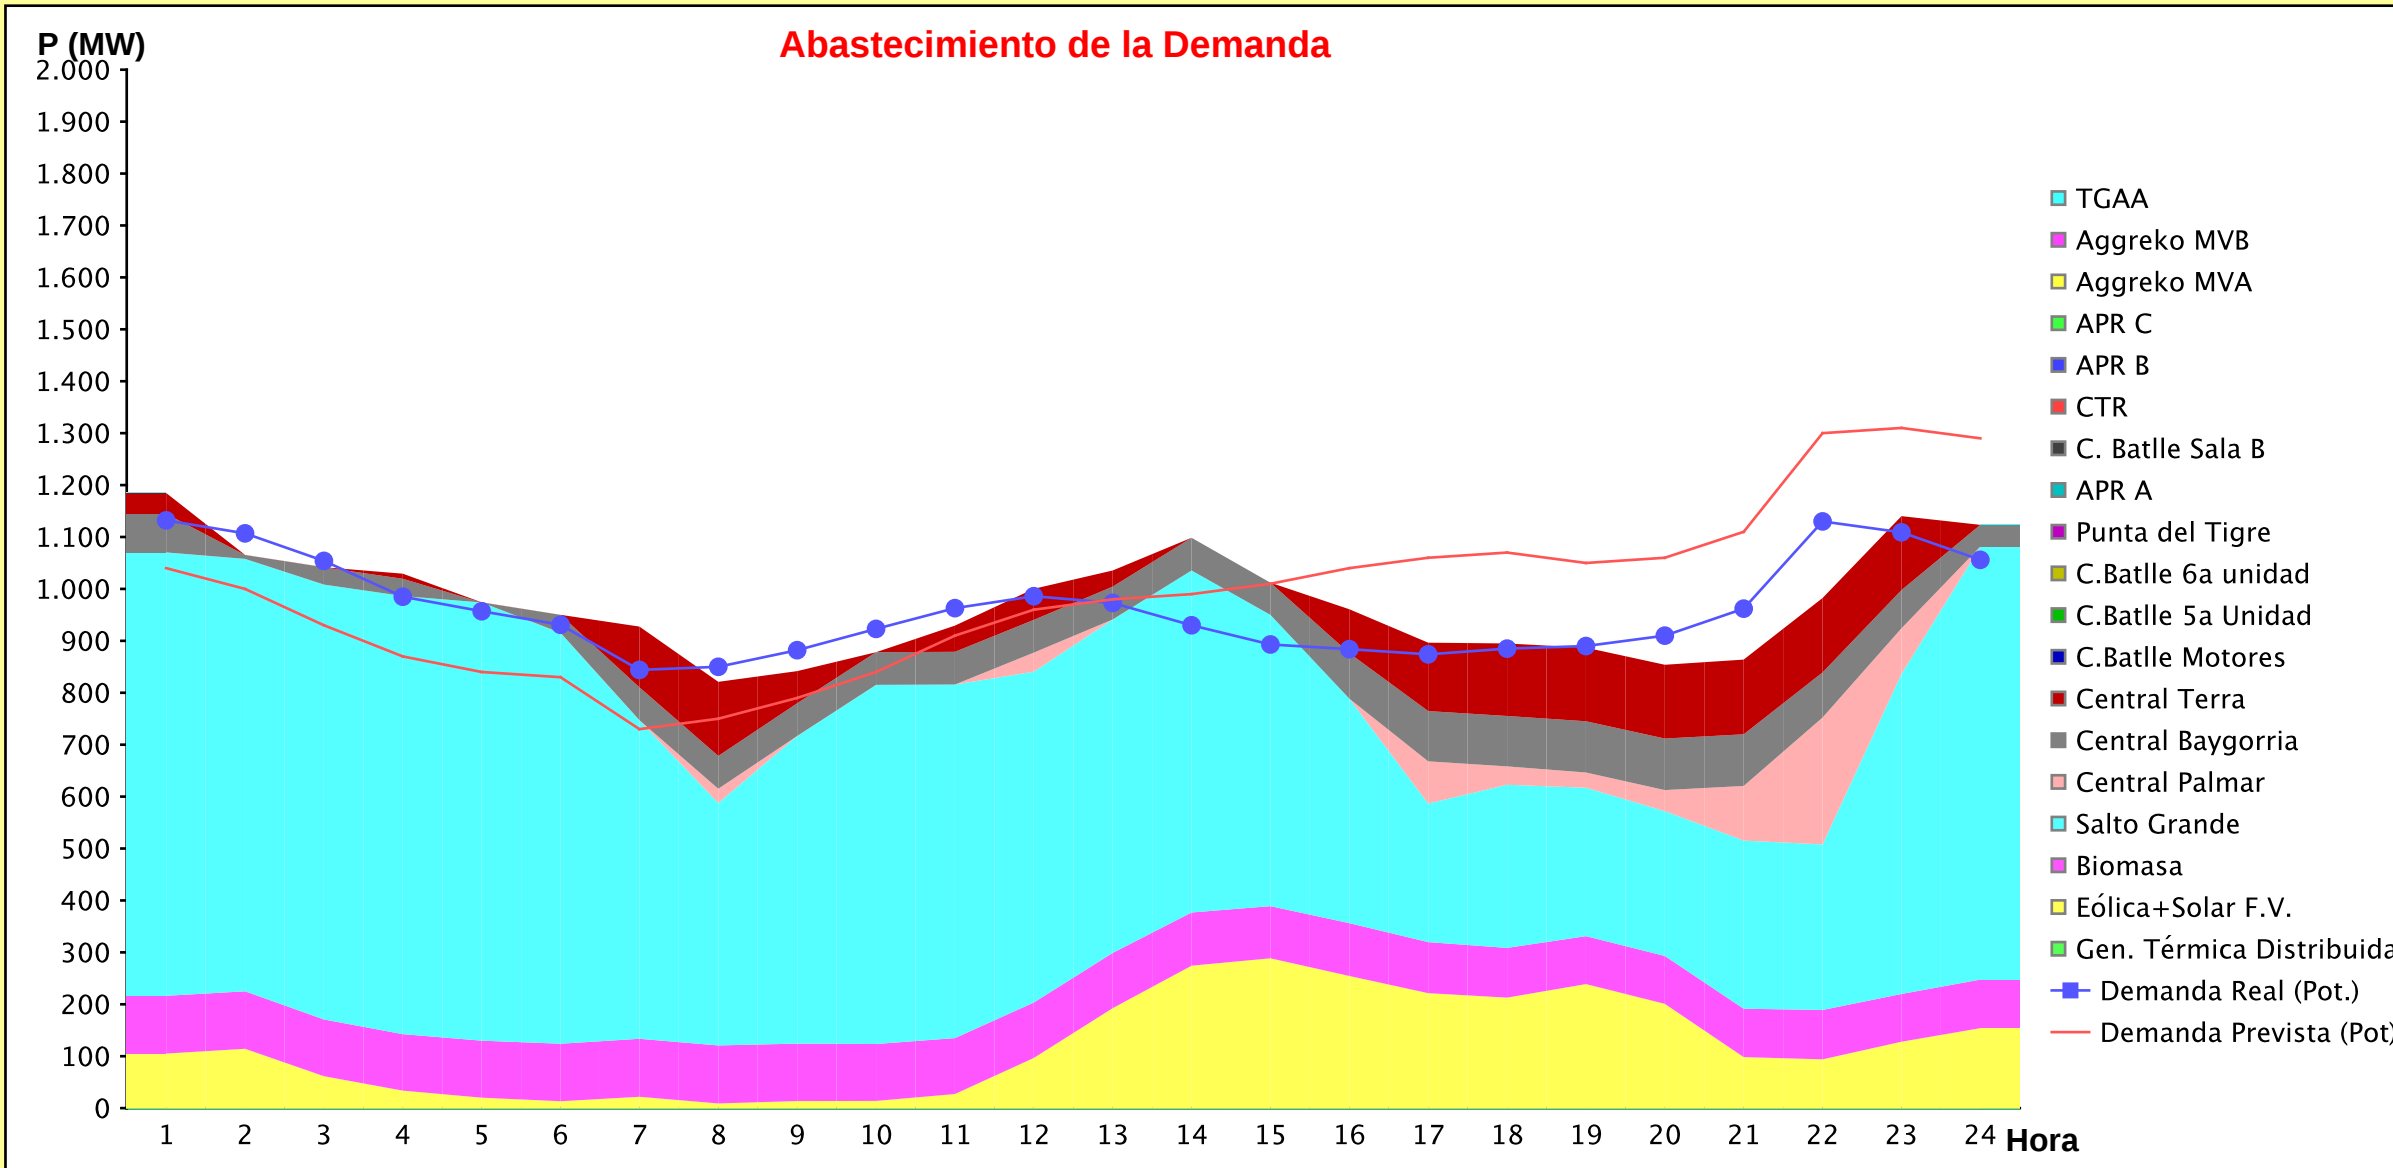


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	992,3 Hora 11:51
Potencia mínima:	784,45 Hora 15:47
Pico noche:	1135,43 Hora 22:14

Generación Media (MW)	
Eólica	120,9
Biomasa	103,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


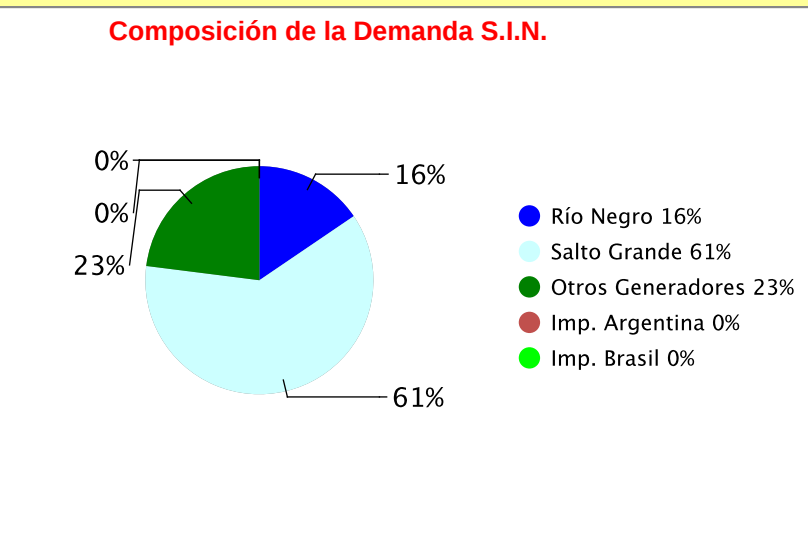


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

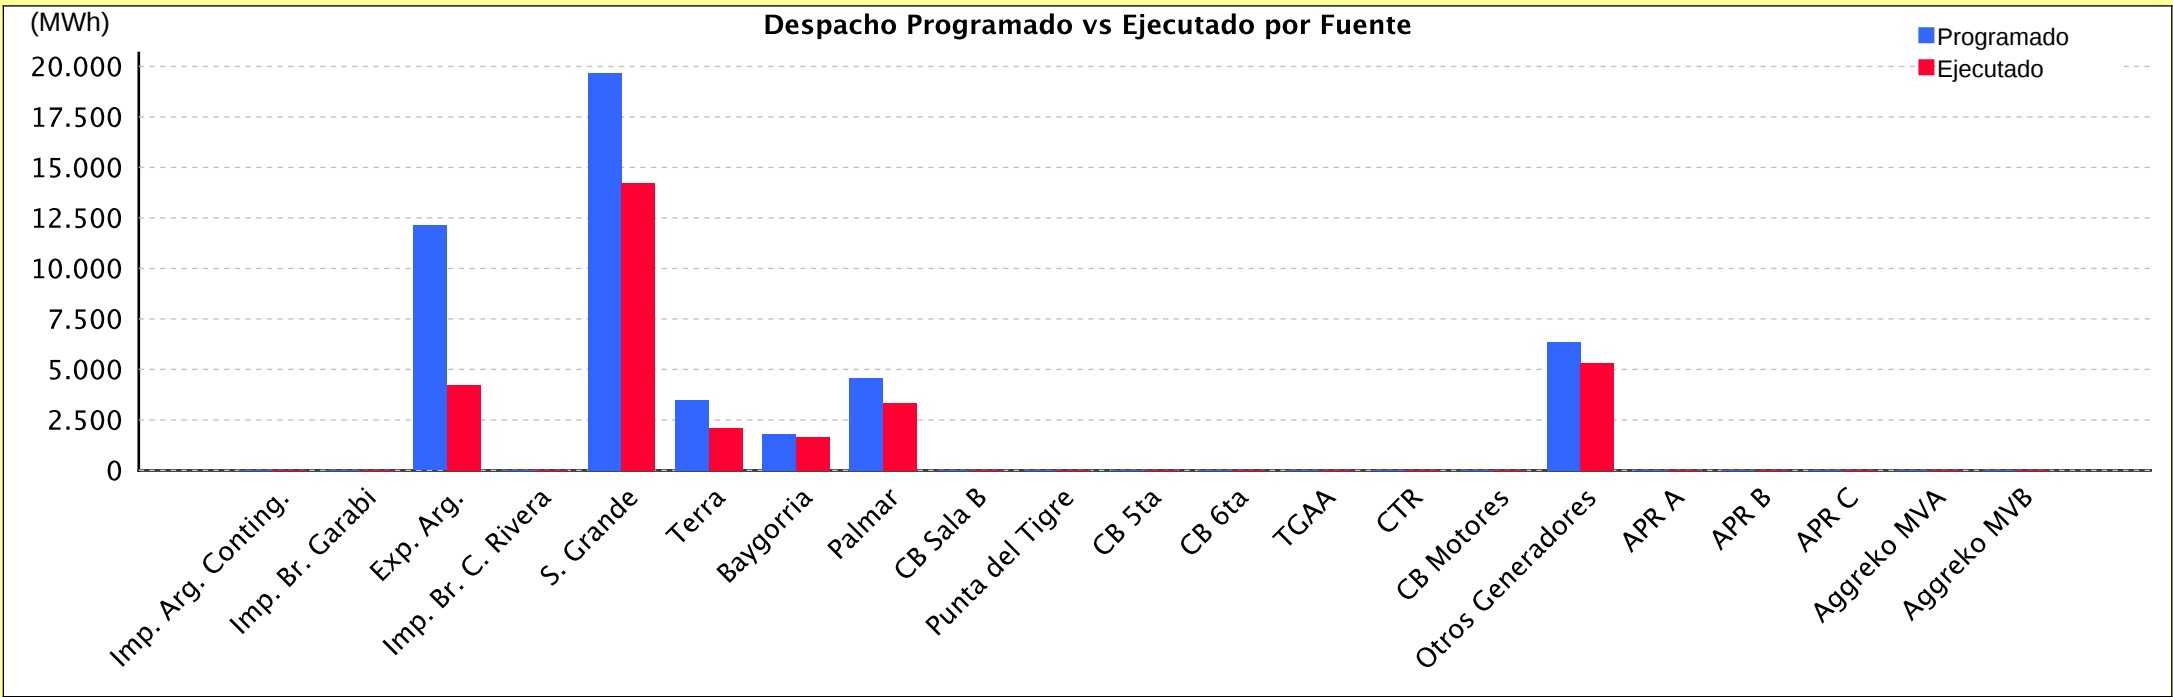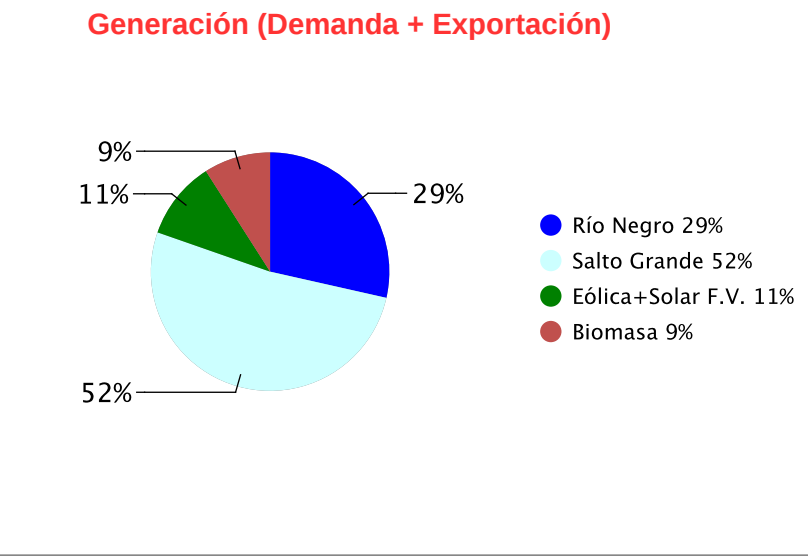



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

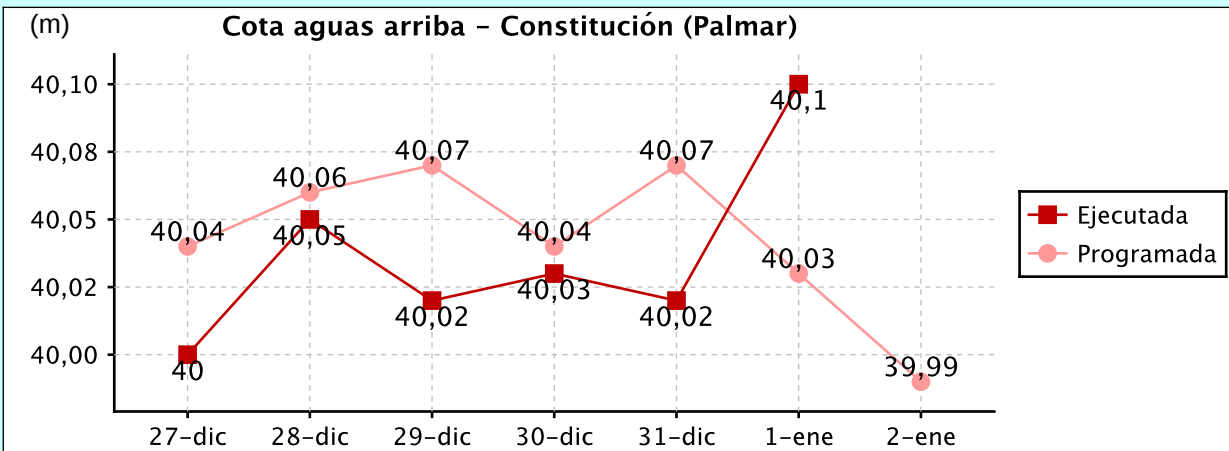
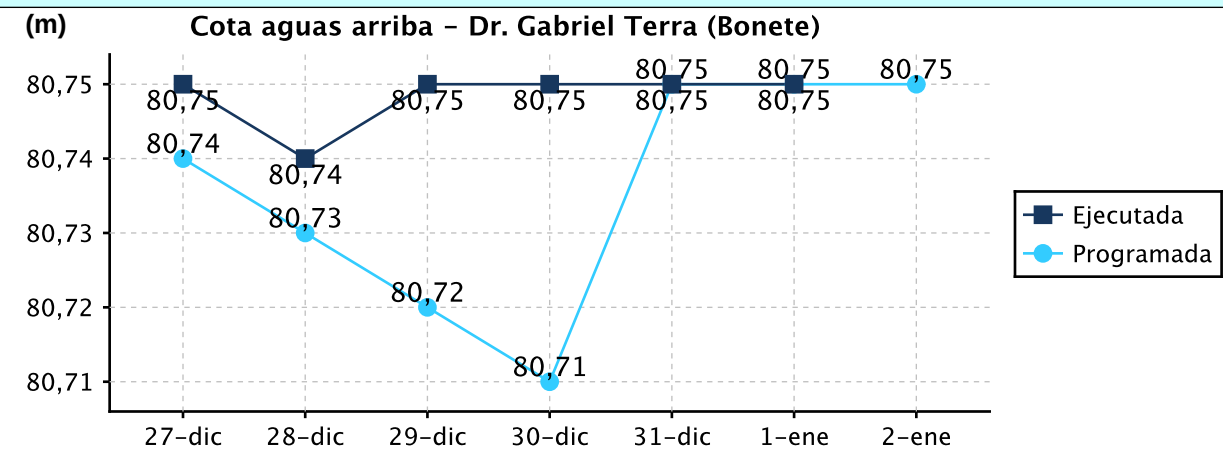


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,75
Baygorria	54,20	54,19
Palmar	40,03	40,1
SGU	35,21	35,07

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

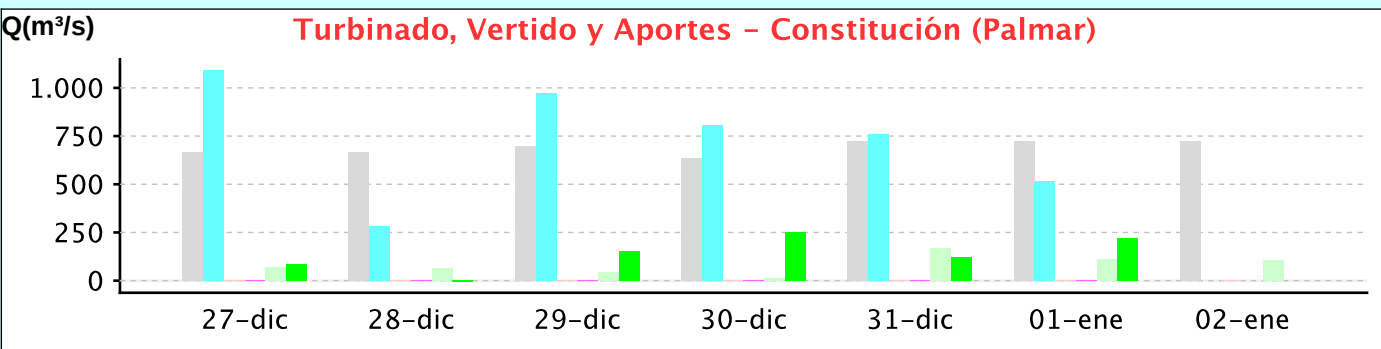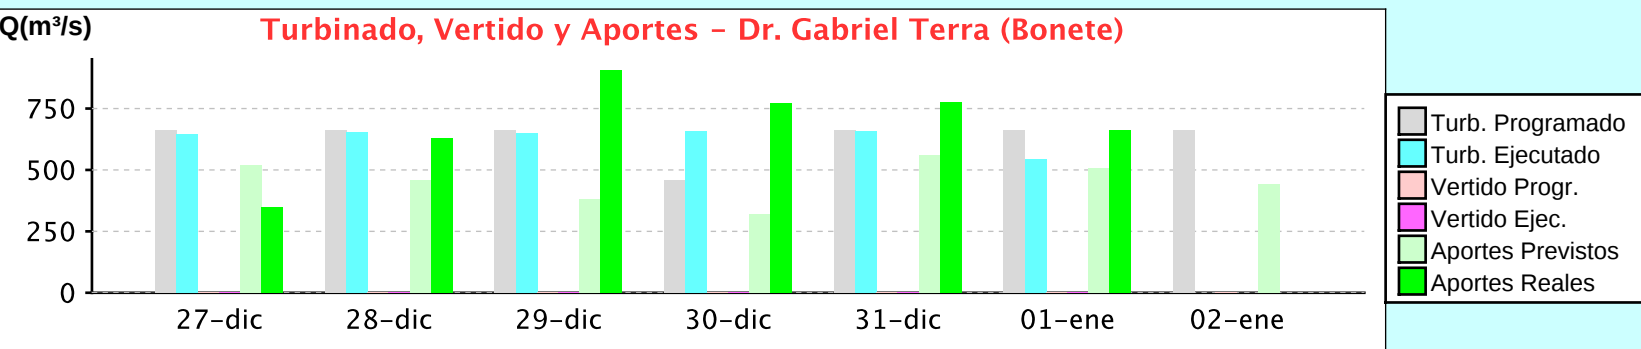

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

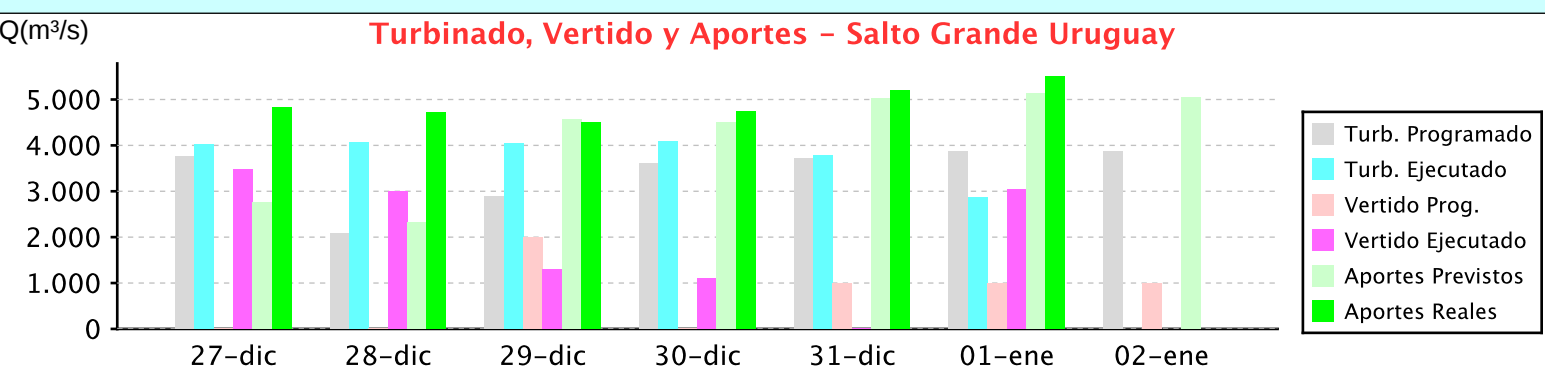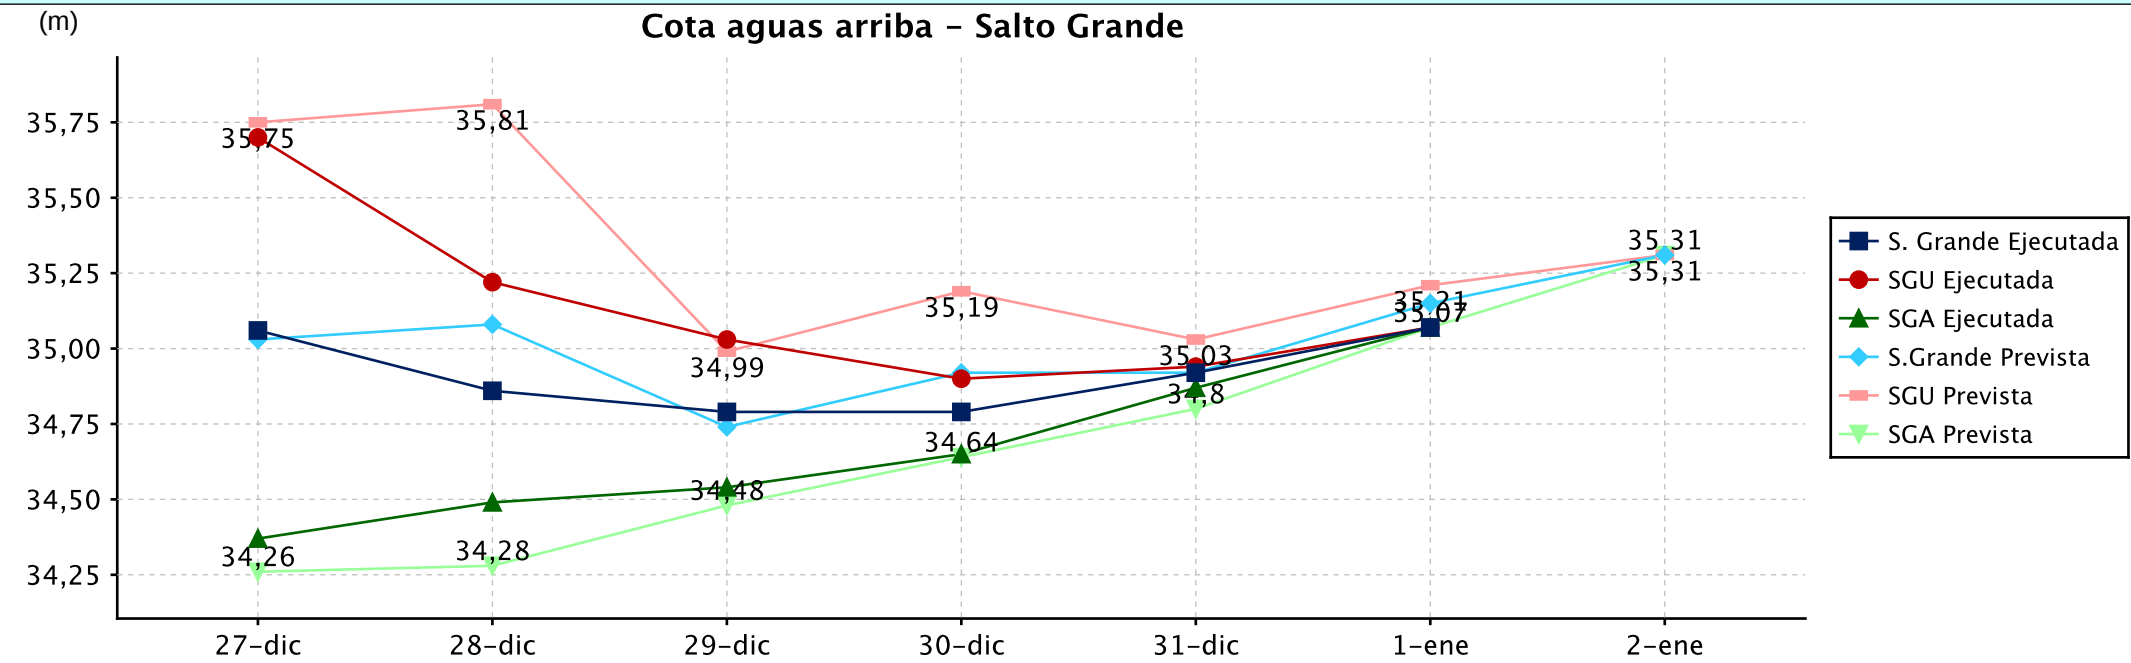

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,07
Cota Vista Arg	35,07
Cota real	35,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	662	545
Baygorria	687	591
Palmar	723	518
SGU	3.866	2.872

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	505	662
Baygorria	5	61
Palmar	113	221
SGU	5.125	5.510

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.000	3.038

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 177 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
