



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 03 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-8
APR A	0
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.399
C. Baygorria	804
C. Palmar	1.951
C. Salto Grande	17.605
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.386
TOTAL Generación	27.050

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.828
Hidráulica	1.828
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.828


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.222
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.000
Diferencia (MWh)	-1.778
Ejecutada - Programada	-6,58 %

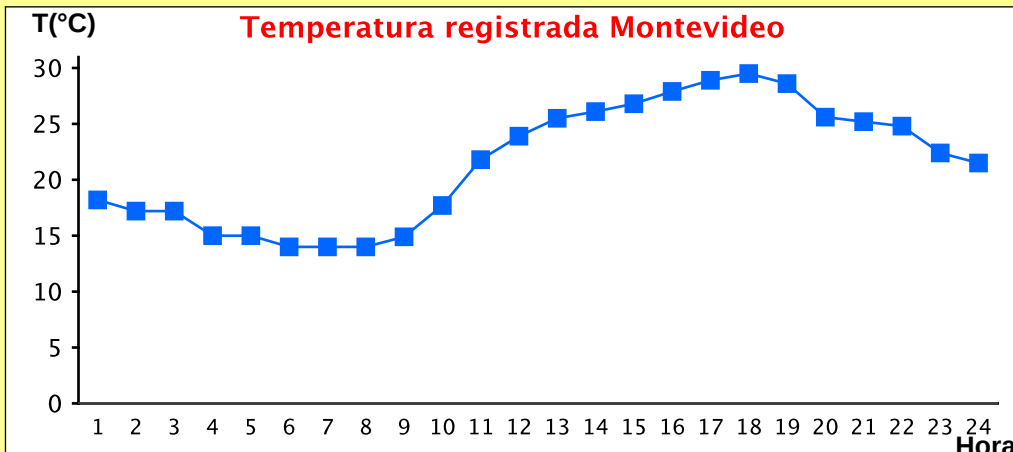
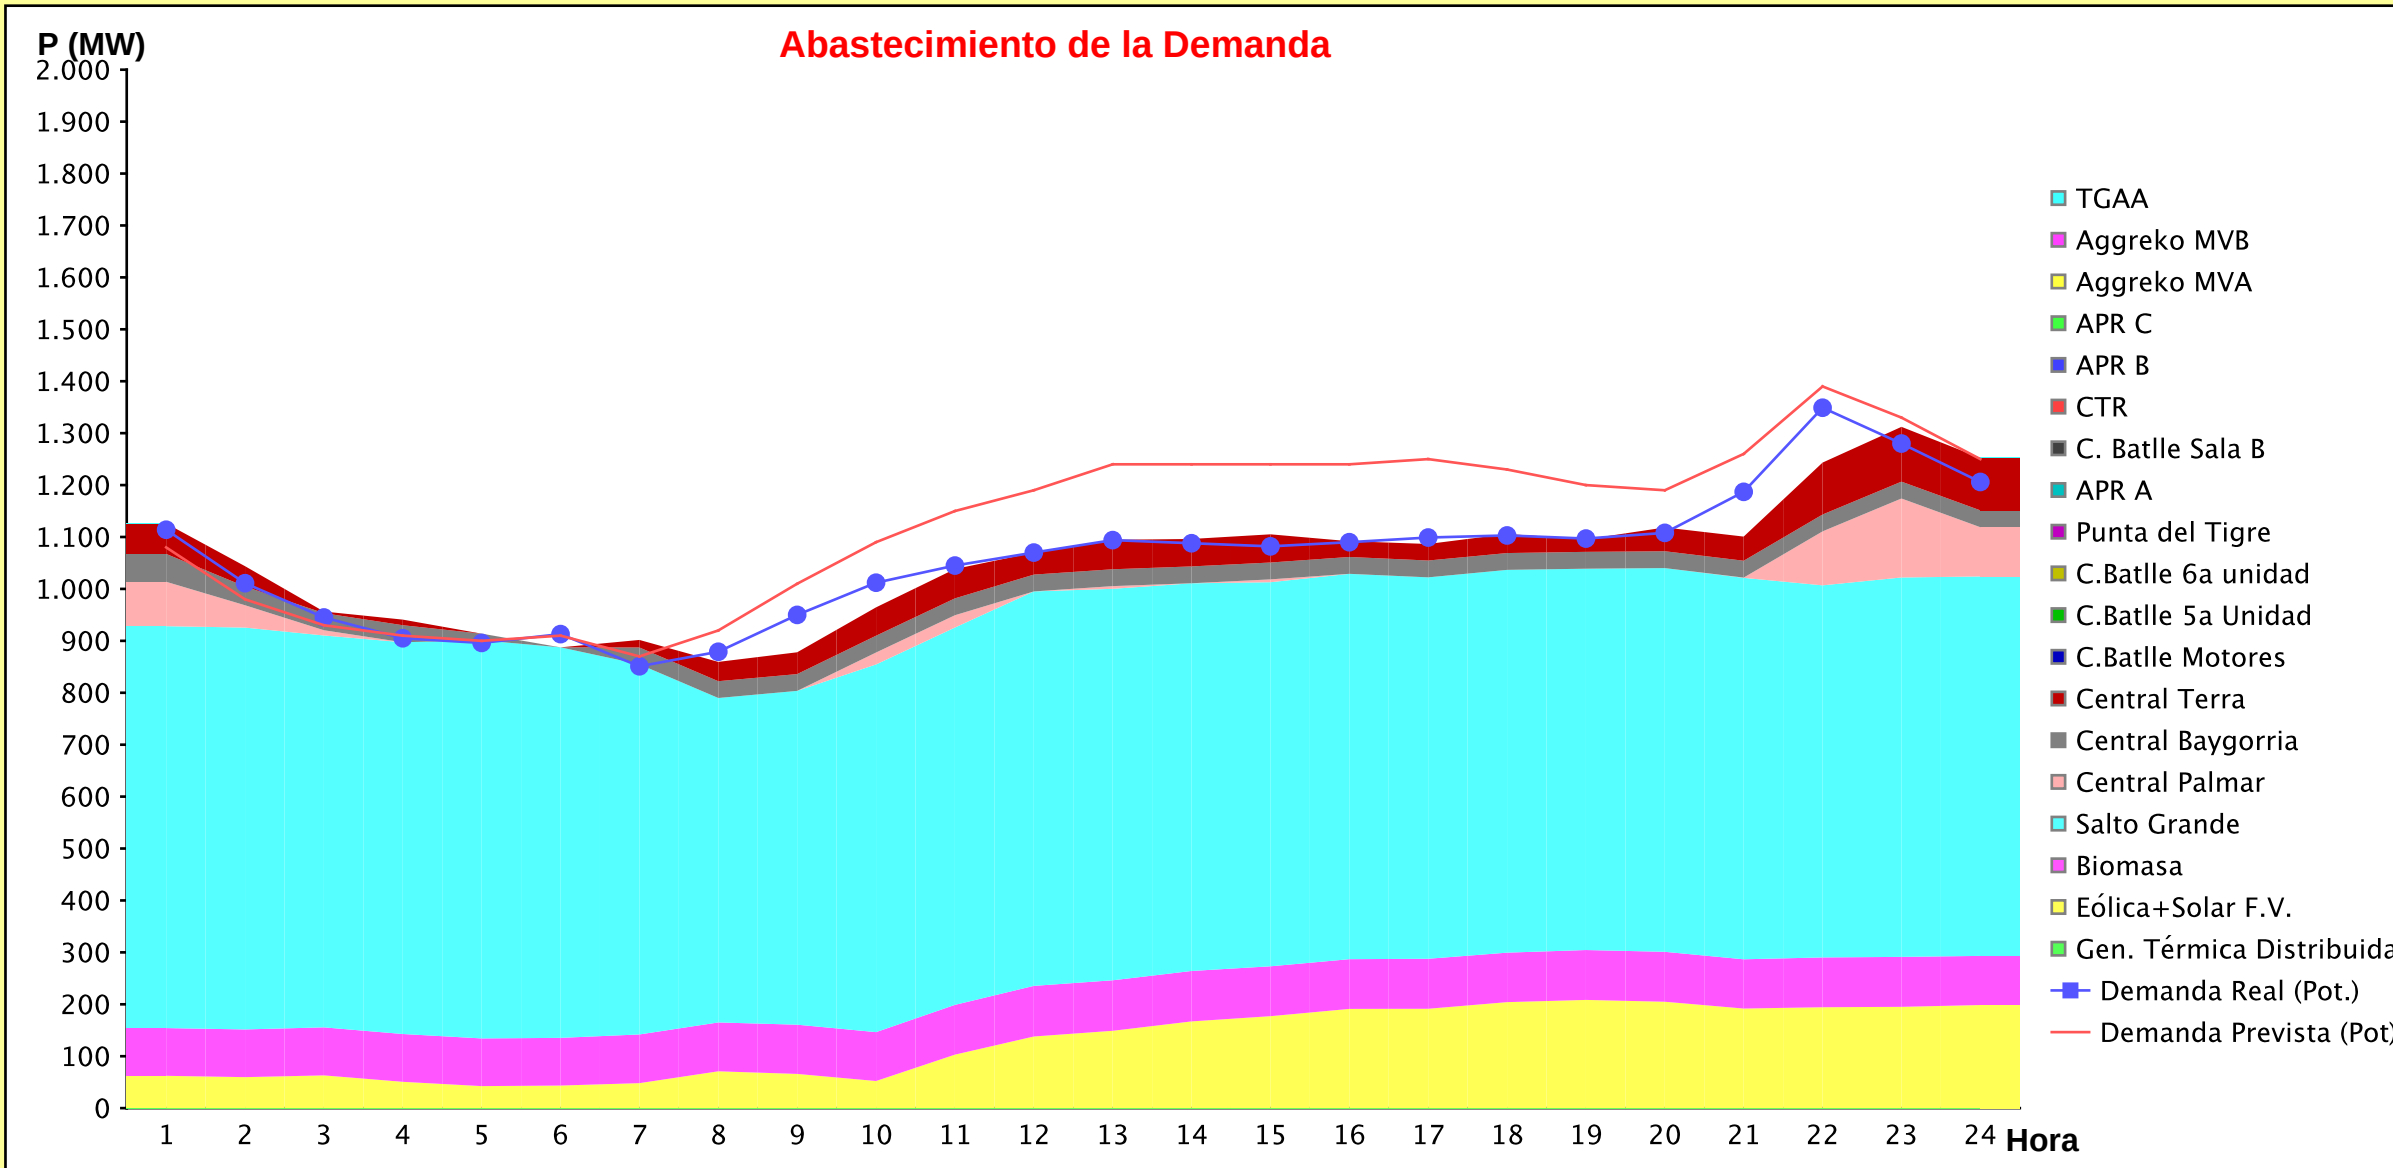


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1106,24 Hora 16:54
Potencia mínima:	848,06 Hora 07:02
Pico noche:	1349,15 Hora 21:52

Generación Media (MW)	
Eólica	128,3
Biomasa	94,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


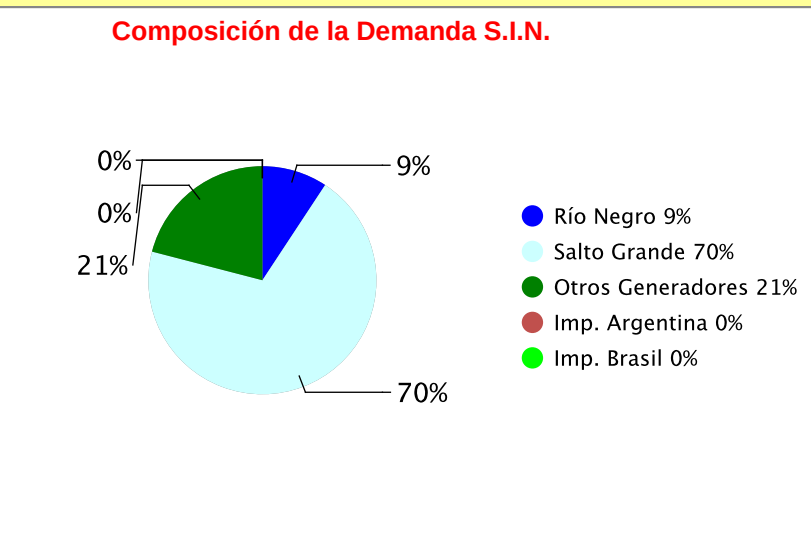


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

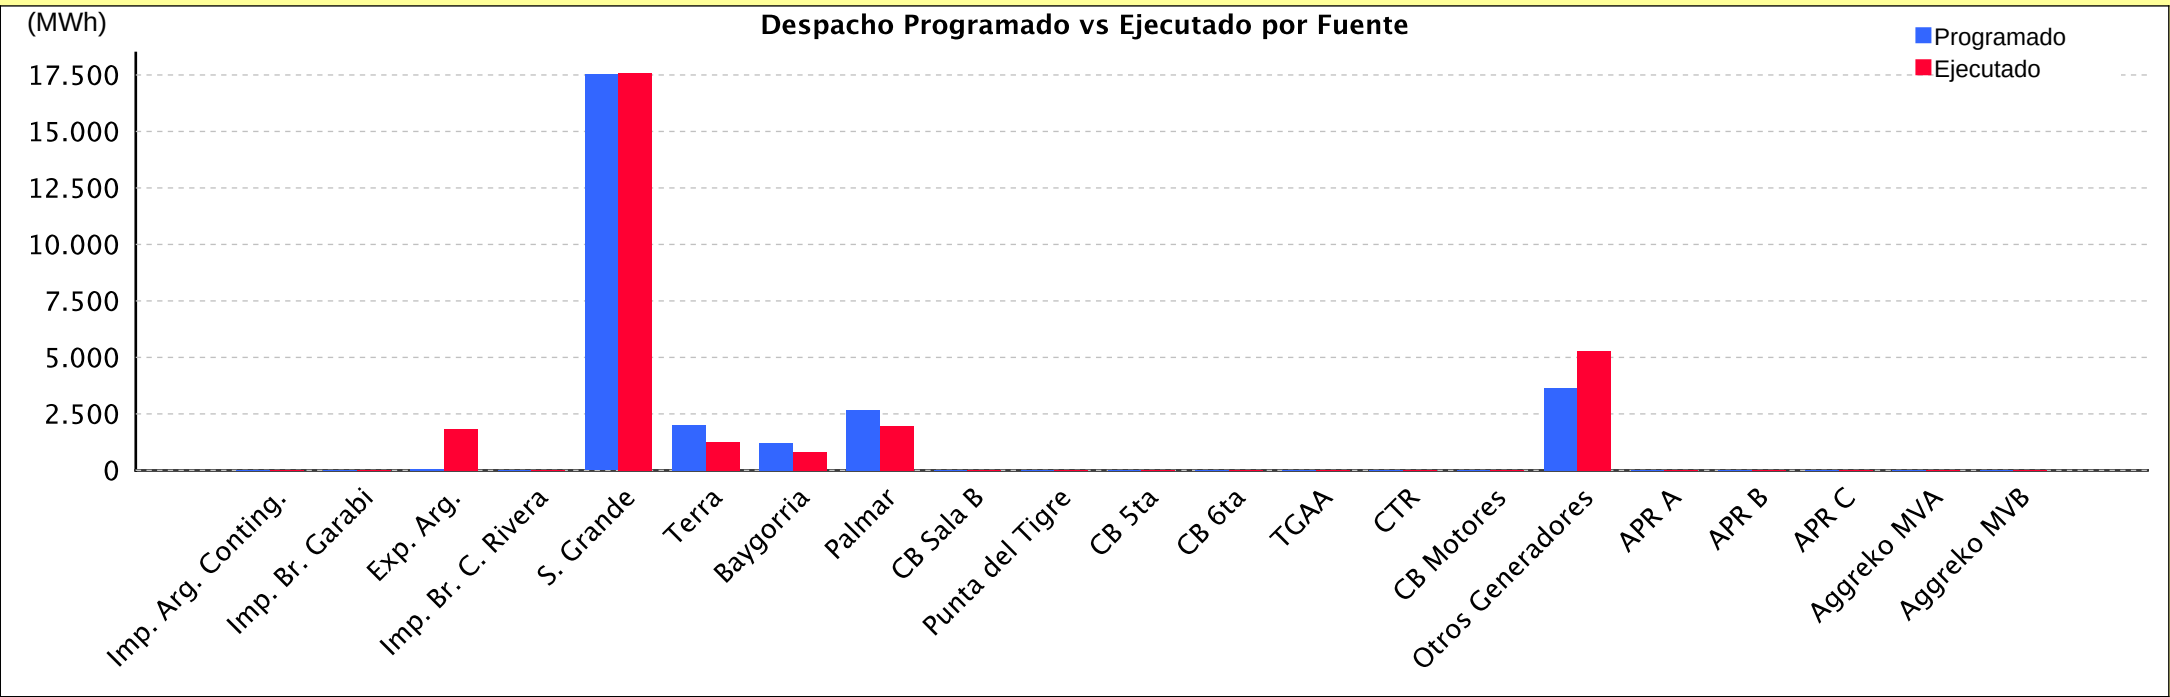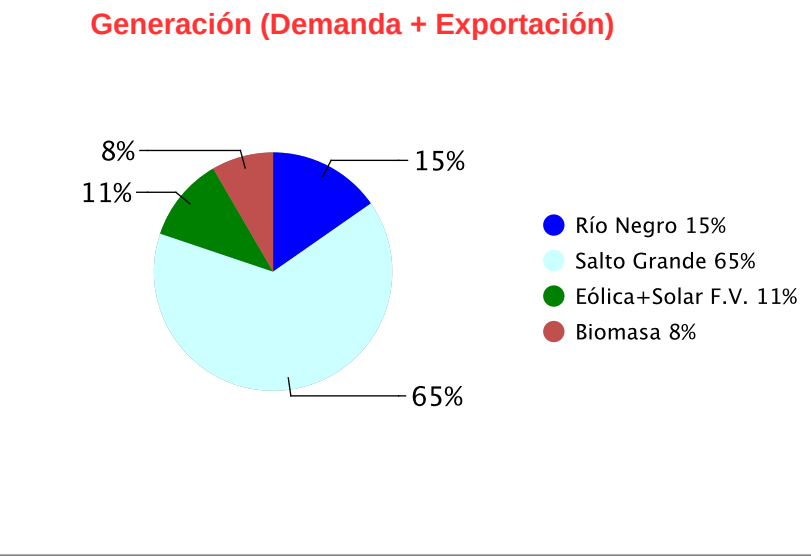



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

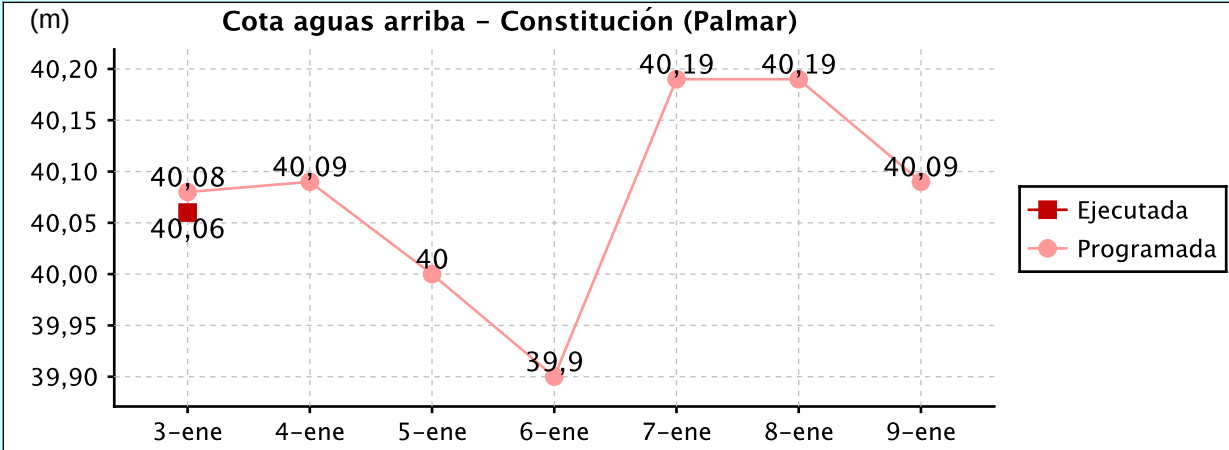
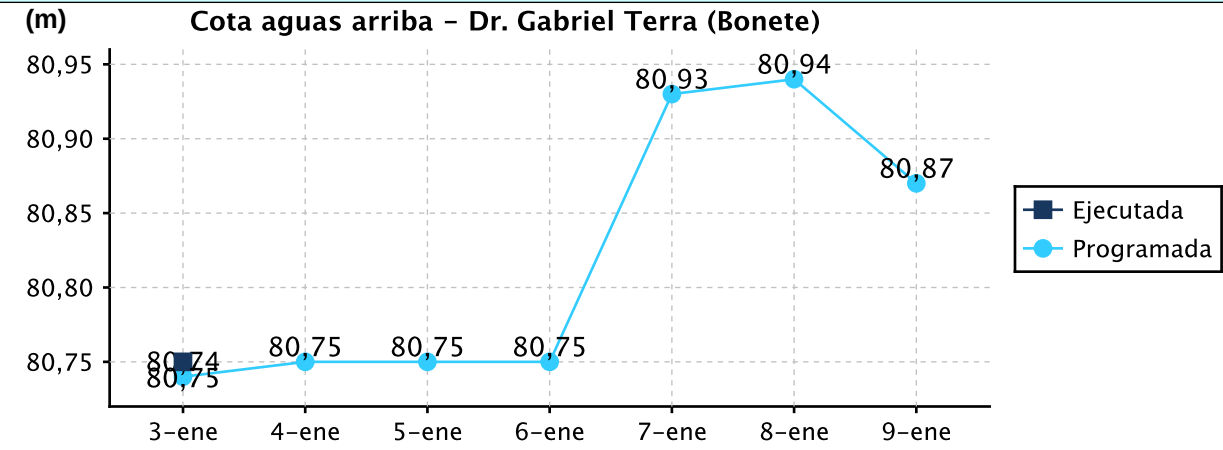


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,74	80,75
Baygorria	54,10	54,09
Palmar	40,08	40,06
SGU	35,17	34,73

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

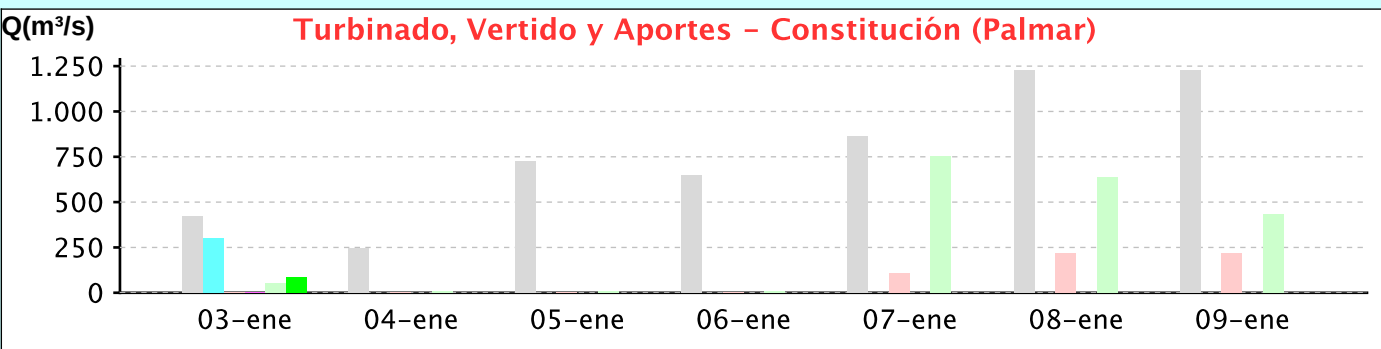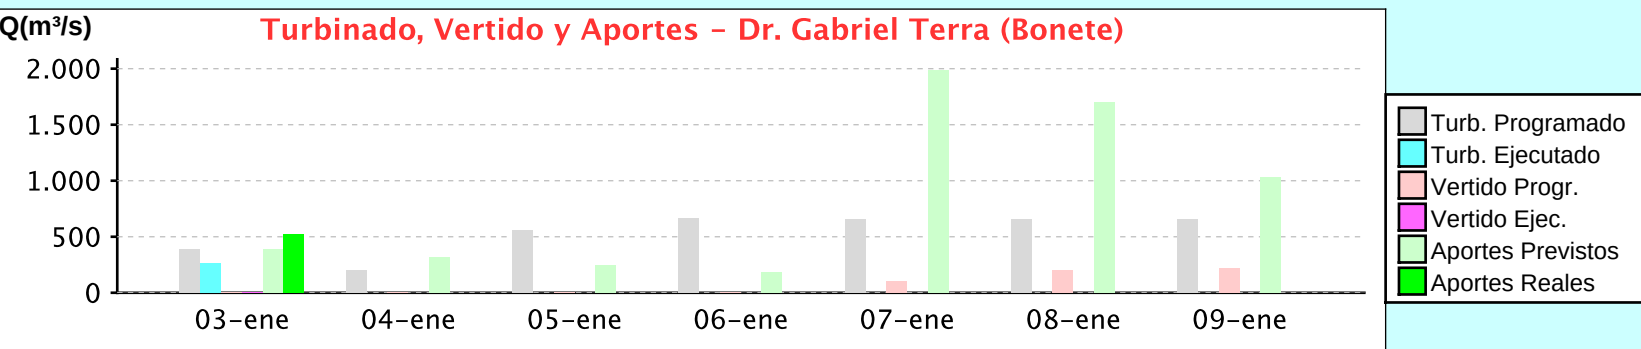

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

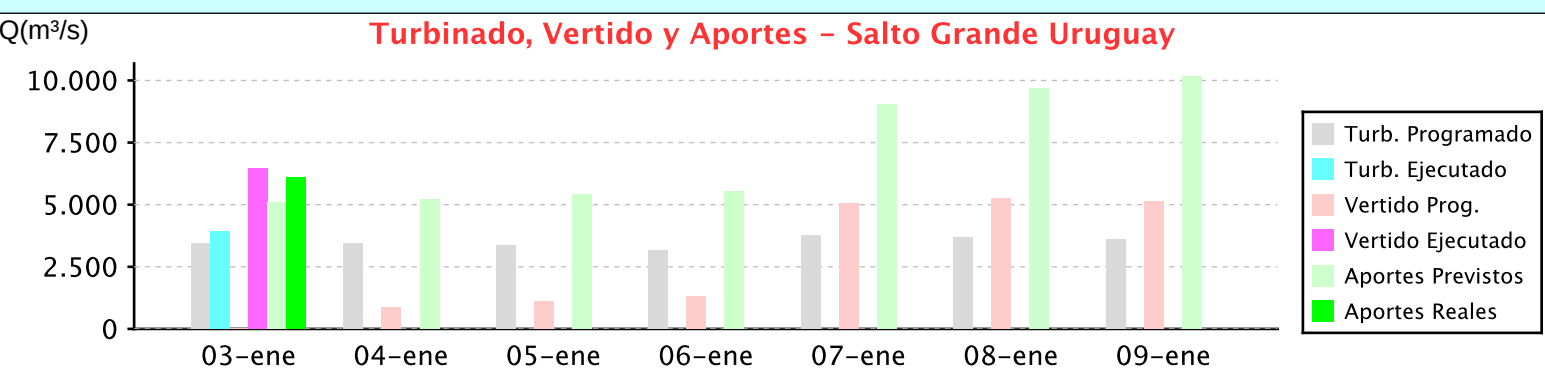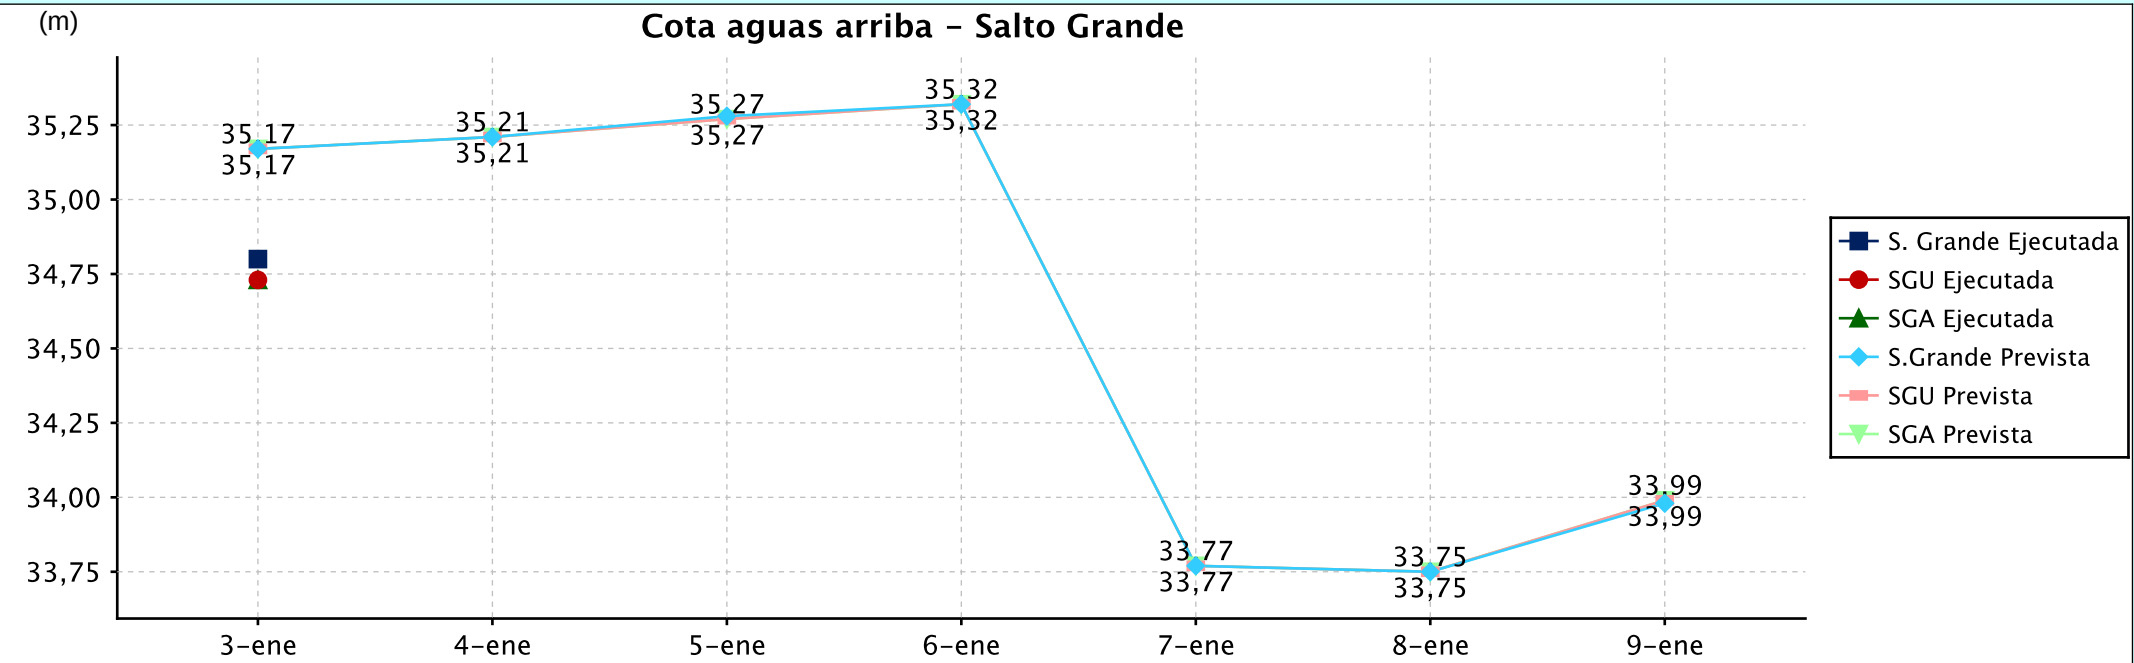

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,73
Cota Vista Arg	34,73
Cota real	34,80
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	384	262
Baygorria	456	286
Palmar	424	300
SGU	3.459	3.925

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	389	518
Baygorria	0	15
Palmar	54	87
SGU	5.100	6.110

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3	6.478

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 76 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
