




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 05 de enero de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	46
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	50
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-9
APR A	0
APR B	117
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.392
C. Baygorria	1.847
C. Palmar	4.095
C. Salto Grande	15.157
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.376
TOTAL Generación	30.939


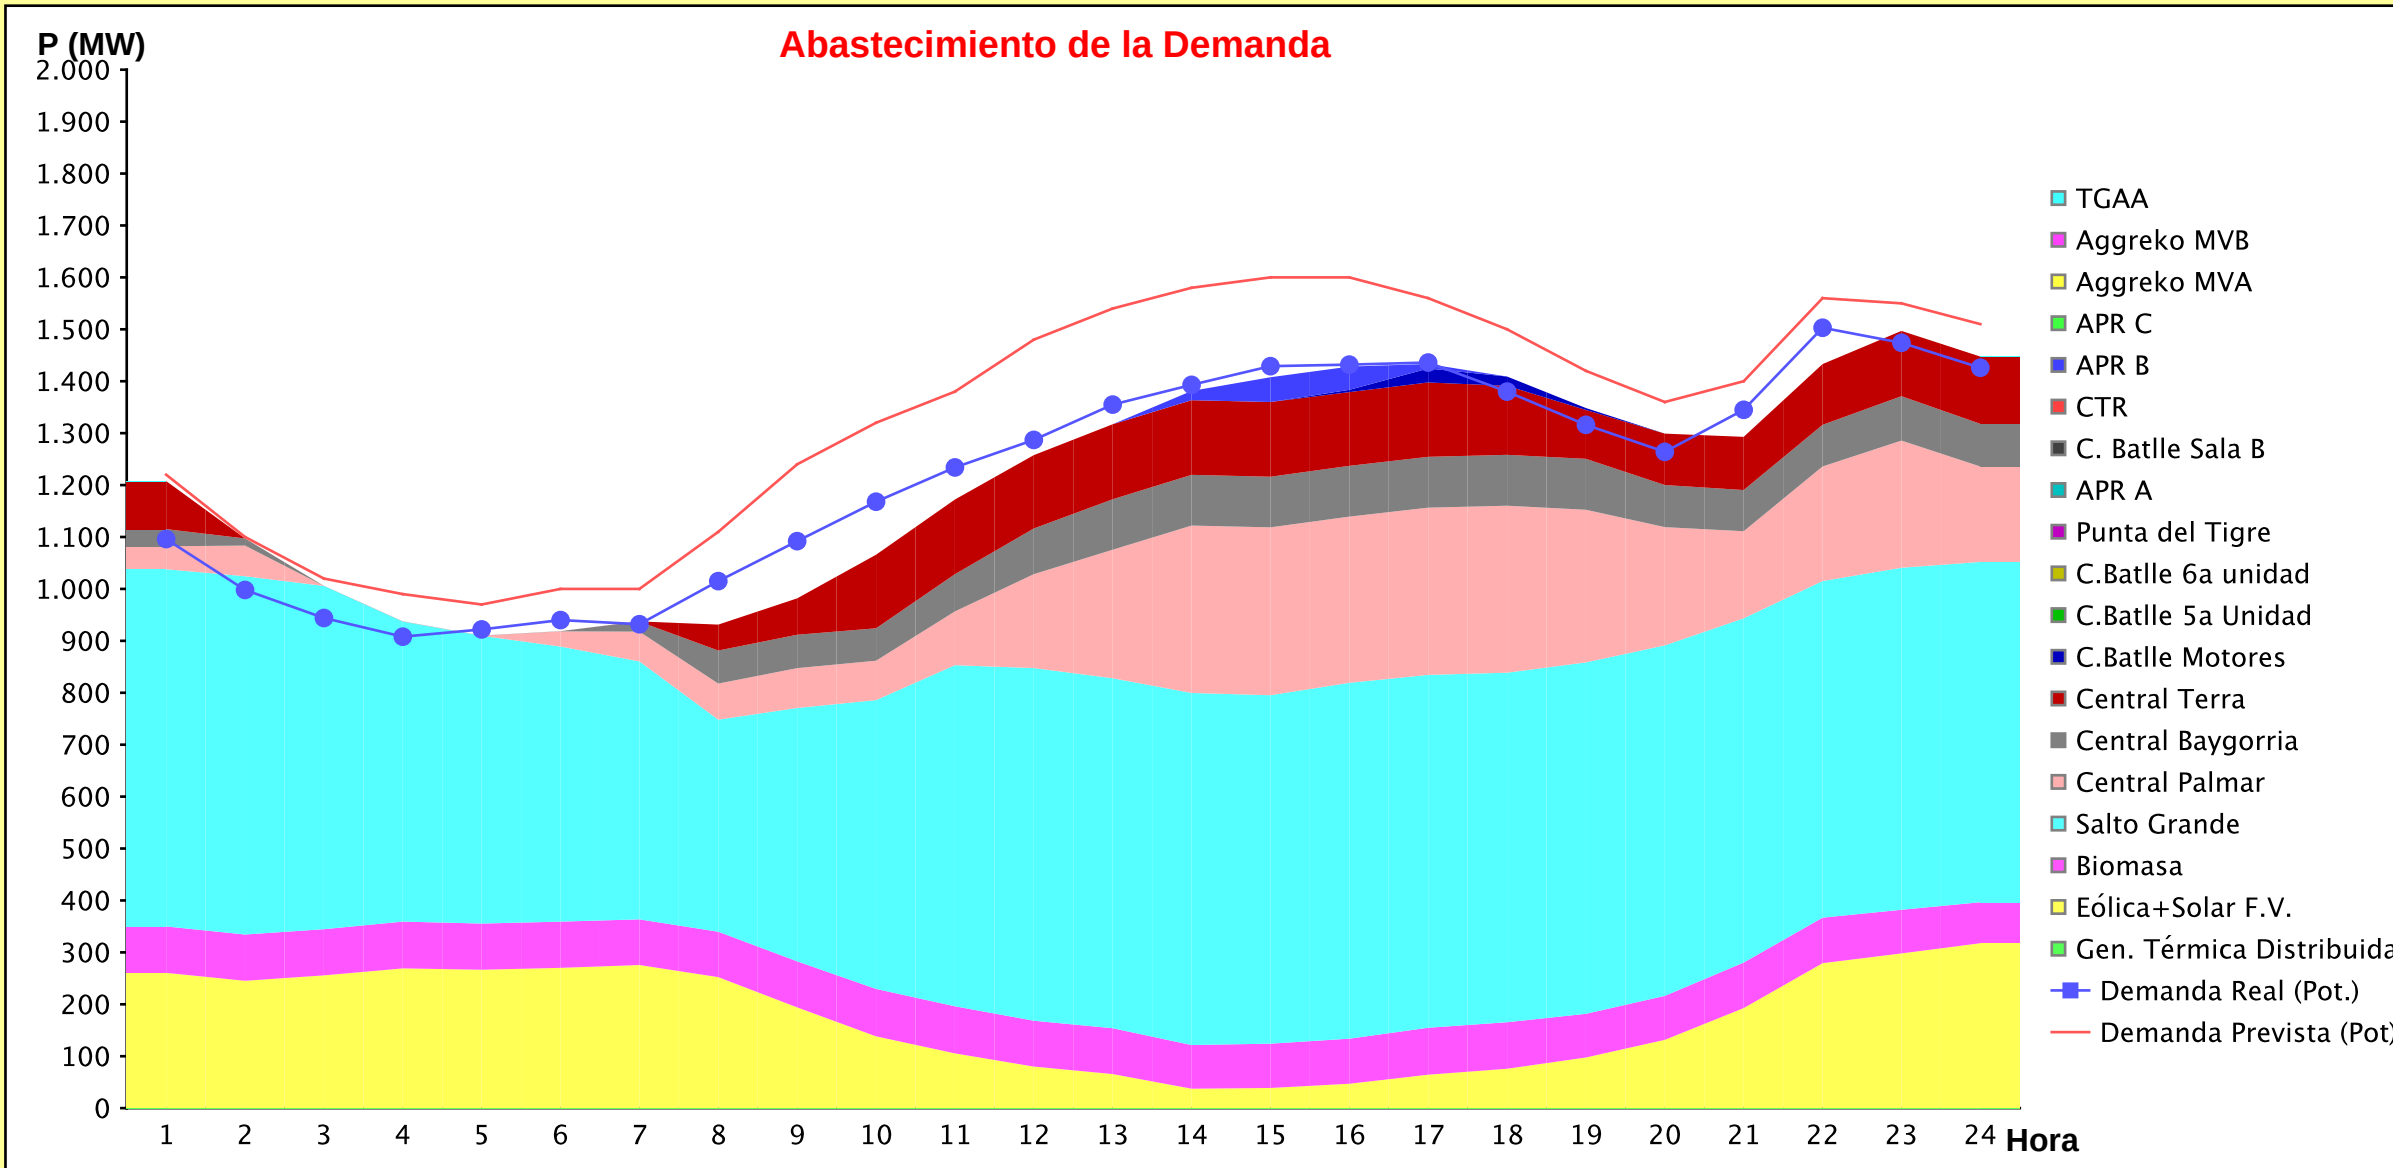


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.907
Hidráulica	1.907
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.907


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.032
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.010
Diferencia (MWh)	-2.978
Ejecutada - Programada	-9,30 %

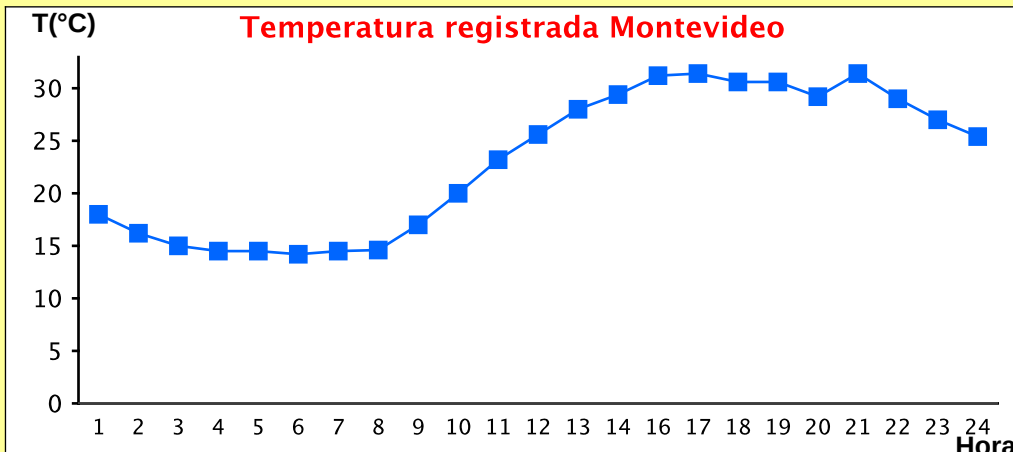

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1453,65 Hora 15:38
Potencia mínima:	896,18 Hora 04:47
Pico noche:	1513,2 Hora 21:50
Generación Media (MW)	
Eólica	177,7
Biomasa	87,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

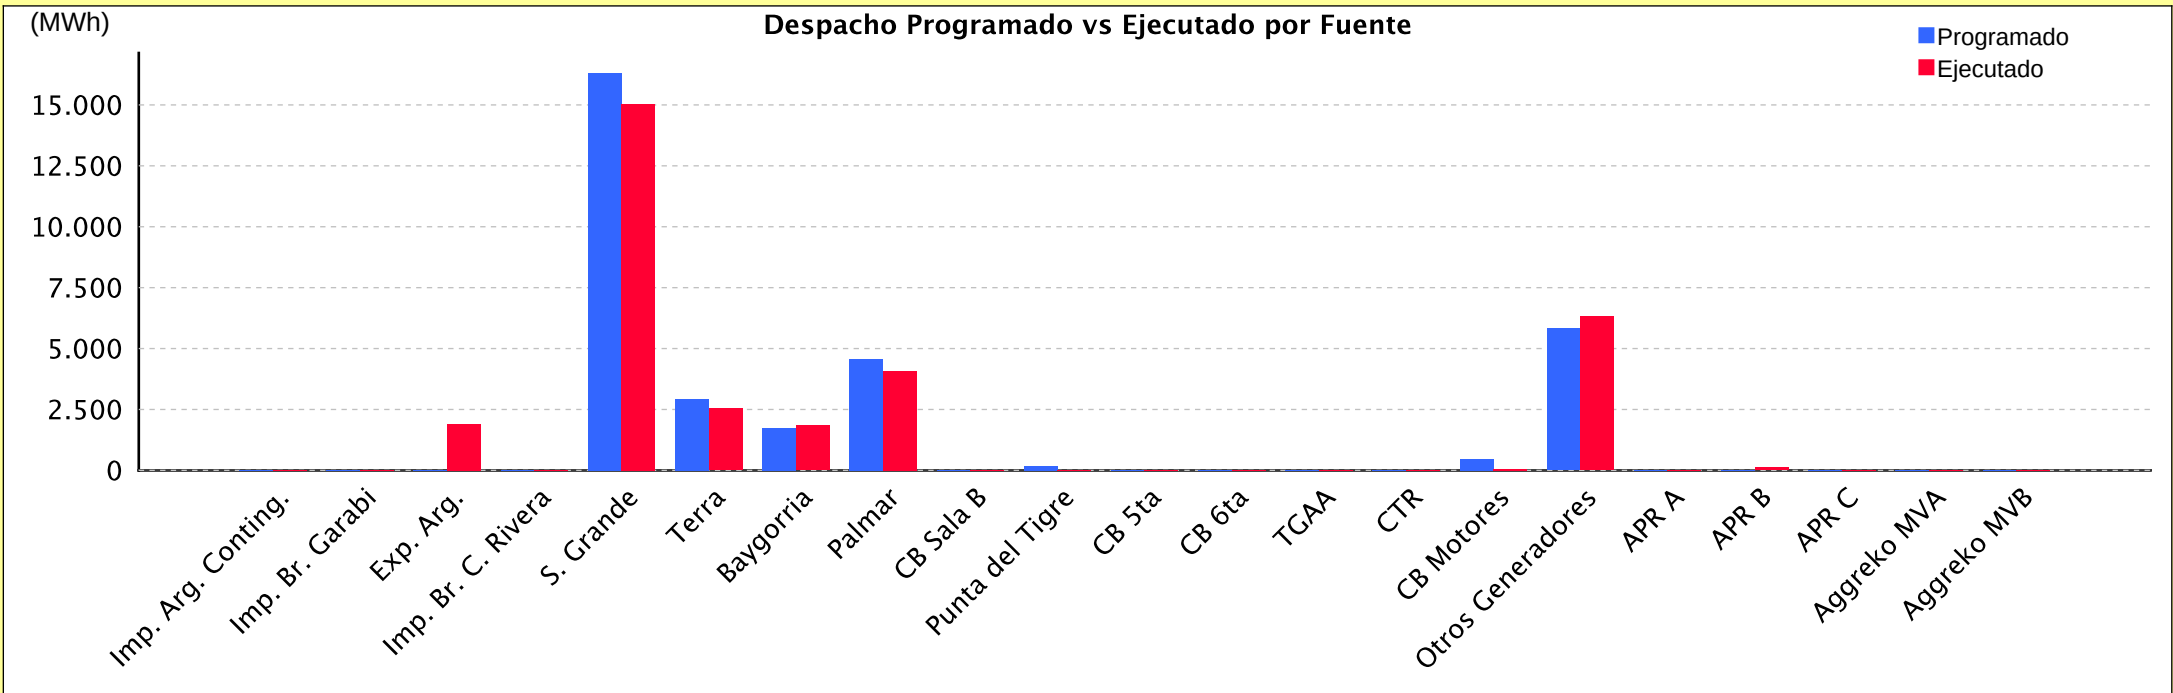
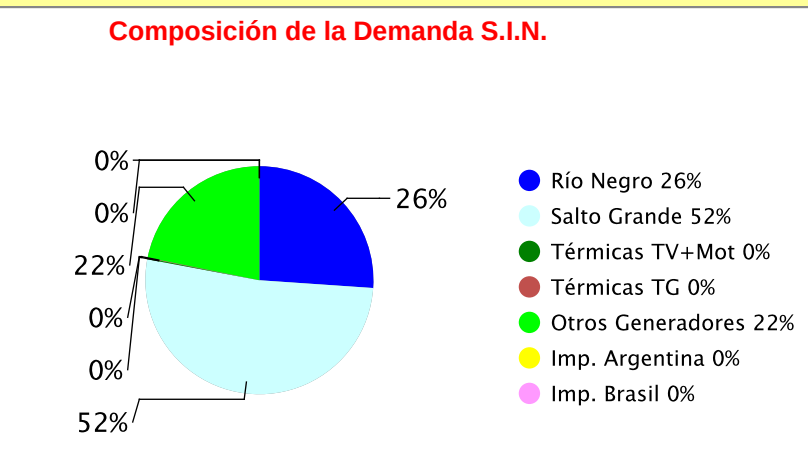


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

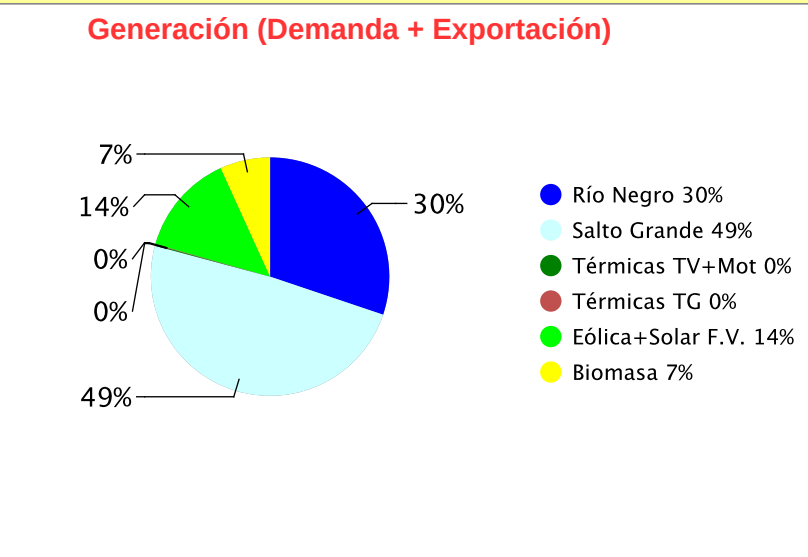



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

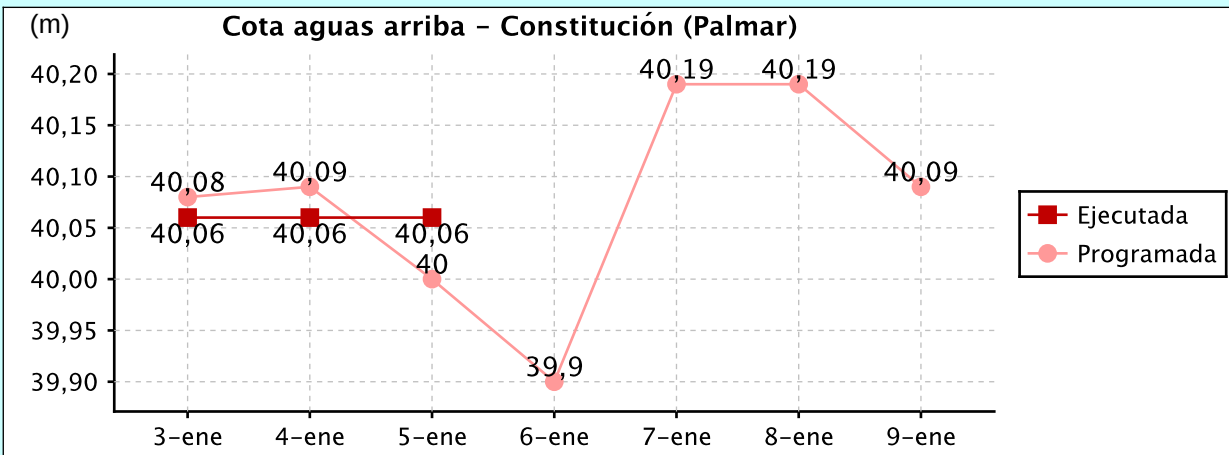
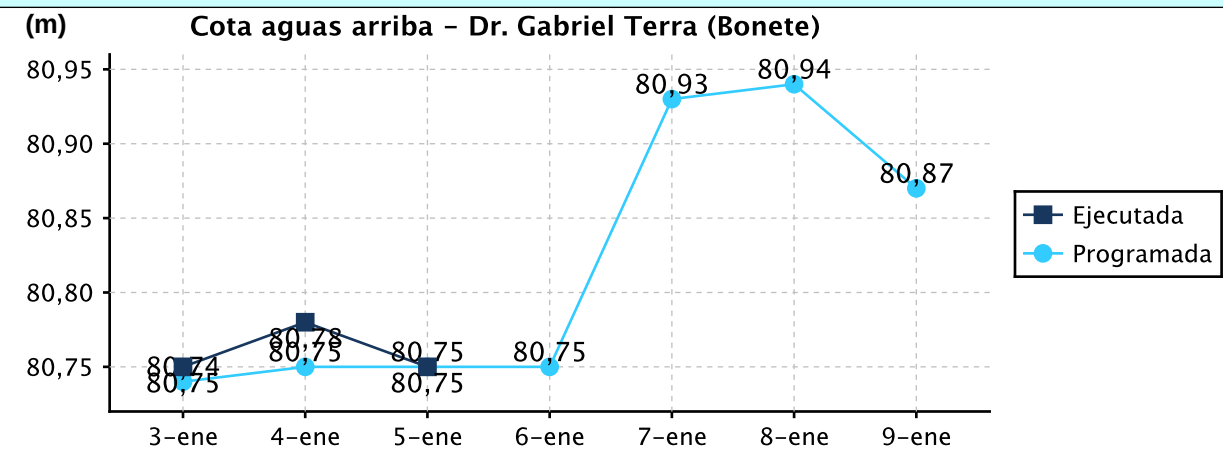


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,75	80,75
Baygorria	54,16	54,23
Palmar	40,00	40,06
SGU	35,27	34,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

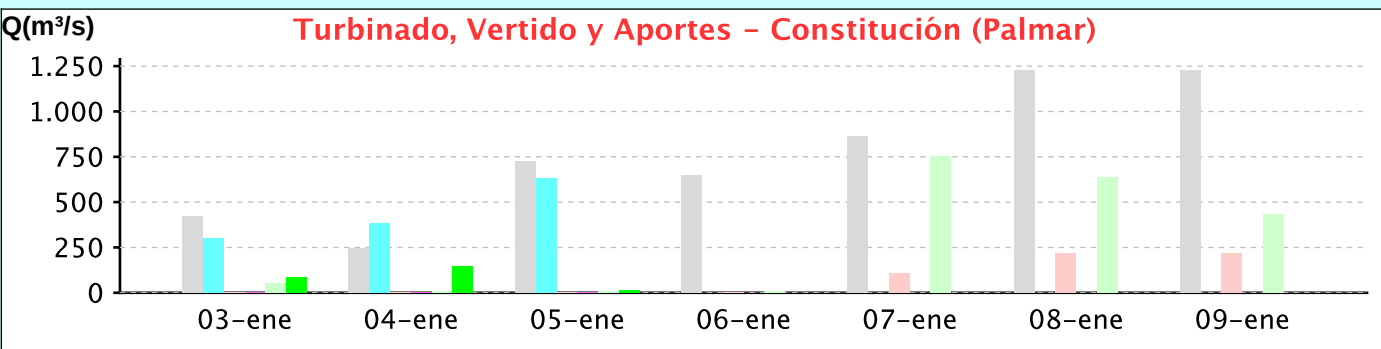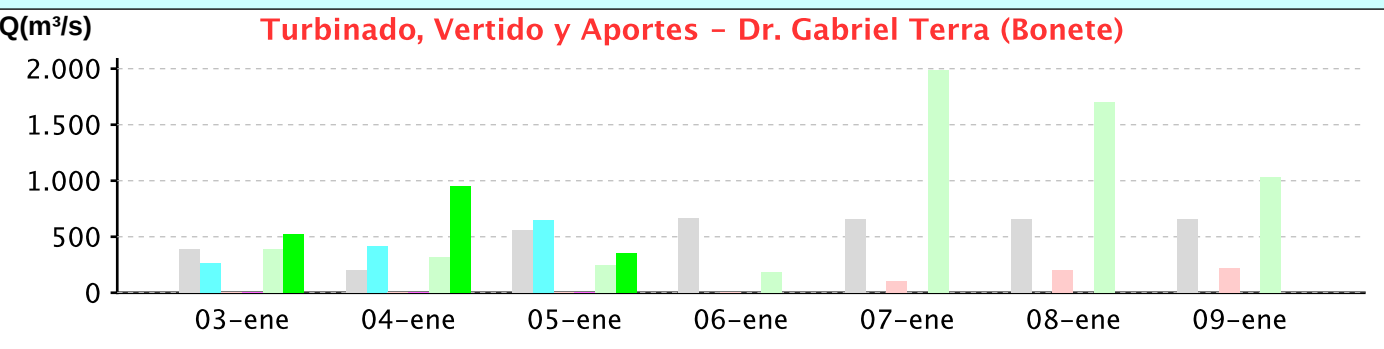

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

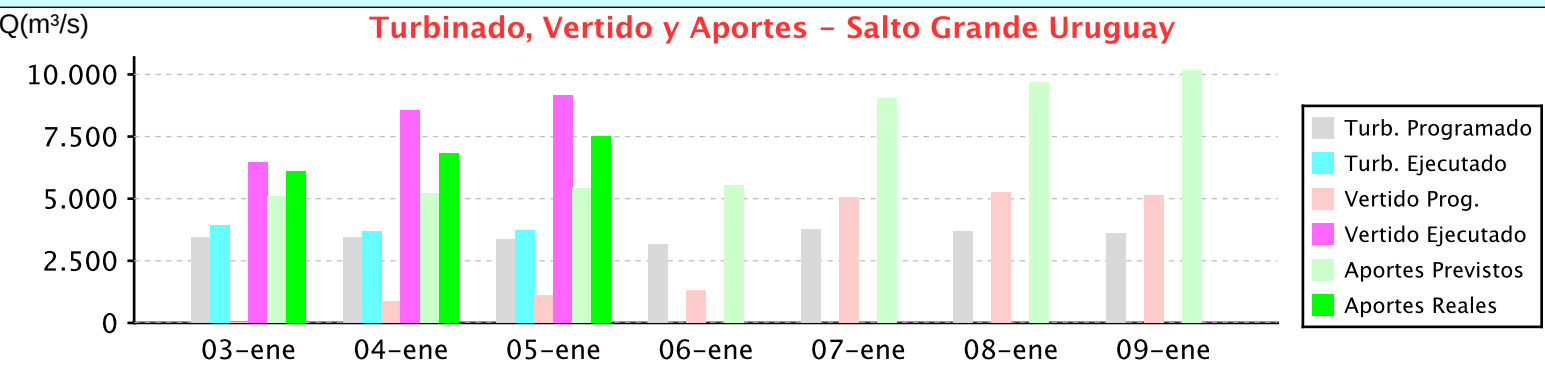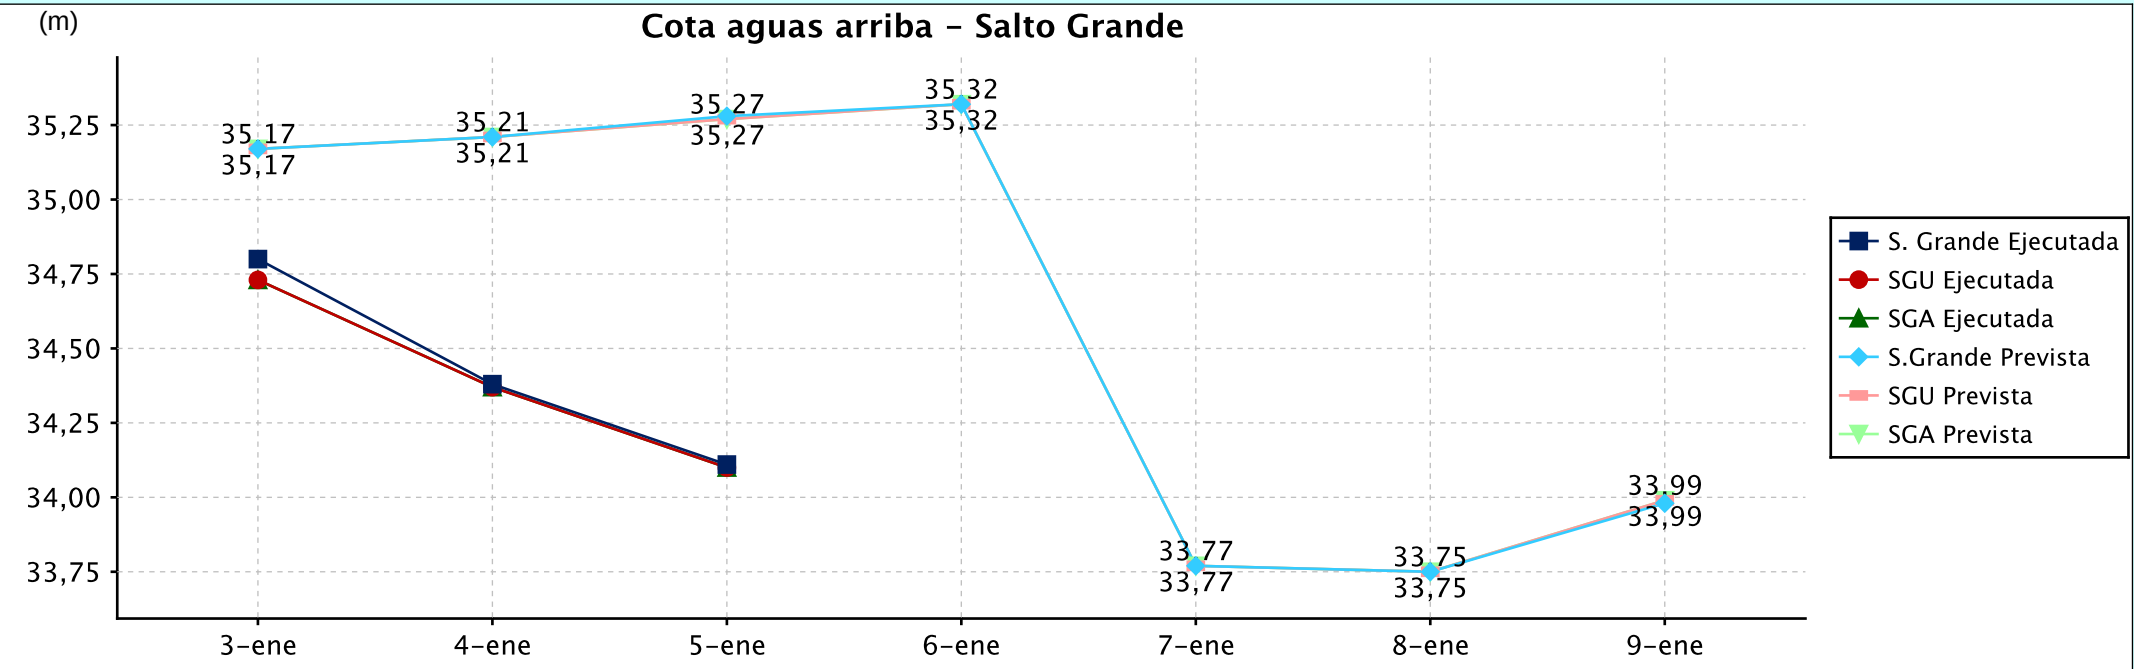

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,10
Cota Vista Arg	34,10
Cota real	34,11
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	558	651
Baygorria	662	661
Palmar	724	633
SGU	3.350	3.716

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	243	352
Baygorria	0	36
Palmar	9	12
SGU	5.400	7.514

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.098	9.141

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 79 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.
